



Dores do Rio Preto-ES, 14 de janeiro de 2026.

**REFERENTE CONTRATO: 3320/2025**

Senhor Prefeito,

Segue anexo o 1º boletim de medição do primeiro termo aditivo referente a Obra de "Reforma da Capela Mortuária de Mundo Novo", no valor de **R\$ 7.408,71** (Sete mil quatrocentos e oito reais e setenta e um centavos).

Atenciosamente,

**Rafael Viana Ângelo**  
Engenheiro Civil



**BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

**Obra:** Reforma da Capela Mortuária de Mundo Novo

**Empresa:** CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA LTDA



**Nº Contrato:** 3320/2025

**Data inicial:** 24/09/2025

**Data final:** 14/01/2026

Nº do B

Valor da Medição **1º TA**

**R\$ 7.408,71**

Item	Descrição	Und.	Contratado			Medições Anteriores		Medição Atual		Acumulado		
			Quant.	P. Unitário	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	%
<b>1</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL</b>											
1.1	REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UND	58,00	2,30	133,69		-	58,00	133,69	58,00	133,69	100,00%
1.2	Limpeza geral da obra (edificação)	m²	198,70	12,82	2.546,45		-	198,70	2.546,45	198,70	2.546,45	100,00%
1.3	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	UND	54,00	5,41	292,08		-	54,00	292,08	54,00	292,08	100,00%
1.4	Remoção e recolocação de rufo metálico.	m	30,00	29,59	887,70		-	30,00	887,70	30,00	887,70	100,00%
1.5	Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação	m²	<b>24,00</b>	90,24	2.165,76		-	24,00	2.165,76	24,00	2.165,76	100,00%
1.6	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	22,56	11,92	269,01		-	22,56	269,01	22,56	269,01	100,00%
1.7	Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo	m²	22,56	49,38	1.114,01		-	22,56	1.114,01	22,56	1.114,01	100,00%
<b>Subtotal</b>					<b>7.408,71</b>		-	<b>7.408,71</b>	<b>7.408,71</b>		<b>7.408,71</b>	

<b>VALOR DO ADITIVO</b>	<b>R\$ 7.408,71</b>	<b>RELATÓRIO FÍSICO DO CONTRATO</b>		<b>RELATÓRIO FINANCEIRO DO CONTRATO</b>	
		% DA MEDIÇÃO 01	<b>100,00 %</b>	MEDIÇÃO 01	<b>R\$ 7.408,71</b>
		% ACUMULADO	<b>100,00 %</b>	ACUMULADO	<b>R\$ 7.408,71</b>
		% SALDO	<b>0,00 %</b>	SALDO	<b>R\$ -</b>

**Rafael Viana Ângelo**  
Engenheiro Civil



**REFERENTE:** Contrato PMDRP 3320/2025 – 1º Boletim de Medição do 1º TA  
**OBRA:** Reforma da Capela Mortuária de Mundo Novo  
**ASSUNTO:** Relatório Fotográfico  
**Data Inicial:** 24/09/2025  
**Data Final:** 14/01/2026




**Foto 01**




**Foto 02**



**Foto 03**

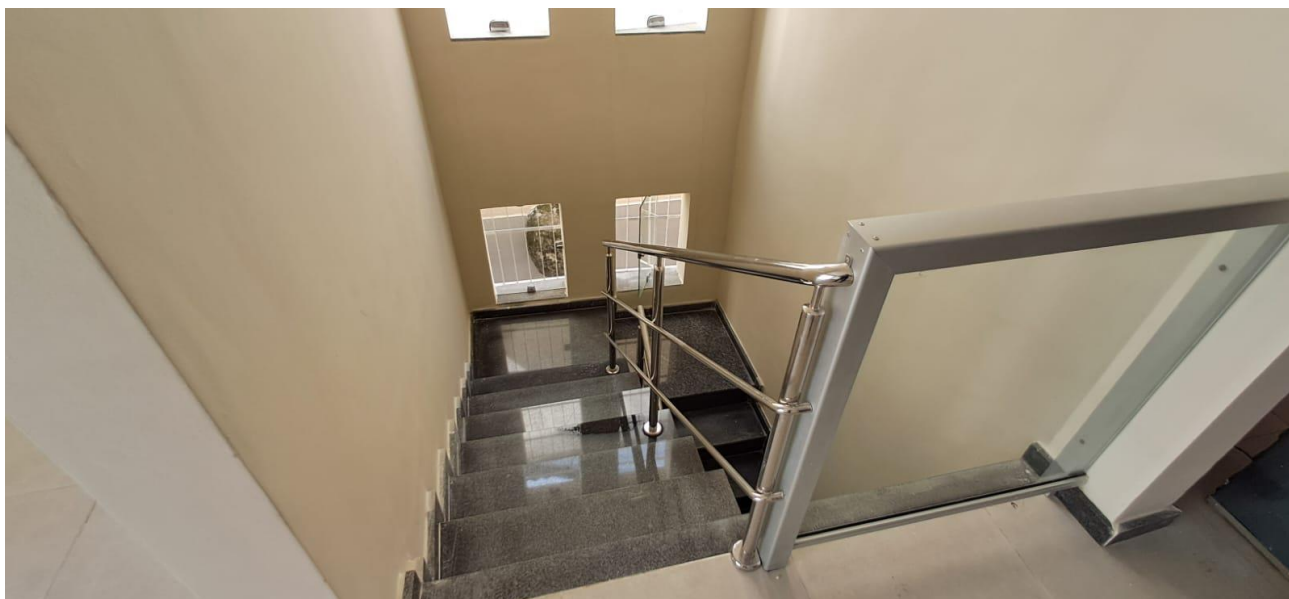


**Foto 04**

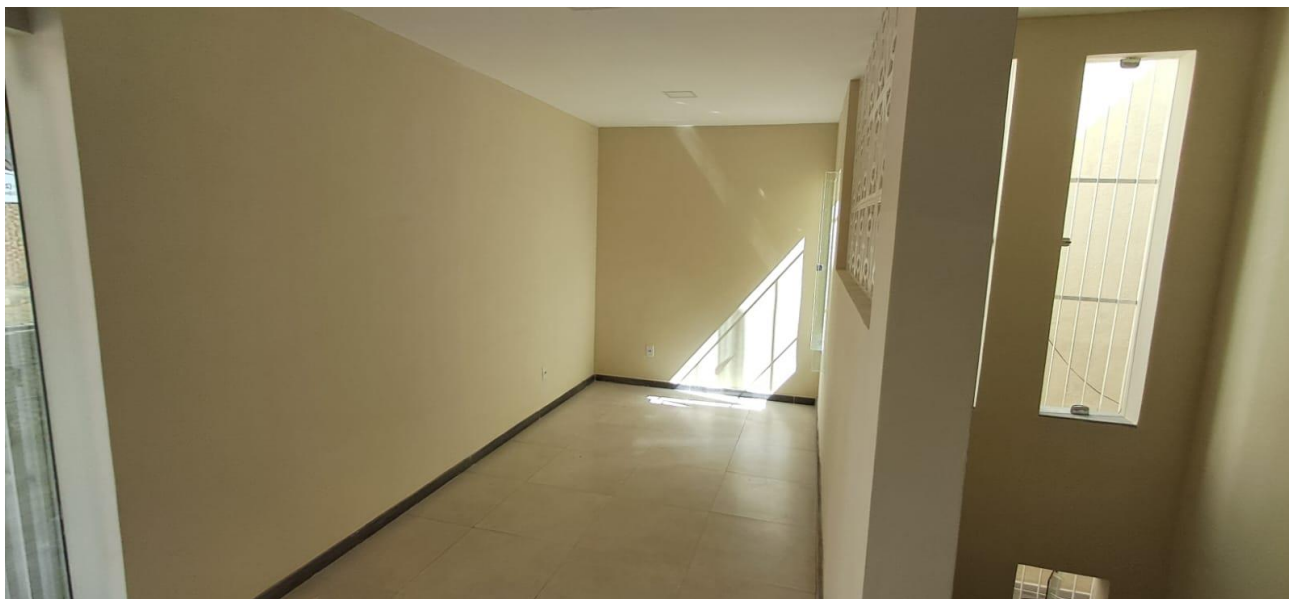


**Foto 05**



**Foto 06**

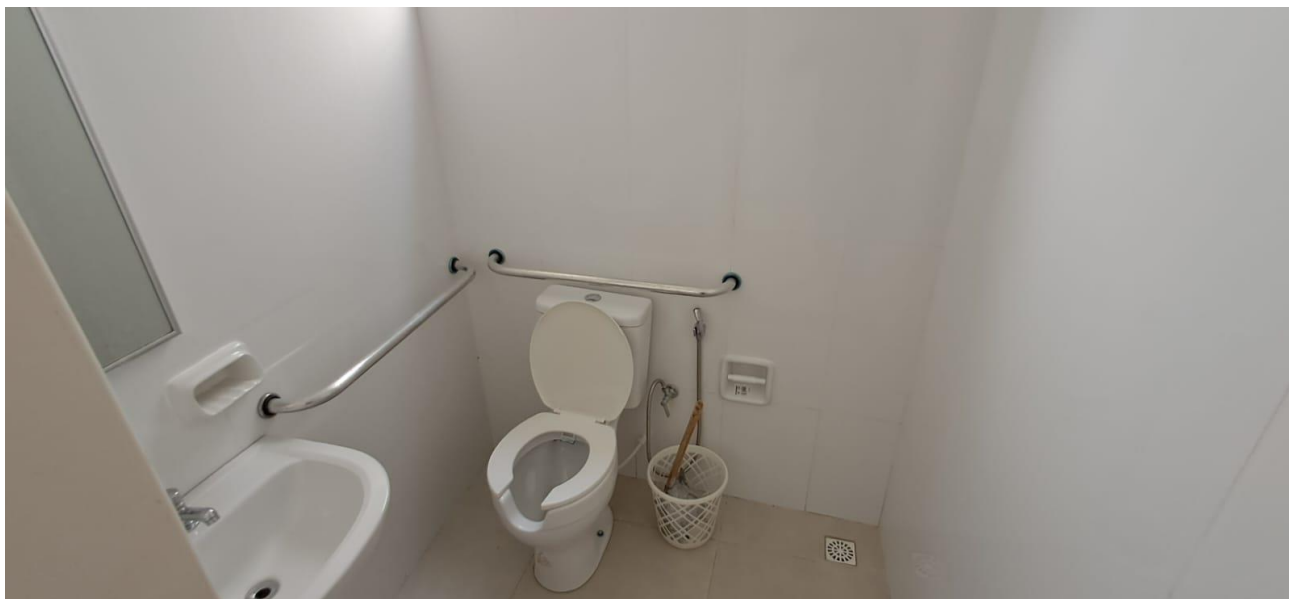

**Foto 07**

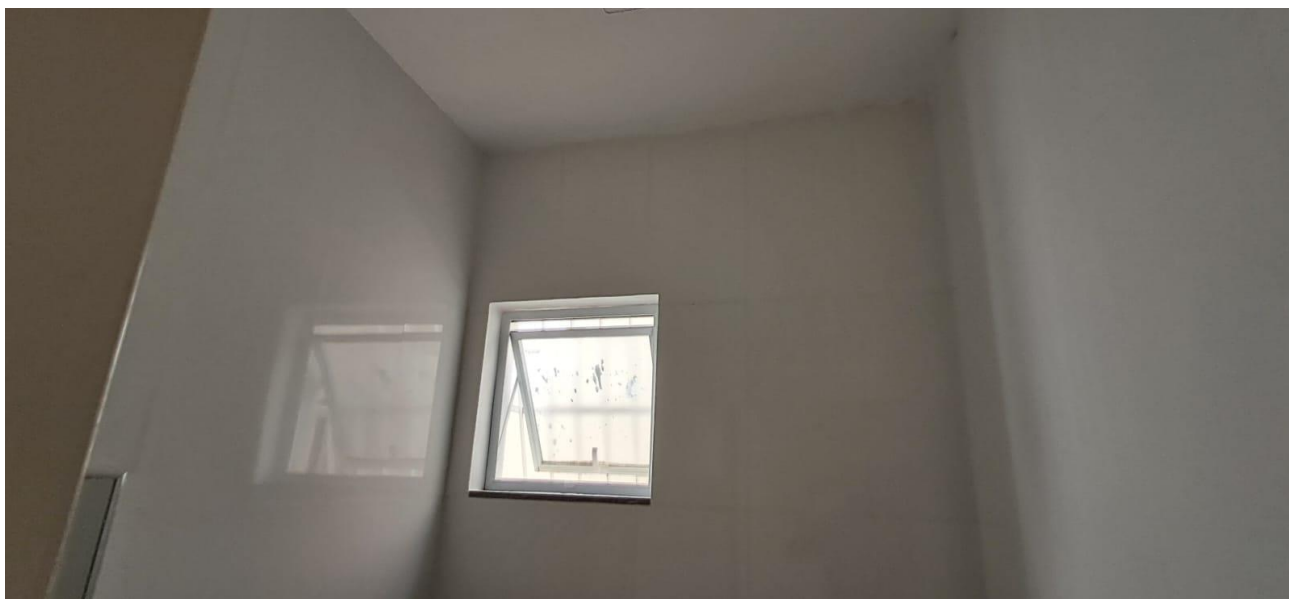


**Foto 08**



**Foto 09**



**Foto 10**

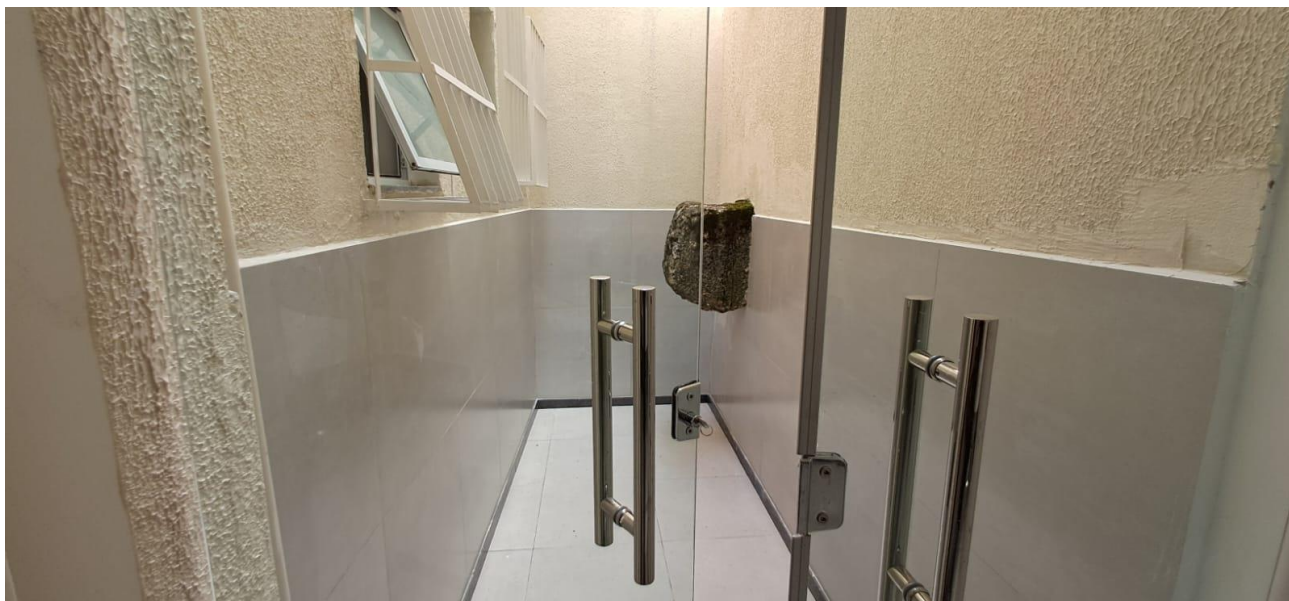

**Foto 11**



**Foto 12**



**Foto 13**

**Rafael Viana Ângelo**  
Engenheiro Civil
