

CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CONVÊNIO															
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI				QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO		MODALIDADE:		DATA BASE:		Nº BOLETIM :		PERÍODO:				
							EXECUTADA					LICITAÇÃO		REF. JUL - 2022 sem Desoneração		03		01/11/2024 a 18/12/2024				
							NO MÊS			ACUMULADA ANTERIOR		ACUMULADA ATUAL		Nº CONTRATO:		VAL. CONTRATADO:		INÍCIO DA OBRA:		TÉRMINO OBRA:		
														003/2024		R\$ 1.248.000,00		28/02/2024		27/02/2025		
														Nº DO ADITIVO:		VALOR ADITIVO:		REINÍCIO OBRA:		TÉRMINO OBRA:		
														1		R\$ 428.593,74		01/07/2024		27/02/2025		
														VALOR								
														CONTRATADO		REALIZADO NO MÊS		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL		
CÓDIGO	FORTE	ITEM	DESCRIÇÃO																			
			01				CAITEIRO DE OBRAS															
S020305	DER-EDIF	01.01	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER				M2	8,00		8,00	8,00	8,00	R\$ 348,14	R\$ 2.785,12	0,00		2785,12				2785,12	
S020802	DER-EDIF	01.02	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)				M2	10,90		10,90	10,90	10,90	R\$ 503,65	R\$ 5.489,76	0,00		5489,76				5489,76	
S020803	DER-EDIF	01.03	BARRACÃO PARA DEPOSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)				M2	10,90		10,90	10,90	10,90	R\$ 442,77	R\$ 4.826,14	0,00		4826,14				4826,14	
S020808	DER-EDIF	01.04	GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)				M2	12,00		12,00	12,00	12,00	R\$ 159,22	R\$ 1.910,58	0,00		1910,58				1910,58	
S020811	DER-EDIF	01.05	RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)				UND	1,00		1,00	1,00	1,00	R\$ 1.469,59	R\$ 1.469,59	0,00		1469,59				1469,59	
			SUBTOTAL										R\$ 16.481,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 16.481,19				R\$ 16.481,19	
			02				COBERTURA															
S090314	DER-EDIF	02.01	RUFO DE CHAPA DE ALUMÍNIO ESP. 0,5MM, LARGURA DE 30CM				M	0,00		-	0,00	0,00	R\$ 59,620	R\$ 0,000	0,00		0,00				0,00	
S090312	DER-EDIF	02.02	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM				M	41,90		41,90	41,90	41,90	R\$ 246,070	R\$ 10.310,333	0,00		10310,33				10310,33	
S090206	DER-EDIF	02.03	COBERTURA NOVA DE TELHAS DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL, H = 8 CM, ESP. 0,5MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO				M2	106,62		106,62	106,62	106,62	R\$ 102,530	R\$ 10.931,749	0,00		10931,75				10931,75	
92580	SINAPI	02.04	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019				M2	520,00		520,00	520,00	520,00	R\$ 60,920	R\$ 31.678,400	0,00		31678,40				31678,40	
101966	SINAPI	02.05	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020				M	126,31	88,15		88,15	88,15	R\$ 87,009	R\$ 10.990,107	7669,84		0,00				7669,84	
			SUBTOTAL										R\$ 63.910,59	R\$ 7.669,84	R\$ 7.669,84		R\$ 52.920,48				R\$ 60.590,32	
			03				IMPERMEABILIZAÇÃO															
S100203	DER-EDIF	03.01	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS				M2	202,71		202,71	202,71	202,71	R\$ 51,210	R\$ 10.380,78	0,00		10380,78				10380,78	
S100105	DER-EDIF	03.02	ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO POLIMÉRICO, ESP.4MM REFORÇ.C/ FILME INT.EM POLIETILENO, REGUL.BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, PROTEÇÃO MEC. ARG. 1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.				M2	92,31		92,10	92,10	92,10	R\$ 310,181	R\$ 28.632,81	0,00		28567,67				28567,67	
98555	SINAPI	03.03	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 06/2018				M2	68,43		68,43	68,43	68,43	R\$ 26,601	R\$ 1.820,31	0,00		1820,31				1820,31	
			SUBTOTAL										R\$ 40.833,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 40.768,76				R\$ 40.768,76	
			04				TETOS E FORROS															
S160702	DER-EDIF	04.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM				M2	43,30	43,30		43,30	43,30	R\$ 7,330	R\$ 317,39	317,39		0,00				317,39	
S160711	DER-EDIF	04.02	REBOCO TIPO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:6, ESPESSURA 25MM				M2	43,30	43,30		43,30	43,30	R\$ 60,020	R\$ 2.598,87	2598,87		0,00				2598,87	
			SUBTOTAL										R\$ 2.916,26	R\$ 2.916,26	R\$ 0,00		R\$ 0,00				R\$ 2.916,26	
			05				REVESTIMENTO DE PAREDES															
S160702	DER-EDIF	05.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM				M2	500,00	26,39		202,27	228,66	R\$ 7,330	R\$ 3.665,00	193,44		1482,64				1676,08	
S160711	DER-EDIF	05.02	REBOCO TIPO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:6, ESPESSURA 25MM				M2	500,00	91,31		115,89	207,20	R\$ 60,020	R\$ 30.010,00	5480,43		6955,72				12436,14	
S120201	DER-EDIF	05.03	AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS À PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO				M2	300,00				0,00	R\$ 91,550	R\$ 27.465,00	0,00		0,00				0,00	

CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CONVÊNIO							
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI				QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO	MODALIDADE:	DATA BASE:	Nº BOLETIM :	PERÍODO:
											LICITAÇÃO	REF. JUL - 2022 sem Desoneração	03	01/11/2024 a 18/12/2024
							Nº CONTRATO:	VAL. CONTRATADO:	INÍCIO DA OBRA:		TÉRMINO OBRA:			
							Nº DO ADITIVO:	VALOR ADITIVO:	REINÍCIO OBRA:		TÉRMINO OBRA:			
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL		CONTRATADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	
S141906	DER-EDIF	08.01.02	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	76,60	12,00	21,30	33,30	R\$ 39,230	R\$ 3.005,02	470,76	835,60	1306,36	
S141907	DER-EDIF	08.01.03	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	61,90	18,00	6,00	24,00	R\$ 50,380	R\$ 3.118,52	906,84	302,28	1209,12	
S141908	DER-EDIF	08.01.04	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	62,37	16,00	4,00	20,00	R\$ 73,190	R\$ 4.564,86	1171,04	292,76	1463,80	
S140903	DER-EDIF	08.01.05	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA	M	107,20		92,69	92,69	R\$ 73,220	R\$ 7.849,18	0,00	6786,76	6786,76	
S141108	DER-EDIF	08.01.06	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM, DIM.60X60CM E HMÁX=1M, COM TAMPA EM CONCR.ESP.5CM, LASTRO CONCR.ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCR.	UND	1,00		1,00	1,00	R\$ 1.202,460	R\$ 1.202,46	0,00	1202,46	1202,46	
S141110	DER-EDIF	08.01.07	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO	UND	4,00	2,00		2,00	R\$ 785,020	R\$ 3.140,08	1570,04	0,00	1570,04	
S140710	DER-EDIF	08.01.08	PONTO PARA CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA EM AÇO INOX	UND	10,00	3,00		3,00	R\$ 224,460	R\$ 2.244,60	673,38	0,00	673,38	
89491	SINAPI	08.01.09	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 06/2022	UN	6,00	3,00		3,00	R\$ 107,120	R\$ 642,72	321,36	0,00	321,36	
S140711	DER-EDIF	08.01.10	PONTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO SIFONADO 100 X 40 MM C/ GRELHA EM AÇO INOX	UND	17,00	6,00	5,00	11,00	R\$ 125,310	R\$ 2.130,27	751,86	626,55	1378,41	
89748	SINAPI	08.01.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	22,00		10,00	10,00	R\$ 56,670	R\$ 1.246,74	0,00	566,70	566,70	
89728	SINAPI	08.01.12	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	32,00		18,00	18,00	R\$ 15,780	R\$ 504,96	0,00	284,04	284,04	
89746	SINAPI	08.01.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	16,00	4,00	8,00	12,00	R\$ 33,940	R\$ 543,04	135,76	271,52	407,28	
89726	SINAPI	08.01.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	0,00	-		0,00	R\$ 11,470	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
89732	SINAPI	08.01.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	0,00	-		0,00	R\$ 17,830	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
89724	SINAPI	08.01.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	0,00	-		0,00	R\$ 11,100	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
89731	SINAPI	08.01.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	0,00	-		0,00	R\$ 16,660	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
89805	SINAPI	08.01.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	0,00	-		0,00	R\$ 24,970	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
89569	SINAPI	08.01.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 08/2022	UN	11,00	5,00	2,00	7,00	R\$ 134,270	R\$ 1.476,97	671,35	268,54	939,89	
89797	SINAPI	08.01.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	9,00	3,00	5,00	8,00	R\$ 65,970	R\$ 593,73	197,91	329,85	527,76	
89785	SINAPI	08.01.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	0,00	-		0,00	R\$ 32,380	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
104343	SINAPI	08.01.22	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	0,00	-		0,00	R\$ 42,190	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			CONVÊNIO													
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI			QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO										
													MODALIDADE:				DATA BASE:	Nº BOLETIM :	PERÍODO:
													LICITAÇÃO				REF. JUL - 2022 sem Desoneração	03	01/11/2024 a 18/12/2024
													Nº CONTRATO:		VAL. CONTRATADO:		INÍCIO DA OBRA:		TÉRMINO OBRA:
003/2024		R\$ 1.248.000,00		28/02/2024		27/02/2025													
Nº DO ADITIVO:		VALOR ADITIVO:		REINÍCIO OBRA:		TÉRMINO OBRA:													
1		R\$ 428.593,74		01/07/2024		27/02/2025													
								VALOR											
CONTRATADO		REALIZADO NO MÊS		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL													
CÓDIGO	FUNTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL											
89677	SINAPI	08.01.23	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	0,00	-	0,00	0,00	R\$ 100,510	R\$ 0,00	0,00	0,00							
89549	SINAPI	08.01.24	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	0,00	-	0,00	0,00	R\$ 24,940	R\$ 0,00	0,00	0,00							
89623	SINAPI	08.01.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,00	-	0,00	0,00	R\$ 23,160	R\$ 0,00	0,00	0,00							
89687	SINAPI	08.01.26	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	0,00	-	0,00	0,00	R\$ 69,440	R\$ 0,00	0,00	0,00							
89504	SINAPI	08.01.27	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,00	-	0,00	0,00	R\$ 22,640	R\$ 0,00	0,00	0,00							
89519	SINAPI	08.01.28	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,00	-	0,00	0,00	R\$ 60,560	R\$ 0,00	0,00	0,00							
89502	SINAPI	08.01.29	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,00	-	0,00	0,00	R\$ 19,970	R\$ 0,00	0,00	0,00							
89515	SINAPI	08.01.30	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,00	-	0,00	0,00	R\$ 111,630	R\$ 0,00	0,00	0,00							
89501	SINAPI	08.01.31	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,00	-	0,00	0,00	R\$ 16,260	R\$ 0,00	0,00	0,00							
89825	SINAPI	08.01.32	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,00	-	0,00	0,00	R\$ 22,300	R\$ 0,00	0,00	0,00							
89786	SINAPI	08.01.33	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,00	-	0,00	0,00	R\$ 48,820	R\$ 0,00	0,00	0,00							
89744	SINAPI	08.01.34	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	15,00	6,00	3,00	9,00	R\$ 32,594	R\$ 488,91	195,56	97,78							
89778	SINAPI	08.01.35	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	47,00	28,00	3,00	31,00	R\$ 21,405	R\$ 1.006,04	599,34	64,22							
104356	SINAPI	08.01.36	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,00	3,00		3,00	R\$ 43,494	R\$ 43,49	130,48	0,00							
104348	SINAPI	08.01.37	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	5,00	-		0,00	R\$ 16,561	R\$ 82,81	0,00	0,00							
89707	SINAPI	08.01.38	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	13,00	6,00	2,00	8,00	R\$ 49,880	R\$ 648,44	299,28	99,76							
		08.02	INSTALAÇÕES DE ÁGUA																
S141410	DER-EDIF	08.02.01	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARRROM, DIÂM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	68,01		9,20	9,20	R\$ 28,470	R\$ 1.936,24	0,00	261,92							
S141411	DER-EDIF	08.02.02	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARRROM, DIÂM. 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	227,03	24,00	186,51	210,51	R\$ 37,650	R\$ 8.547,68	903,60	7022,10							
S141412	DER-EDIF	08.02.03	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARRROM, DIÂM. 40MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,67			0,00	R\$ 46,310	R\$ 725,68	0,00	0,00							
S141413	DER-EDIF	08.02.04	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARRROM, DIÂM. 50MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	86,76			0,00	R\$ 57,100	R\$ 4.954,00	0,00	0,00							
S141414	DER-EDIF	08.02.05	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARRROM, DIÂM. 60MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	18,00			0,00	R\$ 80,510	R\$ 1.449,18	0,00	0,00							
94495	SINAPI	08.02.06	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	18,00			0,00	R\$ 73,600	R\$ 1.324,80	0,00	0,00							
94497	SINAPI	08.02.07	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	6,00			0,00	R\$ 126,980	R\$ 761,88	0,00	0,00							
94498	SINAPI	08.02.08	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,00			0,00	R\$ 175,600	R\$ 526,80	0,00	0,00							
94792	SINAPI	08.02.09	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	16,00		12,00	12,00	R\$ 138,150	R\$ 2.210,40	0,00	1657,80							

CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			CONVÊNIO								
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI			QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO					
						EXECUTADA			VALOR					
			UNID.			QUANTIDADE CONTRATADA			CONTRATADO					
						NO MÊS			REALIZADO NO MÊS					
									ACUMULADO ANTERIOR					
									ACUMULADA ATUAL					
CÓDIGO	FORTE	ITEM	DESCRIÇÃO											
94794	SINAPI	08.02.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021			UN	2,00	-	0,00	R\$ 200,770	R\$ 401,54	0,00	0,00	0,00
94793	SINAPI	08.02.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021			UN	2,00	-	0,00	R\$ 189,900	R\$ 379,80	0,00	0,00	0,00
89987	SINAPI	08.02.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021			UN	3,00	-	0,00	R\$ 113,290	R\$ 339,87	0,00	0,00	0,00
90373	SINAPI	08.02.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022			UN	24,00	-	0,00	R\$ 15,040	R\$ 360,96	0,00	0,00	0,00
89361	SINAPI	08.02.14	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022			UN	1,00	-	0,00	R\$ 10,130	R\$ 10,13	0,00	0,00	0,00
89406	SINAPI	08.02.15	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022			UN	11,00	-	0,00	R\$ 9,360	R\$ 102,96	0,00	0,00	0,00
104202	SINAPI	08.02.16	TE NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022			UN	3,00	-	0,00	R\$ 10,170	R\$ 30,51	0,00	0,00	0,00
99635	SINAPI	08.02.17	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021			UN	19,00	12,00	12,00	R\$ 303,320	R\$ 5.763,08	0,00	3639,84	3639,84
103955	SINAPI	08.02.18	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022			UN	2,00	-	0,00	R\$ 10,910	R\$ 21,82	0,00	0,00	0,00
89429	SINAPI	08.02.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSAS E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022			UN	3,00	-	0,00	R\$ 6,230	R\$ 18,69	0,00	0,00	0,00
94658	SINAPI	08.02.20	ADAPTADOR CURTO COM BOLSAS E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016			UN	68,00	-	0,00	R\$ 8,070	R\$ 548,76	0,00	0,00	0,00
94660	SINAPI	08.02.21	ADAPTADOR CURTO COM BOLSAS E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016			UN	4,00	-	0,00	R\$ 13,870	R\$ 55,48	0,00	0,00	0,00
94662	SINAPI	08.02.22	ADAPTADOR CURTO COM BOLSAS E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016			UN	10,00	4,00	4,00	R\$ 14,980	R\$ 149,80	0,00	59,92	59,92
94664	SINAPI	08.02.23	ADAPTADOR CURTO COM BOLSAS E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016			UN	4,00	2,00	2,00	R\$ 32,040	R\$ 128,16	0,00	64,08	64,08
103953	SINAPI	08.02.24	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022			UN	1,00	-	0,00	R\$ 7,380	R\$ 7,38	0,00	0,00	0,00
89546	SINAPI	08.02.25	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022			UN	1,00	-	0,00	R\$ 14,480	R\$ 14,48	0,00	0,00	0,00
103971	SINAPI	08.02.26	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022			UN	1,00	-	0,00	R\$ 32,300	R\$ 32,30	0,00	0,00	0,00
104014	SINAPI	08.02.27	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022			UN	6,00	-	0,00	R\$ 12,080	R\$ 72,48	0,00	0,00	0,00
103999	SINAPI	08.02.28	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022			UN	1,00	-	0,00	R\$ 14,030	R\$ 14,03	0,00	0,00	0,00

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			CONVÊNIO										
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI			QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO							
													MODALIDADE:			
													DATA BASE:			
													Nº BOLETIM :			
													PERÍODO:			
LICITAÇÃO																
REF.:JUL - 2022 sem Desoneração																
03																
01/11/2024 a 18/12/2024																
Nº CONTRATO:		VAL. CONTRATADO:		INÍCIO DA OBRA:		TÉRMINO OBRA:										
003/2024		R\$ 1.248.000,00		28/02/2024		27/02/2025										
Nº DO ADITIVO:		VALOR ADITIVO:		REINÍCIO OBRA:		TÉRMINO OBRA:										
1		R\$ 428.593,74		01/07/2024		27/02/2025										
								VALOR								
CONTRATADO		REALIZADO NO MÊS		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL										
CÓDIGO	FORTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL								
104003	SINAPI	08.02.29	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00		12,00	12,00	R\$ 16,830	R\$ 269,28	0,00	201,96	201,96			
89364	SINAPI	08.02.30	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	-		0,00	R\$ 12,620	R\$ 126,20	0,00	0,00	0,00			
89494	SINAPI	08.02.31	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	43,00	-		0,00	R\$ 15,130	R\$ 650,59	0,00	0,00	0,00			
89503	SINAPI	08.02.32	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	-		0,00	R\$ 28,250	R\$ 367,25	0,00	0,00	0,00			
89507	SINAPI	08.02.33	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	-		0,00	R\$ 61,700	R\$ 246,80	0,00	0,00	0,00			
89502	SINAPI	08.02.34	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	-		0,00	R\$ 19,970	R\$ 19,97	0,00	0,00	0,00			
89362	SINAPI	08.02.35	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	39,00	-		0,00	R\$ 9,260	R\$ 361,14	0,00	0,00	0,00			
89492	SINAPI	08.02.36	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	-		0,00	R\$ 9,110	R\$ 18,22	0,00	0,00	0,00			
94657	SINAPI	08.02.37	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	-		0,00	R\$ 6,620	R\$ 13,24	0,00	0,00	0,00			
94659	SINAPI	08.02.38	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	-		0,00	R\$ 8,380	R\$ 67,04	0,00	0,00	0,00			
89577	SINAPI	08.02.39	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	-		0,00	R\$ 49,420	R\$ 148,26	0,00	0,00	0,00			
89617	SINAPI	08.02.40	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	-		0,00	R\$ 7,850	R\$ 31,40	0,00	0,00	0,00			
89620	SINAPI	08.02.41	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	-		0,00	R\$ 13,270	R\$ 13,27	0,00	0,00	0,00			
104004	SINAPI	08.02.42	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	-	2,00	2,00	R\$ 33,000	R\$ 462,00	0,00	66,00	66,00			
89628	SINAPI	08.02.43	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	-		0,00	R\$ 61,280	R\$ 183,84	0,00	0,00	0,00			
104008	SINAPI	08.02.44	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	-		0,00	R\$ 37,530	R\$ 187,65	0,00	0,00	0,00			
89427	SINAPI	08.02.45	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	-		0,00	R\$ 14,700	R\$ 102,90	0,00	0,00	0,00			
94707	SINAPI	08.02.46	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	-		0,00	R\$ 85,370	R\$ 597,59	0,00	0,00	0,00			
89366	SINAPI	08.02.47	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	-		0,00	R\$ 19,540	R\$ 97,70	0,00	0,00	0,00			
103950	SINAPI	08.02.48	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,00	-		0,00	R\$ 11,600	R\$ 394,40	0,00	0,00	0,00			
104008	SINAPI	08.02.49	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	-		0,00	R\$ 37,530	R\$ 1.313,55	0,00	0,00	0,00			
S141415	DER-EDIF	08.02.50	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRROM, DIÂM. 75MM (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	11,60	-		0,00	R\$ 127,710	R\$ 1.481,44	0,00	0,00	0,00			
S141409	DER-EDIF	08.02.51	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRROM, DIÂM. 20MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,30	-	1,50	1,50	R\$ 23,413	R\$ 358,22	0,00	35,12	35,12			
94704	SINAPI	08.02.52	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	-		0,00	R\$ 35,834	R\$ 107,50	0,00	0,00	0,00			

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			CONVÊNIO														
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI			QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO											
													MODALIDADE:				DATA BASE:	Nº BOLETIM :	PERÍODO:	
													LICITAÇÃO				REF. JUL - 2022 sem Desoneração	03	01/11/2024 a 18/12/2024	
													Nº CONTRATO:		VAL. CONTRATADO:		INÍCIO DA OBRA:		TÉRMINO OBRA:	
													003/2024		R\$ 1.248.000,00		28/02/2024		27/02/2025	
Nº DO ADITIVO:		VALOR ADITIVO:		REINÍCIO OBRA:		TÉRMINO OBRA:														
1		R\$ 428.593,74		01/07/2024		27/02/2025														
VALOR																				
CONTRATADO		REALIZADO NO MÊS		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL														
CÓDIGO	FORTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL												
94707	SINAPI	08.02.53	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	-	0,00	0,00	R\$ 85,373	R\$ 85,37	0,00	0,00								
94703	SINAPI	08.02.54	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00	-	0,00	0,00	R\$ 26,570	R\$ 53,14	0,00	0,00								
94705	SINAPI	08.02.55	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	4,00	-	0,00	0,00	R\$ 49,559	R\$ 198,24	0,00	0,00								
94496	SINAPI	08.02.56	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	-	0,00	0,00	R\$ 100,289	R\$ 200,58	0,00	0,00								
S170328	DER-EDIF	08.02.57	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	18,00	-	2,00	2,00	R\$ 128,256	R\$ 2.308,61	0,00	256,51								
94492	SINAPI	08.02.58	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	-	0,00	0,00	R\$ 85,601	R\$ 171,20	0,00	0,00								
94795	SINAPI	08.02.59	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,00	-	0,00	0,00	R\$ 38,732	R\$ 116,20	0,00	0,00								
94796	SINAPI	08.02.60	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	-	0,00	0,00	R\$ 44,416	R\$ 44,42	0,00	0,00								
S170540	DER-EDIF	08.02.61	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 1000L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BOIA	UND	3,00	-	0,00	0,00	R\$ 753,651	R\$ 2.260,95	0,00	0,00								
S142201	DER-EDIF	08.02.62	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 1/2" A 1"	M	121,50	24,00	93,70	117,70	R\$ 12,659	R\$ 1.538,07	303,82	1186,15								
		08.03	INSTALAÇÕES DE APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS																	
S170561	DER-EDIF	08.03.01	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 15.000L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 5 X 16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRAS DE BOIA	UND	3,00	-	1,00	1,00	R\$ 12.002,030	R\$ 36.006,09	0,00	12002,03								
86932	SINAPI	08.03.02	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	14,00	-	10,00	10,00	R\$ 542,110	R\$ 7.589,54	0,00	5421,10								
S170613	DER-EDIF	08.03.03	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA DE CANTO P/ BANHEIRO PNE, COLEÇÃO MASTER L76.17, REF. DECA OU EQUIVALENTE, INCL VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES METÁLICOS CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND	7,00	-	5,00	5,00	R\$ 1.955,400	R\$ 13.687,80	0,00	9777,00								
100854	SINAPI	08.03.04	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF 01/2020	UN	7,00	-	3,00	3,00	R\$ 1.456,900	R\$ 10.198,30	0,00	4370,70								
S170101	DER-EDIF	08.03.05	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND	3,00	-	3,00	3,00	R\$ 613,660	R\$ 1.840,98	0,00	1840,98								
S170115	DER-EDIF	08.03.06	CUBA LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, COMPLETA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND	10,00	-	5,00	5,00	R\$ 361,860	R\$ 3.618,60	0,00	1809,30								
S170205	DER-EDIF	08.03.07	BANCADA DE MÁRMORE ESP. 3CM	M2	7,20	-	2,50	2,50	R\$ 536,160	R\$ 3.860,35	0,00	1340,40								
S170353	DER-EDIF	08.03.08	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	12,00	-	10,00	10,00	R\$ 572,250	R\$ 6.867,00	0,00	5722,50								
S170534	DER-EDIF	08.03.09	PIA EM AÇO INOX COM 02 CUBAS Nº 1, DIMENSÕES 0,60 X 2,50, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA, EXCLUSIVE SIFÃO	UND	3,00	-	1,00	1,00	R\$ 3.150,790	R\$ 9.452,37	0,00	3150,79								
S170222	DER-EDIF	08.03.10	BANCADA E TANQUE PARA PANELOES EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, DIM. 0,80X1,10M, BASE DE CONCRETO E APOIO EM ALVENARIA, FRONTÃO H=10CM, INCL VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA, CONF. DET. PROJETO	UND	2,00	-	0,00	0,00	R\$ 2.063,030	R\$ 4.126,06	0,00	0,00								
S170546	DER-EDIF	08.03.11	TANQUE EM MÁRMORE SINTÉTICO COM 2 BOJOS, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM PVC	UND	1,00	-	0,00	0,00	R\$ 373,400	R\$ 373,40	0,00	0,00								
S170313	DER-EDIF	08.03.12	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA, DIAM. 1/2" PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	4,00	-	2,00	2,00	R\$ 184,920	R\$ 739,68	0,00	369,84								
S170315	DER-EDIF	08.03.13	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	7,00	-	3,00	3,00	R\$ 234,140	R\$ 1.638,98	0,00	702,42								

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			CONVÊNIO							
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI			QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO				
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	EXECUTADA			CONTRATADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	
						NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL					
89746	SINAPI	08.04.07	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	2,00		2,00	R\$ 33,940	R\$ 67,88	67,88	0,00	67,88
89744	SINAPI	08.04.08	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	4,00		4,00	R\$ 32,594	R\$ 130,38	130,38	0,00	130,38
89778	SINAPI	08.04.09	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	6,00		6,00	R\$ 21,405	R\$ 128,43	128,43	0,00	128,43
S141111	DER-EDIF	08.04.10	CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPÁ EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO. INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	1,00	1,00		1,00	R\$ 776,225	R\$ 776,23	776,23	0,00	776,23
SUBTOTAL									R\$ 262.446,96	R\$ 26.906,00	R\$ 94.242,30	R\$ 121.148,30	
09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
100556	SINAPI	09.01	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	UN	10,00	-		0,00	R\$ 55,420	R\$ 554,20	0,00	0,00	0,00
91936	SINAPI	09.02	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023	UN	325,00	160,00		160,00	R\$ 19,530	R\$ 6.347,25	3124,80	0,00	3124,80
S150628	DER-EDIF	09.03	CAIXA DE EMBUTIR MARCÁ DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2"	UND	400,00	160,00	113,00	273,00	R\$ 9,380	R\$ 3.752,00	1500,80	1059,94	2560,74
S151139	DER-EDIF	09.04	ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCÁ REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE	M	50,00	50,00		50,00	R\$ 26,890	R\$ 1.344,50	1344,50	0,00	1344,50
S151141	DER-EDIF	09.05	ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 4", MARCÁ REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE	M	50,00	50,00		50,00	R\$ 59,340	R\$ 2.967,00	2967,00	0,00	2967,00
S151132	DER-EDIF	09.06	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4", MARCÁ DE REFERÊNCIA TIGRE	M	1.500,00		1500,00	1500,00	R\$ 8,800	R\$ 13.200,00	0,00	13200,00	13200,00
S151133	DER-EDIF	09.07	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1", MARCÁ DE REFERÊNCIA TIGRE	M	400,00		400,00	400,00	R\$ 10,100	R\$ 4.040,00	0,00	4040,00	4040,00
S160322	DER-EDIF	09.08	ABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÁMETRO 1", REF. TEL-095, MARCÁ DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	UND	570,00	285,00		285,00	R\$ 6,590	R\$ 3.756,30	1878,15	0,00	1878,15
S150836	DER-EDIF	09.09	ELETROCALHA PERFORADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº16, 200X100MM, SEM TAMPÁ	M	210,00	-		0,00	R\$ 113,880	R\$ 23.914,80	0,00	0,00	0,00
S151311	DER-EDIF	09.10	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	6,00	3,00		3,00	R\$ 114,260	R\$ 685,56	342,78	0,00	342,78
S150881	DER-EDIF	09.11	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA DE 200X100MM, NA PAREDE, ATRAVÉS DE SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA SIMPLES (1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (2UND)	UND	105,00	-		0,00	R\$ 35,820	R\$ 3.761,10	0,00	0,00	0,00
S150870	DER-EDIF	09.12	TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA METÁLICA 200X100MM, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2570 OU EQUIVALENTE	UND	5,00	-		0,00	R\$ 112,570	R\$ 562,85	0,00	0,00	0,00
S150875	DER-EDIF	09.13	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA METÁLICA, 200X100MM, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2510	UND	2,00	-		0,00	R\$ 95,960	R\$ 191,92	0,00	0,00	0,00
S150866	DER-EDIF	09.14	JUNÇÃO SIMPLES PARA ELETROCALHA METÁLICA 200X100MM, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2760 OU EQUIVALENTE	UND	70,00	-		0,00	R\$ 12,720	R\$ 890,40	0,00	0,00	0,00
S150850	DER-EDIF	09.15	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UND	120,00	60,00		60,00	R\$ 11,050	R\$ 1.326,00	663,00	0,00	663,00
S150851	DER-EDIF	09.16	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1"	UND	40,00	20,00		20,00	R\$ 11,520	R\$ 460,80	230,40	0,00	230,40
S150309	DER-EDIF	09.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 32 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO	UND	6,00	3,00		3,00	R\$ 655,590	R\$ 3.933,54	1966,77	0,00	1966,77
S151710	DER-EDIF	09.18	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 57001 ATÉ 75000W - 220/127V	UND	1,00	-		0,00	R\$ 9.043,990	R\$ 9.043,99	0,00	0,00	0,00
91924	SINAPI	09.19	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023	M	800,00	400,00	400,00	800,00	R\$ 2,940	R\$ 2.352,00	1176,00	1176,00	2352,00
S151417	DER-EDIF	09.20	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 2,5MM²	M	6.800,00		6042,11	6042,11	R\$ 9,410	R\$ 63.988,00	0,00	56856,26	56856,26
S151418	DER-EDIF	09.21	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 4,0 MM²	M	200,00		200,00	200,00	R\$ 11,240	R\$ 2.248,00	0,00	2248,00	2248,00
S151419	DER-EDIF	09.22	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 6,0 MM²	M	1.900,00	752,00	990,00	1742,00	R\$ 13,970	R\$ 26.543,00	10505,44	13830,30	24335,74

CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CONVÊNIO								
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI				QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO				
							EXECUTADA				VALOR				
							ACUMULADA ANTERIOR				ACUMULADA ATUAL				
							NO MÊS								
CÓDIGO	FUNTE	ITEM	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL								
DESCRIÇÃO															
S151421	DER-EDIF	09.23	M	500,00	264,00	183,00	447,00	R\$ 27,270	R\$ 13.635,00	7199,28	4990,41	12189,69			
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 16,0 MM2															
S151422	DER-EDIF	09.24	M	60,00	20,00	25,00	45,00	R\$ 41,770	R\$ 2.506,20	835,40	1044,25	1879,65			
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 25,0 MM2															
S151425	DER-EDIF	09.25	M	160,00		160,00	160,00	R\$ 77,090	R\$ 12.334,40	0,00	12334,40	12334,40			
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 50,0 MM2															
S180201	DER-EDIF	09.26	UND	164,00	36,00	56,00	92,00	R\$ 40,720	R\$ 6.678,08	1465,92	2280,32	3746,24			
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2"															
91979	SINAPI	09.27	UN	48,00	24,00		24,00	R\$ 57,580	R\$ 2.763,84	1381,92	0,00	1381,92			
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023															
S181007	DER-EDIF	09.28	UND	325,00	183,00		183,00	R\$ 305,930	R\$ 99.427,25	55985,19	0,00	55985,19			
LUMINÁRIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM. ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA NCLUSIVE 4 LÂMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K - REF. CE416AL-N - AMES_6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE															
101666	SINAPI	09.29	UN	8,00	-		0,00	R\$ 373,090	R\$ 2.984,72	0,00	0,00	0,00			
REFLETOR RETÂNGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020															
S151306	DER-EDIF	09.30	UND	42,00	9,00	12,00	21,00	R\$ 74,370	R\$ 3.123,54	669,33	892,44	1561,77			
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE															
S151307	DER-EDIF	09.31	UND	24,00	5,00	8,00	13,00	R\$ 74,370	R\$ 1.784,88	371,85	594,96	966,81			
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE															
S151321	DER-EDIF	09.32	UND	16,00	3,00	6,00	9,00	R\$ 74,370	R\$ 1.189,92	223,11	446,22	669,33			
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE															
S151322	DER-EDIF	09.33	UND	23,00	4,00	8,00	12,00	R\$ 74,370	R\$ 1.710,51	297,48	594,96	892,44			
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE															
S151334	DER-EDIF	09.34	UND	1,00	-		0,00	R\$ 552,040	R\$ 552,04	0,00	0,00	0,00			
DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE															
S151426	DER-EDIF	09.35	M	100,00	100,00		100,00	R\$ 136,420	R\$ 13.642,00	13642,00	0,00	13642,00			
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 95,0 MM2															
S151335	DER-EDIF	09.36	UND	1,00	-		0,00	R\$ 1.237,870	R\$ 1.237,87	0,00	0,00	0,00			
DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400 A, 65KA 220/240V / 36KA 380/415V 35KA 440/460V 25KA 600V (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE															
S151339	DER-EDIF	09.37	UND	2,00			0,00	R\$ 459,720	R\$ 919,44	0,00	0,00	0,00			
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A, CURVA C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE															
S151402	DER-EDIF	09.38	M	3.753,70	1.273,00	1834,00	3107,00	R\$ 7,721	R\$ 28.982,32	9828,83	14160,31	23989,15			
FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2,5 MM2															
S151403	DER-EDIF	09.39	M	2.009,00	683,00	1178,00	1861,00	R\$ 10,268	R\$ 20.628,41	7013,04	12095,70	19108,75			
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4,0 MM2															
S151404	DER-EDIF	09.40	M	82,00	41,00		41,00	R\$ 12,628	R\$ 1.035,50	517,75	0,00	517,75			
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 6,0 MM2															
S151405	DER-EDIF	09.41	M	285,50	148,00		148,00	R\$ 18,828	R\$ 5.375,39	2786,54	0,00	2786,54			
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 10,0 MM2															
S151431	DER-EDIF	09.42	M	132,10	132,10		132,10	R\$ 266,584	R\$ 35.215,75	35215,75	0,00	35215,75			
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 185,0MM2															
S151338	DER-EDIF	09.43	UND	21,00	6,00	5,00	11,00	R\$ 23,413	R\$ 491,67	140,48	117,07	257,54			
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE															
S151301	DER-EDIF	09.44	UND	17,00		9,00	9,00	R\$ 23,413	R\$ 398,02	0,00	210,72	210,72			
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE															
93660	SINAPI	09.45	UN	21,00	10,00		10,00	R\$ 55,863	R\$ 1.173,12	558,63	0,00	558,63			
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020															
S151305	DER-EDIF	09.46	UND	2,00		2,00	2,00	R\$ 29,220	R\$ 58,44	0,00	58,44	58,44			
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE															
S151328	DER-EDIF	09.47	UND	3,00	1,00	1,00	2,00	R\$ 99,068	R\$ 297,20	99,07	99,07	198,14			
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE															
S151304	DER-EDIF	09.48	UND	2,00		1,00	1,00	R\$ 23,413	R\$ 46,83	0,00	23,41	23,41			
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE															
S151324	DER-EDIF	09.49	UND	1,00			0,00	R\$ 83,199	R\$ 83,20	0,00	0,00	0,00			
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE															
S151316	DER-EDIF	09.50	UND	1,00			0,00	R\$ 173,551	R\$ 173,55	0,00	0,00	0,00			
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE															
S151332	DER-EDIF	09.51	UND	2,00		1,00	1,00	R\$ 459,730	R\$ 919,46	0,00	459,73	459,73			
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A, CURVA C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE															

CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			CONVÊNIO													
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI			QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO		MODALIDADE:		DATA BASE:		Nº BOLETIM :		PERÍODO:		
						EXECUTADA					LICITAÇÃO		REF. JUL - 2022 sem Desoneração		03		01/11/2024 a 18/12/2024		
											Nº CONTRATO:		VAL. CONTRATADO:		INICIO DA OBRA:		TÉRMINO OBRA:		
											003/2024		R\$ 1.248.000,00		28/02/2024		27/02/2025		
											Nº DO ADITIVO:		VALOR ADITIVO:		REINÍCIO OBRA:		TÉRMINO OBRA:		
											1		R\$ 428.593,74		01/07/2024		27/02/2025		
													VALOR						
											CONTRATADO		REALIZADO NO MÊS		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL		
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO			UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL									
		11	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA																
S200401	DER-EDIF	11.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO)			M2	1.880,08	-		0,00	R\$ 12,220	R\$ 22.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SUBTOTAL									R\$ 22.974,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		14	RAMPA PRINCIPAL																
		14.02	INFRAESTRUTURA																
S040238	DER-EDIF	14.02.01	FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA)			M2	47,20		47,20	47,20	R\$ 89,503	R\$ 4.224,54	0,00	4224,54	4224,54				
S040231	DER-EDIF	14.02.02	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO)			M3	1,18	1,18	1,18	1,18	R\$ 672,956	R\$ 796,78	0,00	794,09	794,09				
S040243	DER-EDIF	14.02.03	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM			KG	72,00		72,00	72,00	R\$ 11,603	R\$ 835,42	0,00	835,42	835,42				
S040245	DER-EDIF	14.02.04	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")			KG	521,00		521,00	521,00	R\$ 12,203	R\$ 6.357,76	0,00	6357,76	6357,76				
S040224	DER-EDIF	14.02.05	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO)			M3	11,82	11,82	11,82	11,82	R\$ 764,311	R\$ 9.034,16	0,00	9034,16	9034,16				
EST-01	COMP	14.02.06	CURA QUÍMICA PARA CONCRETO, APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO			M2	47,20		47,20	47,20	R\$ 2,486	R\$ 117,34	0,00	117,34	117,34				
98557	SINAPI	14.02.07	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS AF 06/2018			M2	47,20		47,20	47,20	R\$ 38,650	R\$ 1.824,28	0,00	1824,28	1824,28				
		14.03	SUPRAESTRUTURA																
S040339	DER-EDIF	14.03.01	FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES, REFORÇADAS COM SARRAFOS DE MADEIRA DE 2.5 X 10.0CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)			M2	311,88		311,88	311,88	R\$ 132,014	R\$ 41.172,53	0,00	41172,53	41172,53				
S040328	DER-EDIF	14.03.02	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM			KG	1.065,00		1065,00	1065,00	R\$ 11,603	R\$ 12.357,20	0,00	12357,20	12357,20				
S040332	DER-EDIF	14.03.03	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25,0MM			KG	520,00		520,00	520,00	R\$ 12,203	R\$ 6.345,56	0,00	6345,56	6345,56				
S040315	DER-EDIF	14.03.04	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO)			M3	27,34		27,34	27,34	R\$ 875,147	R\$ 23.926,52	0,00	23926,52	23926,52				
EST-01	COMP	14.03.05	CURA QUÍMICA PARA CONCRETO, APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO			M2	311,88		311,88	311,88	R\$ 2,486	R\$ 775,33	0,00	775,33	775,33				
			SUBTOTAL									R\$ 107.767,41	R\$ 0,00	R\$ 107.764,72	R\$ 107.764,72				
			TOTAL									R\$ 1.676.593,74	R\$ 306.110,87	R\$ 582.300,81	R\$ 888.139,18				
			Valor (R\$) por extenso: Trezentos e seis mil e cento e dez reais e oitenta e sete centavos.																
													TOTAL MEDIÇÃO		R\$ 306.110,87				
													TOTAL ACUMULADO		R\$ 888.139,18				
													SALDO CONTRATO		R\$ 788.454,56				

ATAIDE LUIS DE OLIVEIRA:
05882254604

Assinado digitalmente por ATAIDE LUIS DE OLIVEIRA:05882254604
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=32522131000125, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ATAIDE LUIS DE OLIVEIRA:05882254604
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.12.18 09:04:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO: 003/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS:

MEDIÇÃO: 03

DATA: 11/12/2024



Chapisco de teto



Chapisco de teto



Reboco de teto



Instalações hidrossanitárias

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


EMPRESA: APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO: 003/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS:

MEDIÇÃO: 03


DATA: 11/12/024

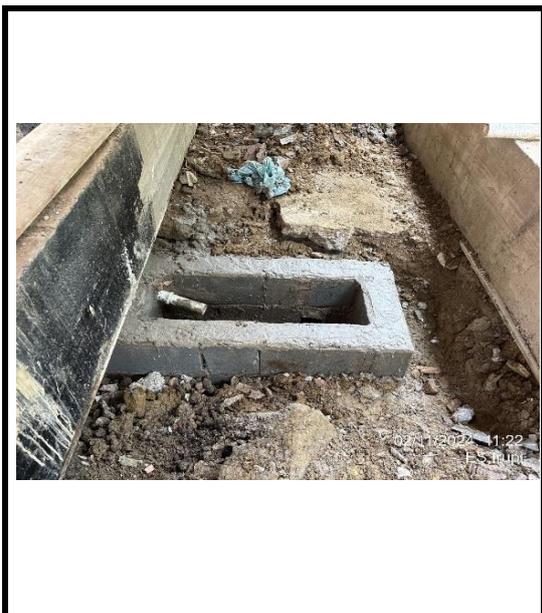

Instalações hidrossanitárias



Instalações hidrossanitárias

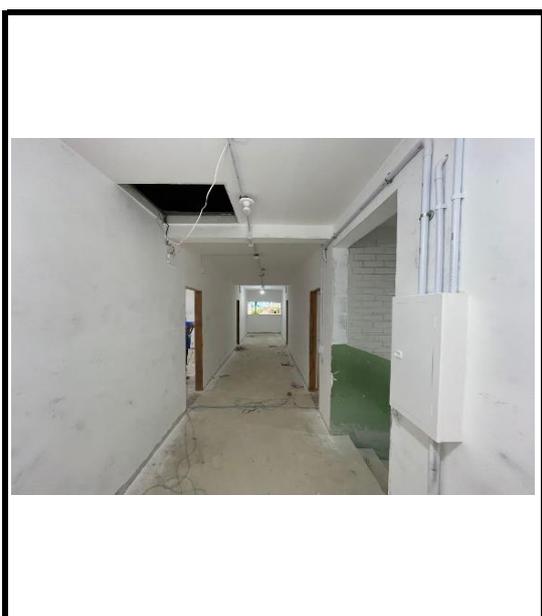

Instalações elétricas



Instalações elétricas

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CONTRATO: 003/2024
SERVIÇOS EXECUTADOS:

MEDIÇÃO: 03
DATA: 11/12/2024




Instalações elétricas



Instalações elétricas



Rodapé

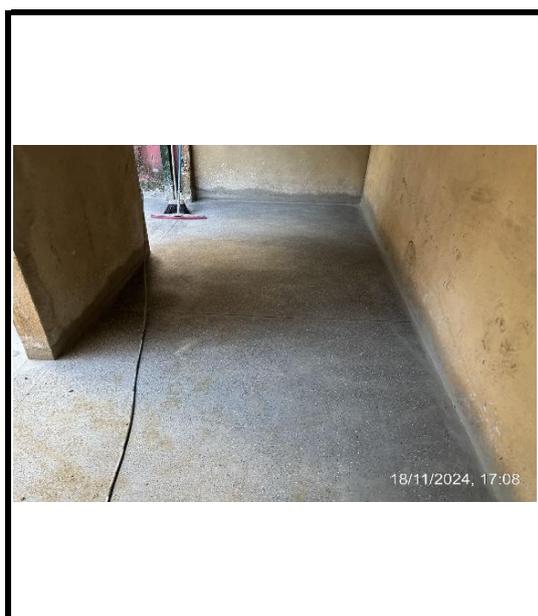

Piso alta resistência

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CONTRATO: 003/2024
SERVIÇOS EXECUTADOS:

MEDIÇÃO: 03
DATA: 11/12/2024




Revestimento Cerâmico



Pintura



Substação

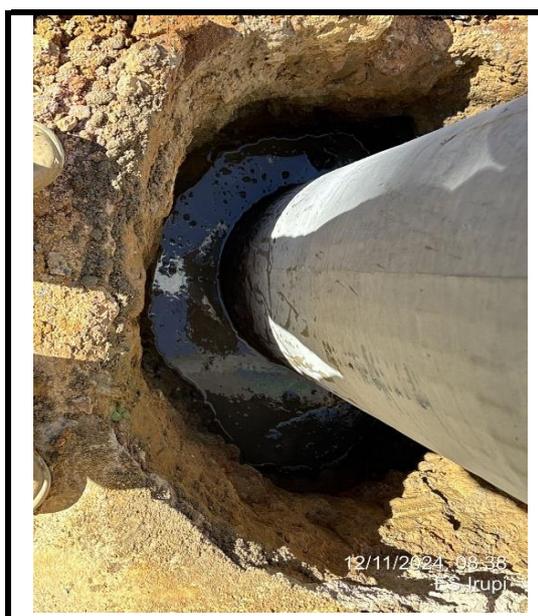


Substação


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CONTRATO: 003/2024
SERVIÇOS EXECUTADOS:

MEDIÇÃO: 03
DATA: 11/12/2024

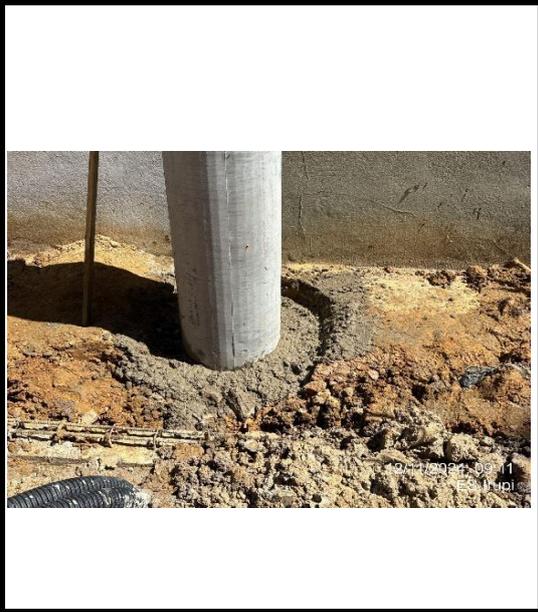

Substação

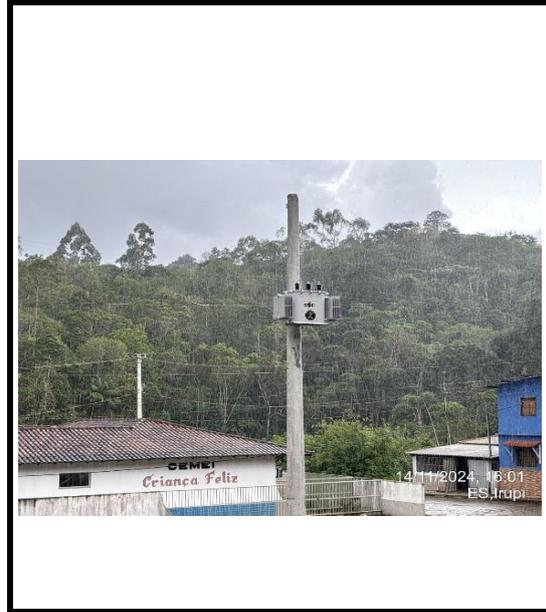

Substação

ATAIDE LUIS
DE OLIVEIRA
05882254604

Assinado digitalmente por ATAIDE LUIS DE OLIVEIRA 05882254604
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PE AT, ou=Presencial, ou=3522191009125, #OU=ICP-SingapuraID Multiple, cn=ATAIDE LUIS DE OLIVEIRA-05882254604
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.24 08:02:41-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



Documento assinado digitalmente
ZAQUEU DOS SANTOS PEREIRA
Data: 12/12/2024 13:22:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
