

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATADA:			CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA							PREÇO UNITÁRIO	OBS.: PREENCHER APENAS A COLUNA EM AZUL			
LOCALIZAÇÃO:			BARRA DE SANTA ROSA - REFORMA EMEIEF "PROF. NELCI GOMES DA COSTA"			QUANTIDADE			MODALIDADE:					
									LICITAÇÃO					
									Nº CONTRATO:		PRAZO	VALOR DE CONTRATO	PERÍODO:	
									052/2025		04 MESES	R\$ 429.900,00		
									Nº DO ADITIVO:		Nº DE BOLETIM	VALOR DE ADITIVO	TERMINO OBRA	
01	02	R\$ 201.242,24	09/12/2025											
						VALOR			VALOR EXECUTADO					
						REVISADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL					
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO											
1INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS														
S020305	DER-EDIF	01.01	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2,0 X 4,0 M, PADRÃO DER	m2	8,00			8,00	8,00	266,380000	R\$ 2.131,04	R\$ 0,00	R\$ 2.131,04	
S020339	DER-EDIF	01.02	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCIO (ALUGUEL DE 1 M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	m3	152,16	15,22		136,94	152,16	23,029968	R\$ 3.504,24	R\$ 350,52	R\$ 3.153,72	
2DEMOLIÇÕES E RETIRADAS														
S010209	DER-EDIF	01.05	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3	9,50	0,00		0,00	0,00	66,330526	R\$ 630,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
S010214	DER-EDIF	01.06	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES	M2	20,80	0,00		0,00	0,00	17,679808	R\$ 367,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
S010215	DER-EDIF	01.07	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	2,00	0,00		0,00	0,00	11,050000	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
S010224	DER-EDIF	01.08	RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES	M2	85,58			85,58	85,58	19,489951	R\$ 1.667,95	R\$ 0,00	R\$ 1.667,95	
S010223	DER-EDIF	01.09	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UND	23,00	9,00		12,00	21,00	22,870000	R\$ 526,01	R\$ 205,83	R\$ 274,44	
S010225	DER-EDIF	01.10	RETIRADA DE BANCADA DE PIA	M2	4,80	1,20		3,60	4,80	27,439583	R\$ 131,71	R\$ 32,93	R\$ 98,78	
S010240	DER-EDIF	01.11	RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS)	UND	2,00			2,00	2,00	12,100000	R\$ 24,20	R\$ 0,00	R\$ 24,20	
S010323	DER-EDIF	01.12	RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS	UND	33,00	29,00		4,00	33,00	12,100000	R\$ 399,30	R\$ 350,90	R\$ 48,40	
97662	SINAPI	01.13	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M	306,00	76,50		229,50	306,00	0,640000	R\$ 195,84	R\$ 48,96	R\$ 146,88	
S142201	DER-EDIF	01.05	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 1/2" A 1"	M	128,77	51,51		77,26	128,77	14,069970	R\$ 1.811,79	R\$ 724,74	R\$ 1.087,05	
S142202	DER-EDIF	01.06	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 1 1/4" A 2"	M	11,81			11,81	11,81	21,120237	R\$ 249,43	R\$ 0,00	R\$ 249,43	
S142203	DER-EDIF	01.07	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 2 1/2" A 4"	M	4,54			4,54	4,54	31,819383	R\$ 144,46	R\$ 0,00	R\$ 144,46	
S142205	DER-EDIF	01.08	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 1 1/4" A 2"	M	112,56	45,02		67,54	112,56	40,989961	R\$ 4.613,83	R\$ 1.845,37	R\$ 2.768,46	
S142206	DER-EDIF	01.09	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 2 1/2" A 4"	M	48,33	19,34		28,99	48,33	59,619905	R\$ 2.881,43	R\$ 1.153,05	R\$ 1.728,38	
S010203	DER-EDIF	01.10	DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	M2	78,90	20,56		58,34	78,90	30,950063	R\$ 2.441,96	R\$ 636,33	R\$ 1.805,63	
S010206	DER-EDIF	01.11	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS	M2	227,10	56,77		170,33	227,10	55,270013	R\$ 12.551,82	R\$ 3.137,68	R\$ 9.414,14	
S010246	DER-EDIF	01.12	LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA	M2	1.781,54			1.781,54	1.781,54	4,189999	R\$ 7.464,65	R\$ 0,00	R\$ 7.464,65	
S010319	DER-EDIF	01.13	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A BASE DE ÓLEO OU ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS	M2	184,33			184,33	184,33	21,600011	R\$ 3.981,53	R\$ 0,00	R\$ 3.981,53	
97631	SINAPI	01.05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M2	186,90			186,90	186,90	14,630016	R\$ 2.734,35	R\$ 0,00	R\$ 2.734,35	
S010318	DER-EDIF	01.06	REMOÇÃO DE FORRO EM EUCATEX, SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	81,28	20,32		60,96	81,28	15,500000	R\$ 1.259,84	R\$ 314,96	R\$ 944,88	
S030304	DER-EDIF	01.07	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	M3	47,39	47,39		0,00	47,39	92,920025	R\$ 4.403,48	R\$ 4.403,48	R\$ 0,00	
3REFORMA														
03.01ACABAMENTOS														
S130103	DER-EDIF	03.01.01	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA: 3 CM	M2	84,21	21,05		42,11	63,16	28,410046	R\$ 2.392,41	R\$ 598,03	R\$ 1.196,35	
87263	SINAPI	03.01.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_ 02/2023 PE	M2	84,21	21,05		42,11	63,16	111,299964	R\$ 9.372,57	R\$ 2.342,87	R\$ 4.686,84	
S050602	DER-EDIF	03.01.03	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESISTÊNCIA MÍNIMO A COMPRESSÃO DE 3 MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM	M2	6,45	0,00		0,00	0,00	93,229457	R\$ 601,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
S120101	DER-EDIF	03.01.04	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM	M2	12,90	0,00		0,00	0,00	8,000000	R\$ 103,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
S120303	DER-EDIF	03.01.05	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0,5:6, ESPESSURA 25 MM	M2	12,90	0,00		0,00	0,00	66,110078	R\$ 852,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
S120301	DER-EDIF	03.01.06	EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0,5:6, ESPESSURA 20 MM	M2	186,90	186,90		0,00	186,90	38,750027	R\$ 7.242,38	R\$ 7.242,38	R\$ 0,00	

 DEPARTAMENTO DE IRUPI DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
CONTRATADA:			CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA								OBS.: PREENCHER APENAS A COLUNA EM AZUL											
											MODALIDADE:											
LOCALIZAÇÃO:			BARRA DE SANTA ROSA - REFORMA EMEIEF "PROF. NELCI GOMES DA COSTA"				QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO				LICITAÇÃO							
															Nº CONTRATO:		PRAZO		VALOR DE CONTRATO		PERÍODO:	
															052/2025		04 MESES		R\$ 429.900,00			
															Nº DO ADITIVO:		Nº DE BOLETIM		VALOR DE ADITIVO		TERMINO OBRA	
															01		02		R\$ 201.242,24		09/12/2025	
							VALOR		VALOR EXECUTADO													
							REVISADO		REALIZADO NO MÊS		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL									
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO				UNID.	QUANTIDADE REVISADO	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL											
S190103	DER-EDIF	03.01.07	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE				M2	1851,39	641,79	842,21	1.484,00	24,129997	R\$ 44.674,04	R\$ 15.486,39	R\$ 20.322,52	R\$ 35.808,92						
96116	SINAPI	03.01.08	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS				M2	81,28	20,32	40,64	60,96	70,289985	R\$ 5.713,17	R\$ 1.428,29	R\$ 2.856,59	R\$ 4.284,88						
87265	SINAPI	03.01.09	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE				M2	186,90	23,36	140,18	163,54	61,200000	R\$ 11.438,28	R\$ 1.429,63	R\$ 8.578,71	R\$ 10.008,34						
S190117	DER-EDIF	03.01.010	PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, ACABAMENTO FOSCO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX				M2	2408,52	378,21	1.652,10	2.030,31	24,290000	R\$ 58.502,95	R\$ 9.186,72	R\$ 40.129,51	R\$ 49.316,23						
S190116	DER-EDIF	03.01.011	PINTURA, SOBRE PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR PVA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE				M2	681,21	136,24	408,73	544,97	27,679996	R\$ 18.855,89	R\$ 3.771,12	R\$ 11.313,53	R\$ 15.084,71						
		03.02	ESQUADRIAS E GUARDA-CORPO																			
S071704	DER-EDIF	03.02.01	PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO				M2	27,20	13,60	0,00	13,60	977,040074	R\$ 26.575,49	R\$ 13.287,75	R\$ 0,00	R\$ 13.287,75						
S061301	DER-EDIF	03.02.02	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE,ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,60 X 2,10 M				UND	2,52		0,00	0,00	1007,210317	R\$ 2.538,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
S190302	DER-EDIF	03.02.03	PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX OU EQUIVALENTE				M2	89,75		0,00	0,00	47,269972	R\$ 4.242,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
ACE-08	COMP	03.02.04	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX COM DIÂMETRO DE 1.1/2". BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				M	53,30		0,00	0,00	374,539962	R\$ 19.962,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
S190417	DER-EDIF	03.02.05	PINTURA SOBRE METAL, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO				M2	184,33	184,33	0,00	184,33	52,519991	R\$ 9.681,01	R\$ 9.681,01	R\$ 0,00	R\$ 9.681,01						
010242	DER-EDIF	03.02.06	RETRADA DE VIDROS QUEBRADOS				M2	25,17	25,17	0,00	25,17	3,870083	R\$ 97,41	R\$ 97,41	R\$ 0,00	R\$ 97,41						
080102	DER-EDIF	03.02.07	VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA				M2	25,17	25,17	0,00	25,17	430,139849	R\$ 10.826,62	R\$ 10.826,62	R\$ 0,00	R\$ 10.826,62						
060103	DER-EDIF	03.02.08	MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M				und	5,00		0,00	0,00	394,110000	R\$ 1.970,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
061303	DER-EDIF	03.02.09	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE,ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M				und	8,00		0,00	0,00	1099,050000	R\$ 8.792,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
062204	DER-EDIF	03.02.10	RECOLOCAÇÃO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE 1 FOLHA, EXCL. FERRAGENS, PORTA, MARCOS E ALIZARES				und	3,00		0,00	0,00	90,930000	R\$ 272,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
062212	DER-EDIF	03.02.11	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE MARCO DE MADEIRA, EXCLUSIVE MARCO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO: PREGOS E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADO E AREIA, PARA CHUMBAMENTO				und	5,00		0,00	0,00	17,020000	R\$ 85,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
062201	DER-EDIF	03.02.12	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE TIPO YALE - IMAB, STAN, ALIANÇA OU EQUIVALENTE				und	5,00		0,00	0,00	115,190000	R\$ 575,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
		03.03	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS																			
S170538	DER-EDIF	03.03.01	CHUVEIRO FRIO DE PVC, MARCAS DE REFERÊNCIA ATLAS, CIPLA OU AKROS				UND	4,00	2,00	0,00	2,00	33,870000	R\$ 135,48	R\$ 67,74	R\$ 0,00	R\$ 67,74						
86901	SINAPI	03.03.02	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	8,00	4,00	0,00	4,00	182,900000	R\$ 1.463,20	R\$ 731,60	R\$ 0,00	R\$ 731,60						

 DEPARTAMENTO DE IRUPI DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA BOLETIM DE MEDIÇÃO																	
CONTRATADA:			CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA								OBS.: PREENCHER APENAS A COLUNA EM AZUL						
LOCALIZAÇÃO:			BARRA DE SANTA ROSA - REFORMA EMEIEF "PROF. NELCI GOMES DA COSTA"		QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO	MODALIDADE:							
										LICITAÇÃO							
										Nº CONTRATO:		PRAZO		VALOR DE CONTRATO		PERÍODO:	
										052/2025		04 MESES		R\$ 429.900,00			
										Nº DO ADITIVO:		Nº DE BOLETIM		VALOR DE ADITIVO		TERMINO OBRA	
										01		02		R\$ 201.242,24		09/12/2025	
					UNID.	QUANTIDADE		QUANTIDADE EXECUTADA		VALOR		VALOR EXECUTADO					
						REVISADO	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL	REVISADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL				
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO														
S170603	DER-EDIF	03.03.03	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO AISI 304, COMPRIMENTO 80 CM, CONFORME REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	4,00		0,00	0,00	185,020000	R\$ 740,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
S170304	DER-EDIF	03.03.04	TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC ALFA - DOCOL, DECAMATIC SMART - DECA OU EQUIVALENTE		UND	4,00	4,00	0,00	4,00	265,300000	R\$ 1.061,20	R\$ 1.061,20	R\$ 0,00	R\$ 1.061,20			
86931	SINAPI	03.03.05	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020		UN	12,00	6,00	0,00	6,00	623,650000	R\$ 7.483,80	R\$ 3.741,90	R\$ 0,00	R\$ 3.741,90			
S170519	DER-EDIF	03.03.06	DUCHA MANUAL ACQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL		UND	12,00	6,00	0,00	6,00	325,660000	R\$ 3.907,92	R\$ 1.953,96	R\$ 0,00	R\$ 1.953,96			
ACS-01	COMP	03.03.07	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	12,00	6,00	0,00	6,00	84,460000	R\$ 1.013,52	R\$ 506,76	R\$ 0,00	R\$ 506,76			
ACS-02	COMP	03.03.08	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	4,00	4,00	0,00	4,00	84,460000	R\$ 337,84	R\$ 337,84	R\$ 0,00	R\$ 337,84			
S170124	DER-EDIF	03.03.09	LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO - IZY - L101 - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA CROMADA 1", SIFÃO EM METAL CROMADO 1" X 1/2", ENGATE FLEXIVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA		UND	4,00	2,00	0,00	2,00	603,420000	R\$ 2.413,68	R\$ 1.206,84	R\$ 0,00	R\$ 1.206,84			
95547	SINAPI	03.03.10	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, AF. 01/2020		UN	4,00	2,00	0,00	2,00	82,600000	R\$ 330,40	R\$ 165,20	R\$ 0,00	R\$ 165,20			
S170315	DER-EDIF	03.03.11	TORNEIRA DE PAREDE DE COZINHA BICA ALTA 360º GALI - DOCOL OU EQUIVALENTE		UND	8,00	2,00	0,00	2,00	292,070000	R\$ 2.336,56	R\$ 584,14	R\$ 0,00	R\$ 584,14			
S170601	DER-EDIF	03.03.12	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO AISI 304, COMPRIMENTO 40 CM, CONFORME REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	8,00		0,00	0,00	142,610000	R\$ 1.140,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
S170607	DER-EDIF	03.03.13	BARRA DE APOIO ARTICULADA, EM AÇO INOX POLIDO AISI 304, COMPRIMENTO 80 CM, CONFORME REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	4,00		0,00	0,00	410,110000	R\$ 1.640,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
S170110	DER-EDIF	03.03.14	CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS ? ICASA, CELITE OU EQUIVALENTE		UND	4,00	2,00	0,00	2,00	84,560000	R\$ 338,24	R\$ 169,12	R\$ 0,00	R\$ 169,12			
S080201	DER-EDIF	03.03.15	ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS		M2	3,76		0,00	0,00	692,101064	R\$ 2.602,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
		03.04	PEÇAS DE GRANITO														
S170220	DER-EDIF	03.04.01	BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM		M2	2,40		1,20	1,20	432,791667	R\$ 1.038,70	R\$ 0,00	R\$ 519,35	R\$ 519,35			
S120227	DER-EDIF	03.04.02	RODA PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7X2CM, COM ACABAMENTO ABALUADO NOS DOIS LADOS		M	4,80		2,40	2,40	55,950000	R\$ 268,56	R\$ 0,00	R\$ 134,28	R\$ 134,28			
S130311	DER-EDIF	03.04.03	SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 3 CM E LARGURA DE 3 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO		M	1,44		0,00	0,00	27,347222	R\$ 39,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
S050205	DER-EDIF	03.04.04	DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 3 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3		M2	46,15		23,08	23,08	481,730011	R\$ 22.231,84	R\$ 0,00	R\$ 11.115,92	R\$ 11.115,92			
		03.05	REVESTIMENTO														
S150628	DER-EDIF	03.05.01	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2"		UND	2,00		0,00	0,00	9,720000	R\$ 19,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
S151402	DER-EDIF	03.05.02	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWV LIVRE DE CHUMBO, 70°C - 2,5MM2		M	16,20		0,00	0,00	7,759877	R\$ 125,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
S151350	DER-EDIF	03.05.03	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE		UND	2,00		0,00	0,00	147,010000	R\$ 294,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
S151126	DER-EDIF	03.05.04	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES		M	6,90		0,00	0,00	19,650725	R\$ 135,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
CP-01	COMP	03.05.05	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	2,00		0,00	0,00	304,180000	R\$ 608,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
91953	SINAPI	03.05.06	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023		UN	2,00		0,00	0,00	41,070000	R\$ 82,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
		03.06	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS														
			ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS														
S170329	DER-EDIF	03.06.01	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL		UND	8,00	4,00	4,00	8,00	192,320000	R\$ 1.538,56	R\$ 769,28	R\$ 769,28	R\$ 1.538,56			
S170317	DER-EDIF	03.06.02	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL		UND	4,00	1,00	3,00	4,00	142,850000	R\$ 571,40	R\$ 142,85	R\$ 428,55	R\$ 571,40			
89482	SINAPI	03.06.03	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, AF. 06/2022		UN	12,00	6,00	6,00	12,00	47,030000	R\$ 564,36	R\$ 282,18	R\$ 282,18	R\$ 564,36			
			TUBOS RÍGIDOS														
S141409	DER-EDIF	03.06.04	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES		M	7,55	3,77	3,78	7,55	22,490066	R\$ 169,80	R\$ 84,79	R\$ 85,01	R\$ 169,80			

 DEPARTAMENTO DE PLANILHAS E ENGENHARIA BOLETIM DE MEDIÇÃO																	
CONTRATADA:			CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA								OBS.: PREENCHER APENAS A COLUNA EM AZUL						
LOCALIZAÇÃO:			BARRA DE SANTA ROSA - REFORMA EMEIEF "PROF. NELCI GOMES DA COSTA"		QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO	MODALIDADE:							
										LICITAÇÃO							
										Nº CONTRATO:		PRAZO		VALOR DE CONTRATO		PERÍODO:	
										052/2025		04 MESES		R\$ 429.900,00			
										Nº DO ADITIVO:		Nº DE BOLETIM		VALOR DE ADITIVO		TERMINO OBRA	
										01		02		R\$ 201.242,24		09/12/2025	
					VALOR		VALOR EXECUTADO										
					REVISADO		REALIZADO NO MÊS		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL						
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO		UNID.	QUANTIDADE REVISADO	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL								
S141410	DER-EDIF	03.06.05	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES		M	74,61	37,31	37,30	74,61	25,629942	R\$ 1.912,25	R\$ 956,25	R\$ 956,00	R\$ 1.912,25			
S141906	DER-EDIF	03.06.06	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES		M	12,42	6,21	6,21	12,42	32,160225	R\$ 399,43	R\$ 199,72	R\$ 199,72	R\$ 399,43			
S141907	DER-EDIF	03.06.07	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES		M	60,02	30,01	30,01	60,02	44,098630	R\$ 2.665,49	R\$ 1.332,74	R\$ 1.323,40	R\$ 2.646,80			
S141908	DER-EDIF	03.06.08	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES		M	3,75	1,88	1,87	1,87	66,960000	R\$ 251,10	R\$ 125,88	R\$ 125,22	R\$ 125,22			
S141909	DER-EDIF	03.06.09	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES		M	37,70	18,85	18,85	37,70	77,800000	R\$ 2.933,06	R\$ 1.466,53	R\$ 1.466,53	R\$ 2.933,06			
			03.07 URBANISMO														
S050602	DER-EDIF	03.07.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESISTÊNCIA MÍNIMO A COMPRESSÃO DE 3 MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL, HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM		M2	90,00		90,00	90,00	93,230000	R\$ 8.390,70	R\$ 0,00	R\$ 8.390,70	R\$ 8.390,70			
S120101	DER-EDIF	03.07.02	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM		M2	204,00		204,00	204,00	8,000000	R\$ 1.632,00	R\$ 0,00	R\$ 1.632,00	R\$ 1.632,00			
S120303	DER-EDIF	03.07.03	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL, HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0,5:6, ESPESSURA 25 MM		M2	300,00		300,00	300,00	66,110000	R\$ 19.833,00	R\$ 0,00	R\$ 19.833,00	R\$ 19.833,00			
S190117	DER-EDIF	03.07.04	PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, ACABAMENTO FOSCO, REFERÊNCIA SÜVINIL, CORAL E METALTEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SÜVINIL, CORAL OU METALTEX		M2	221,47	110,74	0,00	110,74	24,290017	R\$ 5.379,51	R\$ 2.689,88	R\$ 0,00	R\$ 2.689,76			
S071107	DER-EDIF	03.07.05	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, CHAPA E TUBO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO		M2	13,38	13,38	0,00	13,38	1097,739910	R\$ 14.687,76	R\$ 14.687,76	R\$ 0,00	R\$ 14.687,76			
S160718	DER-EDIF	03.07.06	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SÜVINIL, CORAL OU METALTEX A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTI CORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL		M2	17,39	17,39	0,00	17,39	28,319724	R\$ 492,48	R\$ 492,48	R\$ 0,00	R\$ 492,48			
190116	DER-EDIF	03.07.07	PINTURA, SOBRE PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REFERÊNCIA SÜVINIL, CORAL E METALTEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR PVA, REFERÊNCIA SÜVINIL, CORAL OU METALTEX OU EQUIVALENTE		M2	78,53	39,27	0,00	39,27	27,679995	R\$ 2.173,71	R\$ 1.086,99	R\$ 0,00	R\$ 1.086,86			
130317	DER-EDIF	03.07.08	PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM		M	60,00		60,00	60,00	85,580000	R\$ 5.134,80	R\$ 0,00	R\$ 5.134,80	R\$ 5.134,80			
			4 DRENAGEM														
			04.01 DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO														
40892	DER-ES	04.01.01	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUSIVE PERDAS, COLCHÃO DE AREIA E TRANSPORTES DE AREIA E PARALELEPÍPEDO		M2	24,05	24,05	0,00	24,05	116,039917	R\$ 2.790,76	R\$ 2.790,76	R\$ 0,00	R\$ 2.790,76			
4915669	SICRO	04.01.02	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO		M³	3,61	3,61	0,00	3,61	8,409972	R\$ 30,36	R\$ 30,36	R\$ 0,00	R\$ 30,36			
40754	DER-ES	04.01.03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (100% P.L.) H = 0,20 M		M2	24,05	24,05	0,00	24,05	1,920166	R\$ 46,18	R\$ 46,18	R\$ 0,00	R\$ 46,18			
4011276	SICRO	04.01.04	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO		M³	3,61	3,61	0,00	3,61	268,141274	R\$ 967,99	R\$ 967,99	R\$ 0,00	R\$ 967,99			
4011352	SICRO	04.01.05	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA		M²	24,05	24,05	0,00	24,05	0,449896	R\$ 10,82	R\$ 10,82	R\$ 0,00	R\$ 10,82			
S010219	DER-EDIF	04.01.06	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033)		M3	8,13	8,13	0,00	8,13	365,319803	R\$ 2.970,05	R\$ 2.970,05	R\$ 0,00	R\$ 2.970,05			
97083	SINAPI	04.01.07	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF 09/2021		M2	101,66	101,66	0,00	101,66	4,220047	R\$ 429,01	R\$ 429,01	R\$ 0,00	R\$ 429,01			
S030209	DER-EDIF	04.01.08	ATERRO COM AREIA EM ÁREAS DE CALÇADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ADENSAMENTO		M3	10,17	10,17	0,00	10,17	193,050147	R\$ 1.963,32	R\$ 1.963,32	R\$ 0,00	R\$ 1.963,32			
97087	SINAPI	04.01.09	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF 09/2021		M2	101,66	101,66	0,00	101,66	2,349990	R\$ 238,90	R\$ 238,90	R\$ 0,00	R\$ 238,90			
94995	SINAPI	04.01.010	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF 08/2022		M2	101,66	101,66	0,00	101,66	118,680012	R\$ 12.065,01	R\$ 12.065,01	R\$ 0,00	R\$ 12.065,01			
S030304	DER-EDIF	04.01.011	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA		M3	11,74	11,74	0,00	11,74	92,919932	R\$ 1.090,88	R\$ 1.090,88	R\$ 0,00	R\$ 1.090,88			
			04.02 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROJETADOS														
S030103	DER-EDIF	04.02.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA		M3	279,00	279,00	0,00	279,00	18,000000	R\$ 5.022,00	R\$ 5.022,00	R\$ 0,00	R\$ 5.022,00			

CONTRATADA:			CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA							OBS.: PREENCHER APENAS A COLUNA EM AZUL					
LOCALIZAÇÃO:			BARRA DE SANTA ROSA - REFORMA EMEIEF "PROF. NELCI GOMES DA COSTA"			QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO			MODALIDADE:			
												LICITAÇÃO			
												Nº CONTRATO:	PRAZO	VALOR DE CONTRATO	PERÍODO:
						052/2025	04 MESES	R\$ 429.900,00							
						Nº DO ADITIVO:	Nº DE BOLETIM	VALOR DE ADITIVO				TERMINO OBRA			
						01	02	R\$ 201.242,24				09/12/2025			
			UNID.	QUANTIDADE	QUANTIDADE EXECUTADA			VALOR		VALOR EXECUTADO					
				REVISADO	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL	REVISADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL				
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO												
104734	SINAPI	04.02.02	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF. 08/2023	M3	263,45	263,45	0,00	263,45	16,710002	R\$ 4.402,25	R\$ 4.402,25	R\$ 0,00	R\$ 4.402,25		
41241	DER-ES	04.02.03	CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	UD	3,00		3,00	3,00	1987,640000	R\$ 5.962,92	R\$ 0,00	R\$ 5.962,92	R\$ 5.962,92		
DRE-01	COMP	04.02.04	CAIXA COM RALO EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 70X70CM E HMÁX=1M, INCLUSIVE GRELHA EM FERRO FUNDIDO 40X40, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO, CONFORME PROJETO.	UND	5,00	5,00	0,00	5,00	760,330000	R\$ 3.801,65	R\$ 3.801,65	R\$ 0,00	R\$ 3.801,65		
2019774	SICRO	04.02.05	CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTOLIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM POLIAMIDA REFORÇADA - CARGA DE CONTROLE DE 250 KN - 100,0 X 16,0 X 20,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO	M	32,00	32,00	0,00	32,00	416,850000	R\$ 13.339,20	R\$ 13.339,20	R\$ 0,00	R\$ 13.339,20		
102737	SINAPI	04.02.06	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDISADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF. 07/2021	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	1335,330000	R\$ 1.335,33	R\$ 1.335,33	R\$ 0,00	R\$ 1.335,33		
S140904	DER-EDIF	04.02.07	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA	M	12,00	12,00	0,00	12,00	113,310000	R\$ 1.359,72	R\$ 1.359,72	R\$ 0,00	R\$ 1.359,72		
2003983	SICRO	04.02.08	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	89,00	89,00	0,00	89,00	253,810000	R\$ 22.589,09	R\$ 22.589,09	R\$ 0,00	R\$ 22.589,09		
S030304	DER-EDIF	04.02.09	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	M3	12,31	12,31	0,00	12,31	92,920390	R\$ 1.143,85	R\$ 1.143,85	R\$ 0,00	R\$ 1.143,85		
		5	LIMPEZA FINAL												
S200401	DER-EDIF	05.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO)	M2	86,00		0,00	0,00	9,850000	R\$ 847,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
S200402	DER-EDIF	05.02	LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS)	M2	752,00	376,00	0,00	376,00	1,370000	R\$ 1.030,24	R\$ 515,12	R\$ 0,00	R\$ 515,12		
		6	CERCA												
COMP.03		06.01	CERCA H=2,30CM, C/TELA LOSANG. ARAME FIO 12 MALHA 2" REVEST. EM PVC COM MOURÃO CURVO DE CONCRETO H=3,20M, SEÇÃO T, FIXADO EMSOLO, A CADA 3M, C/3 FIOS DE ARAME FARPADO NA PARTE CURVA, INCL. 3 FIOS TENSORES, CHUMBADORES E SAPATA DE 40X40X50CM	M	127,50	76,50	51,00	127,50	431,220000	R\$ 54.980,55	R\$ 32.988,33	R\$ 21.992,22	R\$ 54.980,55		
010224	DER-EDIF	06.02	RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES	M²	127,50		127,50	127,50	19,362431	R\$ 2.472,23	R\$ 0,00	R\$ 2.468,71	R\$ 2.468,71		
190117	DER-EDIF	06.03	PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, ACABAMENTO FOSCO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX	M²	102,00	102,00	0,00	102,00	24,290000	R\$ 2.477,58	R\$ 2.477,58	R\$ 0,00	R\$ 2.477,58		
		7	GRAMA												
COMP.02		07.01	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL (CAMADA DE 5 CM)	M²	1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00	28,900000	R\$ 35.113,50	R\$ 35.113,50	R\$ 0,00	R\$ 35.113,50		
		8	TELHADO												
090101	DER-EDIF	08.01	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PERoba MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA CERÂMICA TIPO CAPA E CANAL, COM PONTALETES, TERÇAS, CAIBROS E RIPAS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS	M²	21,66	21,66	0,00	21,66	238,399815	R\$ 5.163,74	R\$ 5.163,74	R\$ 0,00	R\$ 5.163,74		
090212	DER-EDIF	08.02	COBERTURA NOVA DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CAPA E CANAL INCLUSIVE CUMEIRAS (TELHAS COMPRADAS NA FÁBRICA, POSTO OBRA)	M²	21,66	21,66	0,00	21,66	148,319945	R\$ 3.212,61	R\$ 3.212,61	R\$ 0,00	R\$ 3.212,61		
190303	DER-EDIF	08.03	PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃO DE VERNIZ BRILHANTE INCOLOR, LINHA PREMIUM COPAL, REFERÊNCIA SUVINIL, EUCATEX, MONTANA OU EQUIVALENTE	M²	68,66	68,66	0,00	68,66	29,929945	R\$ 2.054,99	R\$ 2.054,99	R\$ 0,00	R\$ 2.054,99		
		9	PAVIMENTAÇÃO												
10263	DER-EDIF	09.01	MEIO FIO 12 X 30 X 15 CM X 1 M	PÇ	8,40	8,40	0,00	8,40	37,470238	R\$ 314,75	R\$ 314,75	R\$ 0,00	R\$ 314,75		
10267	DER-EDIF	09.02	BLOCO PARA PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO - ESP= 08 CM, RESISTÊNCIA 35 MPa	M²	184,80	184,80	0,00	184,80	87,310011	R\$ 16.134,89	R\$ 16.134,89	R\$ 0,00	R\$ 16.134,89		
40894	DER-EDIF	09.03	MEIO FIO (ASSENTAMENTO), INCLUSIVE CAIAÇÃO	M	8,40	8,40	0,00	8,40	40,090476	R\$ 336,76	R\$ 336,76	R\$ 0,00	R\$ 336,76		

 INSTITUTO DE REGISTRO, URBANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO E ENGENHARIA IRUPI DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA BOLETIM DE MEDIÇÃO																	
CONTRATADA:			CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA									OBS.: PREENCHER APENAS A COLUNA EM AZUL					
												MODALIDADE:					
												LICITAÇÃO					
LOCALIZAÇÃO:			BARRA DE SANTA ROSA - REFORMA EMEIEF "PROF. NELCI GOMES DA COSTA"					QUANTIDADE					PREÇO UNITÁRIO				

CONSTRUTO
RA
IBATIBENSE
LTDA:27372
919000162

Assinado de forma
digital por
CONSTRUTORA
IBATIBENSE
LTDA:273729190001
62
Dados: 2025.10.10
14:34:40 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
RAPHAEL CARVALHO FLORINDO DE FREITAS
Data: 10/10/2025 15:13:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CONTRATO: 052/2025
SERVIÇOS EXECUTADOS

MEDIÇÃO: 2ª medição
PERÍODO: 12/09/2025 a 08/10/2025

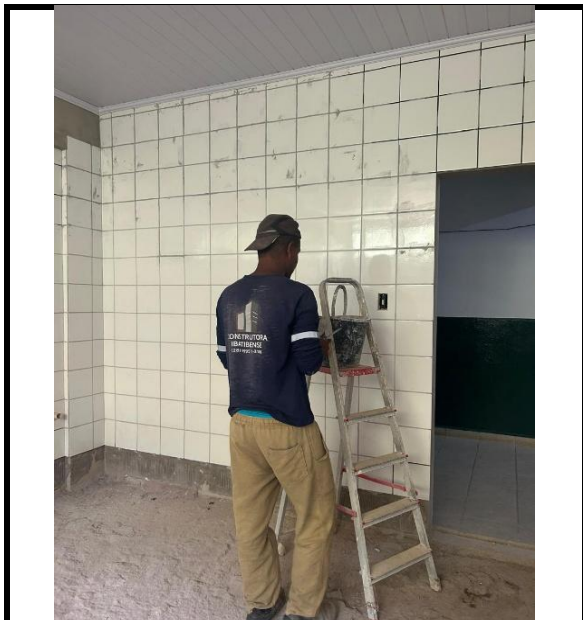


Figura 1 - Assentamento de pastilhas e rejuntamento



Figura 2 - Assentamento de pastilhas e rejuntamento



Figura 3 - Assentamento de pastilhas e rejuntamento



Figura 4 - Assentamento de pastilhas e rejuntamento.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CONTRATO: 052/2025
SERVIÇOS EXECUTADOS

MEDIÇÃO: 2ª medição
PERÍODO: 12/09/2025 a 08/10/2025



Figura 5 - tintas utilizadas na execução da pintura- exteriores



Figura 6 -tintas utilizadas na execução da pintura- exteriores



Figura 7 -Execução de pintura-exterior

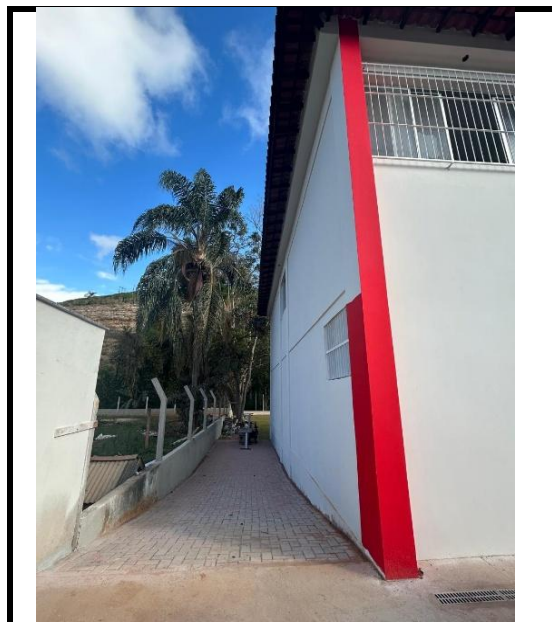


Figura 8 - Execução de pintura-exterior

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CONTRATO: 052/2025
SERVIÇOS EXECUTADOS

MEDIÇÃO: 2ª medição
PERÍODO: 12/09/2025 a 08/10/2025

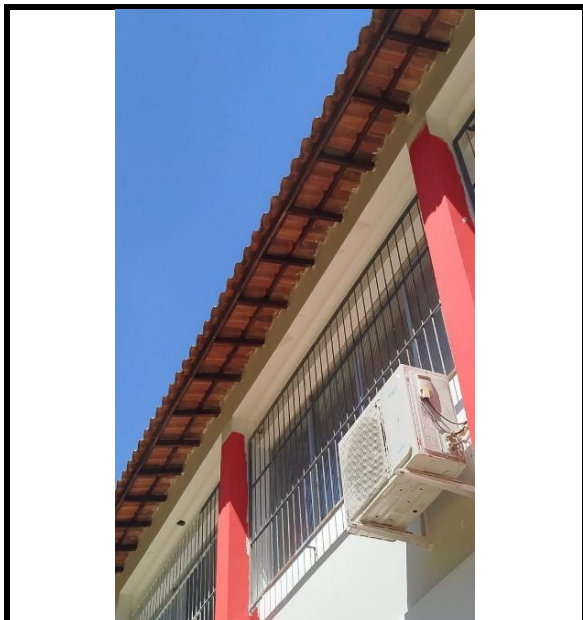


Figura 9 -Execução de pintura-exterior

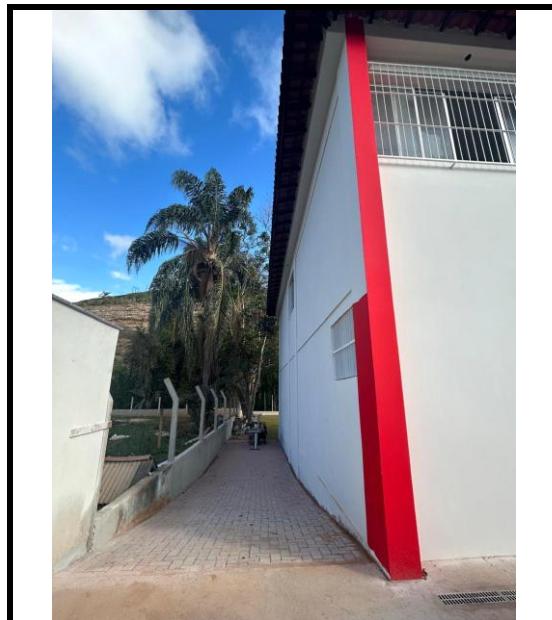


Figura 10 -Execução de pintura-exterior

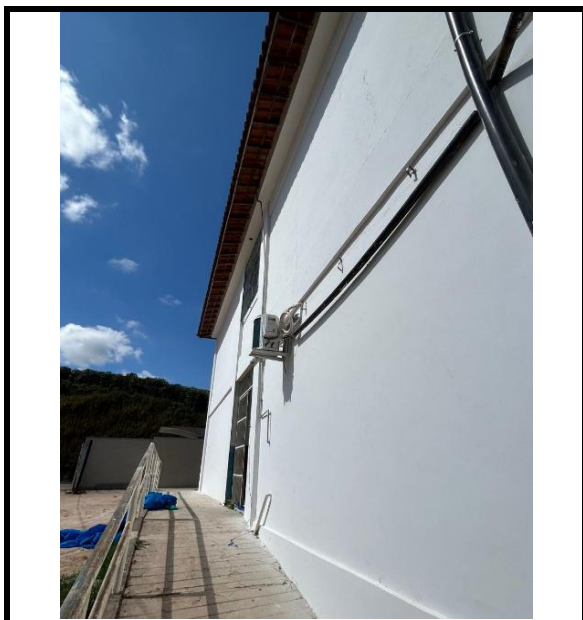


Figura 11 -Execução de pintura-exterior e
pintura em verniz dos beiras



Figura 12 - Execução de pintura-exterior

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CONTRATO: 052/2025
SERVIÇOS EXECUTADOS

MEDIÇÃO: 2ª medição
PERÍODO: 12/09/2025 a 08/10/2025

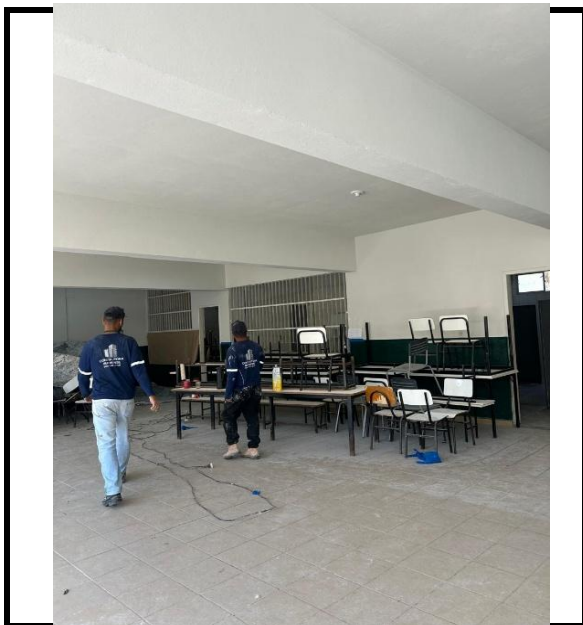


Figura 13 -Execução de pintura-interiores

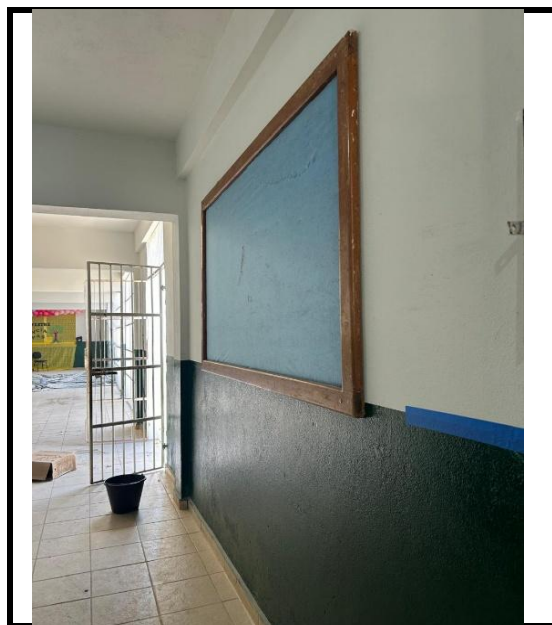


Figura 14 -Execução de pintura-interiores

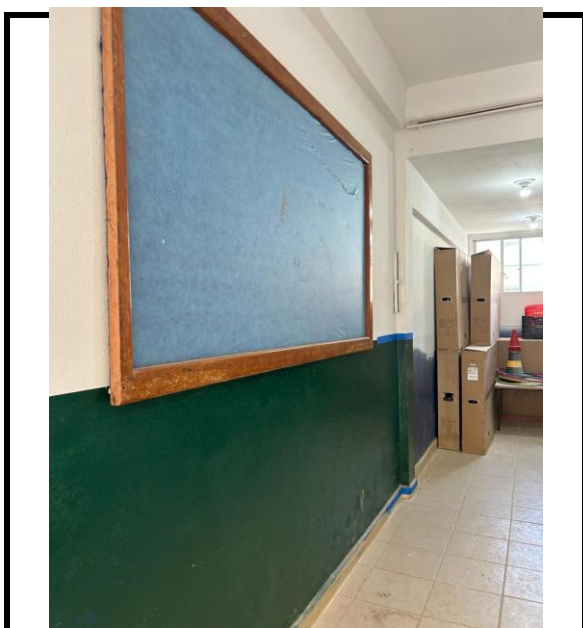


Figura 15 --Execução de pintura-interiores

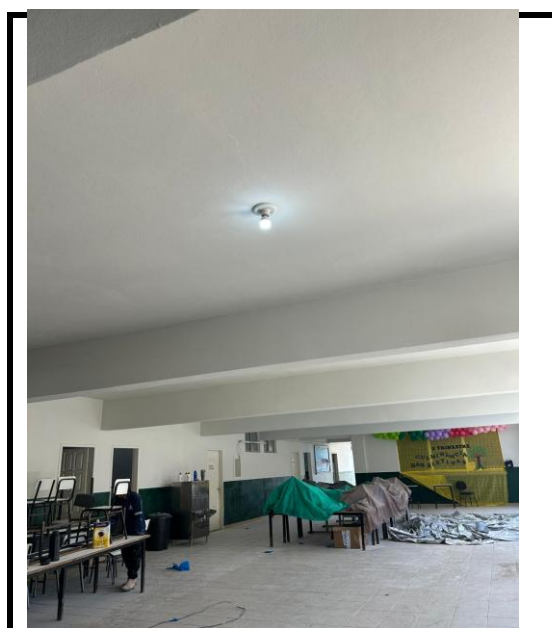


Figura 16 - Execução de pintura-interiores

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CONTRATO: 052/2025
SERVIÇOS EXECUTADOS

MEDIÇÃO: 2ª medição
PERÍODO: 12/09/2025 a 08/10/2025

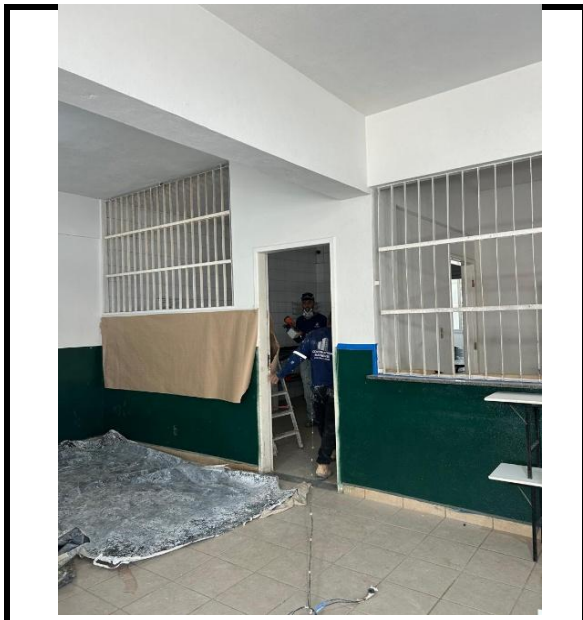


Figura 17 -Execução de pintura de grades de ferro em barra chata



Figura 18 -Execução de pintura de grades de ferro em barra chata

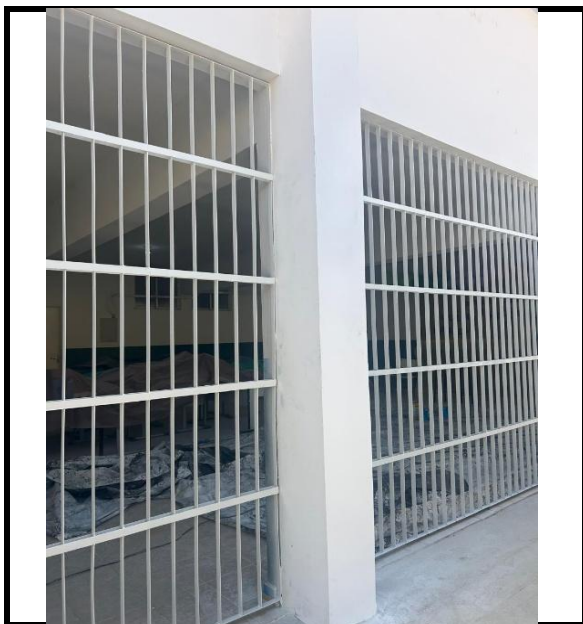


Figura 19 -Execução de pintura de grades de ferro em barra chata

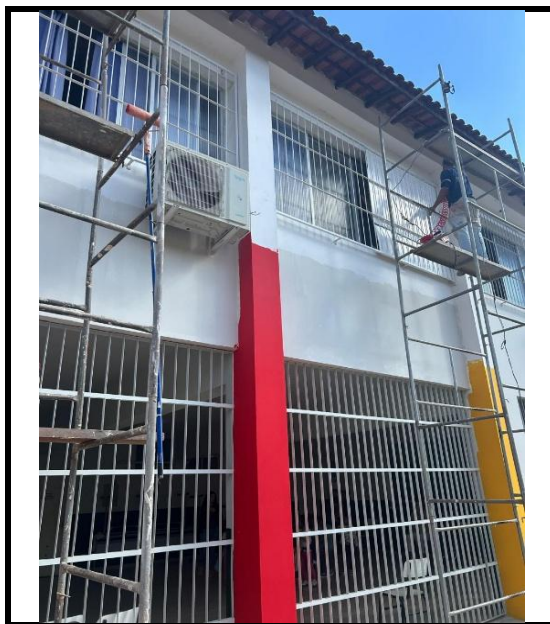


Figura 20-Execução de pintura de grades de ferro em barra chata

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CONTRATO: 052/2025
SERVIÇOS EXECUTADOS

MEDIÇÃO: 2ª medição
PERÍODO: 12/09/2025 a 08/10/2025

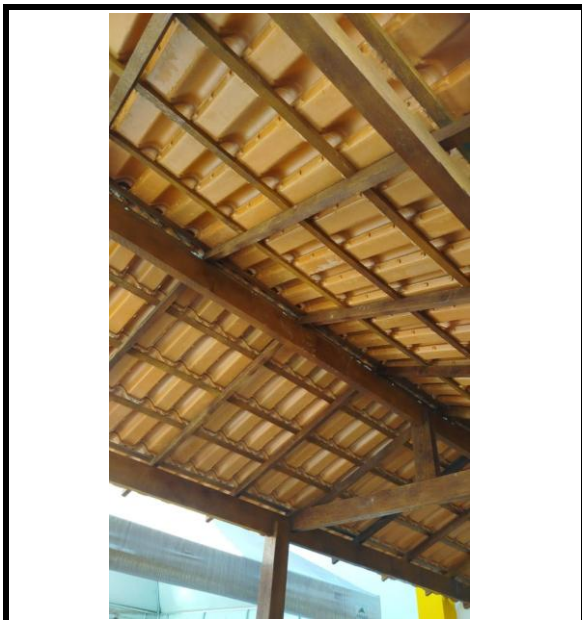


Figura 21 -Execução de madeiramento e de cobertura em telhas coloniais



Figura 22 -Execução de madeiramento e de cobertura em telhas coloniais



Figura 23 -Execução de madeiramento e de cobertura em telhas coloniais



Figura 24 -Execução de madeiramento e de cobertura em telhas coloniais

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CONTRATO: 052/2025
SERVIÇOS EXECUTADOS

MEDIÇÃO: 2ª medição
PERÍODO: 12/09/2025 a 08/10/2025

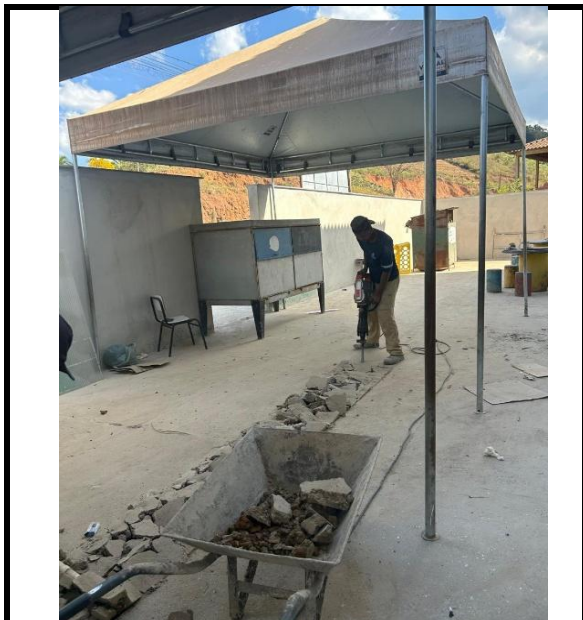


Figura 25- Demolição em concreto-drenagem pluvial

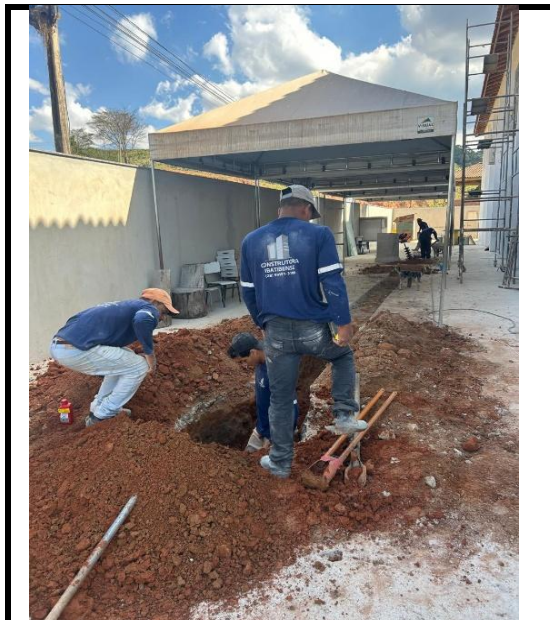


Figura 26- Abertura das cavas das caixas ralo de drenagem

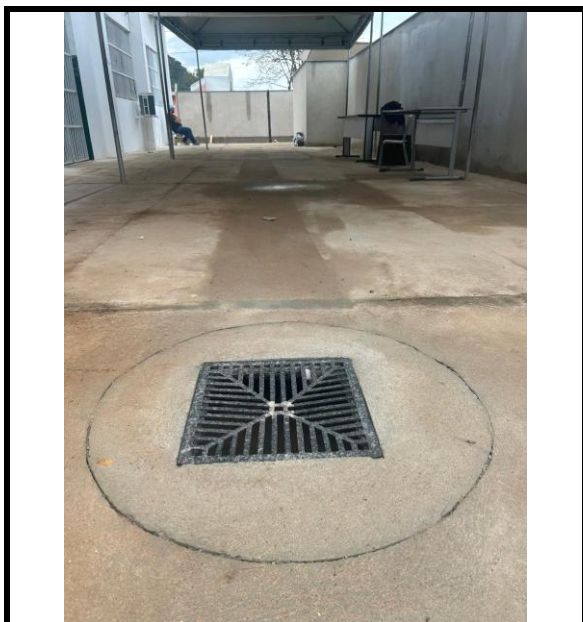


Figura 27 -chumbamento das caixas ralo de drenagem



Figura 28 -chumbamento das caixas ralo de drenagem

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA

CONTRATO: 052/2025

SERVIÇOS EXECUTADOS

MEDIÇÃO: 2ª medição

PERÍODO: 12/09/2025 a 08/10/2025



Figura 29- execução de canal autolimpanete
com grelha



Figura 30- execução de canal autolimpanete
com grelha



Figura 31 - execução de canal autolimpanete
com grelha



Figura 32 - execução de canal autolimpanete
com grelha

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CONTRATO: 052/2025
SERVIÇOS EXECUTADOS

MEDIÇÃO: 2ª medição
PERÍODO: 12/09/2025 a 08/10/2025



Figura 33- instalação de bacias sanitárias e ducha higiênica



Figura 34- instalação de bacias sanitárias e ducha higiênica



Figura 35 - instalação de cuba de canto wc pne



Figura 36 -assntamento de bancadas em granito em banheiros

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CONTRATO: 052/2025
SERVIÇOS EXECUTADOS

MEDIÇÃO: 2ª medição
PERÍODO: 12/09/2025 a 08/10/2025



Figura 37- instalação de portas venezianas em banheiros



Figura 38 -instalação de portas venezianas em banheiros



Figura 39 - instalação de portas venezianas em banheiros



Figura 40 - instalação de portas venezianas em banheiros

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CONTRATO: 052/2025
SERVIÇOS EXECUTADOS

MEDIÇÃO: 2ª medição
PERÍODO: 12/09/2025 a 08/10/2025

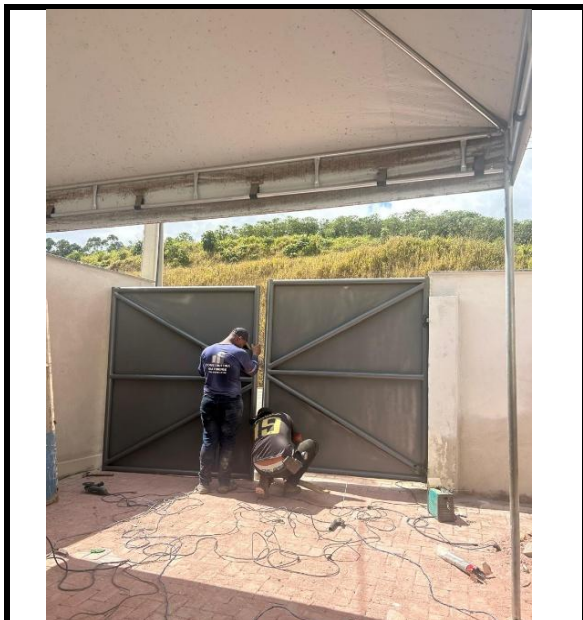


Figura 41-execução de portões com chapa de aço



Figura 42 -iexecução de portões com chapa de aço



Figura 43 - execução de portões com chapa de aço



Figura 44 - execução de portões com chapa de aço

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CONTRATO: 052/2025
SERVIÇOS EXECUTADOS

MEDIÇÃO: 2ª medição
PERÍODO: 12/09/2025 a 08/10/2025



Figura 45-execução de pintura- muro frontal

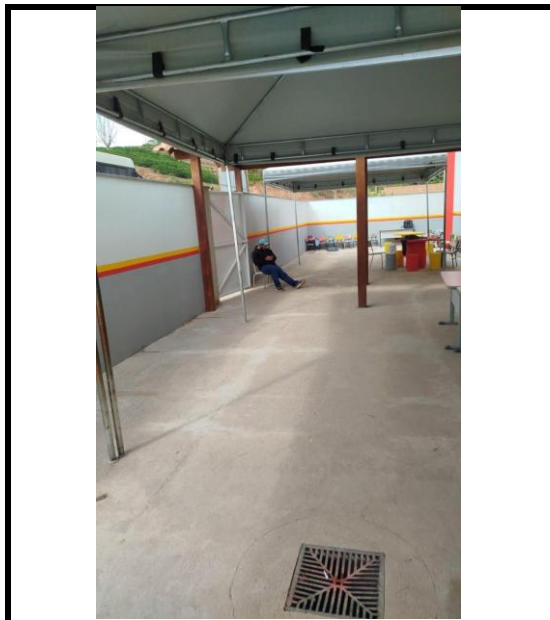


Figura 46 execução de pintura- muro frontal

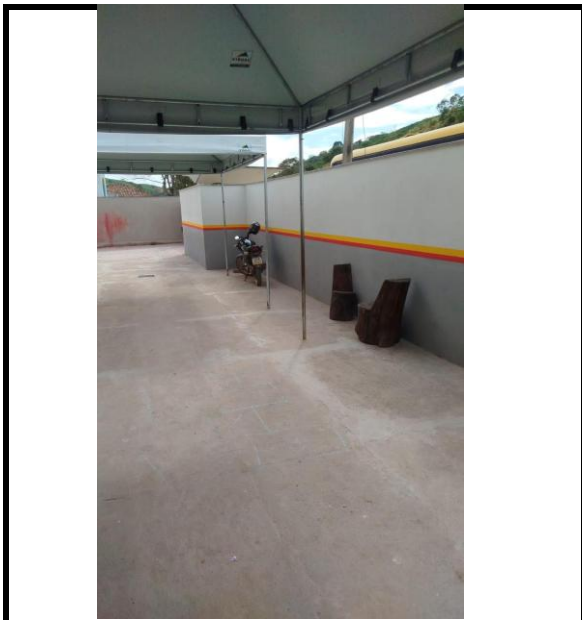


Figura 47 - execução de pintura- muro frontal

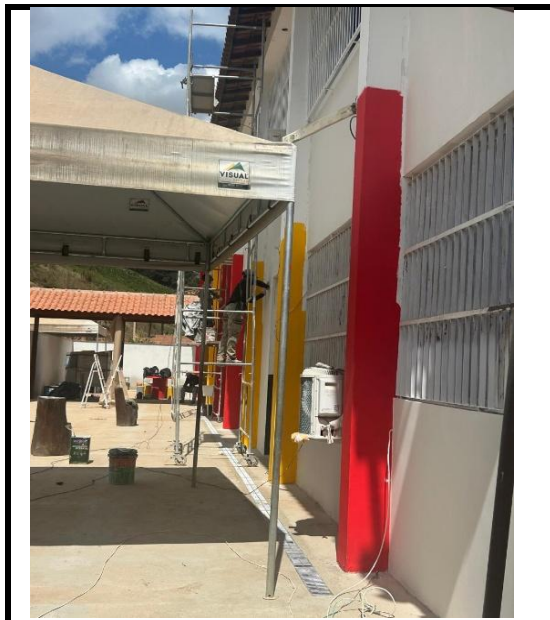


Figura 48 - execução de pintura-exteriores

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CONTRATO: 052/2025
SERVIÇOS EXECUTADOS

MEDIÇÃO: 2ª medição
PERÍODO: 12/09/2025 a 08/10/2025

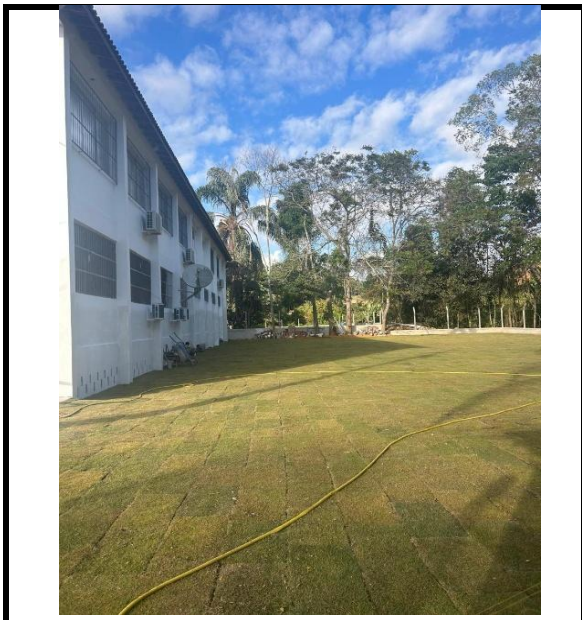


Figura 49-plantio de grama esmeralda em placas



Figura 50- plantio de grama esmeralda em placas



Figura 51 - plantio de grama esmeralda em placas



Figura 52 - plantio de grama esmeralda em placas

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CONTRATO: 052/2025
SERVIÇOS EXECUTADOS

MEDIÇÃO: 2ª medição
PERÍODO: 12/09/2025 a 08/10/2025

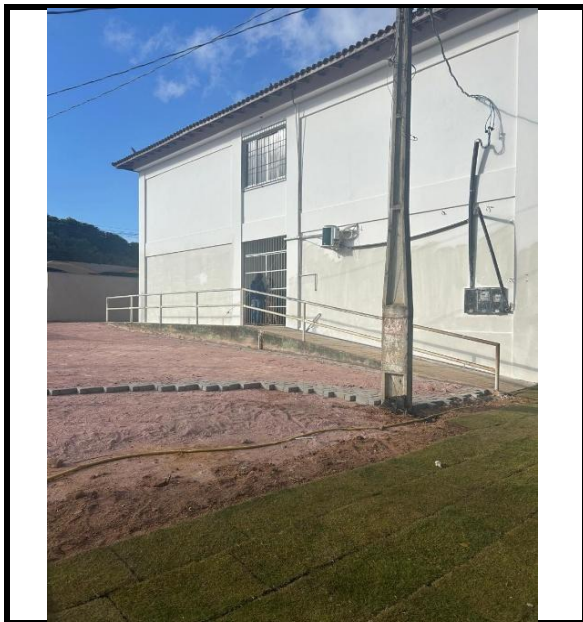


Figura 53-execução de calçamento com bloco holandes

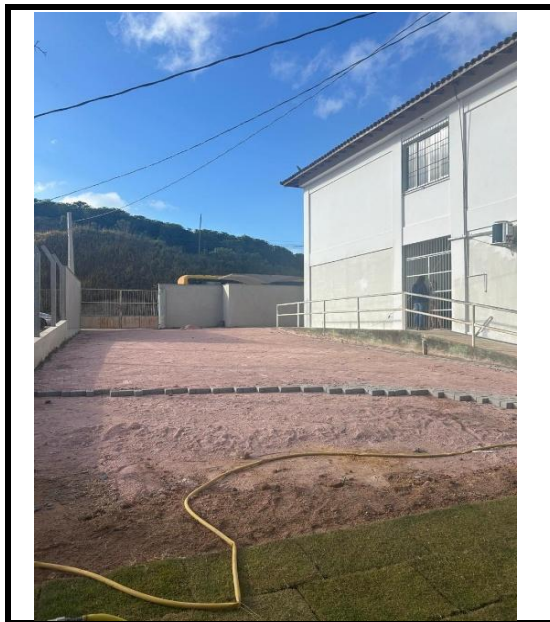


Figura 54- execução de calçamento com bloco holandes



Figura 55 - execução de calçamento com bloco holandes

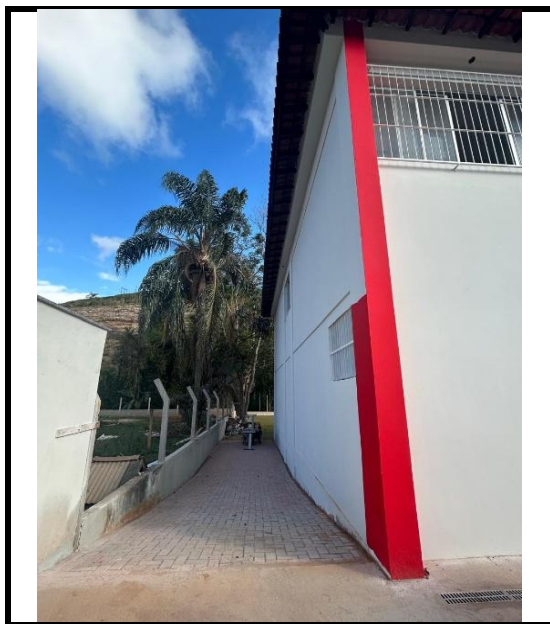


Figura 56 - execução de calçamento com bloco holandes

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CONTRATO: 052/2025
SERVIÇOS EXECUTADOS

MEDIÇÃO: 2ª medição
PERÍODO: 12/09/2025 a 08/10/2025

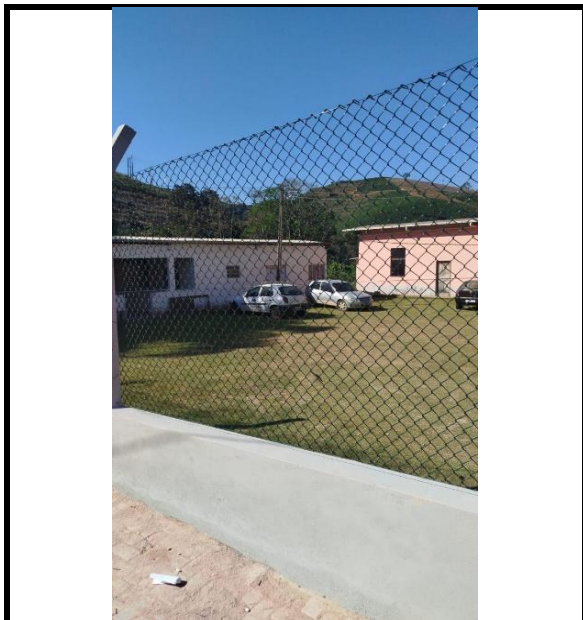


Figura 57- fixação dos alambrados na cerca e pintura da mureta



Figura 58- fixação dos alambrados na cerca e pintura da mureta

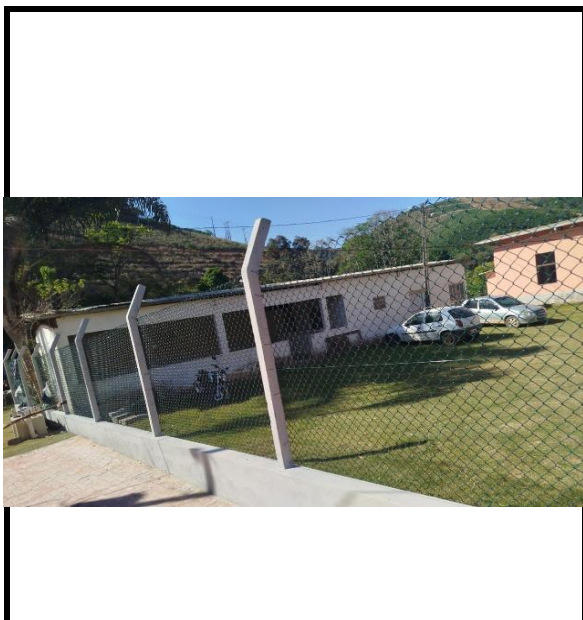


Figura 59 - fixação dos alambrados na cerca e pintura da mureta

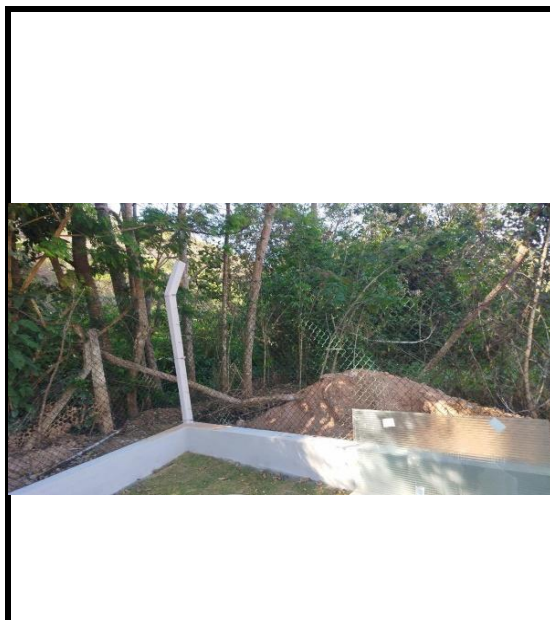


Figura 60 - fixação dos alambrados na cerca e pintura da mureta
