

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			CONVÊNIO													
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI			QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO		MODALIDADE:		DATA BASE:		Nº BOLETIM :		PERÍODO:		
											LICITAÇÃO		REF. JUL - 2022 sem Desoneração		05		25/01/2025 a 12/03/2025		
											Nº CONTRATO:		VAL. CONTRATADO:		INÍCIO DA OBRA:		TÉRMINO OBRA:		
											003/2024		R\$ 1.248.000,00		28/02/2024		27/02/2025		
											Nº DO ADITIVO:		VALOR ADITIVO:		REINÍCIO OBRA:		TÉRMINO OBRA:		
											1		R\$ 428.593,74		01/07/2024		27/02/2025		
											2		R\$ 0,00				27/05/2025		
											VALOR								
											CONTRATADO		REALIZADO NO MÊS		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL		
CÓDIGO	FORTE	ITEM	DESCRIÇÃO			UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL									
89785	SINAPI	08.01.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022			UN	0,00			0,00	R\$ 32,380	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00				
104343	SINAPI	08.01.22	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022			UN	0,00			0,00	R\$ 42,190	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00				
89677	SINAPI	08.01.23	LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022			UN	0,00			0,00	R\$ 100,510	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00				
89549	SINAPI	08.01.24	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022			UN	0,00			0,00	R\$ 24,940	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00				
89623	SINAPI	08.01.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022			UN	0,00			0,00	R\$ 23,160	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00				
89687	SINAPI	08.01.26	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022			UN	0,00			0,00	R\$ 69,440	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00				
89504	SINAPI	08.01.27	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022			UN	0,00			0,00	R\$ 22,640	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00				
89519	SINAPI	08.01.28	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022			UN	0,00			0,00	R\$ 60,560	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00				
89502	SINAPI	08.01.29	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022			UN	0,00			0,00	R\$ 19,970	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00				
89515	SINAPI	08.01.30	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022			UN	0,00			0,00	R\$ 111,630	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00				
89501	SINAPI	08.01.31	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022			UN	0,00			0,00	R\$ 16,260	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00				
89825	SINAPI	08.01.32	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022			UN	0,00			0,00	R\$ 22,300	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00				
89786	SINAPI	08.01.33	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022			UN	0,00			0,00	R\$ 48,820	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00				
89744	SINAPI	08.01.34	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022			UN	15,00	5,00	10,00	15,00	R\$ 32,594	R\$ 488,91	162,97	325,94	488,91				
89778	SINAPI	08.01.35	LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022			UN	47,00	20,00	27,00	47,00	R\$ 21,405	R\$ 1.006,04	428,10	577,94	1006,04				
104356	SINAPI	08.01.36	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022			UN	1,00		1,00	1,00	R\$ 43,494	R\$ 43,49	0,00	43,49	43,49				
104348	SINAPI	08.01.37	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022			UN	5,00		5,00	5,00	R\$ 16,561	R\$ 82,81	0,00	82,81	82,81				
89707	SINAPI	08.01.38	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022			UN	13,00		13,00	13,00	R\$ 49,880	R\$ 648,44	0,00	648,44	648,44				
		08.02	INSTALAÇÕES DE ÁGUA																
S141410	DER-EDIF	08.02.01	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRROM, DIÂM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES			M	68,01		68,01	68,01	R\$ 28,470	R\$ 1.936,24	0,00	1936,24	1936,24				
S141411	DER-EDIF	08.02.02	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRROM, DIÂM. 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES			M	227,03		227,03	227,03	R\$ 37,650	R\$ 8.547,68	0,00	8547,68	8547,68				
S141412	DER-EDIF	08.02.03	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRROM, DIÂM. 40MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES			M	15,67		15,67	15,67	R\$ 46,310	R\$ 725,68	0,00	725,68	725,68				
S141413	DER-EDIF	08.02.04	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRROM, DIÂM. 50MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES			M	86,76		86,76	86,76	R\$ 57,100	R\$ 4.954,00	0,00	4954,00	4954,00				
S141414	DER-EDIF	08.02.05	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRROM, DIÂM. 60MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES			M	18,00		18,00	18,00	R\$ 80,510	R\$ 1.449,18	0,00	1449,18	1449,18				

CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CONVÊNIO														
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI				QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO		MODALIDADE:		DATA BASE:		Nº BOLETIM :		PERÍODO:		
													LICITAÇÃO		REF. JUL - 2022 sem Desoneração		05		25/01/2025 a 12/03/2025		
													Nº CONTRATO:		VAL. CONTRATADO:		INÍCIO DA OBRA:		TÉRMINO OBRA:		
													003/2024		R\$ 1.248.000,00		28/02/2024		27/02/2025		
													Nº DO ADITIVO:		VALOR ADITIVO:		REINÍCIO OBRA:		TÉRMINO OBRA:		
													1		R\$ 428.593,74		01/07/2024		27/02/2025		
													2		R\$ 0,00				27/05/2025		
													VALOR								
													CONTRATADO		REALIZADO NO MÊS		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL		
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO				UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL										
94495	SINAPI	08.02.06	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021				UN	18,00		18,00	18,00	R\$ 73,600	R\$ 1.324,80	0,00	1324,80	1324,80					
94497	SINAPI	08.02.07	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021				UN	6,00		6,00	6,00	R\$ 126,980	R\$ 761,88	0,00	761,88	761,88					
94498	SINAPI	08.02.08	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021				UN	3,00		3,00	3,00	R\$ 175,600	R\$ 526,80	0,00	526,80	526,80					
94792	SINAPI	08.02.09	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021				UN	16,00		16,00	16,00	R\$ 138,150	R\$ 2.210,40	0,00	2210,40	2210,40					
94794	SINAPI	08.02.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021				UN	2,00		2,00	2,00	R\$ 200,770	R\$ 401,54	0,00	401,54	401,54					
94793	SINAPI	08.02.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021				UN	2,00		2,00	2,00	R\$ 189,900	R\$ 379,80	0,00	379,80	379,80					
89987	SINAPI	08.02.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021				UN	3,00		3,00	3,00	R\$ 113,290	R\$ 339,87	0,00	339,87	339,87					
90373	SINAPI	08.02.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022				UN	24,00		24,00	24,00	R\$ 15,040	R\$ 360,96	0,00	360,96	360,96					
89361	SINAPI	08.02.14	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022				UN	1,00		1,00	1,00	R\$ 10,130	R\$ 10,13	0,00	10,13	10,13					
89406	SINAPI	08.02.15	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022				UN	11,00		11,00	11,00	R\$ 9,360	R\$ 102,96	0,00	102,96	102,96					
104202	SINAPI	08.02.16	TE NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022				UN	3,00		3,00	3,00	R\$ 10,170	R\$ 30,51	0,00	30,51	30,51					
99635	SINAPI	08.02.17	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021				UN	19,00		19,00	19,00	R\$ 303,320	R\$ 5.763,08	0,00	5763,08	5763,08					
103955	SINAPI	08.02.18	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022				UN	2,00		2,00	2,00	R\$ 10,910	R\$ 21,82	0,00	21,82	21,82					
89429	SINAPI	08.02.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022				UN	3,00		3,00	3,00	R\$ 6,230	R\$ 18,69	0,00	18,69	18,69					
94658	SINAPI	08.02.20	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016				UN	68,00		68,00	68,00	R\$ 8,070	R\$ 548,76	0,00	548,76	548,76					
94660	SINAPI	08.02.21	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016				UN	4,00		4,00	4,00	R\$ 13,870	R\$ 55,48	0,00	55,48	55,48					
94662	SINAPI	08.02.22	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016				UN	10,00		10,00	10,00	R\$ 14,980	R\$ 149,80	0,00	149,80	149,80					
94664	SINAPI	08.02.23	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016				UN	4,00		4,00	4,00	R\$ 32,040	R\$ 128,16	0,00	128,16	128,16					
103953	SINAPI	08.02.24	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022				UN	1,00		1,00	1,00	R\$ 7,380	R\$ 7,38	0,00	7,38	7,38					
89546	SINAPI	08.02.25	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022				UN	1,00		1,00	1,00	R\$ 14,480	R\$ 14,48	0,00	14,48	14,48					

CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CONVÊNIO											
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI				QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO							
			UNID.		QUANTIDADE CONTRATADA		EXECUTADA				VALOR							
							ACUMULADA ANTERIOR		ACUMULADA ATUAL		CONTRATADO		REALIZADO NO MÊS		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL	
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO															
103971	SINAPI	08.02.26	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022															
104014	SINAPI	08.02.27	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022															
103999	SINAPI	08.02.28	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022															
104003	SINAPI	08.02.29	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022															
89364	SINAPI	08.02.30	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022															
89494	SINAPI	08.02.31	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022															
89503	SINAPI	08.02.32	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022															
89507	SINAPI	08.02.33	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022															
89502	SINAPI	08.02.34	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022															
89362	SINAPI	08.02.35	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022															
89492	SINAPI	08.02.36	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022															
94657	SINAPI	08.02.37	LUIVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016															
94659	SINAPI	08.02.38	LUIVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016															
89577	SINAPI	08.02.39	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022															
89617	SINAPI	08.02.40	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022															
89620	SINAPI	08.02.41	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022															
104004	SINAPI	08.02.42	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022															
89628	SINAPI	08.02.43	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022															
104008	SINAPI	08.02.44	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022															
89427	SINAPI	08.02.45	LUIVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022															
94707	SINAPI	08.02.46	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016															
89366	SINAPI	08.02.47	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022															
103950	SINAPI	08.02.48	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022															

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			CONVÊNIO									
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI			QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO						
									MODALIDADE:	DATA BASE:	Nº BOLETIM :	PERÍODO:			
									LICITAÇÃO	REF. JUL - 2022 sem Desoneração	05	25/01/2025 a 12/03/2025			
									Nº CONTRATO:	VAL. CONTRATADO:	INÍCIO DA OBRA:	TÉRMINO OBRA:			
									003/2024	R\$ 1.248.000,00	28/02/2024	27/02/2025			
									Nº DO ADITIVO:	VALOR ADITIVO:	REINÍCIO OBRA:	TÉRMINO OBRA:			
									1	R\$ 428.593,74	01/07/2024	27/02/2025			
									2	R\$ 0,00		27/05/2025			
									VALOR						
									CONTRATADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL			
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO			UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	NO MÊS	EXECUTADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL					
S140904	DER-EDIF	08.04.02	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA			M	96,58		96,58	96,58	R\$ 113,200	R\$ 10.932,86	0,00	10932,86	10932,86
89854	SINAPI	08.04.03	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022			UN	12,00		12,00	12,00	R\$ 143,000	R\$ 1.716,00	0,00	1716,00	1716,00
S141907	DER-EDIF	08.04.04	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES			M	2,30		2,30	2,30	R\$ 50,408	R\$ 115,94	0,00	115,94	115,94
S141908	DER-EDIF	08.04.05	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES			M	16,70		16,70	16,70	R\$ 73,200	R\$ 1.222,44	0,00	1222,44	1222,44
S140903	DER-EDIF	08.04.06	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA			M	18,90		18,90	18,90	R\$ 73,273	R\$ 1.384,86	0,00	1384,86	1384,86
89746	SINAPI	08.04.07	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022			UN	2,00		2,00	2,00	R\$ 33,940	R\$ 67,88	0,00	67,88	67,88
89744	SINAPI	08.04.08	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022			UN	4,00		4,00	4,00	R\$ 32,594	R\$ 130,38	0,00	130,38	130,38
89778	SINAPI	08.04.09	LUVAS SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022			UN	6,00		6,00	6,00	R\$ 21,405	R\$ 128,43	0,00	128,43	128,43
S141111	DER-EDIF	08.04.10	CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 90X19X39, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO			UND	1,00		1,00	1,00	R\$ 776,225	R\$ 776,23	0,00	776,23	776,23
SUBTOTAL											R\$ 262.446,96	R\$ 57.422,62	R\$ 170.623,38	R\$ 228.046,00	
09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															
100556	SINAPI	09.01	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019			UN	10,00		10,00	10,00	R\$ 55,420	R\$ 554,20	0,00	554,20	554,20
91936	SINAPI	09.02	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023			UN	325,00		325,00	325,00	R\$ 19,530	R\$ 6.347,25	0,00	6347,25	6347,25
S150628	DER-EDIF	09.03	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2"			UND	400,00		400,00	400,00	R\$ 9,380	R\$ 3.752,00	0,00	3752,00	3752,00
S151139	DER-EDIF	09.04	ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE			M	50,00		50,00	50,00	R\$ 26,890	R\$ 1.344,50	0,00	1344,50	1344,50
S151141	DER-EDIF	09.05	ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 4", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE			M	50,00		50,00	50,00	R\$ 59,340	R\$ 2.967,00	0,00	2967,00	2967,00
S151132	DER-EDIF	09.06	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4", MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE			M	1.500,00		1500,00	1500,00	R\$ 8,800	R\$ 13.200,00	0,00	13200,00	13200,00
S151133	DER-EDIF	09.07	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 1", MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE			M	400,00		400,00	400,00	R\$ 10,100	R\$ 4.040,00	0,00	4040,00	4040,00
S160322	DER-EDIF	09.08	ABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1", REF. TEL-095, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE			UND	570,00		570,00	570,00	R\$ 6,590	R\$ 3.756,30	0,00	3756,30	3756,30
S150836	DER-EDIF	09.09	ELETROCALHA PERFORADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº16, 200X100MM, SEM TAMPA			M	210,00		210,00	210,00	R\$ 113,880	R\$ 23.914,80	0,00	23914,80	23914,80
S151311	DER-EDIF	09.10	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE			UND	6,00		6,00	6,00	R\$ 114,260	R\$ 685,56	0,00	685,56	685,56
S150881	DER-EDIF	09.11	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA DE 200X100MM, NA PAREDE, ATRAVÉS DE SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA SIMPLES (1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (2UND)			UND	105,00		105,00	105,00	R\$ 35,820	R\$ 3.761,10	0,00	3761,10	3761,10
S150870	DER-EDIF	09.12	TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA METÁLICA 200X100MM, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2570 OU EQUIVALENTE			UND	5,00		5,00	5,00	R\$ 112,570	R\$ 562,85	0,00	562,85	562,85
S150875	DER-EDIF	09.13	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA METÁLICA, 200X100MM, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2510			UND	2,00		2,00	2,00	R\$ 95,960	R\$ 191,92	0,00	191,92	191,92
S150866	DER-EDIF	09.14	JUNÇÃO SIMPLES PARA ELETROCALHA METÁLICA 200X100MM, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2760 OU EQUIVALENTE			UND	70,00		70,00	70,00	R\$ 12,720	R\$ 890,40	0,00	890,40	890,40
S150850	DER-EDIF	09.15	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4"			UND	120,00		120,00	120,00	R\$ 11,050	R\$ 1.326,00	0,00	1326,00	1326,00
S150851	DER-EDIF	09.16	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1"			UND	40,00		40,00	40,00	R\$ 11,520	R\$ 460,80	0,00	460,80	460,80
S150309	DER-EDIF	09.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 32 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO			UND	6,00		6,00	6,00	R\$ 655,590	R\$ 3.933,54	0,00	3933,54	3933,54



DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			CONVÊNIO								
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI			QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO					
									MODALIDADE:	DATA BASE:	Nº BOLETIM :	PERÍODO:		
									LICITAÇÃO	REF. JUL - 2022 sem Desoneração	05	25/01/2025 a 12/03/2025		
									Nº CONTRATO:	VAL. CONTRATADO:	INÍCIO DA OBRA:	TÉRMINO OBRA:		
									003/2024	R\$ 1.248.000,00	28/02/2024	27/02/2025		
									Nº DO ADITIVO:	VALOR ADITIVO:	REINÍCIO OBRA:	TÉRMINO OBRA:		
									1	R\$ 428.593,74	01/07/2024	27/02/2025		
									2	R\$ 0,00		27/05/2025		
									VALOR					
									CONTRATADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL		
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO			UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	NO MÊS	EXECUTADA ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL				
S151710	DER-EDIF	09.18	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 57001 ATÉ 75000W - 220/127V			UND	1,00		0,00	R\$ 9.043,990	R\$ 9.043,99	0,00	0,00	0,00
91924	SINAPI	09.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023			M	800,00		800,00	R\$ 2,940	R\$ 2.352,00	0,00	2352,00	2352,00
S151417	DER-EDIF	09.20	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 2,5MM2			M	6.800,00		6800,00	R\$ 9,410	R\$ 63.988,00	0,00	63988,00	63988,00
S151418	DER-EDIF	09.21	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 4,0 MM2			M	200,00		200,00	R\$ 11,240	R\$ 2.248,00	0,00	2248,00	2248,00
S151419	DER-EDIF	09.22	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 6,0 MM2			M	1.900,00		1900,00	R\$ 13,970	R\$ 26.543,00	0,00	26543,00	26543,00
S151421	DER-EDIF	09.23	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 16,0 MM2			M	500,00		500,00	R\$ 27,270	R\$ 13.635,00	0,00	13635,00	13635,00
S151422	DER-EDIF	09.24	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 25,0 MM2			M	60,00		60,00	R\$ 41,770	R\$ 2.506,20	0,00	2506,20	2506,20
S151425	DER-EDIF	09.25	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 50,0 MM2			M	160,00		160,00	R\$ 77,090	R\$ 12.334,40	0,00	12334,40	12334,40
S180201	DER-EDIF	09.26	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2"			UND	164,00		164,00	R\$ 40,720	R\$ 6.678,08	0,00	6678,08	6678,08
91979	SINAPI	09.27	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023			UN	48,00		48,00	R\$ 57,580	R\$ 2.763,84	0,00	2763,84	2763,84
S181007	DER-EDIF	09.28	LUMINÁRIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM. ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 4 LÂMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K - REF. CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE			UND	325,00	98,00	183,00	R\$ 305,930	R\$ 99.427,25	29981,14	55985,19	85966,33
101666	SINAPI	09.29	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020			UN	8,00		0,00	R\$ 373,090	R\$ 2.984,72	0,00	0,00	0,00
S151306	DER-EDIF	09.30	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE			UND	42,00		42,00	R\$ 74,370	R\$ 3.123,54	0,00	3123,54	3123,54
S151307	DER-EDIF	09.31	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE			UND	24,00		22,00	R\$ 74,370	R\$ 1.784,88	0,00	1636,14	1636,14
S151321	DER-EDIF	09.32	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE			UND	16,00		16,00	R\$ 74,370	R\$ 1.189,92	0,00	1189,92	1189,92
S151322	DER-EDIF	09.33	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE			UND	23,00	2,00	21,00	R\$ 74,370	R\$ 1.710,51	148,74	1561,77	1710,51
S151334	DER-EDIF	09.34	DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE			UND	1,00		1,00	R\$ 552,040	R\$ 552,04	0,00	552,04	552,04
S151426	DER-EDIF	09.35	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 95,0 MM2			M	100,00		100,00	R\$ 136,420	R\$ 13.642,00	0,00	13642,00	13642,00
S151335	DER-EDIF	09.36	DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400 A, 65KA 220/240V / 36KA 380/415V 35KA 440/460V 25KA 600V (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE			UND	1,00		1,00	R\$ 1.237,870	R\$ 1.237,87	0,00	1237,87	1237,87
S151339	DER-EDIF	09.37	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A, CURVA C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE			UND	2,00		2,00	R\$ 459,720	R\$ 919,44	0,00	919,44	919,44
S151402	DER-EDIF	09.38	FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2,5 MM2			M	3.753,70		3753,70	R\$ 7,721	R\$ 28.982,32	0,00	28982,32	28982,32
S151403	DER-EDIF	09.39	FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4,0 MM2			M	2.009,00		2009,00	R\$ 10,268	R\$ 20.628,41	0,00	20628,41	20628,41
S151404	DER-EDIF	09.40	FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 6,0 MM2			M	82,00		82,00	R\$ 12,628	R\$ 1.035,50	0,00	1035,50	1035,50
S151405	DER-EDIF	09.41	FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 10,0 MM2			M	285,50		285,50	R\$ 18,828	R\$ 5.375,39	0,00	5375,39	5375,39
S151431	DER-EDIF	09.42	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 185,0MM2			M	132,10		132,10	R\$ 266,584	R\$ 35.215,75	0,00	35215,75	35215,75
S151338	DER-EDIF	09.43	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE			UND	21,00		21,00	R\$ 23,413	R\$ 491,67	0,00	491,67	491,67
S151301	DER-EDIF	09.44	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE			UND	17,00		17,00	R\$ 23,413	R\$ 398,02	0,00	398,02	398,02

CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			CONVÊNIO									
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI			QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO						
									MODALIDADE:	DATA BASE:	Nº BOLETIM :	PERÍODO:			
									LICITAÇÃO	REF. JUL - 2022 sem Desoneração	05	25/01/2025 a 12/03/2025			
									Nº CONTRATO:	VAL. CONTRATADO:	INÍCIO DA OBRA:	TÉRMINO OBRA:			
									003/2024	R\$ 1.248.000,00	28/02/2024	27/02/2025			
									Nº DO ADITIVO:	VALOR ADITIVO:	REINÍCIO OBRA:	TÉRMINO OBRA:			
									1	R\$ 428.593,74	01/07/2024	27/02/2025			
									2	R\$ 0,00		27/05/2025			
									VALOR						
									CONTRATADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL			
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO			UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	NO MÊS	EXECUTADA ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL					
93660	SINAPI	09.45	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020			UN	21,00		21,00	21,00	R\$ 55,863	R\$ 1.173,12	0,00	1173,12	1173,12
S151305	DER-EDIF	09.46	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE			UND	2,00		2,00	2,00	R\$ 29,220	R\$ 58,44	0,00	58,44	58,44
S151328	DER-EDIF	09.47	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE			UND	3,00		3,00	3,00	R\$ 99,068	R\$ 297,20	0,00	297,20	297,20
S151304	DER-EDIF	09.48	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE			UND	2,00		2,00	2,00	R\$ 23,413	R\$ 46,83	0,00	46,83	46,83
S151324	DER-EDIF	09.49	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE			UND	1,00		1,00	1,00	R\$ 83,199	R\$ 83,20	0,00	83,20	83,20
S151316	DER-EDIF	09.50	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE			UND	1,00		1,00	1,00	R\$ 173,551	R\$ 173,55	0,00	173,55	173,55
S151332	DER-EDIF	09.51	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A, CURVA C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE			UND	2,00		1,00	1,00	R\$ 459,730	R\$ 919,46	0,00	459,73	459,73
ELE-06	COMP	09.52	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUIDO.			UND	19,00		19,00	19,00	R\$ 252,761	R\$ 4.802,46	0,00	4802,46	4802,46
S151350	DER-EDIF	09.53	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS			UND	5,00		5,00	5,00	R\$ 114,676	R\$ 573,38	0,00	573,38	573,38
ELE-94	COMP	09.54	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 300A COM CAIXA MOLDADA 10KA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			UND	2,00		2,00	2,00	R\$ 1.793,803	R\$ 3.587,61	0,00	3587,61	3587,61
91937	SINAPI	09.55	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023			UN	286,00		286,00	286,00	R\$ 17,441	R\$ 4.988,13	0,00	4988,13	4988,13
S150634	DER-EDIF	09.56	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA			UND	1,00		1,00	1,00	R\$ 152,270	R\$ 152,27	0,00	152,27	152,27
S150629	DER-EDIF	09.57	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X4"			UND	1,00		1,00	1,00	R\$ 14,977	R\$ 14,98	0,00	14,98	14,98
S180218	DER-EDIF	09.58	ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4 X 4"			UND	1,00		1,00	1,00	R\$ 19,242	R\$ 19,24	0,00	19,24	19,24
S151003	DER-EDIF	09.59	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUIROS 10X20X20CM, DIMENSÃO DE 30X30X30CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5CM			UND	1,00		1,00	1,00	R\$ 135,750	R\$ 135,75	0,00	135,75	135,75
S151138	DER-EDIF	09.60	ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE			M	48,50		48,50	48,50	R\$ 22,585	R\$ 1.095,37	0,00	1095,37	1095,37
S151140	DER-EDIF	09.61	ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 3", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE			M	18,50		18,50	18,50	R\$ 43,100	R\$ 797,35	0,00	797,35	797,35
S151126	DER-EDIF	09.62	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES			M	25,70		25,70	25,70	R\$ 17,535	R\$ 450,65	0,00	450,65	450,65
S150801	DER-EDIF	09.63	ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO			M	1.007,00		1007,00	1007,00	R\$ 17,855	R\$ 17.979,99	0,00	17979,99	17979,99
S150806	DER-EDIF	09.64	ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO			M	82,20		82,20	82,20	R\$ 28,889	R\$ 2.374,68	0,00	2374,68	2374,68
ELE-82	COMP	09.65	ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO			M	39,30		39,30	39,30	R\$ 23,055	R\$ 906,06	0,00	906,06	906,06
ELE-83	COMP	09.66	ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO			M	3,30		3,30	3,30	R\$ 25,782	R\$ 85,08	0,00	85,08	85,08
ELE-84	COMP	09.67	ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 2", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO			M	6,50		6,50	6,50	R\$ 30,528	R\$ 198,43	0,00	198,43	198,43
ELE-93	COMP	09.68	ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO.			M	0,10		0,10	0,10	R\$ 54,546	R\$ 5,45	0,00	5,45	5,45
ELE-18	COMP	09.69	BLOCO AUTÔNOMO DE ENERGIA 60 LEDS (MÍNIMO 200 LÚMENS) COM AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS, INCLUINDO LÂMPADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			UND	44,00		44,00	44,00	R\$ 97,053	R\$ 4.270,33	0,00	4270,33	4270,33
ELE-14	COMP	09.70	ARANDELA TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO Prensado, GRADE DE PROTEÇÃO, COM LÂMPADA BULBO LED 15W. SOQUETE E27. TUDO INCLUIDO.			UND	1,00		1,00	1,00	R\$ 107,229	R\$ 107,23	0,00	107,23	107,23
ELE-16 A	COMP	09.71	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA COM VIDRO FOSCO, COM 1 LÂMPADA BULBO LED DE 9W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUIDO.			UND	1,00		1,00	1,00	R\$ 87,521	R\$ 87,52	0,00	87,52	87,52

CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CONVÊNIO												
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI				QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO		VALOR						
			UNID.		QUANTIDADE CONTRATADA		EXECUTADA				CONTRATADO		REALIZADO NO MÊS		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL		
CÓDIGO	FUNTE	ITEM	DESCRIÇÃO																
S181001	DER-EDIF	09.72	LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 9/10W TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM - REF. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE																
ELE-08	COMP	09.73	REFLETOR DE LED 50W, BRANCO FRIO 6500K, 10.000LM, IP66, SLIM, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUIDO.																
S180202	DER-EDIF	09.74	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2"																
S180206	DER-EDIF	09.75	INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2"																
S180204	DER-EDIF	09.76	INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2"																
91956	SINAPI	09.77	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023																
S180207	DER-EDIF	09.78	INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2"																
S180205	DER-EDIF	09.79	INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2"																
92027	SINAPI	09.80	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023																
ELE-01	COMP	09.81	TAMPA COM FURO PARA CAIXA 4X2" DE PVC. TUDO INCLUIDO.																
SBE-01	COMP	09.82	SUBESTAÇÃO EXT. AÉREA TRIFÁS. 112.5KVA, COMPLETA, C/ QUADROS DE MEDIÇÃO, TRANSF. A ÓLEO, CHAVE GERAL TRIP., POSTE E ACESSÓRIOS, CONF. NOR-TEC-01 DA ESCELSA, INCL. MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRAÇO 1:0.5:6																
101878	SINAPI	09.83	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020																
QD-03	COMP	09.84	QD-03 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN. 100 A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.																
QD-01	COMP	09.85	QD-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 42 DISJUNTORES DIN. 100 A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.																
QD-02	COMP	09.86	QD-02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR C/ PORTA C/ BARRAMENTO CHAPA METÁLICA 225A - PARA NO MÍNIMO 60 E NO MÁXIMO 70 DISJUNTORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.																
QDB-01	COMP	09.87	QDB-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.																
QGBT	COMP	09.88	QGBT - QUADRO DISTRIB. ENERGIA, SOBREPOR, CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 345A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG-56DIN-CEMAR OU EQUIV																
SUBTOTAL												R\$ 599.219,30		R\$ 32.028,11		R\$ 491.009,90		R\$ 523.038,02	
10			PINTURA																
10.01			PINTURA SOBRE PAREDE E TETO																
S190103	DER-EDIF	10.01.01	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX																
S190106	DER-EDIF	10.01.02	PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃO DE TINTA LÁTEX ACRILICO PREMIUM, REFERÊNCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE																
10.02			PINTURA SOBRE MADEIRA																

CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CONVÊNIO											
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI				QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO		VALOR					
			UNID.		QUANTIDADE CONTRATADA		EXECUTADA				CONTRATADO		REALIZADO NO MÊS		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL	
					NO MÊS		ACUMULADA ANTERIOR		ACUMULADA ATUAL									
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO															
S190301	DER-EDIF	10.02.01	M2	92,68	92,68		92,68		R\$ 51,110	R\$ 4.736,87	4736,87	0,00	4736,87					
S190302	DER-EDIF	10.02.02	M2	92,68	92,68		92,68		R\$ 46,550	R\$ 4.314,25	4314,25	0,00	4314,25					
		10.03																
S190417	DER-EDIF	10.03.01	M2	96,63	48,32		48,32		R\$ 47,240	R\$ 4.564,80	2282,64	0,00	2282,64					
			SUBTOTAL							R\$ 159.445,92	R\$ 51.203,17	R\$ 63.693,09	R\$ 114.896,26					
		11	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA															
S200401	DER-EDIF	11.01	M2	1.880,08			0,00		R\$ 12,220	R\$ 22.974,58	0,00	0,00	0,00					
			SUBTOTAL							R\$ 22.974,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
		14	RAMPA PRINCIPAL															
		14.02	INFRAESTRUTURA															
S040238	DER-EDIF	14.02.01	M2	47,20			47,20		R\$ 89,503	R\$ 4.224,54	0,00	4224,54	4224,54					
S040231	DER-EDIF	14.02.02	M3	1,18			1,18		R\$ 672,956	R\$ 796,78	0,00	794,09	794,09					
S040243	DER-EDIF	14.02.03	KG	72,00			72,00		R\$ 11,603	R\$ 835,42	0,00	835,42	835,42					
S040245	DER-EDIF	14.02.04	KG	521,00			521,00		R\$ 12,203	R\$ 6.357,76	0,00	6357,76	6357,76					
S040224	DER-EDIF	14.02.05	M3	11,82			11,82		R\$ 764,311	R\$ 9.034,16	0,00	9034,16	9034,16					
EST-01	COMP	14.02.06	M2	47,20			47,20		R\$ 2,486	R\$ 117,34	0,00	117,34	117,34					
98557	SINAPI	14.02.07	M2	47,20			47,20		R\$ 38,650	R\$ 1.824,28	0,00	1824,28	1824,28					
		14.03	SUPRAESTRUTURA															
S040339	DER-EDIF	14.03.01	M2	311,88			311,88		R\$ 132,014	R\$ 41.172,53	0,00	41172,53	41172,53					
S040328	DER-EDIF	14.03.02	KG	1.065,00			1.065,00		R\$ 11,603	R\$ 12.357,20	0,00	12357,20	12357,20					
S040332	DER-EDIF	14.03.03	KG	520,00			520,00		R\$ 12,203	R\$ 6.345,56	0,00	6345,56	6345,56					
S040315	DER-EDIF	14.03.04	M3	27,34			27,34		R\$ 875,147	R\$ 23.926,52	0,00	23926,52	23926,52					
EST-01	COMP	14.03.05	M2	311,88			311,88		R\$ 2,486	R\$ 775,33	0,00	775,33	775,33					
			SUBTOTAL							R\$ 107.767,41	R\$ 0,00	R\$ 107.764,72	R\$ 107.764,72					
			TOTAL							R\$ 1.676.593,74	R\$ 229.152,98	R\$ 1.157.065,29	R\$ 1.386.218,27					
			Valor (R\$) por extenso: Duzentos e vinte e nove mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos															
											TOTAL MEDIÇÃO		R\$ 229.152,98					
											TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.386.218,27					
											SALDO CONTRATO		R\$ 290.375,47					

ATAIDE LUIS DE OLIVEIRA
05882254604

Assinado digitalmente por ATAIDE LUIS DE OLIVEIRA-05882254604
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF-A1, OU=Presencial, OU=32522131000125, OU=AC SIngularID *Multipla, CN=ATAIDE LUIS DE OLIVEIRA: 05882254604
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025/03/17 13:39:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Documento assinado digitalmente
gov.br
ZAZUEU DOS SANTOS PEREIRA
Data: 14/03/2025 14:03:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO: 003/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS:

MEDIÇÃO: 05

DATA: 13/03/2025



Chapisco de parede



Reboco de parede



Pintura de paredes



Emassamento de paredes

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO: 003/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS:

MEDIÇÃO: 01


DATA: 09/08/2024



Revestimento de paredes



Revestimento de paredes

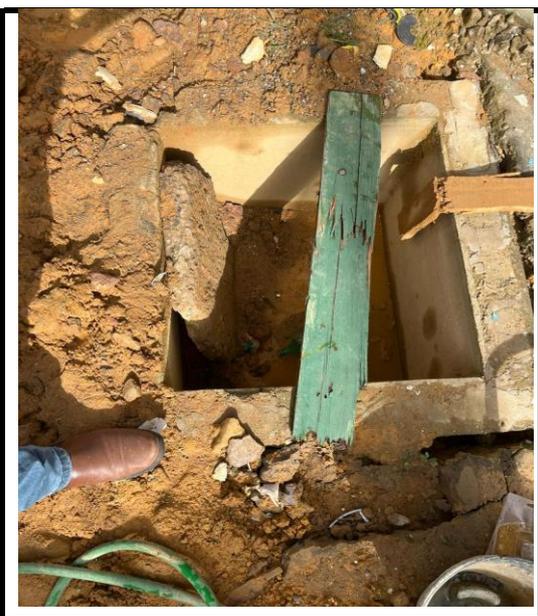

Caixa de passagem




Reboco de paredes

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CONTRATO: 003/2024
SERVIÇOS EXECUTADOS:

MEDIÇÃO: 01
DATA: 09/08/2024

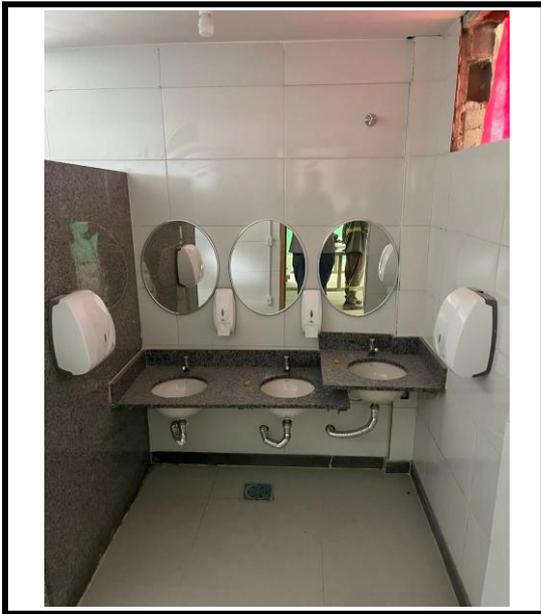

Instalações hidrossanitárias



Instalações hidrossanitárias



Revestimento de paredes



Instalações hidrossanitárias

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


EMPRESA: APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO: 003/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS:

MEDIÇÃO: 01

DATA: 09/08/2024

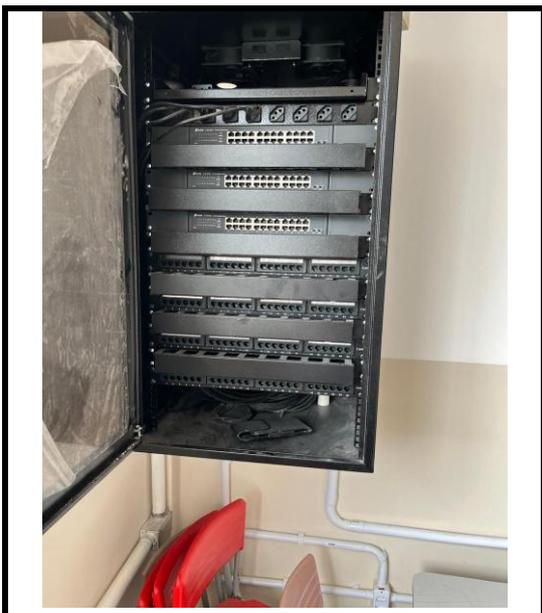

Instalações elétricas



Instalações elétricas



Instalações elétricas




Instalações elétricas

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CONTRATO: 003/2024
SERVIÇOS EXECUTADOS:


MEDIÇÃO: 01
DATA: 09/08/2024

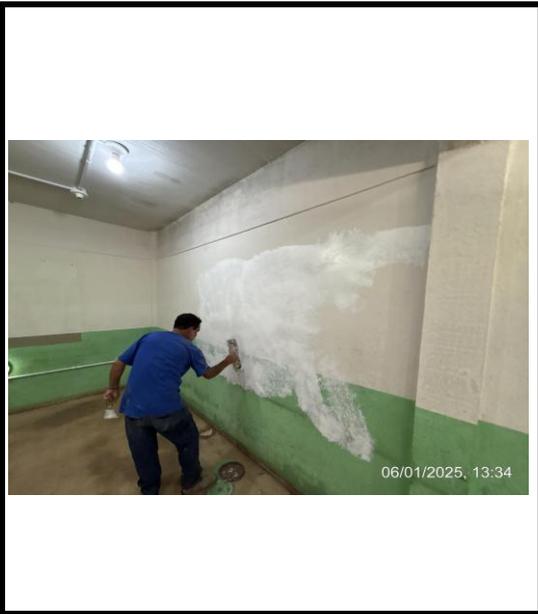

Emassamento de paredes



Instalações hidrossanitárias

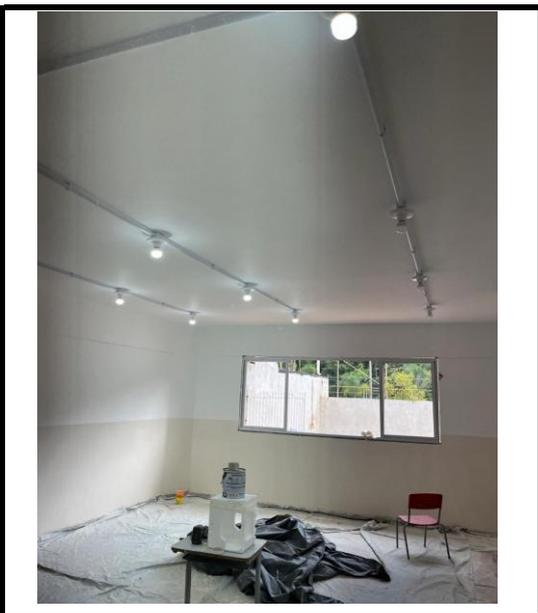

Pintura de paredes

