

 INSTITUTO DE REGISTRO E URBANIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS																					
CONTRATADA:			ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA						CONVÊNIO												
LOCALIZAÇÃO:			RUA JOÃO LOURENÇO DA SILVA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, IRUPI-ES			QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO			MODALIDADE:		DATA BASE:		Nº BOLETIM:		PERÍODO:			
												LICITAÇÃO		REF. JAN. 2023 sem Desoneração		05		01/03/2025 a 14/04/2025			
												Nº CONTRATO:		PRAZO:		VAL. CONTRATADO:		INÍCIO DA OBRA:		TÉRMINO OBRA:	
												024/2024		24 meses		R\$ 1.005.000,00		24/04/2024		24/07/2025	
												Nº DO ADITIVO:		PRAZO:		VALOR ADITIVO:		REINÍCIO OBRA:		TÉRMINO OBRA:	
01 e 02				R\$ 254.539,05																	
				VALOR																	
CONTRATADO		REVISADO		REALIZADO NO MÊS		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL													
CÓDIGO	FORTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	REVISADA	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL												
		1	Serviços Preliminares																		
20305	DER	01,01	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão DER	m2	4,50			4,50	4,50	251,28	RS 1.130,76		0,00	1130,76	1130,76						
10209	DER	01,02	Demolição de alvenaria	m3	35,69			3,60	3,60	RS 56,00	RS 1.998,76		0,00	201,59	201,59						
20803	DER	01,03	Barração para depósito de cimento área de 10,90m2, de chapa de compensado 12mm e portâteis 6x6cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	M²			7,50	7,50	7,50	RS 423,80		RS 3.178,48	3178,48		3178,48						
20351	DER	01,04	Tapume madeira compensada resinada esp= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint. adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm	M			17,40	17,40	17,40	RS 254,81		RS 4.433,68	4433,68		4433,68						
			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				17,40														
97626	SINAPI	01,05	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Af_12/2017	M³			18,41	18,41	18,41	RS 601,29		RS 11.069,82	11069,82		11069,82						
10224	DER	01,06	Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões	M²			32,40			RS 16,45		RS 532,93	0,00		0,00						
10220	DER	01,07	Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto	M²			843,38			RS 11,52		RS 9.714,92	0,00		0,00						
10213	DER	01,08	Retirada manual de blocos pr e-modulados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento	M²			54,60	54,60	54,60	RS 13,07		RS 713,36	713,36		713,36						
10214	DER	01,09	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	UND			3,00	3,00	3,00	RS 14,93		RS 44,80	44,80		44,80						
10218	DER	01,10	Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte	m²			187,74			RS 12,84		RS 2.410,91	0,00		0,00						
010324	DER	01,11	Retirada de cobertura em telha canalato 90	m²			852,70			RS 8,21		RS 6.999,48	0,00		0,00						
010325	DER	01,12	Demolição de estrutura de madeira para telhado	m²			852,70			RS 27,18		RS 23.175,28	0,00		0,00						
030210	DER	01,13	Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material	m³			75,44	75,44	75,44	RS 28,59		RS 2.166,83	2166,83		2166,83						
			SUBTOTAL								RS 3.129,52	RS 64.429,60	RS 21.598,97	RS 1.332,35	RS 22.929,32						
		2	Fundação																		
30101	DER	02,01	Escavação manual em material de 1ª, categoria, até 1,50 m de profundidade	m3	28,34		45,00	16,66	28,10	44,76	RS 53,46	RS 1.515,00	RS 2.405,610	890,61	1502,17	2392,78					
40231	DER	02,02	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (zona 1 e 2) -(8% de perdas já incluído no custo)	m3	3,82		7,37	3,55	3,82	7,37	RS 889,92	RS 2.635,49	RS 5.064,696	2449,21	2835,49	5084,70					
40246	DER	02,03	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg	650,20			544,40	544,40	RS 12,15		RS 7.899,93	0,00	6614,46	6614,46						
40328	DER	02,04	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	4087,00			2.153,40	2153,40	RS 11,495		RS 48.980,07	0,00	24753,33	24753,33						
40332	DER	02,05	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12,5 a 25,0mm	kg	116,30		190,80	74,50	116,30	190,80	RS 11,955	RS 1.390,37	RS 2.261,014	890,65	1390,37	2281,01					
40337	DER	02,06	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2,5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em escaloço e desforma)	m2	68,22		806,43	473,53	68,22	541,75	RS 102,415	RS 6.986,75	RS 82.590,528	48496,57	6986,75	55483,33					
40253	DER	02,07	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m3	67,60			36,04	36,04	RS 713,275		RS 48.217,39	0,00	25706,43	25706,43						
100203	DER	02,08	Pintura impermeabilizante com igluflex ou equivalente a 3 demãos	m2	247,70			17,45	17,45	RS 46,916		RS 11.621,09	0,00	818,58	818,58						
			SUBTOTAL								RS 127.246,08	RS 92.361,85	RS 52.727,04	RS 70.407,88	RS 123.134,72						
		3	Super Estrutura																		
40337	DER	03,01	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2,5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucaloço e desforma)	m2	158,68		453,65	86,85	158,68	245,53	RS 102,415	RS 16.251,21	RS 46.460,565	8694,74	16251,21	25145,95					
40246	DER	03,02	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg	483,00			105,30	105,30	RS 12,150		RS 5.868,45	0,00	1279,40	1279,40						
40328	DER	03,03	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	3.836,20			1462,70	1462,70	RS 11,495		RS 44.097,12	0,00	16813,74	16813,74						
40332	DER	03,04	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12,5 a 25,0mm	kg	586,10		101,00	101,00	101,00	RS 11,955		RS 7.006,83	0,00	1207,46	1207,46						
40331	DER	03,05	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p concor. bombeável)	m3	67,80			27,02	27,02	RS 669,692		RS 45.405,12	0,00	18095,08	18095,08						
			SUBTOTAL								RS 118.628,72	RS 46.460,56	RS 5.894,74	RS 53.646,88	RS 62.541,62						
		4	ALVENARIA E VEDAÇÃO																		
50602	DER	04,01	Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compress. 2,5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, sí rev. 14cm	m2	160,43		74,11	160,43	234,54	RS 85,374	RS 13.696,12	RS 20.023,618	6327,07	13896,55	20023,62						
90403	DER	04,02	Rebordo de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, armada com planetes em conc. arm. a cada 2m (H=1,0m), excl. revest.	m	49,94					RS 125,258	RS 6.255,38	0,00	0,00	0,00	0,00						
			SUBTOTAL								RS 19.951,51	RS 26.023,62	RS 6.327,07	RS 13.696,55	RS 20.023,62						
		5	ESQUADRIAS																		
71701	DER	05,01	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m2	10,59					RS 539,979	RS 5.718,38		0,00	0,00	0,00						
61303	DER	05,02	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalentes em madeira 1ª qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alçares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim. 0,80 x 2,10 m	und	29,00		3,00			RS 1.209,258	RS 35.068,48	3.627,77	0,00	0,00	0,00						
61302	DER	05,03	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalentes em madeira 1ª qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alçares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim. 0,70 x 2,10 m	und	6,00		0,00			RS 1.198,082	RS 7.188,49	0,00	0,00	0,00	0,00						
61301	DER	05,04	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalentes em madeira 1ª qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alçares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim. 0,80 x 2,10 m	und	8,00		0,00			RS 1.171,330	RS 9.370,64	0,00	0,00	0,00	0,00						

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS																							
CONTRATADA:			ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA		CONVÊNIO		MODALIDADE:			DATA BASE:		Nº BOLETIM :		PERÍODO:									
LOCALIZAÇÃO:			RUA JOÃO LOURENÇO DA SILVA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, IRUPI-ES		QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO		LICITAÇÃO		REF. JAN 2023 sem Desoneração		05		01/03/2025 a 14/04/2025							
										Nº CONTRATO:		PRAZO:		VAL. CONTRATADO:		INÍCIO DA OBRA:		TÉRMINO OBRA:					
										024/2024		24 meses		R\$ 1.005.800,00		24/04/2024		24/07/2025					
										Nº DO ADITIVO:		PRAZO:		VALOR ADITIVO:		REINÍCIO OBRA:		TÉRMINO OBRA:					
								01 e 02		R\$ 254.539,05													
										VALOR													
										CONTRATADO		REVISADO		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL							
												REALIZADO NO MÊS											
CÓDIGO	FORNE	ITEM	DESCRIÇÃO		UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	REVISADA	EXECUTADA															
								NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL													
60101	DER	05,05	Marco de madeira de lei de 1" (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de balente, nas dimensões de 0,80 x 2,10 m		und	8,00	0,00				R\$ 434,722	R\$ 3.477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60102	DER	05,06	Marco de madeira de lei de 1" (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de balente, nas dimensões de 0,70 x 2,10 m		und	6,00	0,00				R\$ 434,722	R\$ 2.808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60103	DER	05,07	Marco de madeira de lei de 1" (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de balente, nas dimensões de 0,80 x 2,10 m		und	29,00	3,00				R\$ 434,722	R\$ 12.606,94	1.304,17	0,00	0,00	0,00	0,00						
SUBTOTAL																		R\$ 76.039,04	R\$ 4.931,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6 REVESTIMENTOS																							
110101	DER	06,01	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm		m2	420,73	140,45	280,28	420,71	R\$ 13,551	R\$ 5.701,31			1903,20	3797,80	5701,00							
110302	DER	06,02	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0,5:6, espessura 25 mm		m2	420,73	116,00	117,16	233,16	R\$ 64,190	R\$ 27.006,66			7446,04	7520,50	14866,54							
120301	DER	06,03	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 20 mm		m2	420,73	843,38	411,79	411,78	R\$ 33,738	R\$ 14.194,50	R\$ 28.453,954		13892,77	0,00	13892,77							
130236	DER	06,04	Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Elianeleque, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento		m2	248,79	843,38		0,00	R\$ 74,097	R\$ 18.434,87	R\$ 62,491,928		0,00	0,00	0,00	0,00						
120220	DER	06,05	Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecorla ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0,5 cm, empregando argamassa colante		m2	399,50			0,00	R\$ 90,180	R\$ 36.027,27			0,00	0,00	0,00	0,00						
130202	DER	06,06	Piso cimentado liso com 1,5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m		m2	121,93			0,00	R\$ 58,092	R\$ 7.083,27			0,00	0,00	0,00	0,00						
130303	DER	06,07	Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7,0 cm, inclusive rejuntamento com cimento branco		m	73,05			0,00	R\$ 16,379	R\$ 1.196,48			0,00	0,00	0,00	0,00						
130317	DER	06,08	Pietoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm		m	115,10	37,90		0,00	R\$ 84,884	R\$ 9.770,15	R\$ 3.217,104		0,00	0,00	0,00	0,00						
130308	DER	06,09	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm		m	37,90	37,90		0,00	R\$ 53,061	R\$ 2.011,01			0,00	0,00	0,00	0,00						
130103	DER	06,10	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm		m2	370,72	843,38	146,66	146,66	R\$ 25,584	R\$ 9.484,58	R\$ 21.577,034		3752,15	0,00	3752,15							
130111	DER	06,11	Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm		m2	232,58	160,51		160,51	R\$ 62,34		R\$ 14.498,503		10005,82		10005,82							
SUBTOTAL																		R\$ 130.209,99	R\$ 132.249,53	R\$ 36.899,98	R\$ 11.318,30	R\$ 48.318,28	
7 FORROS																							
110201	DER	07,01	Forro de gesso acabamento tipo liso		m2	1.004,35	0,00			R\$ 45,452	R\$ 45.649,72	R\$ 0,000		0,00	0,00	0,00	0,00						
SUBTOTAL																		R\$ 45.649,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8 COBERTURAS																							
90101	DER	08,01	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontalões, lergas, cabros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas		m2	250,95	0,00			R\$ 213,233	R\$ 53.510,29	R\$ 0,000		0,00	0,00	0,00	0,00						
90211	DER	08,02	Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal, incl. 35%)		m2	250,95	0,00			R\$ 171,870	R\$ 43.130,35	R\$ 0,000		0,00	0,00	0,00	0,00						
100203	DER	08,03	Pintura impermeabilizante com igdiflex ou equivalente a 3 demãos		m2	108,56				R\$ 46,916	R\$ 5.093,20			0,00	0,00	0,00	0,00						
090103	DER	08,04	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canilete 49/90, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas		m²	950,51				R\$ 113,77		R\$ 108.138,23											
090206	DER	08,05	Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0,5mm, inclusive acessórios de fixação		m²	950,51				R\$ 102,19		R\$ 97.130,09											
SUBTOTAL																		R\$ 101.733,84	R\$ 205.268,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9 PINTURAS																							
190101	DER	09,01	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex		m2	1.975,74	1115,10	498,63	1613,73	R\$ 13,583	R\$ 26.836,48			15146,38	6772,89	21919,27							
190104	DER	09,02	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos		m2	2.943,72	1115,10	498,63	1613,73	R\$ 26,519	R\$ 78.064,51			29571,28	13223,17	42794,45							
160708	DER	09,03	Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos		m2	556,16				R\$ 26,379	R\$ 14.670,94			0,00	0,00	0,00	0,00						
SUBTOTAL																		R\$ 119.571,93	R\$ 0,00	R\$ 44.717,66	R\$ 19.996,06	R\$ 64.713,72	
10 ELÉTRICA																							
150832	DER	10,01	Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada		und	5,00		0,00		R\$ 79,549	R\$ 397,75			0,00	0,00	0,00	0,00						
91937	DER	10,02	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_12/2015		UN	201,00	31,00		31,00	R\$ 17,656	R\$ 3.548,86			547,34	0,00	547,34							
150628	DER	10,03	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"		und	196,00		0,00		R\$ 8,995	R\$ 1.763,02			0,00	0,00	0,00	0,00						
151141	DER	10,04	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente		m	50,00		0,00		R\$ 58,077	R\$ 2.903,85			0,00	0,00	0,00	0,00						
151132	DER	10,05	Eletroduto flexível corrugado 3/4", marca de referência TIGRE		m	1.550,00	950,00		950,00	R\$ 9,634	R\$ 14.932,70			9152,30	0,00	9152,30							
151133	DER	10,06	Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE		m	420,00	420,00		420,00	R\$ 10,530	R\$ 4.422,60			4422,60	0,00	4422,60							
151138	DER	10,07	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1,1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente		m	120,00		0,00		R\$ 22,041	R\$ 2.644,92			0,00	0,00	0,00	0,00						
150835	DER	10,08	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa		m	40,00		0,00		R\$ 73,630	R\$ 2.945,20			0,00	0,00	0,00	0,00						
150884	DER	10,09	Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (n=60cm), cantoneira Z2 (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)		und	60,00		0,00		R\$ 49,681	R\$ 2.980,86			0,00	0,00	0,00	0,00						
150866	DER	10,10	Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente		und	40,00		0,00		R\$ 12,851	R\$ 514,04			0,00	0,00	0,00	0,00						
150870	DER	10,11	TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente		und	3,00		0,00		R\$ 108,310	R\$ 324,93			0,00	0,00	0,00	0,00						
150875	DER	10,12	Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510		und	1,00		0,00		R\$ 89,432	R\$ 89,43			0,00	0,00	0,00	0,00						
151402	DER	10,13	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2,5 mm2		m	4.985,00		0,00		R\$ 7,438	R\$ 37.078,43			0,00	0,00	0,00	0,00						
151401	DER	10,14	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1,5 mm2		m	850,00		0,00		R\$ 5,833	R\$ 4.958,05			0,00	0,00	0,00	0,00						
151403	DER	10,15	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4,0 mm2		m	600,00		0,00		R\$ 9,673	R\$ 5.803,80			0,00	0,00	0,00	0,00						
151404	DER	10,16	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6,0 mm2		m	1.650,00		0,00		R\$ 12,048	R\$ 19.879,20			0,00	0,00	0,00	0,00						

CONTRATADA:			ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA			CONVÊNIO			MODALIDADE:			DATA BASE:			Nº BOLETIM :			PERÍODO:								
LOCALIZAÇÃO:			RUA JOÃO LOURENÇO DA SILVA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, IRUPI-ES			QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO			LICITAÇÃO			REF. JAN - 2023 sem Desoneração			05			01/03/2025 a 14/04/2025					
												Nº CONTRATO:			PRAZO:			VAL. CONTRATADO:			INÍCIO DA OBRA:			TÉRMINO OBRA:		
												024/2024			24 meses			R\$ 1.000.000,00			24/04/2024			24/07/2025		
												Nº DO ADITIVO:			PRAZO:			VALOR ADITIVO:			REINÍCIO OBRA:			TÉRMINO OBRA:		
												01 e 02						R\$ 254.539,05								
									VALOR			REALIZADO NO MÊS			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO ATUAL								
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	REVISADA	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL		CONTRATADO	REVISADO														
151426	DER	10,17	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 95,0 mm2	m	45,00			0,00	RS 136,979	RS 6.164,06			0,00	0,00	0,00											
151425	DER	10,18	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 50,0 mm2	m	30,00			0,00	RS 72,524	RS 2.175,72			0,00	0,00	0,00											
151429	DER	10,19	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 70,0 mm2	m	90,00			0,00	RS 99,977	RS 8.997,93			0,00	0,00	0,00											
151423	DER	10,20	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 35,0 mm2	m	10,00			0,00	RS 52,228	RS 522,28			0,00	0,00	0,00											
151427	DER	10,21	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 120,0 mm2	m	200,00			0,00	RS 173,342	RS 34.668,40			0,00	0,00	0,00											
151420	DER	10,22	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 10,0 mm2	m	100,00			0,00	RS 19,408	RS 1.940,80			0,00	0,00	0,00											
160808	DER	10,23	Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e	m	800,00			0,00	RS 3,723	RS 2.978,40			0,00	0,00	0,00											
180201	DER	10,24	Tornada pedreiro brasileiro linha branca, NBR 14136 2 pólos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	133,00			0,00	RS 39,253	RS 5.220,65			0,00	0,00	0,00											
160872	DER	10,25	Espelho 4" x 25 com conector RJ 45 fêmea CAT. 6	und	13,00			0,00	RS 21,815	RS 283,60			0,00	0,00	0,00											
2	DER	10,26	CAMERA FULL HD	UND	15,00			0,00	RS 241,645	RS 3.624,68			0,00	0,00	0,00											
180204	DER	10,27	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	28,00			0,00	RS 35,592	RS 996,58			0,00	0,00	0,00											
181004	DER	10,28	Luminária embutir compl., corpo ch, aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000K c/ 1,20m - Ref. CE232ALH - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE	und	30,00			0,00	RS 183,435	RS 5.503,05			0,00	0,00	0,00											
SUBTOTAL											RS 178.263,76		RS 14.122,24	RS 0,00	RS 14.122,24											
HIDROSSANITARIO																										
141909	DER	11,01	Tubo de PVC rígido soltável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	125,16		50,00	50,00	RS 87,866	RS 10.997,31			4393,30	0,00	4393,30											
141908	DER	11,02	Tubo de PVC rígido soltável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	6,48		6,48	6,48	RS 71,402	RS 462,68			462,68	0,00	462,68											
141907	DER	11,03	Tubo de PVC rígido soltável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	53,09		45,00	45,00	RS 47,944	RS 2.545,35			2157,48	0,00	2157,48											
141906	DER	11,04	Tubo de PVC rígido soltável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	13,54		9,50	9,50	RS 37,041	RS 501,54			351,89	0,00	351,89											
141110	DER	11,05	Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp. 10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reatero e enchimento	und	10,00			0,00	RS 736,849	RS 7.368,49																
141113	DER	11,06	Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1,0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reatero e parede int. em concreto	und	1,00			0,00	RS 776,297	RS 776,30			0,00	0,00	0,00											
142107	DER	11,07	Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC	und	17,00		6,00	6,00	RS 62,454	RS 1.061,72			499,63	0,00	499,63											
140904	DER	11,08	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia	m	115,53			0,00	RS 108,677	RS 12.555,45			0,00	0,00	0,00											
142112	DER	11,09	Caixa seca em PVC, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox	und	10,00			0,00	RS 71,137	RS 711,37			0,00	0,00	0,00											
170528	DER	11,10	Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bola	und	1,00			0,00	RS 4.322,934	RS 4.322,93			0,00	0,00	0,00											
141410	DER	11,11	Tubo de PVC rígido soltável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	103,26		85,00	85,00	RS 25,366	RS 2.619,29			2156,11	0,00	2156,11											
141409	DER	11,12	Tubo de PVC rígido soltável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	20,14		15,20	15,20	RS 22,196	RS 447,03			337,36	0,00	337,36											
141411	DER	11,13	Tubo de PVC rígido soltável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	53,50		53,50	53,50	RS 35,553	RS 1.902,09			1902,09	0,00	1902,09											
141412	DER	11,14	Tubo de PVC rígido soltável marrom, diâm. 40mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	32,94			0,00	RS 47,796	RS 1.574,40			0,00	0,00	0,00											
141414	DER	11,15	Tubo de PVC rígido soltável marrom, diâm. 50mm (2"), inclusive conexões	m	14,16			0,00	RS 67,804	RS 960,10			0,00	0,00	0,00											
170317	DER	11,16	Registro de pressão com canola cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	6,00		2,00	2,00	RS 125,709	RS 754,25			251,42	0,00	251,42											
170319	DER	11,17	Registro de gaveta bruto diam. 15mm (1/2")	und	2,00			0,00	RS 58,964	RS 117,93			0,00	0,00	0,00											
170320	DER	11,18	Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4")	und	6,00		6,00	6,00	RS 66,815	RS 400,89			400,89	0,00	400,89											
170321	DER	11,19	Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")	und	2,00			0,00	RS 81,184	RS 162,37			0,00	0,00	0,00											
142121	DER	11,20	Torneira de bola de PVC, diâm. 1 1/4" (32mm)	und	1,00			0,00	RS 265,803	RS 265,80			0,00	0,00	0,00											
141526	DER	11,21	Adaptador de PVC soltável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 60mm (2")	und	1,00			0,00	RS 66,955	RS 66,96			0,00	0,00	0,00											
170353	DER	11,22	Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	9,00			0,00	RS 563,889	RS 5.075,00			0,00	0,00	0,00											
170315	DER	11,23	Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	6,00			0,00	RS 240,523	RS 1.443,14			0,00	0,00	0,00											
170306	DER	11,24	Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.	und	3,00			0,00	RS 144,043	RS 432,13			0,00	0,00	0,00											
142118	DER	11,25	Engate flexível de PVC para lavatório	und	26,00			0,00	RS 17,394	RS 457,44			0,00	0,00	0,00											
170114	DER	11,26	Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios	und	3,00			0,00	RS 1.038,689	RS 3.116,07			0,00	0,00	0,00											
170129	DER	11,27	Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios	und	5,00			0,00	RS 688,422	RS 3.442,11			0,00	0,00	0,00											
170515	DER	11,28	Cuba p/ painéis de aço inox 80x60x40 cm, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. torneira	und	2,00			0,00	RS 2.588,556	RS 5.177,11			0,00	0,00	0,00											
170220	DER	11,29	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m2	14,92			0,00	RS 383,117	RS 5.716,11			0,00	0,00	0,00											
180809	DER	11,30	Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona	und	6,00			0,00	RS 101,465	RS 608,79			0,00	0,00	0,00											
170519	DER	11,31	Ducha manual Acqua jet, linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	8,00			0,00	RS 330,363	RS 2.647,70			0,00	0,00	0,00											
170602	DER	11,32	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm	und	8,00			0,00	RS 156,301	RS 1.255,21			0,00	0,00	0,00											
170512	DER	11,33	Cuba de aço inox 1" 15dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, transomina, inclusive válvula de metal 3/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	und	3,00			0,00	RS 581,705	RS 1.745,12			0,00	0,00	0,00											
170115	DER	11,34	Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira	und	6,00			0,00	RS 364,246	RS 2.185,48			0,00	0,00	0,00											

 INSTITUTO RUIPI DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS																								
CONTRATADA:			ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA						CONVÊNIO															
LOCALIZAÇÃO:			RUA JOÃO LOURENÇO DA SILVA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, IRUPI-ES		QUANTIDADE					PREÇO UNITÁRIO		MODALIDADE:		DATA BASE:		Nº BOLETIM :		PERÍODO:						
												LICITAÇÃO		REF. JAN - 2023 sem Desoneração		05		01/03/2025 a 14/04/2025						
												Nº CONTRATO:		PRAZO:		VAL. CONTRATADO:		INÍCIO DA OBRA:		TÉRMINO OBRA:				
												02/01/2024		24 meses		R\$ 1.005.000,00		24/04/2024		24/07/2025				
												Nº DO ADITIVO:		PRAZO:		VALOR ADITIVO:		REINÍCIO OBRA:		TÉRMINO OBRA:				
												01 e 02				R\$ 254.539,05								
												VALOR												
CONTRATADO		REVISADO		REALIZADO NO MÊS		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL																
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO																					
			SUBTOTAL											R\$ 83.875,65		R\$ 0,00		R\$ 12.912,87		R\$ 0,00		R\$ 12.912,87		
			TOTAL											R\$ 1.005.000,00		R\$ 254.539,05		R\$ 198.298,57		R\$ 170.397,82		R\$ 368.696,39		
														R\$ 1.259.539,05										
			Valor (R\$) por extenso:													TOTAL MEDIÇÃO				R\$ 198.298,57				
																TOTAL ACUMULADO				R\$ 368.696,39				
																SALDO CONTRATADO				R\$ 890.842,66				

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA
CONTRATO: 024/2024
SERVIÇOS EXECUTADOS: Infraestrutura e Alvenaria

MEDIÇÃO: 5ª medição
PERÍODO: 01/03/2025 a 14/04/2025.



Figura 1 - Chapisco- Palco



Figura 2 - chapisco - Palco



Figura 3 - Reboco



Figura 4 - Emboço - Cozinha

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA

CONTRATO: 024/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS: Serviços Preliminares e Infraestrutura

MEDIÇÃO: 5ª medição

PERÍODO: 01/03/2025 a 14/04/2025



Figura 5 - Lastro e Regularização de base-cozinha



Figura 6 -reboco e Regularização de base-Cozinha

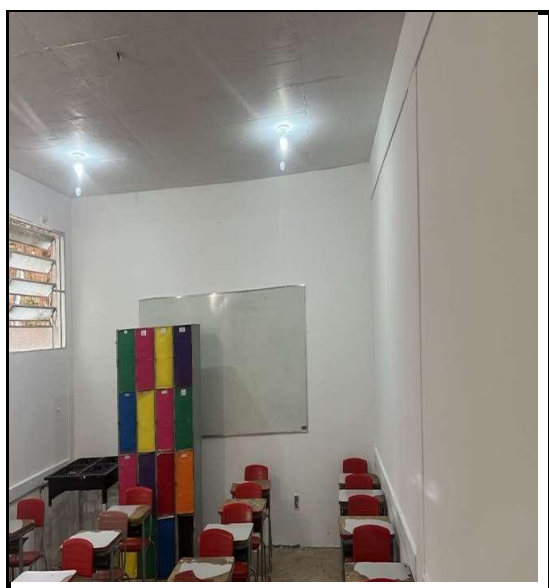


Figura 7 -Emassamento e pintura

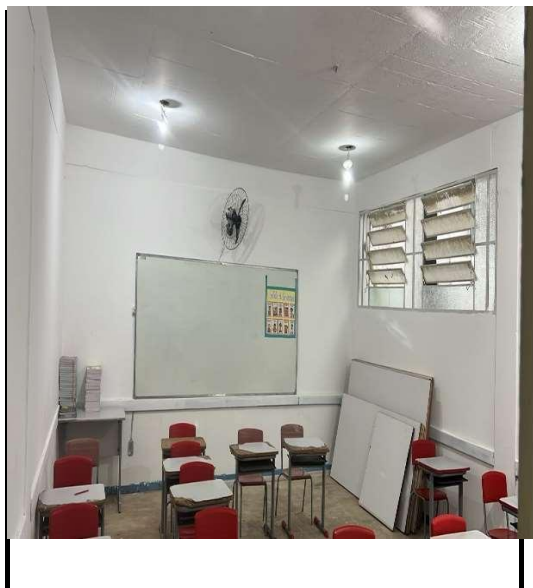


Figura 8 - Emassamento e pintura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA

CONTRATO: 024/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS: Serviços Preliminares e Infraestrutura

MEDIÇÃO: 5ª medição

PERÍODO: 01/03/2025 a 14/04/2025.



Figura 9 - Eletroduto corrugado e caixa octogonal

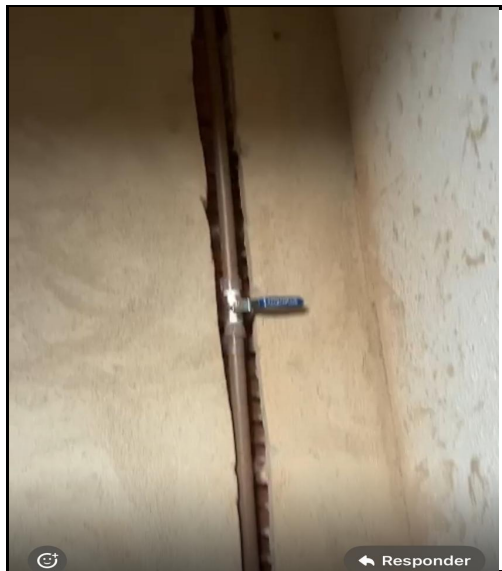


Figura 10 - tubo PVC e Registro de gaveta - Cozinha



Figura 11 - tubo PVC - Cozinha



Figura 12 -tubo PVC e Registro de Gaveta e Pressão- Cozinha

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA

CONTRATO: 024/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS: Serviços Preliminares e Infraestrutura

MEDIÇÃO: 5ª medição

PERÍODO: 01/03/2025 a 14/04/2025.



Figura 9 - Tubo PVC



Figura 10 - tubo PVC e Tubo PVC de Esgoto



Figura 11 - Caixa de inspeção



Figura 12 -tubo PVC de esgoto e Caixa de inspeção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA

CONTRATO: 024/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS: Serviços Preliminares e Infraestrutura

MEDIÇÃO: 5ª medição

PERÍODO: 01/03/2025 a 14/04/2025.



Figura 13 - Tubo PVC esgoto e Ralo

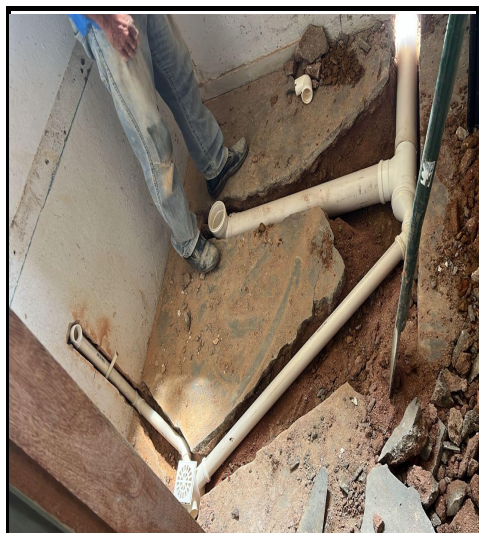


Figura 14 - tubo PVC de esgoto e Ralo



Figura 15 - tubo PVC de esgoto e Ralo



Figura 16 -Ralo

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA

CONTRATO: 024/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS: Serviços Preliminares e Infraestrutura

MEDICÃO: 5ª medição

PERÍODO: 01/03/2025 a 14/04/2025.



Figura 17 - Rede de água e esgoto e Ralo



Figura 18 - Ralo



Figura 19 - Reboco



Figura 20 - Regularização de Base
