


REPORTE FOTOGRAFICO

Día: 06.11.2017



- 1) Excavación al 90%, la profundidad mostrada en las fotos es la final. En la colindancia oriente edificio de 4 niveles se dejo una berma con una corona de 80cm por toda la profundidad del terreno y una base de 1.80

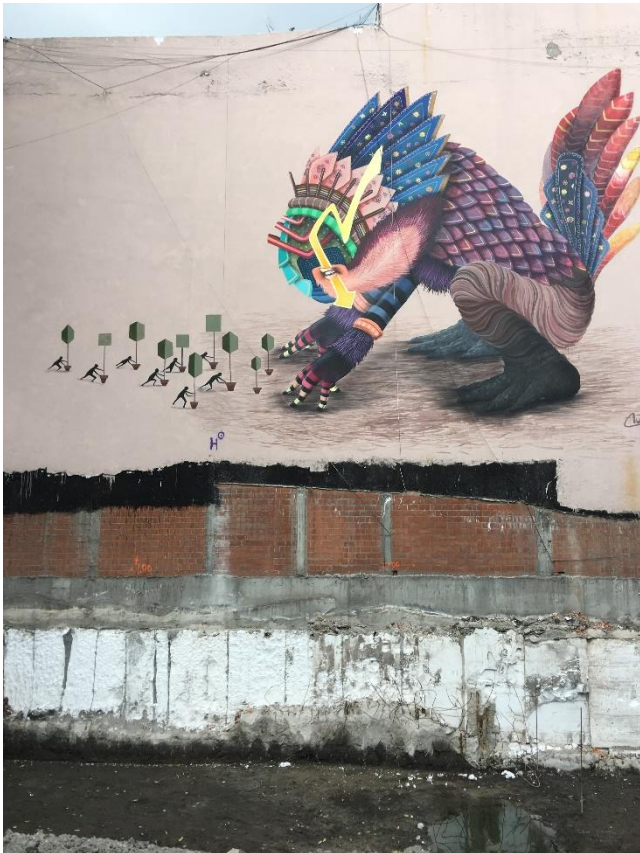

- 2) La colindancia norte con el edificio de 4 niveles se realizo la excavación al paño de su cajón de cimentación de concreto armado que abarca 1 sótano.



5) Colado de plantilla de concreto en el fondo de la cimentación para habilitar acero



4) Se habilito área de desplante de losa fondo con el colado de plantilla de cemento y arena.



5) Retiro del 20% restante del banco de tierra en excavación.

Con el retiro de este banco de tierra se finaliza la etapa de excavación y se comienza con el armado de acero de la losa fondo de cimentación.
