





PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

Estado do Espírito Santo

RELATÓRIO DE OBRAS/PROJETOS EM ANDAMENTO – EXERCÍCIO 2026




Previsão Legal: Art. 45 – Lei Complementar 101/2000

IMAGEM	SECRETARIA	SITUAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA/PROJETO	EMPRESA CONTRATADA	Nº PROCESSO	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR EXECUTADO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	PRAZO DE CONCLUSÃO
 LINK 1 – LINK 2 – LINK 3 – LINK 4	ASSISTÊNCIA SOCIAL	OBRA CONCLUÍDA	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	ILUMINERGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	015504/2021	474.279,85	453.884,41	20.395,44 VALOR GLOSADO	95,70%	06/06/2022	14/08/2023 OBRA CONCLUÍDA
 LINK 1 – LINK 2 (Link 3)	OBRAS	OBRA CONCLUÍDA	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS REVSOL SÃO PEDRO/LEKKER	ZANDONADI TERRAPLENAGEM	4842/2021	146.449,09	146.449,09	0,00	100%	28/11/2021	28/02/2023 OBRA CONCLUÍDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO




Estado do Espírito Santo

 (LINK 1) – (LINK 2) – (LINK 3)	EDUCAÇÃO	OBRA CONCLUÍDA	CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL GUMERCINDO LACERDA	GESSO AFONSO CLÁUDIO LTDA	10908/2023	4.171.104,39	4.171.104,39	0,00%	100,00%	28/02/2024	CONCLUÍDA EM : 20/12/2025
 (LINK 1)	EDUCAÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO	CONSTRUÇÃO DO CMEI - AMAURY GOMES	GESSO AFONSO CLÁUDIO LTDA	11490/2023	3.597.011,95	3.135.166,32	459.810,98	87,16%	23/05/2024	DATA PARA CONCLUIR :15/06/2026
 (LINK 1) (Link 2) (link 3)	EDUCAÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO	CONSTRUÇÃO DO CMEI - DIOCLEZIO TOSTA DAS NEVES	BRAZAN ENGENHARIA LTDA	8578/2023	4.453.899,39	3.940.445,15	513.453,9	88,5%	07/12/2023	30/05/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO




Estado do Espírito Santo

	EDUCAÇÃO	OBRA CONCLUÍDA	REFORMA DA ESCOLA FRANZ CARLOS JOÃO	---- PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO - RECURSO PRÓPRIO - ----	-----	12.500,00	-----	-----	-----	-----	03 MESES
 (LINK 1)	EDUCAÇÃO	OBRA CONCLUÍDA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTA LAMAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO - RECURSO PRÓPRIO	s/nº	839.443,00	839.443,00	0,00	100%	14/06/2021	08/02/2024 OBRA CONCLUÍDA
 (LINK 1 - LINK 2 - LINK 3)	ESPORTES	OBRA CONCLUÍDA	QUADRA BAIRRO BELA VISTA	OPUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LDA	10087/2022	542.493,12	507.678,02	34.815,09 VALOR GLOSADO	93,58%	09/02/2023	04/02/2024 OBRA CONCLUÍDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

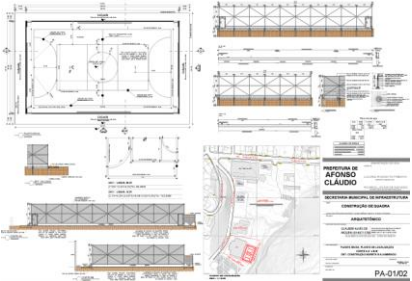


Estado do Espírito Santo

 <p>(LINK 1)</p>	ESPORTES	OBRA EM ANDAMEN TO	QUADRA NO BAIRRO AMANCIO PIMENTA	SHOPPING DOS TELHADOS	020485/2021	297.000,84	89.180,91	207.819,93	30,03%	28/05/202 5	24/05/2026
 <p>(LINK1 - LINK 2 - LINK 3 - LINK4)</p>	ESPORTES	OBRA CONCLUÍ DA	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO CAMPO AMERICA - SAO FRANCISCO	WVS CONSTRUTORA LTDA	10120/2022	605.409,72	605.409,72	0,00	100%	27/04/202 3	11/10/2023 OBRA CONCLUÍDA
 <p>(LINK 1), LINK 2 (Link3) (Link 4)</p>	OBRAS	OBRA CONCLUIDA	DA GRAMA	THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	9130/2022	238.750,04	31,665,22	207.084,82	13,26%	24/04/2024	OBRA CONCLUIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO



Estado do Espírito Santo

 <p>(Link) (LINK 1) (Link 2)</p>	OBRAS	OBRA CONCLUÍDA	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS TRECHO SAO VICENTE X BREJETUBA	ILUMINERGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7344/2021	325.849,52	308.833,54	17.015,97 Valor glosado	94,78%	19/10/2021 1	7/11/2023 Obra concluída
 <p>(LINK 1 - LINK 2 - LINK 3 - LINK 4 LINK 5 - LINK 6 - LINK 7)</p>	OBRAS	OBRA CONCLUÍDA	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS CALÇAMENTO RURAL 10 trechos	ESSENCIAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	014457/2021	432.206,74	200.547,74	231.659,34	-----	08/02/2023 3	Obra concluída
 <p>(LINK 1)</p>	MEIO AMBIENTE	OBRA CONCLUÍDA	CONSTRUÇÃO DO PISO - GALPÃO DE TRIAGEM	PREFEITURA MUNICIPAL	24290/2022	147.000,05	36.010,16	110.989,98	24,50%	27/07/2023 3	OBRA CONCLUÍDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

Estado do Espírito Santo

 <p>(LINK1) (LINK2) (Link 3) (link 4) (link 5) (link 6) (link 7) link 8 (link 9) (link 10) (link 11) (link 12) (Link 13)</p>	SÁUDE	OBRA CONCLUÍDA	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, NO CENTRO	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	24261/2023 CT 004/2024	3.121.573,21	3.099.239,42	22.333,73 Valor glosado	0,7%	29/04/202 4	CONCLUDA 20/12/2025
 <p>(LINK1) (LINK 2) (LINK 3)(Link3), (link4), (link 5)</p>	SÁUDE	OBRA PARALISADA	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO JOÃO VALIM	INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	24260/2023 CT005/2024	2.274.399,16	269.048,73	1.860.417,09	40,6%	29/04/2024	20/12/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

Estado do Espírito Santo

	EDUCAÇÃO	OBRA CONCLUÍDA	REFORMA DA ESCOLA ABRAHÃO SALEME	PREFEITURA MUNICIPAL- RECURSO PRÓPRIO		298.345,32				02/2024	02/2025 01 ANO CONCLUÍDA																																																																																																																			
<p style="text-align: center;">LINK1</p> <p style="text-align: center;">Relatório de Aplicação de Revsol / Revsol Plus Afonso Cláudio - ES</p> <table border="1" data-bbox="78 810 537 1149"> <thead> <tr> <th colspan="5">ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DE REVSOL NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO</th> </tr> <tr> <th>LOCALIZAÇÃO</th> <th colspan="2">COORDENADAS UTM</th> <th>COMPRIMENTO DO TRECHO (m)</th> <th>ESPESSURA DE APLICAÇÃO (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estrada da Floresta</td> <td>276242 / 7778058</td> <td>276285 / 7777857</td> <td>210</td> <td>5,5</td> </tr> <tr> <td>ES - 462 Sertão São Vicente do Firme</td> <td>271240 / 7780829</td> <td>275830 / 7778472</td> <td>1770</td> <td>5,5</td> </tr> <tr> <td>Alegoria</td> <td>274552 / 7779510</td> <td>273751 / 7779900</td> <td>470</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Santa Luzia Do Firme</td> <td>271700 / 7778754</td> <td>271468 / 7778456</td> <td>356</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Sierra Do Rocão</td> <td>267600 / 7783983</td> <td>268071 / 7783369</td> <td>620</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Queopim</td> <td>269058 / 7787798</td> <td>269167 / 7787663</td> <td>175</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>ES - 264 sentido Giestas</td> <td>273536 / 7786886</td> <td>273600 / 7786739</td> <td>205</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Emilia Ribeiro</td> <td>273620 / 7786233</td> <td>273949 / 7786202</td> <td>150</td> <td>5,5</td> </tr> <tr> <td>Falgueto</td> <td>275453 / 7786008</td> <td>275516 / 7785877</td> <td>200</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Munho Beija-Flor</td> <td>277249 / 7784442</td> <td>277400 / 7784363</td> <td>240</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Comun Do Inha</td> <td>277284 / 7782098</td> <td>278478 / 7778462</td> <td>515</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Empogalinho</td> <td>285677 / 7786213</td> <td>285237 / 7786040</td> <td>1000</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Ribeirão Do Costa Trecho Lasker</td> <td>280075 / 7771384</td> <td>281631 / 7771584</td> <td>1800</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Ribeirão Do Costa Trecho Bankart</td> <td>281708 / 7772041</td> <td>281823 / 7772274</td> <td>400</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>São Pedro</td> <td>281072 / 7774078</td> <td>284331 / 7773369</td> <td>4400</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>São Luz da Boa Sorte</td> <td>280848 / 7782225</td> <td>280727 / 7781118</td> <td>190</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sierra Do Boa</td> <td>279630 / 7783649</td> <td>279534 / 7783395</td> <td>4200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Sierra do Bai</td> <td>280753 / 7782938</td> <td>280568 / 7782503</td> <td>940</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Tabatinga</td> <td>281546 / 7782924</td> <td>282672 / 7783789</td> <td>3020</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Metragem Total das aplicações</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">20.860 m</td> </tr> </tbody> </table>	ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DE REVSOL NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO					LOCALIZAÇÃO	COORDENADAS UTM		COMPRIMENTO DO TRECHO (m)	ESPESSURA DE APLICAÇÃO (cm)	Estrada da Floresta	276242 / 7778058	276285 / 7777857	210	5,5	ES - 462 Sertão São Vicente do Firme	271240 / 7780829	275830 / 7778472	1770	5,5	Alegoria	274552 / 7779510	273751 / 7779900	470	4	Santa Luzia Do Firme	271700 / 7778754	271468 / 7778456	356	4	Sierra Do Rocão	267600 / 7783983	268071 / 7783369	620	5	Queopim	269058 / 7787798	269167 / 7787663	175	5	ES - 264 sentido Giestas	273536 / 7786886	273600 / 7786739	205	5	Emilia Ribeiro	273620 / 7786233	273949 / 7786202	150	5,5	Falgueto	275453 / 7786008	275516 / 7785877	200	6	Munho Beija-Flor	277249 / 7784442	277400 / 7784363	240	4	Comun Do Inha	277284 / 7782098	278478 / 7778462	515	4	Empogalinho	285677 / 7786213	285237 / 7786040	1000	5	Ribeirão Do Costa Trecho Lasker	280075 / 7771384	281631 / 7771584	1800	5	Ribeirão Do Costa Trecho Bankart	281708 / 7772041	281823 / 7772274	400	5	São Pedro	281072 / 7774078	284331 / 7773369	4400	5	São Luz da Boa Sorte	280848 / 7782225	280727 / 7781118	190	3	Sierra Do Boa	279630 / 7783649	279534 / 7783395	4200	5	Sierra do Bai	280753 / 7782938	280568 / 7782503	940	5	Tabatinga	281546 / 7782924	282672 / 7783789	3020	5	Metragem Total das aplicações					20.860 m					OBRAS	EM ANDAMENTO	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUEIROS CELULARES	LATEC ENGENHARIA E PREFEITURA MUNICIPAL	11188/2023 ARP 102/2023	2.000.000,00					
ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DE REVSOL NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO																																																																																																																														
LOCALIZAÇÃO	COORDENADAS UTM		COMPRIMENTO DO TRECHO (m)	ESPESSURA DE APLICAÇÃO (cm)																																																																																																																										
Estrada da Floresta	276242 / 7778058	276285 / 7777857	210	5,5																																																																																																																										
ES - 462 Sertão São Vicente do Firme	271240 / 7780829	275830 / 7778472	1770	5,5																																																																																																																										
Alegoria	274552 / 7779510	273751 / 7779900	470	4																																																																																																																										
Santa Luzia Do Firme	271700 / 7778754	271468 / 7778456	356	4																																																																																																																										
Sierra Do Rocão	267600 / 7783983	268071 / 7783369	620	5																																																																																																																										
Queopim	269058 / 7787798	269167 / 7787663	175	5																																																																																																																										
ES - 264 sentido Giestas	273536 / 7786886	273600 / 7786739	205	5																																																																																																																										
Emilia Ribeiro	273620 / 7786233	273949 / 7786202	150	5,5																																																																																																																										
Falgueto	275453 / 7786008	275516 / 7785877	200	6																																																																																																																										
Munho Beija-Flor	277249 / 7784442	277400 / 7784363	240	4																																																																																																																										
Comun Do Inha	277284 / 7782098	278478 / 7778462	515	4																																																																																																																										
Empogalinho	285677 / 7786213	285237 / 7786040	1000	5																																																																																																																										
Ribeirão Do Costa Trecho Lasker	280075 / 7771384	281631 / 7771584	1800	5																																																																																																																										
Ribeirão Do Costa Trecho Bankart	281708 / 7772041	281823 / 7772274	400	5																																																																																																																										
São Pedro	281072 / 7774078	284331 / 7773369	4400	5																																																																																																																										
São Luz da Boa Sorte	280848 / 7782225	280727 / 7781118	190	3																																																																																																																										
Sierra Do Boa	279630 / 7783649	279534 / 7783395	4200	5																																																																																																																										
Sierra do Bai	280753 / 7782938	280568 / 7782503	940	5																																																																																																																										
Tabatinga	281546 / 7782924	282672 / 7783789	3020	5																																																																																																																										
Metragem Total das aplicações																																																																																																																														
20.860 m																																																																																																																														
	OBRAS	EM ANDAMENTO	APLICAÇÃO DE REVSOL EM DIVERSAS LOCALIDADES	PREFEITURA MUNICIPAL		MATERIAL DOADO ARCELOR MITAL																																																																																																																								
	OBRAS	OBRA CONCLUÍDA	CALÇAMENTO NO TREVO DO CAMPO 21	EXATA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6913/2023 ARP 115/2023	2.400.000,00	286.780,23	2.113.219,77	11,95%	26/03/2024	OBRA CONCLUÍDA																																																																																																																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO



Estado do Espírito Santo

 (LINK2) (LINK3) (LINK 4) (LINK 5) (LINK 6) (LINK 7)											
 LINK1	OBRAS	OBRA CONCLUÍDA	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO VICENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	26209/2023 CT 03/2024	124.950,62					12 meses CONCLUÍDA
 (link 1) (link 2) (link3)	ESPORTES	OBRA CONCLUÍDA	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE SERRA PELADA		4147/2023	795.965,76 CONVÊNIO SESPORT					CONCLUÍDA EM:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO



Estado do Espírito Santo

	OBRAS	EM FASE DE CONTRATO	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA ADERBAL GALVÃO			1.855.745,74						
COLOCAR IMAGEM DO PROJETO	OBRAS	CONVÊNIO ASSINADO	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM SERRA PELADA			830.549,37						
COLOCAR IMAGEM DO PROJETO	OBRAS	CONVÊNIO ASSINADO	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SÃO LUIZ DA BOA SORTE			525.744,39						
COLOCAR IMAGEM DO PROJETO	OBRAS	CONVENIO ASSINADO	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM FAZENDA GUANDU			946.270,81						
	OBRAS	CONCLUIDA	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOCHA EM FAZENDA GUANDU	CONSTRUTORA SOUZA FERNANDES LTDA	14706/2024	296.293,85	296.293,85	0,00	100%	04/07/2025	Concluida em:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO


Estado do Espírito Santo

(link1) LINK 2) (link3)											
 <p>(link 1)</p> <p>(link2) (link 3) (Link 4)</p>	ESPORTE	OBRA EM CONCLUSÃO FINAL:	REFORMA DA QUADRA DE VILA PONTÕES	WVS CONSTRUTORA	4145/2024	450.894,68	439.802,14	11.092,53	97,5%	17/06/2025	CONCLUIDA EM:
 <p>Link1</p>	ESPORTE	OBRA CONCLUIDA	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE VILA PONTÕES	JM CORDEIRO MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA	4146/2024	208.500,00	208.500,00	0,00	100%	14/03/2025	Obra concluída 12/07/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO



Estado do Espírito Santo

 <p>(LINK 1) (LINK 2) (Link 3)</p>	OBRAS	OBRA EM ANDAMENTO	CONTRUÇÃO DA PONTE NORTE NO CENTRO DE AFONSO CLÁUDIO-ES	CONSÓRCIO AFONSO CLAUDIO	Processo nº 28101/2024	3.949.000,00	2.073.648,95	1.523.790,48	52,51%	18/06/2025	18/08/2026
	OBRAS	A INICIAR	CALÇAMENTOS RURAIS EM LOCALIDADES DIVERSAS			500.000,00 Aproximadamente					
	OBRAS	A CONVENIAR	CONSTRUÇÃO DA ETE (ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO E REDE) DE FRANCISCO CORRÊA			2.000.000,00					
	OBRAS	FUNDO CIDADES	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS			4.000.000,00 DE CONVÊNIO E 2.000.000,00 DE CONTRAPARTIDA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO



Estado do Espírito Santo

	OBRAS	A CONVENIAR	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA MATA FRIA			191.000,00					
 LINK 1 , LINK 2 , LINK 3	ESPORTES	OBRA CONCLUÍDA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BELA VISTA	CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA	14080/2023	343.099,39	163.024,72	142.761,02	35,7%	24/06/2024	21/11/2024 CONCLUÍDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO



Estado do Espírito Santo

 <p>Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio -20° 5' 38", -41° 6' 52", 419,7m 21/07/2025 14:42:43</p> <p>(Link 1) (link 2)</p>	EDUCAÇÃO	OBRA PARALISADA	CONSTRUÇÃO DO CMEI JOÃO VALIM	INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA	17018/2024	3.190.000,00	658.045,62	2.531.954,37	20,63%	02/06/2025	27/07/2026
 <p>22/04/2026, 09:41 -20,085437 -41,125876 Afonso Cláudio, ES Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</p>	ASSISTÊNCIA SOCIAL	OBRA EM ANDAMENTO	CONSTRUÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL CASA DE ABRIGO	BENEVIDES	008850/2025	1.690.160,77	1.055.334,08	634.826,63	62,44%	07/08/2026	31/10/2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

Estado do Espírito Santo

	ASSISTÊNCIA SOCIAL	OBRA EM ANDAMENTO	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS FONTE LUZ	NEIMEG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	5694/2025	531.331,89	318.490,39	212.838,51	59,94%	16/10/2025	14/05/2026
	EDUCAÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO	ESCOLA DE 9 SALAS	WVS CONSTRUTORA LTDA,	6503/2025	8.399.463,02				03/02/2026	
