

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPÍ DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS														
CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CONVÊNIO							
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPÍ		QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO	MODALIDADE:	DATA BASE:	Nº BOLETIM :	PERÍODO:	
										LICITAÇÃO	REF. JUL - 2022 sem Desoneração	01	13/05/2024 a XX/XX/XXXX	
					Nº CONTRATO:	VAL. CONTRATADO:	INICIO DA OBRA:	TÉRMINO OBRA:						
					003/2024	R\$ 1.248.000,00	28/02/2024	27/02/2025						
					Nº DO ADITIVO:	VALOR ADITIVO:	REINÍCIO OBRA:	TÉRMINO OBRA:						
					03	R\$ 428.593,74	01/07/2024	01/08/2025						
VALOR														
					EXECUTADA				CONTRATADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL		
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO											
1			CANTEIRO DE OBRAS											
S020305	DER-EDIF	01.01	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER		M2	8,00	8,00	8,00	R\$ 348,14	R\$ 2.785,12	2785,12	0,00	2785,12	
S020802	DER-EDIF	01.02	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)		M2	10,90	10,90	10,90	R\$ 503,65	R\$ 5.489,76	5489,76	0,00	5489,76	
S020803	DER-EDIF	01.03	BARRACÃO PARA DEPOSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)		M2	10,90	10,90	10,90	R\$ 442,77	R\$ 4.826,14	4826,14	0,00	4826,14	
S020808	DER-EDIF	01.04	GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)		M2	12,00	12,00	12,00	R\$ 159,22	R\$ 1.910,58	1910,58	0,00	1910,58	
S020811	DER-EDIF	01.05	RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)		UND	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.469,59	R\$ 1.469,59	1469,59	0,00	1469,59	
SUBTOTAL										R\$ 16.481,19	R\$ 16.481,19	R\$ 0,00	R\$ 16.481,19	
02			COBERTURA											
S090314	DER-EDIF	02.01	RUFO DE CHAPA DE ALUMÍNIO ESP. 0.5MM, LARGURA DE 30CM		M	0,00	-	0,00	R\$ 59,620	R\$ 0,000	0,00	0,00	0,00	
S090312	DER-EDIF	02.02	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM		M	41,90	10,90	10,90	R\$ 246,070	R\$ 10.310,333	2682,16	0,00	2682,16	
S090206	DER-EDIF	02.03	COBERTURA NOVA DE TELHAS DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL, H = 8 CM, ESP. 0.5MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO		M2	106,62	-	0,00	R\$ 102,530	R\$ 10.931,749	0,00	0,00	0,00	
92580	SINAPI	02.04	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019		M2	520,00	520,00	520,00	R\$ 60,920	R\$ 31.678,400	31678,40	0,00	31678,40	
101966	SINAPI	02.05	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020		M	126,31	-	0,00	R\$ 87,009	R\$ 10.990,107	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL										R\$ 63.910,59	R\$ 34.360,56	R\$ 0,00	R\$ 34.360,56	
03			IMPERMEABILIZAÇÃO											
S100203	DER-EDIF	03.01	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS		M2	202,71	-	0,00	R\$ 51,210	R\$ 10.380,78	0,00	0,00	0,00	
S100105	DER-EDIF	03.02	ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO POLIMÉRICO, ESP.4MM REFORÇ.C/ FILME INT.EM POLIETILENO, REGUL.BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, PROTEÇÃO MEC. ARG. 1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.		M2	92,31	-	0,00	R\$ 310,181	R\$ 28.632,81	0,00	0,00	0,00	
98555	SINAPI	03.03	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 06/2018		M2	68,43	16,50	16,50	R\$ 26,601	R\$ 1.820,31	438,92	0,00	438,92	
SUBTOTAL										R\$ 40.833,89	R\$ 438,92	R\$ 0,00	R\$ 438,92	
04			TETOS E FORROS											
S160702	DER-EDIF	04.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM		M2	43,30	-	0,00	R\$ 7,330	R\$ 317,39	0,00	0,00	0,00	
S160711	DER-EDIF	04.02	REBOCO TIPO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0,5:6, ESPESSURA 25MM		M2	43,30	-	0,00	R\$ 60,020	R\$ 2.598,87	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL										R\$ 2.916,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
05			REVESTIMENTO DE PAREDES											
S160702	DER-EDIF	05.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM		M2	500,00	174,21	174,21	R\$ 7,330	R\$ 3.665,00	1276,96	0,00	1276,96	
S160711	DER-EDIF	05.02	REBOCO TIPO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0,5:6, ESPESSURA 25MM		M2	500,00	115,89	115,89	R\$ 60,020	R\$ 30.010,00	6955,72	0,00	6955,72	
S120201	DER-EDIF	05.03	AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO		M2	300,00	-	0,00	R\$ 91,550	R\$ 27.465,00	0,00	0,00	0,00	

 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS															
CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CONVÊNIO								
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI		QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO	MODALIDADE:	DATA BASE:	Nº BOLETIM :	PERÍODO:		
										LICITAÇÃO	REF. JUL - 2022 sem Desoneração	01	13/05/2024 a XX/XX/XXXX		
					Nº CONTRATO:	VAL. CONTRATADO:	INICIO DA OBRA:	TÉRMINO OBRA:							
					003/2024	R\$ 1.248.000,00	28/02/2024	27/02/2025							
					Nº DO ADITIVO:	VALOR ADITIVO:	REINÍCIO OBRA:	TÉRMINO OBRA:							
					03	R\$ 428.593,74	01/07/2024	01/08/2025							
					EXECUTADA				VALOR						
					UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL		CONTRATADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	
CÓDIGO	FORNTE	ITEM	DESCRIÇÃO												
S120221	DER-EDIF	05.04	PASTILHA CERÂMICA BRANCA 5 X 5 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTE PRÉ-FABRICADO, MARCAS DE REFERÊNCIA ATLAS, JATOBÁ, NGK OU EQUIVALENTWE		M2	500,00	-		0,00	R\$ 224,550	R\$ 112.275,00	0,00	0,00	0,00	
S120301	DER-EDIF	05.05	EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0:5:6, ESPESSURA 20 MM		M2	282,90	36,14		36,14	R\$ 35,369	R\$ 10.005,71	1278,24	0,00	1278,24	
87265	SINAPI	05.06	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE		M2	265,93	36,14		36,14	R\$ 66,690	R\$ 17.734,54	2410,18	0,00	2410,18	
S120232	DER-EDIF	05.07	CERÂMICA 10 X 10 CM, REF CAMBURI BRANCO ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO JUNTA PLUS CINZA CLARO ESP. 3 MM		M2	16,97	-		0,00	R\$ 98,115	R\$ 1.665,01	0,00	0,00	0,00	
			SUBTOTAL								R\$ 202.820,26	R\$ 11.921,09	R\$ 0,00	R\$ 11.921,09	
			06 PISOS INTERNOS E EXTERNOS												
			06.01 LASTRO DE CONTRAPISO												
S130104	DER-EDIF	06.01.01	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 5CM		M2	104,67	13,65		13,65	R\$ 41,030	R\$ 4.294,61	560,06	0,00	560,06	
S160711	DER-EDIF	06.01.02	REBOCO TIPO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0:5:6, ESPESSURA 25MM		M2	0,00	-		0,00	R\$ 64,960	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
			06.02 ACABAMENTOS												
S130236	DER-EDIF	06.02.01	PISO CERÂMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO, DIM. 45X45CM, REF. DE COR CARGO PLUS WHITE ELIANE/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO		M2	0,00	-		0,00	R\$ 75,680	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
S130230	DER-EDIF	06.02.02	PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3,0CM		M2	923,15	310,38		310,38	R\$ 131,310	R\$ 121.218,83	40756,00	0,00	40756,00	
S190602	DER-EDIF	06.02.03	PINTURA SOBRE PISO, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS NOVACOR, METALATEX OU EQUIVALENTE		M2	834,89	-		0,00	R\$ 19,020	R\$ 15.879,61	0,00	0,00	0,00	
S130202	DER-EDIF	06.02.04	PISO CIMENTADO LISO COM 1,5 CM DE ESPESSURA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 E JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1 M		M2	0,00	-		0,00	R\$ 60,710	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
S130234	DER-EDIF	06.02.05	PORCELANATO NATURAL, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO		M2	104,67	13,65		13,65	R\$ 213,868	R\$ 22.385,56	2919,30	0,00	2919,30	
			SUBTOTAL								R\$ 163.778,61	R\$ 44.235,36	R\$ 0,00	R\$ 44.235,36	
			07 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS												
S130317	DER-EDIF	07.01	PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM		M	115,65			0,00	R\$ 90,200	R\$ 10.431,63	0,00	0,00	0,00	
S130322	DER-EDIF	07.02	RODAPÉ DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE COMPROVADA, ALTURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 10 MM, COM CANTOS BOLEADOS, EXECUTADO COM CIMENTO E GRANITINA GRANA N.1, INCLUSIVE POLIMENTO		M	603,00	-		0,00	R\$ 29,000	R\$ 17.487,00	0,00	0,00	0,00	
S130308	DER-EDIF	07.03	SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM		M	13,55	-		0,00	R\$ 54,060	R\$ 732,51	0,00	0,00	0,00	
S130315	DER-EDIF	07.04	RODAPÉ DE MÁRMORE OU GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0:5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM		M	98,32	-		0,00	R\$ 54,390	R\$ 5.347,62	0,00	0,00	0,00	
S130307	DER-EDIF	07.05	PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO COM LARGURA 40 CM E ESP. 3CM		M	0,00	-		0,00	R\$ 227,630	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
			SUBTOTAL								R\$ 33.998,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			08 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS												
			08.01 INSTALAÇÕES DE ESGOTO												
S141411	DER-EDIF	08.01.01	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES		M	0,00	-		0,00	R\$ 37,650	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
S141906	DER-EDIF	08.01.02	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES		M	76,60	3,30		3,30	R\$ 39,230	R\$ 3.005,02	129,46	0,00	129,46	

 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS														
CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CONVÊNIO							
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI		QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO	MODALIDADE:	DATA BASE:	Nº BOLETIM :	PERÍODO:		
									LICITAÇÃO	REF. JUL - 2022 sem Desoneração	01	13/05/2024 a XX/XX/XXXX		
					Nº CONTRATO:	VAL. CONTRATADO:	INICIO DA OBRA:		TÉRMINO OBRA:					
					003/2024	R\$ 1.248.000,00	28/02/2024		27/02/2025					
					Nº DO ADITIVO:	VALOR ADITIVO:	REINÍCIO OBRA:		TÉRMINO OBRA:					
					03	R\$ 428.593,74	01/07/2024		01/08/2025					
VALOR														
								CONTRATADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL			
CÓDIGO	FORTE	ITEM	DESCRIÇÃO											
S141907	DER-EDIF	08.01.03	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES			M	61,90	6,00	6,00	R\$ 50,380	R\$ 3.118,52	302,28	0,00	302,28
S141908	DER-EDIF	08.01.04	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES			M	62,37	4,00	4,00	R\$ 73,190	R\$ 4.564,86	292,76	0,00	292,76
S140903	DER-EDIF	08.01.05	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA			M	107,20	38,69	38,69	R\$ 73,220	R\$ 7.849,18	2832,88	0,00	2832,88
S141108	DER-EDIF	08.01.06	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM, DIM.60X60CM E HMÁX=1M, COM TAMPA EM CONCR.ESP.5CM, LASTRO CONCR.ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCR.			UND	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.202,460	R\$ 1.202,46	1202,46	0,00	1202,46
S141110	DER-EDIF	08.01.07	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO			UND	4,00	-	0,00	R\$ 785,020	R\$ 3.140,08	0,00	0,00	0,00
S140710	DER-EDIF	08.01.08	PONTO PARA CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA EM AÇO INOX			UND	10,00	-	0,00	R\$ 224,460	R\$ 2.244,60	0,00	0,00	0,00
89491	SINAPI	08.01.09	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 06/2022			UN	6,00	-	0,00	R\$ 107,120	R\$ 642,72	0,00	0,00	0,00
S140711	DER-EDIF	08.01.10	PONTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO SIFONADO 100 X 40 MM C/ GRELHA EM AÇO INOX			UND	17,00	-	0,00	R\$ 125,310	R\$ 2.130,27	0,00	0,00	0,00
89748	SINAPI	08.01.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022			UN	22,00	2,00	2,00	R\$ 56,670	R\$ 1.246,74	113,34	0,00	113,34
89728	SINAPI	08.01.12	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022			UN	32,00	-	0,00	R\$ 15,780	R\$ 504,96	0,00	0,00	0,00
89746	SINAPI	08.01.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022			UN	16,00	8,00	8,00	R\$ 33,940	R\$ 543,04	271,52	0,00	271,52
89726	SINAPI	08.01.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022			UN	0,00	-	0,00	R\$ 11,470	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
89732	SINAPI	08.01.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022			UN	0,00	-	0,00	R\$ 17,830	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
89724	SINAPI	08.01.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022			UN	0,00	-	0,00	R\$ 11,100	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
89731	SINAPI	08.01.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022			UN	0,00	-	0,00	R\$ 16,660	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
89805	SINAPI	08.01.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022			UN	0,00	-	0,00	R\$ 24,970	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
89569	SINAPI	08.01.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022			UN	11,00	2,00	2,00	R\$ 134,270	R\$ 1.476,97	268,54	0,00	268,54
89797	SINAPI	08.01.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022			UN	9,00	5,00	5,00	R\$ 65,970	R\$ 593,73	329,85	0,00	329,85
89785	SINAPI	08.01.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022			UN	0,00	-	0,00	R\$ 32,380	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
104343	SINAPI	08.01.22	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022			UN	0,00	-	0,00	R\$ 42,190	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00

 MUNICÍPIO DE IRUPUI DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS																	
CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			CONVÊNIO											
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI			QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO								
						UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	EXECUTADA		CONTRATADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL				
								NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR								
CÓDIGO	FORTE	ITEM	DESCRIÇÃO														
89677	SINAPI	08.01.23	LUVAS SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022			UN	0,00	-	0,00	R\$ 100,510	R\$ 0,00	0,00	0,00				
89549	SINAPI	08.01.24	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022			UN	0,00	-	0,00	R\$ 24,940	R\$ 0,00	0,00	0,00				
89623	SINAPI	08.01.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022			UN	0,00	-	0,00	R\$ 23,160	R\$ 0,00	0,00	0,00				
89687	SINAPI	08.01.26	TE, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022			UN	0,00	-	0,00	R\$ 69,440	R\$ 0,00	0,00	0,00				
89504	SINAPI	08.01.27	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022			UN	0,00	-	0,00	R\$ 22,640	R\$ 0,00	0,00	0,00				
89519	SINAPI	08.01.28	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022			UN	0,00	-	0,00	R\$ 60,560	R\$ 0,00	0,00	0,00				
89502	SINAPI	08.01.29	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022			UN	0,00	-	0,00	R\$ 19,970	R\$ 0,00	0,00	0,00				
89515	SINAPI	08.01.30	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022			UN	0,00	-	0,00	R\$ 111,630	R\$ 0,00	0,00	0,00				
89501	SINAPI	08.01.31	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022			UN	0,00	-	0,00	R\$ 16,260	R\$ 0,00	0,00	0,00				
89825	SINAPI	08.01.32	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022			UN	0,00	-	0,00	R\$ 22,300	R\$ 0,00	0,00	0,00				
89786	SINAPI	08.01.33	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022			UN	0,00	-	0,00	R\$ 48,820	R\$ 0,00	0,00	0,00				
89744	SINAPI	08.01.34	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022			UN	15,00	3,00	3,00	R\$ 32,594	R\$ 488,91	97,78	97,78				
89778	SINAPI	08.01.35	LUVAS SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022			UN	47,00	3,00	3,00	R\$ 21,405	R\$ 1.006,04	64,22	64,22				
104356	SINAPI	08.01.36	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022			UN	1,00	-	0,00	R\$ 43,494	R\$ 43,49	0,00	0,00				
104348	SINAPI	08.01.37	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022			UN	5,00	-	0,00	R\$ 16,561	R\$ 82,81	0,00	0,00				
89707	SINAPI	08.01.38	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022			UN	13,00	2,00	2,00	R\$ 49,880	R\$ 648,44	99,76	99,76				
		08.02	INSTALAÇÕES DE ÁGUA														
S141410	DER-EDIF	08.02.01	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES			M	68,01	9,20	9,20	R\$ 28,470	R\$ 1.936,24	261,92	261,92				
S141411	DER-EDIF	08.02.02	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES			M	227,03	-	0,00	R\$ 37,650	R\$ 8.547,68	0,00	0,00				
S141412	DER-EDIF	08.02.03	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 40MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES			M	15,67	-	0,00	R\$ 46,310	R\$ 725,68	0,00	0,00				
S141413	DER-EDIF	08.02.04	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 50MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES			M	86,76	-	0,00	R\$ 57,100	R\$ 4.954,00	0,00	0,00				
S141414	DER-EDIF	08.02.05	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 60MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES			M	18,00	-	0,00	R\$ 80,510	R\$ 1.449,18	0,00	0,00				
94495	SINAPI	08.02.06	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021			UN	18,00	-	0,00	R\$ 73,600	R\$ 1.324,80	0,00	0,00				
94497	SINAPI	08.02.07	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021			UN	6,00	-	0,00	R\$ 126,980	R\$ 761,88	0,00	0,00				
94498	SINAPI	08.02.08	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021			UN	3,00	-	0,00	R\$ 175,600	R\$ 526,80	0,00	0,00				
94792	SINAPI	08.02.09	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021			UN	16,00	-	0,00	R\$ 138,150	R\$ 2.210,40	0,00	0,00				

 MUNICÍPIO DE IRUPUI DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS																
CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CONVÊNIO									
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI				QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO	MODALIDADE:	DATA BASE:	Nº BOLETIM :	PERÍODO:		
											LICITAÇÃO	REF. JUL - 2022 sem Desoneração	01	13/05/2024 a XX/XX/XXXX		
							Nº CONTRATO:	VAL. CONTRATADO:	INICIO DA OBRA:		TÉRMINO OBRA:					
							003/2024	R\$ 1.248.000,00	28/02/2024		27/02/2025					
							Nº DO ADITIVO:	VALOR ADITIVO:	REINÍCIO OBRA:		TÉRMINO OBRA:					
							03	R\$ 428.593,74	01/07/2024		01/08/2025					
										VALOR						
						EXECUTADA										
						UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL	CONTRATADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL		
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO													
94794	SINAPI	08.02.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021				UN	2,00	-		0,00	R\$ 200,770	R\$ 401,54	0,00	0,00	0,00
94793	SINAPI	08.02.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021				UN	2,00	-		0,00	R\$ 189,900	R\$ 379,80	0,00	0,00	0,00
89987	SINAPI	08.02.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021				UN	3,00	-		0,00	R\$ 113,290	R\$ 339,87	0,00	0,00	0,00
90373	SINAPI	08.02.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022				UN	24,00	-		0,00	R\$ 15,040	R\$ 360,96	0,00	0,00	0,00
89361	SINAPI	08.02.14	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	1,00	-		0,00	R\$ 10,130	R\$ 10,13	0,00	0,00	0,00
89406	SINAPI	08.02.15	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	11,00	-		0,00	R\$ 9,360	R\$ 102,96	0,00	0,00	0,00
104202	SINAPI	08.02.16	TÊ NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022				UN	3,00	-		0,00	R\$ 10,170	R\$ 30,51	0,00	0,00	0,00
99635	SINAPI	08.02.17	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021				UN	19,00	-		0,00	R\$ 303,320	R\$ 5.763,08	0,00	0,00	0,00
103955	SINAPI	08.02.18	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022				UN	2,00	-		0,00	R\$ 10,910	R\$ 21,82	0,00	0,00	0,00
89429	SINAPI	08.02.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	3,00	-		0,00	R\$ 6,230	R\$ 18,69	0,00	0,00	0,00
94658	SINAPI	08.02.20	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				UN	68,00	-		0,00	R\$ 8,070	R\$ 548,76	0,00	0,00	0,00
94660	SINAPI	08.02.21	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				UN	4,00	-		0,00	R\$ 13,870	R\$ 55,48	0,00	0,00	0,00
94662	SINAPI	08.02.22	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				UN	10,00	-		0,00	R\$ 14,980	R\$ 149,80	0,00	0,00	0,00
94664	SINAPI	08.02.23	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				UN	4,00	-		0,00	R\$ 32,040	R\$ 128,16	0,00	0,00	0,00
103953	SINAPI	08.02.24	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	1,00	-		0,00	R\$ 7,380	R\$ 7,38	0,00	0,00	0,00
89546	SINAPI	08.02.25	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022				UN	1,00	-		0,00	R\$ 14,480	R\$ 14,48	0,00	0,00	0,00
103971	SINAPI	08.02.26	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	1,00	-		0,00	R\$ 32,300	R\$ 32,30	0,00	0,00	0,00
104014	SINAPI	08.02.27	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	6,00	-		0,00	R\$ 12,080	R\$ 72,48	0,00	0,00	0,00
103999	SINAPI	08.02.28	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	1,00	-		0,00	R\$ 14,030	R\$ 14,03	0,00	0,00	0,00

 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS														
CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CONVÊNIO							
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI		QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO	MODALIDADE:	DATA BASE:	Nº BOLETIM :	PERÍODO:		
									LICITAÇÃO	REF. JUL - 2022 sem Desoneração	01	13/05/2024 a XX/XX/XXXX		
					Nº CONTRATO:	VAL. CONTRATADO:	INICIO DA OBRA:		TÉRMINO OBRA:					
					003/2024	R\$ 1.248.000,00	28/02/2024		27/02/2025					
					Nº DO ADITIVO:	VALOR ADITIVO:	REINÍCIO OBRA:		TÉRMINO OBRA:					
					03	R\$ 528.593,74	01/07/2024		01/08/2025					
								VALOR						
								CONTRATADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL			
CÓDIGO	FONTES	ITEM	DESCRIÇÃO											
104003	SINAPI	08.02.29	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	16,00	-		0,00	R\$ 16,830	R\$ 269,28	0,00	0,00	
89364	SINAPI	08.02.30	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	10,00	-		0,00	R\$ 12,620	R\$ 126,20	0,00	0,00	
89494	SINAPI	08.02.31	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	43,00	-		0,00	R\$ 15,130	R\$ 650,59	0,00	0,00	
89503	SINAPI	08.02.32	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	13,00	-		0,00	R\$ 28,250	R\$ 367,25	0,00	0,00	
89507	SINAPI	08.02.33	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	4,00	-		0,00	R\$ 61,700	R\$ 246,80	0,00	0,00	
89502	SINAPI	08.02.34	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	1,00	-		0,00	R\$ 19,970	R\$ 19,97	0,00	0,00	
89362	SINAPI	08.02.35	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	39,00	-		0,00	R\$ 9,260	R\$ 361,14	0,00	0,00	
89492	SINAPI	08.02.36	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	2,00	-		0,00	R\$ 9,110	R\$ 18,22	0,00	0,00	
94657	SINAPI	08.02.37	LULA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		UN	2,00	-		0,00	R\$ 6,620	R\$ 13,24	0,00	0,00	
94659	SINAPI	08.02.38	LULA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		UN	8,00	-		0,00	R\$ 8,380	R\$ 67,04	0,00	0,00	
89577	SINAPI	08.02.39	LULA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	3,00	-		0,00	R\$ 49,420	R\$ 148,26	0,00	0,00	
89617	SINAPI	08.02.40	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	4,00	-		0,00	R\$ 7,850	R\$ 31,40	0,00	0,00	
89620	SINAPI	08.02.41	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	1,00	-		0,00	R\$ 13,270	R\$ 13,27	0,00	0,00	
104004	SINAPI	08.02.42	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	14,00	-		0,00	R\$ 33,000	R\$ 462,00	0,00	0,00	
89628	SINAPI	08.02.43	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	3,00	-		0,00	R\$ 61,280	R\$ 183,84	0,00	0,00	
104008	SINAPI	08.02.44	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	5,00	-		0,00	R\$ 37,530	R\$ 187,65	0,00	0,00	
89427	SINAPI	08.02.45	LULA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	7,00	-		0,00	R\$ 14,700	R\$ 102,90	0,00	0,00	
94707	SINAPI	08.02.46	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		UN	7,00	-		0,00	R\$ 85,370	R\$ 597,59	0,00	0,00	
89366	SINAPI	08.02.47	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	5,00	-		0,00	R\$ 19,540	R\$ 97,70	0,00	0,00	
103950	SINAPI	08.02.48	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	34,00	-		0,00	R\$ 11,600	R\$ 394,40	0,00	0,00	
104008	SINAPI	08.02.49	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	35,00	-		0,00	R\$ 37,530	R\$ 1.313,55	0,00	0,00	
S141415	DER-EDIF	08.02.50	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 75MM (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES		M	11,60	-		0,00	R\$ 127,710	R\$ 1.481,44	0,00	0,00	
S141409	DER-EDIF	08.02.51	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 20MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES		M	15,30	1,50		1,50	R\$ 23,413	R\$ 358,22	35,12	35,12	
94704	SINAPI	08.02.52	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		UN	3,00	-		0,00	R\$ 35,834	R\$ 107,50	0,00	0,00	

 PREFEITURA MUNICIPAL IRUPI DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS														
CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			CONVÊNIO								
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI			QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO	MODALIDADE:	DATA BASE:	Nº BOLETIM :	PERÍODO:	
										LICITAÇÃO	REF. JUL - 2022 sem Desoneração	01	13/05/2024 a XX/XX/XXXX	
						Nº CONTRATO:	VAL. CONTRATADO:	INICIO DA OBRA:		TÉRMINO OBRA:				
						003/2024	R\$ 1.248.000,00	28/02/2024		27/02/2025				
						Nº DO ADITIVO:	VALOR ADITIVO:	REINÍCIO OBRA:		TÉRMINO OBRA:				
						03	R\$ 428.593,74	01/07/2024		01/08/2025				
										VALOR				
						EXECUTADA				CONTRATADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	
						UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	NO MÊS						ACUMULADA ANTERIOR
CÓDIGO	FORTE	ITEM	DESCRIÇÃO											
94707	SINAPI	08.02.53	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016			UN	1,00	-	0,00	R\$ 85,373	R\$ 85,37	0,00	0,00	
94703	SINAPI	08.02.54	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016			UN	2,00	-	0,00	R\$ 26,570	R\$ 53,14	0,00	0,00	
94705	SINAPI	08.02.55	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016			UN	4,00	-	0,00	R\$ 49,559	R\$ 198,24	0,00	0,00	
94496	SINAPI	08.02.56	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021			UN	2,00	-	0,00	R\$ 100,289	R\$ 200,58	0,00	0,00	
S170328	DER-EDIF	08.02.57	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL			UND	18,00	2,00	2,00	R\$ 128,256	R\$ 2.308,61	256,51	0,00	256,51
94492	SINAPI	08.02.58	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021			UN	2,00	-	0,00	R\$ 85,601	R\$ 171,20	0,00	0,00	
94795	SINAPI	08.02.59	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021			UN	3,00	-	0,00	R\$ 38,732	R\$ 116,20	0,00	0,00	
94796	SINAPI	08.02.60	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021			UN	1,00	-	0,00	R\$ 44,416	R\$ 44,42	0,00	0,00	
S170540	DER-EDIF	08.02.61	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 1000L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BOIA			UND	3,00	-	0,00	R\$ 753,651	R\$ 2.260,95	0,00	0,00	
S142201	DER-EDIF	08.02.62	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 1/2" A 1"			M	121,50	10,70	10,70	R\$ 12,659	R\$ 1.538,07	135,45	0,00	135,45
		08.03	INSTALAÇÕES DE APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS											
S170561	DER-EDIF	08.03.01	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 15.000L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 5 X 16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRAS DE BOIA			UND	3,00	-	0,00	R\$ 12.002,030	R\$ 36.006,09	0,00	0,00	
86932	SINAPI	08.03.02	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020			UN	14,00	3,00	3,00	R\$ 542,110	R\$ 7.589,54	1626,33	0,00	1626,33
S170613	DER-EDIF	08.03.03	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA DE CANTO P/ BANHEIRO PNE, COLEÇÃO MASTER L.76.17, REF. DECA OU EQUIVALENTE, INCL. VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES METÁLICOS CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA			UND	7,00	2,00	2,00	R\$ 1.955,400	R\$ 13.687,80	3910,80	0,00	3910,80
100854	SINAPI	08.03.04	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF. 01/2020			UN	7,00	-	0,00	R\$ 1.456,900	R\$ 10.198,30	0,00	0,00	
S170101	DER-EDIF	08.03.05	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA			UND	3,00	-	0,00	R\$ 613,660	R\$ 1.840,98	0,00	0,00	
S170115	DER-EDIF	08.03.06	CUBA LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, COMPLETA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL. VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA			UND	10,00	-	0,00	R\$ 361,860	R\$ 3.618,60	0,00	0,00	
S170205	DER-EDIF	08.03.07	BANCADA DE MÁRMORE ESP. 3CM			M2	7,20	2,50	2,50	R\$ 536,160	R\$ 3.860,35	1340,40	0,00	1340,40
S170353	DER-EDIF	08.03.08	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL			UND	12,00	-	0,00	R\$ 572,250	R\$ 6.867,00	0,00	0,00	
S170534	DER-EDIF	08.03.09	PIA EM AÇO INOX COM 02 CUBAS Nº 1, DIMENSÕES 0.60 X 2.50, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA, EXCLUSIVE SIFÃO			UND	3,00	-	0,00	R\$ 3.150,790	R\$ 9.452,37	0,00	0,00	
S170222	DER-EDIF	08.03.10	BANCADA E TANQUE PARA PANELÕES EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, DIM. 0.80X1.10M, BASE DE CONCRETO E APOIO EM ALVENARIA, FRONTÃO H=10CM, INCL. VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA, CONF. DET. PROJETO			UND	2,00	-	0,00	R\$ 2.063,030	R\$ 4.126,06	0,00	0,00	
S170546	DER-EDIF	08.03.11	TANQUE EM MÁRMORE SINTÉTICO COM 2 BOJOS, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM PVC			UND	1,00	-	0,00	R\$ 373,400	R\$ 373,40	0,00	0,00	
S170313	DER-EDIF	08.03.12	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA, DIAM. 1/2" PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL			UND	4,00	-	0,00	R\$ 184,920	R\$ 739,68	0,00	0,00	
S170315	DER-EDIF	08.03.13	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL			UND	7,00	-	0,00	R\$ 234,140	R\$ 1.638,98	0,00	0,00	

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS															
CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			CONVÊNIO									
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI			QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO			MODALIDADE:	DATA BASE:	Nº BOLETIM :	PERÍODO:
												LICITAÇÃO	REF. JUL - 2022 sem Desoneração	01	13/05/2024 a XX/XX/XXXX
						Nº CONTRATO:	VAL. CONTRATADO:	INICIO DA OBRA:				TÉRMINO OBRA:			
						003/2024	R\$ 1.248.000,00	28/02/2024				27/02/2025			
						Nº DO ADITIVO:	VALOR ADITIVO:	REINÍCIO OBRA:				TÉRMINO OBRA:			
						03	R\$ 428.593,74	01/07/2024				01/08/2025			
VALOR										CONTRATADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL		
CÓDIGO	FORNTE	ITEM	DESCRIÇÃO												
S170309	DER-EDIF	08.03.14	TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	4,00	-		0,00	R\$ 117,900	R\$ 471,60	0,00	0,00	0,00		
95544	SINAPI	08.03.15	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	21,00	-		0,00	R\$ 39,760	R\$ 834,96	0,00	0,00	0,00		
95547	SINAPI	08.03.16	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	11,00	-		0,00	R\$ 82,480	R\$ 907,28	0,00	0,00	0,00		
S170535	DER-EDIF	08.03.17	PIA EM AÇO INOX COM 01 CUBA Nº 1, DIMENSÕES DE 0.60 X 1.80M, INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA, EXCLUSIVE SIFÃO	UND	1,00	-		0,00	R\$ 2.301,950	R\$ 2.301,95	0,00	0,00	0,00		
S170510	DER-EDIF	08.03.18	BEBEDOURO DE AÇO INOX, MARCAS DE REFERÊNCIA FISHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRAS, EXCLUSIVE ALVENARIA, DIM. 0.45X2.75 M, CONFORME DETALHE EM PROJETO	UND	2,00	-		0,00	R\$ 4.909,670	R\$ 9.819,34	0,00	0,00	0,00		
S170519	DER-EDIF	08.03.19	DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	21,00	-		0,00	R\$ 333,910	R\$ 7.012,11	0,00	0,00	0,00		
S170607	DER-EDIF	08.03.20	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA EM AÇO INOX 304 - 80CM P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050)	UND	15,00	-		0,00	R\$ 397,080	R\$ 5.956,20	0,00	0,00	0,00		
S170603	DER-EDIF	08.03.21	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 80 CM	UND	10,00	-		0,00	R\$ 176,250	R\$ 1.762,50	0,00	0,00	0,00		
S170134	DER-EDIF	08.03.22	BACIA CONVENCIONAL EM LOUÇA BRANCA REF. LINHA RAVENA P9 DECA OU EQUIV., INCLUSIVE TUBO DE LIGAÇÃO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ASSENTO PLÁSTICO	UND	2,00	-		0,00	R\$ 686,504	R\$ 1.373,01	0,00	0,00	0,00		
S170114	DER-EDIF	08.03.23	BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUÇA BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS	UND	4,00	-		0,00	R\$ 1.063,190	R\$ 4.252,76	0,00	0,00	0,00		
S170601	DER-EDIF	08.03.24	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM	UND	8,00	-		0,00	R\$ 135,233	R\$ 1.081,86	0,00	0,00	0,00		
100867	SINAPI	08.03.25	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	-		0,00	R\$ 357,143	R\$ 1.428,57	0,00	0,00	0,00		
S080201	DER-EDIF	08.03.26	ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS	M2	4,50	-		0,00	R\$ 603,430	R\$ 2.712,42	0,00	0,00	0,00		
ACS-01	COMP	08.03.27	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11,00	-		0,00	R\$ 80,833	R\$ 889,16	0,00	0,00	0,00		
ACS-02	COMP	08.03.28	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11,00	-		0,00	R\$ 77,058	R\$ 847,64	0,00	0,00	0,00		
S050205	DER-EDIF	08.03.29	DIVISÓRIA DE GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA COR CINZA	M2	35,38	7,83	7,83		R\$ 488,142	R\$ 17.270,46	3822,15	0,00	3822,15		
S170538	DER-EDIF	08.03.30	CHUVEIRO FRIO DE PVC, MARCAS DE REFERÊNCIA ATLAS, CIPLA OU AKROS	UND	4,00	-		0,00	R\$ 28,703	R\$ 114,81	0,00	0,00	0,00		
CP-04	COMP	08.03.31	BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM, APOIADA EM SUPORTE MÃO FRANCESA DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,40	1,70	1,70		R\$ 467,637	R\$ 1.589,97	794,98	0,00	794,98		
86872	SINAPI	08.03.32	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	-		0,00	R\$ 723,829	R\$ 1.447,66	0,00	0,00	0,00		
		08.04	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL												
S141111	DER-EDIF	08.04.01	CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	5,00	-		0,00	R\$ 776,120	R\$ 3.880,60	0,00	0,00	0,00		
S140904	DER-EDIF	08.04.02	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA	M	96,58	-		0,00	R\$ 113,200	R\$ 10.932,86	0,00	0,00	0,00		
89854	SINAPI	08.04.03	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	12,00	-		0,00	R\$ 143,000	R\$ 1.716,00	0,00	0,00	0,00		
S141907	DER-EDIF	08.04.04	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,30	-		0,00	R\$ 50,408	R\$ 115,94	0,00	0,00	0,00		
S141908	DER-EDIF	08.04.05	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,70	-		0,00	R\$ 73,200	R\$ 1.222,44	0,00	0,00	0,00		
S140903	DER-EDIF	08.04.06	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA	M	18,90	-		0,00	R\$ 73,273	R\$ 1.384,86	0,00	0,00	0,00		
89746	SINAPI	08.04.07	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	-		0,00	R\$ 33,940	R\$ 67,88	0,00	0,00	0,00		

 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS														
CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CONVÊNIO							
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI		QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO	MODALIDADE:	DATA BASE:	Nº BOLETIM :	PERÍODO:		
									LICITAÇÃO	REF. JUL - 2022 sem Desoneração	01	13/05/2024 a XX/XX/XXXX		
					Nº CONTRATO:	VAL. CONTRATADO:	INICIO DA OBRA:		TÉRMINO OBRA:					
					003/2024	R\$ 1.248.000,00	28/02/2024		27/02/2025					
					Nº DO ADITIVO:	VALOR ADITIVO:	REINÍCIO OBRA:		TÉRMINO OBRA:					
					03	R\$ 428.593,74	01/07/2024		01/08/2025					
										VALOR				
						EXECUTADA				CONTRATADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	
		UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	NO MÊS		ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL							
CÓDIGO	FORTE	ITEM	DESCRIÇÃO											
89744	SINAPI	08.04.08	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022		UN	4,00	-	0,00	R\$ 32,594	R\$ 130,38	0,00	0,00	0,00	
89778	SINAPI	08.04.09	LUVAS SIMPES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022		UN	6,00	-	0,00	R\$ 21,405	R\$ 128,43	0,00	0,00	0,00	
S141111	DER-EDIF	08.04.10	CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPAS EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO		UND	1,00	-	0,00	R\$ 776,225	R\$ 776,23	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL														
										R\$ 262.446,96	R\$ 18.188,52	R\$ 0,00	R\$ 18.188,52	
		09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
100556	SINAPI	09.01	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBEPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2019		UN	10,00	-	0,00	R\$ 55,420	R\$ 554,20	0,00	0,00	0,00	
91936	SINAPI	09.02	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023		UN	325,00	-	0,00	R\$ 19,530	R\$ 6.347,25	0,00	0,00	0,00	
S150628	DER-EDIF	09.03	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2"		UND	400,00	-	0,00	R\$ 9,380	R\$ 3.752,00	0,00	0,00	0,00	
S151139	DER-EDIF	09.04	ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE		M	50,00	-	0,00	R\$ 26,890	R\$ 1.344,50	0,00	0,00	0,00	
S151141	DER-EDIF	09.05	ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 4", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE		M	50,00	-	0,00	R\$ 59,340	R\$ 2.967,00	0,00	0,00	0,00	
S151132	DER-EDIF	09.06	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE		M	1.500,00	1.500,00	1500,00	R\$ 8,800	R\$ 13.200,00	13200,00	0,00	13200,00	
S151133	DER-EDIF	09.07	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1", MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE		M	400,00	400,00	400,00	R\$ 10,100	R\$ 4.040,00	4040,00	0,00	4040,00	
S160322	DER-EDIF	09.08	ABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1", REF. TEL-095, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE		UND	570,00	-	0,00	R\$ 6,590	R\$ 3.756,30	0,00	0,00	0,00	
S150836	DER-EDIF	09.09	ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº16, 200X100MM, SEM TAMPAS		M	210,00	-	0,00	R\$ 113,880	R\$ 23.914,80	0,00	0,00	0,00	
S151311	DER-EDIF	09.10	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE		UND	6,00	-	0,00	R\$ 114,260	R\$ 685,56	0,00	0,00	0,00	
S150881	DER-EDIF	09.11	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA DE 200X100MM, NA PAREDE, ATRAVÉS DE SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA SIMPLES (1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (2UND)		UND	105,00	-	0,00	R\$ 35,820	R\$ 3.761,10	0,00	0,00	0,00	
S150870	DER-EDIF	09.12	TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA METÁLICA 200X100MM, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2570 OU EQUIVALENTE		UND	5,00	-	0,00	R\$ 112,570	R\$ 562,85	0,00	0,00	0,00	
S150875	DER-EDIF	09.13	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA METÁLICA, 200X100MM, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2510		UND	2,00	-	0,00	R\$ 95,960	R\$ 191,92	0,00	0,00	0,00	
S150866	DER-EDIF	09.14	JUNÇÃO SIMPLES PARA ELETROCALHA METÁLICA 200X100MM, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2760 OU EQUIVALENTE		UND	70,00	-	0,00	R\$ 12,720	R\$ 890,40	0,00	0,00	0,00	
S150850	DER-EDIF	09.15	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4"		UND	120,00	-	0,00	R\$ 11,050	R\$ 1.326,00	0,00	0,00	0,00	
S150851	DER-EDIF	09.16	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1"		UND	40,00	-	0,00	R\$ 11,520	R\$ 460,80	0,00	0,00	0,00	
S150309	DER-EDIF	09.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 32 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO		UND	6,00	-	0,00	R\$ 655,590	R\$ 3.933,54	0,00	0,00	0,00	
S151710	DER-EDIF	09.18	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 57001 ATÉ 75000W - 220/127V		UND	1,00	-	0,00	R\$ 9.043,990	R\$ 9.043,99	0,00	0,00	0,00	
91924	SINAPI	09.19	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023		M	800,00	-	0,00	R\$ 2,940	R\$ 2.352,00	0,00	0,00	0,00	
S151417	DER-EDIF	09.20	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 2,5MM2		M	6.800,00	1.022,11	1022,11	R\$ 9,410	R\$ 63.988,00	9618,06	0,00	9618,06	
S151418	DER-EDIF	09.21	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 4,0 MM2		M	200,00	-	0,00	R\$ 11,240	R\$ 2.248,00	0,00	0,00	0,00	
S151419	DER-EDIF	09.22	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 6,0 MM2		M	1.900,00	-	0,00	R\$ 13,970	R\$ 26.543,00	0,00	0,00	0,00	
S151421	DER-EDIF	09.23	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 16,0 MM2		M	500,00	-	0,00	R\$ 27,270	R\$ 13.635,00	0,00	0,00	0,00	
S151422	DER-EDIF	09.24	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 25,0 MM2		M	60,00	-	0,00	R\$ 41,770	R\$ 2.506,20	0,00	0,00	0,00	

 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS																						
CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CONVÊNIO															
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI				QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO												
							UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	EXECUTADA					CONTRATADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL					
									NO MÊS									ACUMULADA ANTERIOR				
									ACUMULADA ATUAL													
CÓDIGO	FORNTE	ITEM	DESCRIÇÃO																			
S151425	DER-EDIF	09.25	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 50,0 MM2				M	160,00	-	0,00	R\$ 77,090	R\$ 12.334,40	0,00	0,00								
S180201	DER-EDIF	09.26	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2"				UND	164,00	-	0,00	R\$ 40,720	R\$ 6.678,08	0,00	0,00								
91979	SINAPI	09.27	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 03/2023				UN	48,00	-	0,00	R\$ 57,580	R\$ 2.763,84	0,00	0,00								
S181007	DER-EDIF	09.28	LUMINÁRIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR,ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA NCLUSIVE 4 LÂMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K - REF.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE				UND	325,00	-	0,00	R\$ 305,930	R\$ 99.427,25	0,00	0,00								
101666	SINAPI	09.29	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 08/2020				UN	8,00	-	0,00	R\$ 373,090	R\$ 2.984,72	0,00	0,00								
S151306	DER-EDIF	09.30	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE				UND	42,00	-	0,00	R\$ 74,370	R\$ 3.123,54	0,00	0,00								
S151307	DER-EDIF	09.31	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE				UND	24,00	-	0,00	R\$ 74,370	R\$ 1.784,88	0,00	0,00								
S151321	DER-EDIF	09.32	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE				UND	16,00	-	0,00	R\$ 74,370	R\$ 1.189,92	0,00	0,00								
S151322	DER-EDIF	09.33	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE				UND	23,00	-	0,00	R\$ 74,370	R\$ 1.710,51	0,00	0,00								
S151334	DER-EDIF	09.34	DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE				UND	1,00	-	0,00	R\$ 552,040	R\$ 552,04	0,00	0,00								
S151426	DER-EDIF	09.35	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 95,0 MM2				M	100,00	-	0,00	R\$ 136,420	R\$ 13.642,00	0,00	0,00								
S151335	DER-EDIF	09.36	DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400 A, 65KA 220/240V / 36KA 380/415V 35KA 440/460V 25KA 600V (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE				UND	1,00	-	0,00	R\$ 1.237,870	R\$ 1.237,87	0,00	0,00								
S151339	DER-EDIF	09.37	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A, CURVA C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE				UND	2,00	-	0,00	R\$ 459,720	R\$ 919,44	0,00	0,00								
S151402	DER-EDIF	09.38	FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2,5 MM2				M	3.753,70	-	0,00	R\$ 7,721	R\$ 28.982,32	0,00	0,00								
S151403	DER-EDIF	09.39	FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4,0 MM2				M	2.009,00	-	0,00	R\$ 10,268	R\$ 20.628,41	0,00	0,00								
S151404	DER-EDIF	09.40	FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 6,0 MM2				M	82,00	-	0,00	R\$ 12,628	R\$ 1.035,50	0,00	0,00								
S151405	DER-EDIF	09.41	FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 10,0 MM2				M	285,50	-	0,00	R\$ 18,828	R\$ 5.375,39	0,00	0,00								
S151431	DER-EDIF	09.42	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 185,0MM2				M	132,10	-	0,00	R\$ 266,584	R\$ 35.215,75	0,00	0,00								
S151338	DER-EDIF	09.43	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE				UND	21,00	-	0,00	R\$ 23,413	R\$ 491,67	0,00	0,00								
S151301	DER-EDIF	09.44	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE				UND	17,00	-	0,00	R\$ 23,413	R\$ 398,02	0,00	0,00								
93660	SINAPI	09.45	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 10/2020				UN	21,00	-	0,00	R\$ 55,863	R\$ 1.173,12	0,00	0,00								
S151305	DER-EDIF	09.46	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE				UND	2,00	-	0,00	R\$ 29,220	R\$ 58,44	0,00	0,00								
S151328	DER-EDIF	09.47	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE				UND	3,00	-	0,00	R\$ 99,068	R\$ 297,20	0,00	0,00								
S151304	DER-EDIF	09.48	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE				UND	2,00	-	0,00	R\$ 23,413	R\$ 46,83	0,00	0,00								
S151324	DER-EDIF	09.49	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE				UND	1,00	-	0,00	R\$ 83,199	R\$ 83,20	0,00	0,00								
S151316	DER-EDIF	09.50	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE				UND	1,00	-	0,00	R\$ 173,551	R\$ 173,55	0,00	0,00								
S151332	DER-EDIF	09.51	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A, CURVA C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE				UND	2,00	-	0,00	R\$ 459,730	R\$ 919,46	0,00	0,00								
ELE-06	COMP	09.52	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, TUDO INCLUIDO.				UND	19,00	-	0,00	R\$ 252,761	R\$ 4.802,46	0,00	0,00								
S151350	DER-EDIF	09.53	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS				UND	5,00	-	0,00	R\$ 114,676	R\$ 573,38	0,00	0,00								

 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS														
CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CONVÊNIO							
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI		QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO	MODALIDADE:	DATA BASE:	Nº BOLETIM :	PERÍODO:	
										LICITAÇÃO	REF. JUL - 2022 sem Desoneração	01	13/05/2024 a XX/XX/XXXX	
					Nº CONTRATO:	VAL. CONTRATADO:	INICIO DA OBRA:	TÉRMINO OBRA:						
					003/2024	R\$ 1.248.000,00	28/02/2024	27/02/2025						
					Nº DO ADITIVO:	VALOR ADITIVO:	REINÍCIO OBRA:	TÉRMINO OBRA:						
					03	R\$ 428.593,74	01/07/2024	01/08/2025						
										VALOR				
					EXECUTADA									
					UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL	CONTRATADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	
CÓDIGO	FONTES	ITEM	DESCRIÇÃO											
ELE-94	COMP	09.54	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 300A COM CAIXA MOLDADA 10KA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UND	2.00	-		0,00	R\$ 1.793,803	R\$ 3.587,61	0,00	0,00	
91937	SINAPI	09.55	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	286,00	-		0,00	R\$ 17,441	R\$ 4.988,13	0,00	0,00	
S150634	DER-EDIF	09.56	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA		UND	1,00	-		0,00	R\$ 152,270	R\$ 152,27	0,00	0,00	
S150629	DER-EDIF	09.57	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X4"		UND	1,00	-		0,00	R\$ 14,977	R\$ 14,98	0,00	0,00	
S180218	DER-EDIF	09.58	ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4 X 4"		UND	1,00	-		0,00	R\$ 19,242	R\$ 19,24	0,00	0,00	
S151003	DER-EDIF	09.59	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, DIMENSÃO DE 30X30X30CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5CM		UND	1,00	-		0,00	R\$ 135,750	R\$ 135,75	0,00	0,00	
S151138	DER-EDIF	09.60	ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE		M	48,50	-		0,00	R\$ 22,585	R\$ 1.095,37	0,00	0,00	
S151140	DER-EDIF	09.61	ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 3", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE		M	18,50	-		0,00	R\$ 43,100	R\$ 797,35	0,00	0,00	
S151126	DER-EDIF	09.62	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES		M	25,70	-		0,00	R\$ 17,535	R\$ 450,65	0,00	0,00	
S150801	DER-EDIF	09.63	ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO		M	1.007,00	-		0,00	R\$ 17,855	R\$ 17.979,99	0,00	0,00	
S150806	DER-EDIF	09.64	ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO		M	82,20	-		0,00	R\$ 28,889	R\$ 2.374,68	0,00	0,00	
ELE-82	COMP	09.65	ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO		M	39,30	-		0,00	R\$ 23,055	R\$ 906,06	0,00	0,00	
ELE-83	COMP	09.66	ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO		M	3,30	-		0,00	R\$ 25,782	R\$ 85,08	0,00	0,00	
ELE-84	COMP	09.67	ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 2", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO		M	6,50	-		0,00	R\$ 30,528	R\$ 198,43	0,00	0,00	
ELE-93	COMP	09.68	ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO.		M	0,10	-		0,00	R\$ 54,546	R\$ 5,45	0,00	0,00	
ELE-18	COMP	09.69	BLOCO AUTÔNOMO DE ENERGIA 60 LEDS (MÍNIMO 200 LÚMENS) COM AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS, INCLUINDO LÂMPADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UND	44,00	-		0,00	R\$ 97,053	R\$ 4.270,33	0,00	0,00	
ELE-14	COMP	09.70	ARANDELA TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO , DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, GRADE DE PROTEÇÃO, COM LÂMPADA BULBO LED 15W, SOQUETE E27. TUDO INCLUÍDO.		UND	1,00	-		0,00	R\$ 107,229	R\$ 107,23	0,00	0,00	
ELE-16 A	COMP	09.71	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA COM VIDRO FOSCO, COM 1 LÂMPADA BULBO LED DE 9W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUÍDO.		UND	1,00	-		0,00	R\$ 87,521	R\$ 87,52	0,00	0,00	
S181001	DER-EDIF	09.72	LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 9/10W TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM - REF. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE		UND	286,00	-		0,00	R\$ 183,954	R\$ 52.610,84	0,00	0,00	
ELE-08	COMP	09.73	REFLETOR DE LED 50W, BRANCO FRIO 6500K, 10.000LM, IP66, SLIM, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUÍDO.		UND	4,00	-		0,00	R\$ 121,508	R\$ 486,03	0,00	0,00	
S180202	DER-EDIF	09.74	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2"		UND	1,00	-		0,00	R\$ 48,111	R\$ 48,11	0,00	0,00	
S180206	DER-EDIF	09.75	INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2"		UND	2,00	-		0,00	R\$ 44,436	R\$ 88,87	0,00	0,00	
S180204	DER-EDIF	09.76	INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2"		UND	1,00	-		0,00	R\$ 35,389	R\$ 35,39	0,00	0,00	
91956	SINAPI	09.77	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	1,00	-		0,00	R\$ 46,257	R\$ 46,26	0,00	0,00	
S180207	DER-EDIF	09.78	INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2"		UND	12,00	-		0,00	R\$ 63,978	R\$ 767,74	0,00	0,00	
S180205	DER-EDIF	09.79	INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2"		UND	14,00	-		0,00	R\$ 58,637	R\$ 820,92	0,00	0,00	

 INSTITUTO DE REGISTRO E PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS														
CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CONVÊNIO							
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI		QUANTIDADE					PREÇO UNITÁRIO	MODALIDADE:	DATA BASE:	Nº BOLETIM :	PERÍODO:
											LICITAÇÃO	REF. JUL - 2022 sem Desoneração	01	13/05/2024 a XX/XX/XXXX
											Nº CONTRATO:	VAL. CONTRATADO:	INICIO DA OBRA:	TÉRMINO OBRA:
					003/2024	R\$ 1.248.000,00	28/02/2024	27/02/2025						
					Nº DO ADITIVO:	VALOR ADITIVO:	REINÍCIO OBRA:	TÉRMINO OBRA:						
					03	R\$ 428.593,74	01/07/2024	01/08/2025						
										VALOR				
		CONTRATADO	REALIZADO NO MÊS		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL							
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO											
92027	SINAPI	09.80	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023		UN	1,00	-		0,00	R\$ 75,147	R\$ 75,15	0,00	0,00	
ELE-01	COMP	09.81	TAMPA COM FURO PARA CAIXA 4X2" DE PVC. TUDO INCLUÍDO.		UND	23,00	-		0,00	R\$ 10,992	R\$ 252,82	0,00	0,00	
SBE-01	COMP	09.82	SUBESTAÇÃO EXT. AÉREA TRIFÁS. 112.5KVA, COMPLETA, C/ QUADROS DE MEDIÇÃO, TRANSF. A ÓLEO, CHAVE GERAL TRIP. POSTE E ACESSÓRIOS, CONF. NOR-TEC-01 DA ESCELSA, INCL. MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRAÇO 1:0.5:6		UND	1,00	-		0,00	R\$ 54.533,936	R\$ 54.533,94	0,00	0,00	
101878	SINAPI	09.83	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020		UN	1,00	-		0,00	R\$ 615,718	R\$ 615,72	0,00	0,00	
QD-03	COMP	09.84	QD-03 - QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UND	1,00	-		0,00	R\$ 1.436,734	R\$ 1.436,73	0,00	0,00	
QD-01	COMP	09.85	QD-01 - QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 42 DISJUNTORES DIN, 100 A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UND	1,00	-		0,00	R\$ 1.850,501	R\$ 1.850,50	0,00	0,00	
QD-02	COMP	09.86	QD-02 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR C/ PORTA C/ BARRAMENTO CHAPA METALICA 225A - PARA NO MÍNIMO 60 E NO MÁXIMO 70 DISJUNTORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UND	1,00	-		0,00	R\$ 3.076,009	R\$ 3.076,01	0,00	0,00	
QDB-01	COMP	09.87	QDB-01 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UND	23,00	-		0,00	R\$ 125,118	R\$ 2.877,71	0,00	0,00	
QGBT	COMP	09.88	QGBT - QUADRO DISTRIB. ENERGIA, SOBREPOR, CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 345A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG-56DIN-CEMAR OU EQUIV		UND	1,00	-		0,00	R\$ 1.732,848	R\$ 1.732,85	0,00	0,00	
SUBTOTAL											R\$ 599.219,30	R\$ 26.858,06	R\$ 0,00	R\$ 26.858,06
		10	PINTURA											
		10.01	PINTURA SOBRE PAREDE E TETO											
S190103	DER-EDIF	10.01.01	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX		M2	2.461,18	972,39		972,39	R\$ 18,940	R\$ 46.614,82	18417,07	0,00	18417,07
S190106	DER-EDIF	10.01.02	PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE		M2	3.692,41	-		0,00	R\$ 26,870	R\$ 99.215,16	0,00	0,00	0,00
		10.02	PINTURA SOBRE MADEIRA											
S190301	DER-EDIF	10.02.01	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA À BASE ÁGUA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE		M2	92,68	-		0,00	R\$ 51,110	R\$ 4.736,87	0,00	0,00	0,00
S190302	DER-EDIF	10.02.02	PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX OU EQUIVALENTE		M2	92,68	-		0,00	R\$ 46,550	R\$ 4.314,25	0,00	0,00	0,00
		10.03	PINTURA SOBRE METAL											
S190417	DER-EDIF	10.03.01	PINTURA SOBRE METAL, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO		M2	96,63	-		0,00	R\$ 47,240	R\$ 4.564,80	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL											R\$ 159.445,92	R\$ 18.417,07	R\$ 0,00	R\$ 18.417,07
		11	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA											
S200401	DER-EDIF	11.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO)		M2	1.880,08	-		0,00	R\$ 12,220	R\$ 22.974,58	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL											R\$ 22.974,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS															
CONTRATADA:			APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CONVÊNIO								
LOCALIZAÇÃO:			R. DIONISIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ - IRUPI			QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO	MODALIDADE:	DATA BASE:	Nº BOLETIM :	PERÍODO:		
										LICITAÇÃO	REF. JUL - 2022 sem Desoneração	01	13/05/2024 a XX/XX/XXXX		
										Nº CONTRATO:	VAL. CONTRATADO:	INICIO DA OBRA:	TÉRMINO OBRA:		
										003/2024	R\$ 1.248.000,00	28/02/2024	27/02/2025		
						Nº DO ADITIVO:	VALOR ADITIVO:	REINÍCIO OBRA:		TÉRMINO OBRA:					
03	R\$ 428.593,74	01/07/2024	01/08/2025												
VALOR															
									CONTRATADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL			
CÓDIGO	FORTE	ITEM	DESCRIÇÃO												
		14	RAMPA PRINCIPAL												
		14.02	INFRAESTRUTURA												
S040238	DER-EDIF	14.02.01	FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUÍDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA)			M2	47,20	47,20		47,20	R\$ 89,503	R\$ 4.224,54	4224,54	0,00	4224,54
S040231	DER-EDIF	14.02.02	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)			M3	1,18	1,18		1,18	R\$ 672,956	R\$ 796,78	794,09	0,00	794,09
S040243	DER-EDIF	14.02.03	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM			KG	72,00	72,00		72,00	R\$ 11,603	R\$ 835,42	835,42	0,00	835,42
S040245	DER-EDIF	14.02.04	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")			KG	521,00	521,00		521,00	R\$ 12,203	R\$ 6.357,76	6357,76	0,00	6357,76
S040224	DER-EDIF	14.02.05	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)			M3	11,82	11,82		11,82	R\$ 764,311	R\$ 9.034,16	9034,16	0,00	9034,16
EST-01	COMP	14.02.06	CURA QUÍMICA PARA CONCRETO, APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO			M2	47,20	47,20		47,20	R\$ 2,486	R\$ 117,34	117,34	0,00	117,34
98557	SINAPI	14.02.07	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018			M2	47,20	47,20		47,20	R\$ 38,650	R\$ 1.824,28	1824,28	0,00	1824,28
		14.03	SUPRAESTRUTURA												
S040339	DER-EDIF	14.03.01	FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES, REFORÇADAS COM SARRAFOS DE MADEIRA DE 2.5 X 10.0CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)			M2	311,88	311,88		311,88	R\$ 132,014	R\$ 41.172,53	41172,53	0,00	41172,53
S040328	DER-EDIF	14.03.02	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM			KG	1.065,00	1.065,00		1065,00	R\$ 11,603	R\$ 12.357,20	12357,20	0,00	12357,20
S040332	DER-EDIF	14.03.03	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM			KG	520,00	520,00		520,00	R\$ 12,203	R\$ 6.345,56	6345,56	0,00	6345,56
S040315	DER-EDIF	14.03.04	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)			M3	27,34	10,91		10,91	R\$ 875,147	R\$ 23.926,52	9547,85	0,00	9547,85
EST-01	COMP	14.03.05	CURA QUÍMICA PARA CONCRETO, APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO			M2	311,88	-		0,00	R\$ 2,486	R\$ 775,33	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												R\$ 107.767,41	R\$ 92.610,72	R\$ 0,00	R\$ 92.610,72
TOTAL												R\$ 1.676.593,74	R\$ 263.511,48	R\$ 0,00	R\$ 263.511,48
Valor (R\$) por extenso:												TOTAL MEDIÇÃO		R\$ 263.511,48	
												TOTAL ACUMULADO		R\$ 263.511,48	
												SALDO CONTRATO		R\$ 1.413.082,26	


 Documento assinado digitalmente
ZAQUEU DOS SANTOS PEREIRA
 Data: 18/09/2024 11:45:43-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO: 003/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS:

MEDIÇÃO: 01


DATA: 09/08/2024




Barracão de obra



Placa de obra

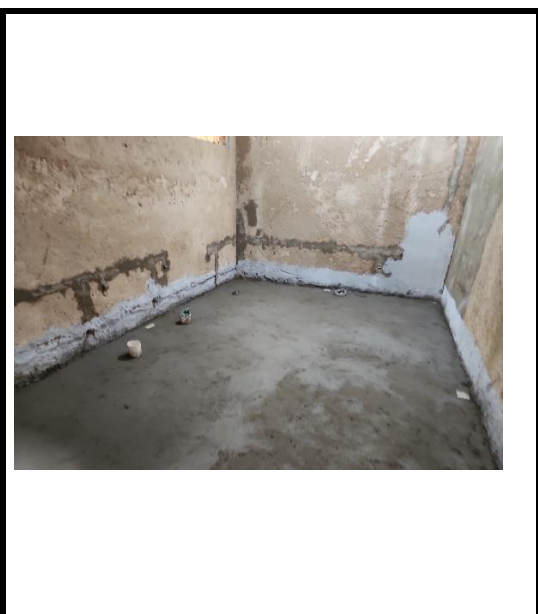

Impermeabilização polimérica

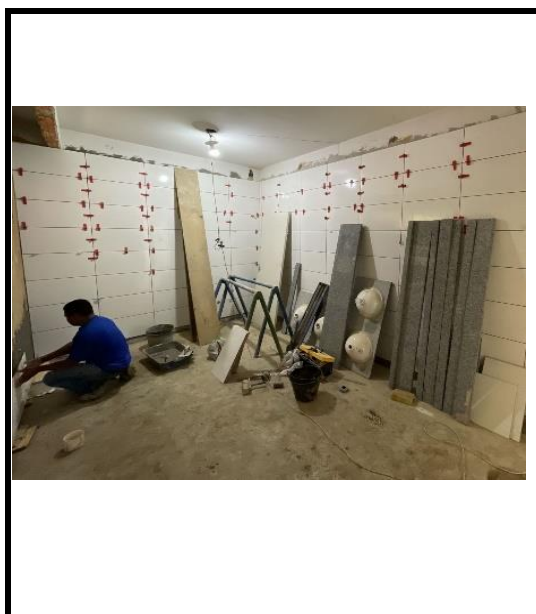

Revestimento cerâmico

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO: 003/2024


SERVIÇOS EXECUTADOS:

MEDIÇÃO: 01

DATA: 09/08/2024



Piso de alta resistência

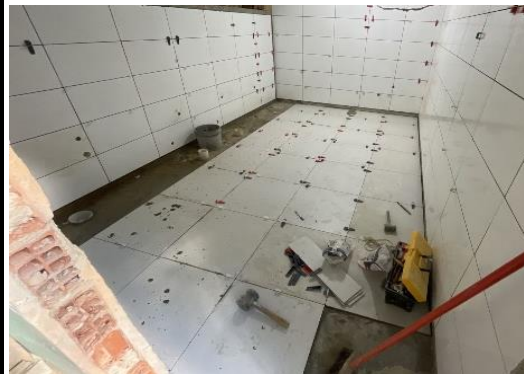

Porcelanato



Hidráulica



Infra estrutura Rampa

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: APREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO: 003/2024


SERVIÇOS EXECUTADOS:

MEDIÇÃO: 01


DATA: 09/08/2024



Esquadrias e Janelas

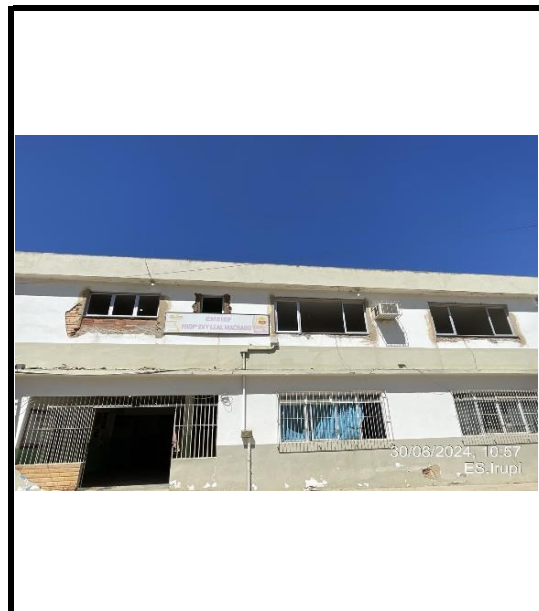

Esquadrias e Janelas



Documento assinado digitalmente
ZAQUEU DOS SANTOS PEREIRA
Data: 18/09/2024 11:30:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
