

 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS																					
CONTRATADA:			CS COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA						CONVÊNIO				MODALIDADE:		DATA BASE:		Nº BOLETIM :		PERÍODO:		
LOCALIZAÇÃO:			CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE				QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO		LICITAÇÃO	OUT/2022 DER - ES SINAPI - ES		OUT/2022 SEINFRA		3		23/11/2024 a 27/01/2025	
													Nº CONTRATO:	VAL. CONTRATADO:		INICIO DA OBRA:		TÉRMINO OBRA:			
													001/2023	R\$ 995.557,20		02/01/2024		22/01/2025			
													Nº DO ADITIVO:	VALOR ADITIVO:		REINICIO OBRA:		TÉRMINO OBRA:			
													1	R\$ 6.059,33							
												VALOR									
CÓDIGO			ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	1º ADITIVO		EXECUTADA		CONTRATADO C/ ADITIVO		REALIZADO NO MÊS		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL				
			1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES																	
20305			DER-ES	1.1	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	M²	4,50			4,50		R\$ 319,51		R\$ 1.437,80		R\$ 0,00		R\$ 1.437,80			
10501			DER-ES	1.2	Locação de obra com gabarito de madeira	M2	267,25			267,25		R\$ 14,48		R\$ 3.869,78		R\$ 0,00		R\$ 3.869,78			
20350			DER-ES	1.3	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x).	M	30,00			0,00		R\$ 271,11		R\$ 8.133,30		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
10402			DER-ES	1.4	Raspagem e limpeza do terreno (manual)	M2	829,73			0,00		R\$ 5,23		R\$ 4.339,49		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
ED-50151			SEINFRA	1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	UN	1,00			1,00		R\$ 1.587,08		R\$ 1.587,08		R\$ 0,00		R\$ 1.587,08			
ED-50150			SEINFRA	1.6	LIGAÇÃO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL - EM AÇO	UN	1,00			0,00		R\$ 468,01		R\$ 468,01		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
20802			DER-ES	1.7	Barrido para amortizado área de 10,50m2, de chapa de compensado 12mm e pontalões 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm	M2	10,90			10,90		R\$ 618,44		R\$ 6.741,00		R\$ 0,00		R\$ 6.741,00			
				2	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 26.576,45		R\$ 0,00		R\$ 13.635,65		R\$ 13.635,65			
30101			DER-ES	2.1	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade	M3	61,83			61,83		R\$ 67,97		R\$ 4.202,59		R\$ 0,00		R\$ 4.202,59			
93382			SINAPI	2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	40,22			40,22		R\$ 40,23		R\$ 1.618,05		R\$ 0,00		R\$ 1.618,05			
				3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA							R\$ 5.820,64		R\$ 0,00		R\$ 5.820,64		R\$ 5.820,64			
				3.1	FUNDAÇÃO																
101173			SINAPI	3.1.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE AF_05/2020	M	208,00			208,00		R\$ 79,77		R\$ 16.592,16		R\$ 0,00		R\$ 16.592,16			
40243			DER-ES	3.1.2	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	KG	104,00			104,00		R\$ 15,37		R\$ 1.598,48		R\$ 0,00		R\$ 1.598,48			
30203			DER-ES	3.1.3	Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente	M3	1,38			1,38		R\$ 293,94		R\$ 405,64		R\$ 0,00		R\$ 405,64			
40206			DER-ES	3.1.4	Fôrma de tábua de madeira de 2,5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	M2	218,32			218,32		R\$ 102,99		R\$ 22.484,78		R\$ 0,00		R\$ 22.484,78			
40243			DER-ES	3.1.5	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	KG	903,48			903,48		R\$ 16,90		R\$ 15.268,81		R\$ 0,00		R\$ 15.268,81			
40246			DER-ES	3.1.6	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	KG	369,03			369,03		R\$ 15,77		R\$ 5.819,60		R\$ 0,00		R\$ 5.819,60			
40330			DER-ES	3.1.7	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)	M3	20,23			20,23		R\$ 857,77		R\$ 17.352,69		R\$ 0,00		R\$ 17.352,69			
				3.2	ESTRUTURA							R\$ 79.522,16		R\$ 0,00		R\$ 79.522,16		R\$ 79.522,16			
40337			DER-ES	3.2.1	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2,5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	M2	317,39	194,48		511,87		R\$ 130,23		R\$ 66.660,83		R\$ 0,00		R\$ 66.660,83			
40243			DER-ES	3.2.2	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	KG	1.454,95	435,91		1890,86		R\$ 16,90		R\$ 31.955,53		R\$ 0,00		R\$ 31.955,53			
40243			DER-ES	3.2.3	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	KG	594,28	422,28		1016,56		R\$ 15,77		R\$ 16.031,15		R\$ 0,00		R\$ 16.031,15			
40330			DER-ES	3.2.4	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)	M3	18,78	13,38		5,40		R\$ 857,77		R\$ 16.108,92		R\$ 11.476,96		R\$ 4.631,96			
ED-50262			SEINFRA	3.2.5	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 370 KG/M2	M2	303,42	303,42		303,42		R\$ 198,01		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
90000			SINAPI	3.2.6	ARMADAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	M	152,20			152,20		R\$ 20,51		R\$ 3.121,62		R\$ 0,00		R\$ 3.121,62			
				4	ALVENARIA - VEDAÇÃO							R\$ 133.878,06		R\$ 11.476,96		R\$ 122.401,10		R\$ 133.878,06			
89282			SINAPI	4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	790,91			790,91		R\$ 84,11		R\$ 66.523,44		R\$ 0,00		R\$ 66.523,44			
ED-50396			SEINFRA	4.2	MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP. 15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO	M2	19,38			0,00		R\$ 595,31		R\$ 11.537,11		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
				5	COBERTURA							R\$ 78.060,55		R\$ 0,00		R\$ 66.523,44		R\$ 66.523,44			
92568			SINAPI	5.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	286,94	264,28		22,66		R\$ 207,22		R\$ 59.459,71		R\$ 54.764,10		R\$ 4.695,61			

94213	SINAPI	5.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	286,94				22,66	22,66	R\$ 109,37	R\$ 31.382,63	R\$ 0,00	R\$ 2.478,32	R\$ 2.478,32
COTAÇÃO		5.3	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA	M2	29,83					0,00	R\$ 288,33	R\$ 8.600,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-48402	SEINFRA	5.4	COLOCAÇÃO DE CUMEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50MM, SIMPLES	M	26,83					0,00	R\$ 70,80	R\$ 1.899,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-50662	SEINFRA	5.5	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL	M	59,88					0,00	R\$ 66,35	R\$ 3.973,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90302	DER-ES	5.6	Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm	M	298,10					0,00	R\$ 52,69	R\$ 15.706,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL												121.022,71	R\$ 54.764,10	R\$ 7.173,93	R\$ 61.938,03
		6	IMPERMEABILIZAÇÃO												
98557	SINAPI	6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	194,49			194,49	194,49	R\$ 51,09	R\$ 9.936,49	R\$ 0,00	R\$ 9.936,49	R\$ 9.936,49	
98546	SINAPI	6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUÍVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF_06/2018	M2	1,60				0,00	R\$ 149,06	R\$ 238,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SUBTOTAL											R\$ 10.174,99	R\$ 0,00	R\$ 9.936,49	R\$ 9.936,49	
		7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS												
		7.1	PISO												
87620	SINAPI	7.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF_07/2021	M2	234,35		234,35	234,35	R\$ 36,53	R\$ 8.560,81	R\$ 8.560,81	R\$ 0,00	R\$ 8.560,81		
87298	SINAPI	7.1.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	M3	5,12		5,12	5,12	R\$ 655,10	R\$ 3.354,11	R\$ 3.354,11	R\$ 0,00	R\$ 3.354,11		
94990	SINAPI	7.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	15,38			0,00	R\$ 945,96	R\$ 14.548,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
92396	SINAPI	7.1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	M2	63,76			0,00	R\$ 98,09	R\$ 6.254,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
ED-48914	SEINFRA	7.1.5	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE LASTRO DE AREIA	M3	14,29		14,29	14,29	R\$ 191,62	R\$ 2.738,25	R\$ 2.738,25	R\$ 0,00	R\$ 2.738,25		
94273	SINAPI	7.1.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	29,90			0,00	R\$ 67,25	R\$ 2.010,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
94284	SINAPI	7.1.7	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016	M2	11,96			0,00	R\$ 107,06	R\$ 1.280,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
87259	SINAPI	7.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², AF_06/2014	M2	234,35			0,00	R\$ 195,29	R\$ 45.766,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
88649	SINAPI	7.1.9	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM, AF_06/2014	M	204,25			0,00	R\$ 11,53	R\$ 2.355,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
96869	SINAPI	7.1.10	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	27,45			0,00	R\$ 96,91	R\$ 2.660,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SUBTOTAL											R\$ 89.528,86	R\$ 14.653,17	R\$ 0,00	R\$ 14.653,17	
		7.2	PAREDE												
87878	SINAPI	7.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	678,77		20,27	658,50	678,77	R\$ 5,62	R\$ 3.814,69	R\$ 113,92	R\$ 3.700,77	R\$ 3.814,69	
87889	SINAPI	7.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	899,04			899,04	899,04	R\$ 9,71	R\$ 8.729,68	R\$ 0,00	R\$ 8.729,68	R\$ 8.729,68	
110301	DER-ES	7.2.3	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0,5:6, espessura 20 mm	M2	1.577,81			405,00	405,00	R\$ 35,56	R\$ 56.106,92	R\$ 0,00	R\$ 14.401,80	R\$ 14.401,80	
93395	SINAPI	7.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014	M2	219,18			0,00	R\$ 77,37	R\$ 16.957,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
88495	SINAPI	7.2.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	679,86			0,00	R\$ 17,68	R\$ 12.019,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
88489	SINAPI	7.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 (INTERNO)	M2	679,86			0,00	R\$ 20,16	R\$ 13.705,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
101965	SINAPI	7.2.7	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	M	33,75			0,00	R\$ 95,99	R\$ 3.239,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
88489	SINAPI	7.2.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 (EXTERNO)	M2	690,13			0,00	R\$ 20,16	R\$ 13.913,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SUBTOTAL											R\$ 128.487,83	R\$ 113,92	R\$ 26.832,25	R\$ 26.946,17	
		7.3	TETO												
87878	SINAPI	7.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	285,93			0,00	R\$ 5,62	R\$ 1.606,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
110301	DER-ES	7.3.2	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0,5:6, espessura 20 mm	M2	285,93			0,00	R\$ 35,56	R\$ 10.167,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
88495	SINAPI	7.3.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	257,40			0,00	R\$ 17,68	R\$ 4.550,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
88489	SINAPI	7.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	257,40			0,00	R\$ 20,16	R\$ 5.189,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
ED-9013	SEINFRA	7.3.5	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR	M2	35,21			0,00	R\$ 28,90	R\$ 1.017,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
ED-49687	SEINFRA	7.3.6	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA	M2	6,68			0,00	R\$ 70,78	R\$ 472,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
											R\$ 23.004,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		7.4	MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA												
87878	SINAPI	7.4.1	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	38,76			0,00	R\$ 5,62	R\$ 217,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
ED-50761	SEINFRA	7.4.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	38,76			0,00	R\$ 39,52	R\$ 1.531,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
88489	SINAPI	7.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	38,76			0,00	R\$ 20,16	R\$ 781,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

ED-15790	SEINFRA	9.2.17	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	9,00					0,00	R\$ 50,29	R\$ 452,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
104473	SINAPI	9.2.18	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_ 01/2016	PT	29,00					0,00	R\$ 196,63	R\$ 5.702,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL									R\$ 44.892,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		9.3	QPDG												
101878	SINAPI	9.3.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00					0,00	R\$ 1.021,34	R\$ 1.021,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
101895	SINAPI	9.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUPT. 25KA- CURVA C	UN	1,00					0,00	R\$ 535,30	R\$ 535,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
101894	SINAPI	9.3.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUPT. 25KA- CURVA C	UN	2,00					0,00	R\$ 199,14	R\$ 398,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
101896	SINAPI	9.3.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00					0,00	R\$ 799,76	R\$ 799,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL									R\$ 2.754,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		9.4	QUADROS												
101878	SINAPI	9.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00					0,00	R\$ 1.021,34	R\$ 2.042,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-15114	SEINFRA	9.4.2	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UN	2,00					0,00	R\$ 158,04	R\$ 316,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
101896	SINAPI	9.4.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	3,00					0,00	R\$ 799,76	R\$ 2.399,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
101896	SINAPI	9.4.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00					0,00	R\$ 799,76	R\$ 1.599,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
93657	SINAPI	9.4.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	10,00					0,00	R\$ 19,29	R\$ 192,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
93659	SINAPI	9.4.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	10,00					0,00	R\$ 31,71	R\$ 317,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
93666	SINAPI	9.4.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	5,00					0,00	R\$ 93,16	R\$ 465,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL									R\$ 7.333,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		9.5	EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA												
98307	SINAPI	9.5.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	UN	11,00					0,00	R\$ 65,85	R\$ 724,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-50229	SEINFRA	9.5.2	PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	11,00					0,00	R\$ 318,64	R\$ 3.505,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COTAÇÃO		9.5.3	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6	PT	11,00					0,00	R\$ 158,35	R\$ 1.741,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-50231	SEINFRA	9.5.4	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	PT	7,00					0,00	R\$ 217,98	R\$ 1.525,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
100555	SINAPI	9.5.5	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	UN	1,00					0,00	R\$ 2.995,97	R\$ 2.995,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
98593	SINAPI	9.5.6	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA SE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	UN	1,00					0,00	R\$ 5.211,58	R\$ 5.211,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
98301	SINAPI	9.5.7	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA SE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	UN	1,00					0,00	R\$ 1.137,23	R\$ 1.137,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91949	SINAPI	9.5.8	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	2,00					0,00	R\$ 19,78	R\$ 39,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
104473	SINAPI	9.5.9	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_ 01/2016	PT	2,00					0,00	R\$ 196,36	R\$ 392,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
100563	SINAPI	9.5.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METÁLICA, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	UN	1,00					0,00	R\$ 779,00	R\$ 779,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
101795	SINAPI	9.5.11	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_ 12/2020	UN	3,00					0,00	R\$ 702,79	R\$ 2.108,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL									R\$ 20.161,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		10	INSTALAÇÕES HIDÁULICAS												
		10.1	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS												
86888	SINAPI	10.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00					0,00	R\$ 613,57	R\$ 613,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
100849	SINAPI	10.1.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00					0,00	R\$ 58,26	R\$ 58,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
95471	SINAPI	10.1.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	4,00					0,00	R\$ 959,11	R\$ 3.836,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-48183	SEINFRA	10.1.4	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	UN	5,00					0,00	R\$ 77,13	R\$ 385,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

86904	SINAPI	10.1.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	13,00					0,00	R\$ 185,69	R\$ 2.413,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-50277	SEINFRA	10.1.6	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00					0,00	R\$ 493,06	R\$ 493,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
95545	SINAPI	10.1.7	SABONEITEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	14,00					0,00	R\$ 50,34	R\$ 704,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
95543	SINAPI	10.1.8	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	14,00					0,00	R\$ 70,44	R\$ 986,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-50289	SEINFRA	10.1.9	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO	UN	1,00					0,00	R\$ 512,07	R\$ 512,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-48169	SEINFRA	10.1.10	BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX	UN	1,00					0,00	R\$ 961,03	R\$ 961,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-21657	SEINFRA	10.1.11	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	M	13,20					0,00	R\$ 419,01	R\$ 5.530,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-48337	SEINFRA	10.1.12	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL	M	2,70					0,00	R\$ 1.637,90	R\$ 4.422,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-48167	SEINFRA	10.1.13	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	M	18,20					0,00	R\$ 309,39	R\$ 5.630,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COTAÇÃO		10.1.14	EXPURGO EM INOX COMPLETO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	UN	1,00					0,00	R\$ 1.959,61	R\$ 1.959,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
86906	SINAPI	10.1.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	27,00					0,00	R\$ 93,84	R\$ 2.533,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
100860	SINAPI	10.1.16	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2,00					0,00	R\$ 113,76	R\$ 227,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL									R\$ 31.269,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-49937	SEINFRA	10.2	REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS												
		10.2.1	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA	UN	1,00					0,00	R\$ 2.110,45	R\$ 2.110,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
99621	SINAPI	10.2.2	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	1,00					0,00	R\$ 230,96	R\$ 230,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
94796	SINAPI	10.2.3	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	1,00					0,00	R\$ 55,48	R\$ 55,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3886	SINAPI	10.2.4	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00			1,00		1,00	R\$ 26,05	R\$ 26,05	R\$ 0,00	R\$ 26,05	R\$ 26,05
COTAÇÃO		10.2.5	FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1	UN	1,00					0,00	R\$ 1.788,06	R\$ 1.788,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COTAÇÃO		10.2.6	FREIO D'ÁGUA Ø100	UN	1,00					0,00	R\$ 178,15	R\$ 178,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COTAÇÃO		10.2.7	SIFÃO LADRÃO Ø100	UN	1,00					0,00	R\$ 139,15	R\$ 139,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COTAÇÃO		10.2.8	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BOIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENOÍDE	UN	1,00					0,00	R\$ 106,33	R\$ 106,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COTAÇÃO		10.2.9	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUÇÃO Ø 1"	UN	1,00					0,00	R\$ 326,60	R\$ 326,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COTAÇÃO		10.2.10	PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMATICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19MCA 2.000 L/H	UN	1,00					0,00	R\$ 2.040,83	R\$ 2.040,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
94496	SINAPI	10.2.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	1,00			1,00		1,00	R\$ 123,95	R\$ 123,95	R\$ 0,00	R\$ 123,95	R\$ 123,95
89353	SINAPI	10.2.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	1,00			1,00		1,00	R\$ 58,50	R\$ 58,50	R\$ 0,00	R\$ 58,50	R\$ 58,50
94495	SINAPI	10.2.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	1,00			1,00		1,00	R\$ 90,97	R\$ 90,97	R\$ 0,00	R\$ 90,97	R\$ 90,97
			SUBTOTAL									R\$ 7.275,48	R\$ 0,00	R\$ 299,47	R\$ 299,47
103046	SINAPI	10.3	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS												
		10.3.1	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	2,00			2,00		2,00	R\$ 40,82	R\$ 81,64	R\$ 0,00	R\$ 81,64	R\$ 81,64
99635	SINAPI	10.3.2	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	6,00					0,00	R\$ 387,83	R\$ 2.326,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
89353	SINAPI	10.3.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	16,00					0,00	R\$ 58,50	R\$ 936,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-49937	SEINFRA	10.3.4	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA	UN	2,00					0,00	R\$ 2.118,26	R\$ 4.236,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
94796	SINAPI	10.3.5	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	1,00					0,00	R\$ 55,48	R\$ 55,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3886	SINAPI	10.3.6	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00					0,00	R\$ 26,05	R\$ 26,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
89353	SINAPI	10.3.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	2,00			2,00		2,00	R\$ 58,50	R\$ 117,00	R\$ 0,00	R\$ 117,00	R\$ 117,00
89482	SINAPI	10.3.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_ 06/2022	UN	9,00					0,00	R\$ 58,43	R\$ 525,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL									R\$ 8.305,54	R\$ 0,00	R\$ 198,64	R\$ 198,64
ED-50222	SEINFRA	10.4	PONTOS DE HIRAULICA												
		10.4.1	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	40,00			40,00		40,00	R\$ 208,03	R\$ 8.321,20	R\$ 0,00	R\$ 8.321,20	R\$ 8.321,20
ED-50224	SEINFRA	10.4.2	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	34,00			34,00		34,00	R\$ 265,24	R\$ 9.018,16	R\$ 0,00	R\$ 9.018,16	R\$ 9.018,16

ED-50225	SEINFRA	10.4.3	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	PT	6,00				6,00	6,00	R\$ 387,50	R\$ 2.325,00	R\$ 0,00	R\$ 2.325,00	R\$ 2.325,00
			SUBTOTAL									R\$ 19.664,36	R\$ 0,00	R\$ 19.664,36	R\$ 19.664,36
		10.5	REDE EXTERNA												
ED-49170	SEINFRA	10.5.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	18,00					0,00	R\$ 403,06	R\$ 7.255,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-50024	SEINFRA	10.5.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,40					0,00	R\$ 113,02	R\$ 3.435,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-50105	SEINFRA	10.5.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	152,50				30,00	30,00	R\$ 67,63	R\$ 10.313,58	R\$ 0,00	R\$ 2.028,90	R\$ 2.028,90
			SUBTOTAL									R\$ 21.004,46	R\$ 0,00	R\$ 2.028,90	R\$ 2.028,90
		11	REDE AR COMPRIMIDO												
ED-50087	SEINFRA	11.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2"	M	30,00					0,00	R\$ 138,53	R\$ 4.155,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-49841	SEINFRA	11.2	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA COM ROSCA NPT, CLASSE 300LBS - 1/2"	UN	1,00					0,00	R\$ 138,64	R\$ 138,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		11.3	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	UN	10,00					0,00	R\$ 178,74	R\$ 1.787,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-48177	SEINFRA	11.4	FILTRO AP-200 CURTO	UN	2,00					0,00	R\$ 211,73	R\$ 423,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL									R\$ 6.505,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		12	COMUNICAÇÃO VISUAL												
ED-50632	SEINFRA	12.1	PLACA VINÍLICA 30 X 30 CM E = 2 MM (PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" DIMENSÃO 150X77CM)	M2	2,16					0,00	R\$ 151,52	R\$ 327,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-50632	SEINFRA	12.2	PLACA VINÍLICA 30 X 30 CM E = 2 MM (PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" DIM 80X41CM)	M2	2,33					0,00	R\$ 151,52	R\$ 353,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-50632	SEINFRA	12.3	PLACA VINÍLICA 30 X 30 CM E = 2 MM (PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" DIM 40X50CM)	M2	3,20					0,00	R\$ 151,52	R\$ 484,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-50632	SEINFRA	12.4	PLACA VINÍLICA 30 X 30 CM E = 2 MM (PLACA DE SINALIZAÇÃO "5" DIM 150X60CM)	M2	1,90					0,00	R\$ 151,52	R\$ 287,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-50632	SEINFRA	12.5	PLACA VINÍLICA 30 X 30 CM E = 2 MM (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" DIM 20X10CM)	M2	20,02					0,00	R\$ 151,52	R\$ 3.033,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-50632	SEINFRA	12.6	PLACA VINÍLICA 30 X 30 CM E = 2 MM (PLACA DE INDICAÇÃO "7" DIM 20X5CM)	M2	4,25					0,00	R\$ 151,52	R\$ 643,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL									R\$ 5.130,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		13	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA												
ED-15446	SEINFRA	13.1	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	UN	1,00					0,00	R\$ 435,64	R\$ 435,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-15447	SEINFRA	13.2	BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-1, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 130CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	UN	1,00					0,00	R\$ 259,80	R\$ 259,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ED-50266	SEINFRA	13.3	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	309,25					0,00	R\$ 7,80	R\$ 2.412,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
100981	SINAPI	13.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	39,58					0,00	R\$ 11,18	R\$ 442,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL									R\$ 3.550,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		14	ITENS NOVOS												
ED-40331	DER-ES	14.1	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa pl concor. Bombeável)	M³	30,31				30,31	30,31	R\$ 883,74	R\$ 26.786,16	R\$ 0,00	R\$ 26.786,16	R\$ 26.786,16
			SUBTOTAL									R\$ 26.786,16	R\$ 0,00	R\$ 26.786,16	R\$ 26.786,16
			TOTAL									R\$ 1.001.616,52	R\$ 81.008,15	R\$ 380.823,18	R\$ 461.831,33
Valor (R\$) por extenso: Oitenta e um mil e oito reais e quinze centavos.												TOTAL MEDIÇÃO		R\$ 81.008,15	
												TOTAL ACUMULADO		R\$ 461.831,33	
												SALDO CONTRATO		R\$ 539.785,19	

CLEITON DE FREITAS DA CUNHA
CIDADÃO
assinado em 27/01/2025 13:53:35 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/01/2025 13:53:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CLEITON DE FREITAS DA CUNHA (CIDADÃO)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-RP44KV>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


EMPRESA: CS COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

MEDICÃO: 3


CONTRATO: 001/2022

PERÍODO: 21/11/2024 a 07/01/2025

SERVIÇOS EXECUTADOS: Construção da Unidade Básica de Saúde no Loteamento Monte Hermon

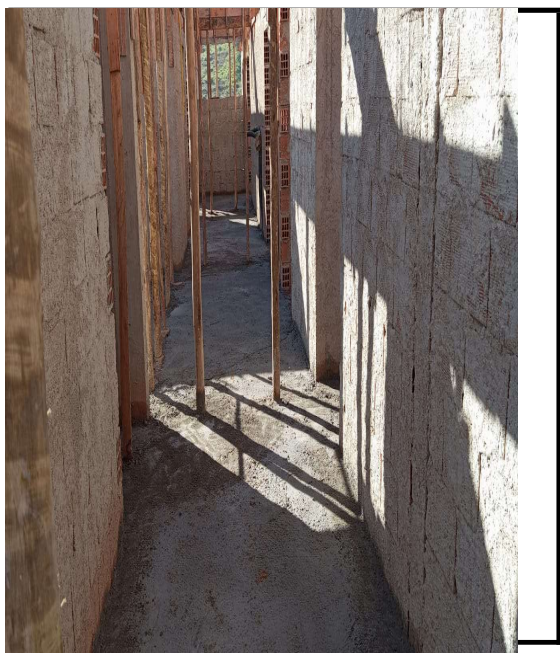


EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO

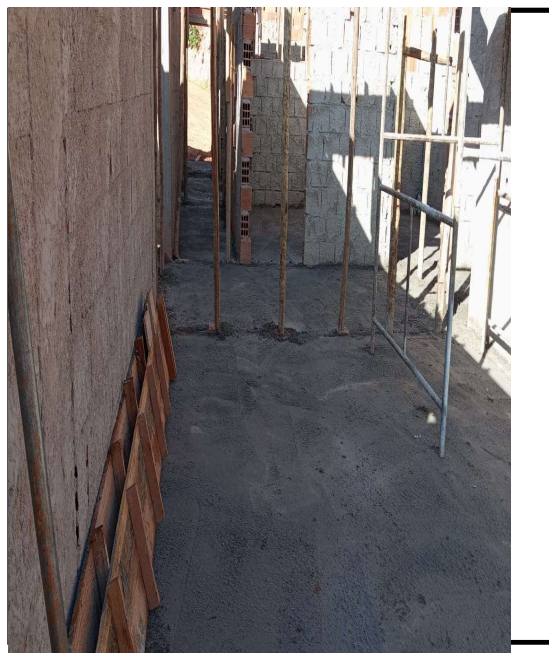

EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO



EXECUÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA

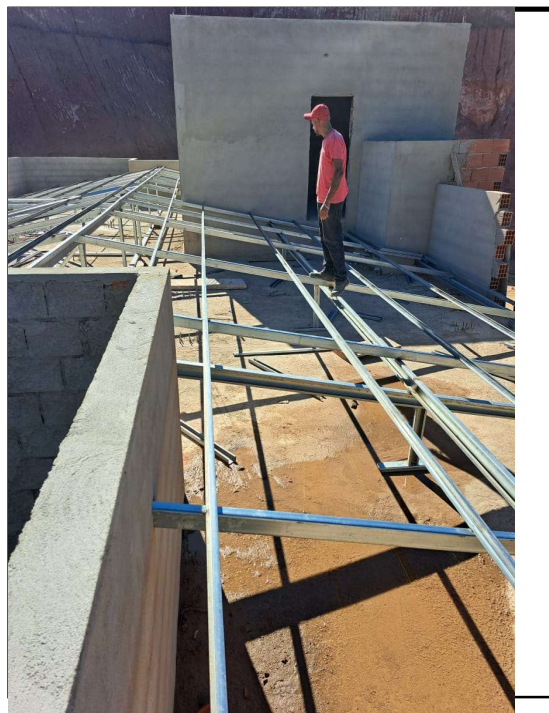

EXECUÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA

Cleiton de Freitas da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-ES 055016/D



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


EMPRESA: CS COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

MEDICÃO: 3

CONTRATO: 001/2022

PERÍODO: 21/11/2024 a 07/01/2025

SERVIÇOS EXECUTADOS: Construção da Unidade Básica de Saúde no Loteamento Monte Hermon

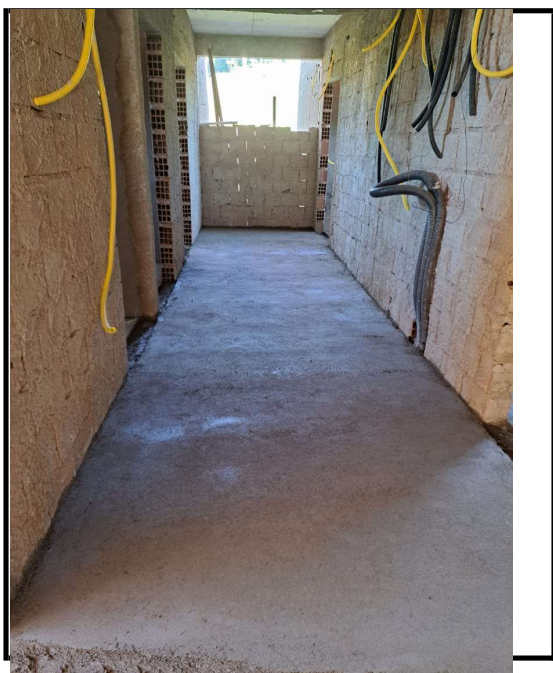


EXECUÇÃO DE CONTRAPISO



EXECUÇÃO DE CONTRAPISO



EXECUÇÃO DE CONTRAPISO

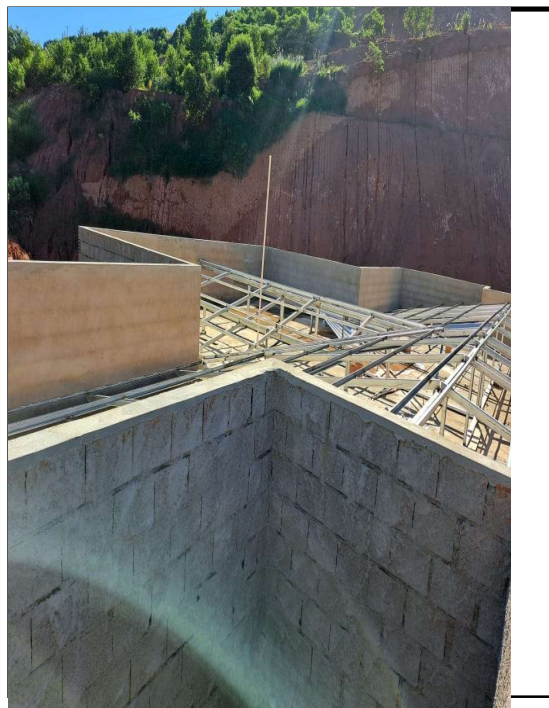

EXECUÇÃO DE CHAPISCO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CS COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

MEDIÇÃO: 3

CONTRATO: 001/2022

PERÍODO: 21/11/2024 a 07/01/2025

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Construção da Unidade Básica de Saúde no Loteamento Monte Hermon



CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA



CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA



CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA



CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA

Cleiton de Freitas da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-ES 055016/D

