



|                                                                                   |                           |        |                                                                                                                                                         |       |                                                                                                               |                    |                      |                 |                          |                      |                            |                  |           |     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------|-----|--------------|
|  |                           |        | P R E F E I T U R A<br>M U N I C I P A L D E<br>P A N C A S                                                                                             |       | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 09<br><br>Obra: PROJETO EXECUTIVO DO HOSPITAL<br>MATERNIDADE DO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES |                    |                      |                 | Valor contrato:          |                      | R\$                        | 92,94            |           |     |              |
|                                                                                   |                           |        |                                                                                                                                                         |       |                                                                                                               |                    |                      |                 | Acumulado anterior       |                      | R\$                        | 11,75            |           |     |              |
|                                                                                   |                           |        |                                                                                                                                                         |       |                                                                                                               |                    |                      |                 | ESTA MEDIÇÃO             |                      | R\$                        | 213.277,35       |           |     |              |
|                                                                                   |                           |        |                                                                                                                                                         |       |                                                                                                               |                    |                      |                 | Acumulado atual          |                      | R\$                        | 1.071.589,10     |           |     |              |
|                                                                                   |                           |        |                                                                                                                                                         |       |                                                                                                               |                    |                      |                 | percentual executado (%) |                      |                            | 7,52%            |           |     |              |
| Contratada: VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA                                 |                           |        | Ordem de serviço emitida em 04/05/2022                                                                                                                  |       | Prazo: 365 dias                                                                                               |                    | Proc. nº 2556/2021   |                 | C. P. 003/2021           |                      | Ref.: Contrato nº 035/2022 |                  |           |     |              |
| PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/05/2023 A 05/06/2023                                       |                           |        |                                                                                                                                                         |       |                                                                                                               |                    |                      |                 |                          |                      |                            | saldo contratual |           | R\$ | 1.764.703,84 |
| Ítem                                                                              |                           | Ref.   | Descrição                                                                                                                                               | Unid. | Contratada                                                                                                    | Quantidade         |                      |                 | Preço unitário com BDI   | Valor                |                            |                  |           |     |              |
|                                                                                   |                           |        |                                                                                                                                                         |       |                                                                                                               | Acumulada anterior | Realizada no período | Acumulada total |                          | Realizado no período | Acumulado total            |                  |           |     |              |
|                                                                                   |                           |        |                                                                                                                                                         |       |                                                                                                               |                    |                      |                 |                          |                      |                            |                  |           |     |              |
| 1                                                                                 | SERVIÇOS PRELIMINARES     |        |                                                                                                                                                         |       |                                                                                                               |                    |                      |                 |                          |                      |                            |                  |           |     |              |
| 01.01                                                                             | 20305                     | IOPES  | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES                                                                                                | m2    | 8,00                                                                                                          | 8,00               |                      | 8,00            | 257,43                   | R\$                  | -                          | R\$              | 2.059,44  |     |              |
| 01.02                                                                             | 98459                     | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018                                                                                                                   | M2    | 187,00                                                                                                        | 136,20             |                      | 136,20          | 118,44                   | R\$                  | -                          | R\$              | 16.131,53 |     |              |
| 01.03                                                                             | 93207                     | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016                            | M2    | 9,00                                                                                                          | 9,00               |                      | 9,00            | 972,49                   | R\$                  | -                          | R\$              | 8.752,41  |     |              |
| 01.04                                                                             | 93210                     | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016                            | M2    | 24,20                                                                                                         | 24,20              |                      | 24,20           | 522,56                   | R\$                  | -                          | R\$              | 12.645,95 |     |              |
| 01.05                                                                             | 93212                     | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016                                | M2    | 19,20                                                                                                         | 19,20              |                      | 19,20           | 867,27                   | R\$                  | -                          | R\$              | 16.651,58 |     |              |
| 01.06                                                                             | 93208                     | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016                                            | M2    | 10,50                                                                                                         | 10,50              |                      | 10,50           | 803,81                   | R\$                  | -                          | R\$              | 8.440,01  |     |              |
| 01.07                                                                             | 10501                     | IOPES  | Locação de obra com gabarito de madeira                                                                                                                 | m2    | 917,03                                                                                                        | 917,03             |                      | 917,03          | 8,01                     | R\$                  | -                          | R\$              | 7.345,41  |     |              |
| 02 PRONTO SOCORRO                                                                 |                           |        |                                                                                                                                                         |       |                                                                                                               |                    |                      |                 |                          |                      |                            |                  |           |     |              |
| 02.01                                                                             | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA     |        |                                                                                                                                                         |       |                                                                                                               |                    |                      |                 |                          |                      |                            |                  |           |     |              |
| 02.01.01                                                                          | 30103                     | IOPES  | Escavação mecânica em material de 1a. categoria                                                                                                         | m3    | 158,74                                                                                                        | 158,74             |                      | 158,74          | 9,12                     | R\$                  | -                          | R\$              | 1.447,71  |     |              |
| 02.01.02                                                                          | 93382                     | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                         | M3    | 109,24                                                                                                        | 109,24             |                      | 109,24          | 29,22                    | R\$                  | -                          | R\$              | 3.191,99  |     |              |
| 02.01.03                                                                          | 100575                    | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019                                                                                             | M2    | 584,40                                                                                                        |                    |                      |                 | 0,09                     | R\$                  | -                          | R\$              | -         |     |              |
| 02.02 ESTRUTURAS                                                                  |                           |        |                                                                                                                                                         |       |                                                                                                               |                    |                      |                 |                          |                      |                            |                  |           |     |              |
| 02.02.01                                                                          | INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |        |                                                                                                                                                         |       |                                                                                                               |                    |                      |                 |                          |                      |                            |                  |           |     |              |
| 02.02.01.01                                                                       | 96616                     | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017                                                                       | M3    | 3,43                                                                                                          | 3,43               |                      | 3,43            | 486,34                   | R\$                  | -                          | R\$              | 1.668,15  |     |              |
| 02.02.01.02                                                                       | 40331                     | IOPES  | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m3    | 41,57                                                                                                         | 40,93              |                      | 40,93           | 420,36                   | R\$                  | -                          | R\$              | 17.205,33 |     |              |
| 02.02.01.03                                                                       | 96544                     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                         | KG    | 182,02                                                                                                        | 164,69             |                      | 164,69          | 14,99                    | R\$                  | -                          | R\$              | 2.468,70  |     |              |
| 02.02.01.04                                                                       | 96545                     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                           | KG    | 326,95                                                                                                        | 326,95             |                      | 326,95          | 13,65                    | R\$                  | -                          | R\$              | 4.462,87  |     |              |
| 02.02.01.05                                                                       | 96546                     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                          | KG    | 601,18                                                                                                        | 581,87             |                      | 581,87          | 12,01                    | R\$                  | -                          | R\$              | 6.988,26  |     |              |
| 02.02.01.06                                                                       | 96547                     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                        | KG    | 1.790,65                                                                                                      | 1790,65            |                      | 1790,65         | 10,08                    | R\$                  | -                          | R\$              | 18.049,75 |     |              |
| 02.02.01.07                                                                       | 96543                     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                            | KG    | 457,27                                                                                                        | 457,27             |                      | 457,27          | 16,53                    | R\$                  | -                          | R\$              | 7.558,67  |     |              |



|             |       |        |                                                                                                                        |    |        |        |  |        |        |     |   |     |        |
|-------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--|--------|--------|-----|---|-----|--------|
| 02.02.01.08 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017 | M2 | 340,99 | 340,99 |  | 340,99 | 105,82 | R\$ | - | R\$ | 083,56 |
|-------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--|--------|--------|-----|---|-----|--------|

| 02.02.02 SUPER-ESTRUTURA |       |        |                                                                                                                                                                         |    |          |         |  |         |        |     |   |     |           |
|--------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|--|---------|--------|-----|---|-----|-----------|
| 02.02.02.01              | 40331 | IOPES  | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)                 | m3 | 185,83   | 171,88  |  | 171,88  | 420,36 | R\$ | - | R\$ | 72.251,48 |
| 02.02.02.02              | 92784 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015              | KG | 1.453,76 | 1453,76 |  | 1453,76 | 14,33  | R\$ | - | R\$ | 20.832,38 |
| 02.02.02.03              | 92785 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015              | KG | 2.968,72 | 2870,58 |  | 2870,58 | 13,30  | R\$ | - | R\$ | 38.178,71 |
| 02.02.02.04              | 92786 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015              | KG | 2.767,62 | 2681,46 |  | 2681,46 | 12,3   | R\$ | - | R\$ | 32.981,96 |
| 02.02.02.05              | 92787 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015             | KG | 223,35   |         |  | 0,00    | 10,90  | R\$ | - | R\$ | -         |
| 02.02.02.06              | 92788 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015             | KG | 16,69    |         |  | 0,00    | 9,15   | R\$ | - | R\$ | -         |
| 02.02.02.07              | 92789 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015             | KG | 342,57   |         |  | 0,00    | 8,61   | R\$ | - | R\$ | -         |
| 02.02.02.08              | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  | KG | 545,26   | 545,26  |  | 545,26  | 13,85  | R\$ | - | R\$ | 7.551,85  |
| 02.02.02.09              | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  | KG | 69,15    | 69,15   |  | 69,15   | 12,93  | R\$ | - | R\$ | 894,11    |
| 02.02.02.10              | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  | KG | 15,90    | 15,90   |  | 15,90   | 12,06  | R\$ | - | R\$ | 191,75    |
| 02.02.02.11              | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 346,55   | 283,57  |  | 283,57  | 10,75  | R\$ | - | R\$ | 3.048,38  |
| 02.02.02.12              | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 2.105,52 | 2105,52 |  | 2105,52 | 9,06   | R\$ | - | R\$ | 19.076,01 |
| 02.02.02.13              | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020  | M2 | 220,96   | 208,01  |  | 208,01  | 64,94  | R\$ | - | R\$ | 13.508,17 |
| 02.02.02.14              | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                  | M2 | 600,90   | 539,52  |  | 539,52  | 42,42  | R\$ | - | R\$ | 22.886,44 |
| 02.02.02.15              | 92452 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020                              | M2 | 412,52   | 412,52  |  | 412,52  | 125,04 | R\$ | - | R\$ | 51.581,50 |



|             |       |        |                                                                           |    |        |        |  |        |       |     |   |     |        |
|-------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--|--------|-------|-----|---|-----|--------|
| 02.02.02.16 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF 06/2018 | M2 | 303,66 | 281,60 |  | 281,60 | 30,02 | R\$ | - | R\$ | 453,63 |
|-------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--|--------|-------|-----|---|-----|--------|

**02.03 PAREDES E PAINÉIS**

|          |       |        |                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |  |        |        |     |   |     |           |
|----------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--|--------|--------|-----|---|-----|-----------|
| 02.03.01 | 87489 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 554,89 | 403,45 |  | 403,45 | 45,18  | R\$ | - | R\$ | 18.227,87 |
| 02.03.02 | 96367 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF 06/2017 P                                                              | M2 | 900,04 |        |  |        | 128,49 | R\$ | - | R\$ | -         |
| 02.03.03 | 96372 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF 06/2017                                                                                                                                              | M2 | 900,04 |        |  |        | 19,32  | R\$ | - | R\$ | -         |
| 02.03.04 | 79627 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS                                                                                   | M2 | 9,45   |        |  |        | 420,07 | R\$ | - | R\$ | -         |
| 02.03.05 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016                                                                                                                                      | M  | 19,45  | 11,2   |  |        | 81,70  | R\$ | - | R\$ | -         |
| 02.03.06 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016                                                                                                                                  | M  | 30,20  | 24,00  |  |        | 93,02  | R\$ | - | R\$ | -         |
| 02.03.07 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016                                                                                                                            | M  | 19,45  | 11,20  |  |        | 79,59  | R\$ | - | R\$ | -         |
| 02.03.08 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016                                                                                                                        | M  | 30,20  | 24,00  |  |        | 88,95  | R\$ | - | R\$ | -         |
| 02.03.09 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016                                                                                                                                       | M  | 12,50  | 2,00   |  |        | 75,69  | R\$ | - | R\$ | -         |
| 02.03.10 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016                                                                                                                                   | M  | 10,50  | 10,50  |  |        | 93,62  | R\$ | - | R\$ | -         |

**02.04 ESQUADRIAS**

**02.04.01 ESQUADRIAS DE MADEIRA**

|             |           |      |                                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |  |         |     |   |     |   |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|---------|-----|---|-----|---|
| 02.04.01.01 | COMP 07   | COMP | Porta de abrir de uma folha em madeira, com acabamento melamínico, inclusive marcos, alizares e fechadura, dim.: 0,80 x 2,10 m, inclusive chapa em aço inox, conforme projeto. Tudo incluído.               | und | 3,00  |  |  |  | 1096,80 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.04.01.02 | COMP 100  | COMP | Porta de correr em madeira de lei, com acabamento melamínico, inclusive marcos, alizares e fechadura, conforme projeto. Tudo incluído.                                                                      | m²  | 20,79 |  |  |  | 806,95  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.04.01.03 | COMP 100a | COMP | Porta de correr em madeira de lei, com acabamento melamínico, inclusive marcos, alizares e fechadura, inclusive chapa em aço inox, conforme projeto. Tudo incluído.                                         | m²  | 20,16 |  |  |  | 848,08  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.04.01.04 | COMP 03   | COMP | Porta de abrir de uma folha em madeira, com acabamento melamínico, inclusive marcos, alizares e fechadura, dim.: 1.00 x 2.10 m, conforme projeto. Tudo incluído.                                            | und | 3,00  |  |  |  | 1163,50 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.04.01.05 | COMP 04   | COMP | Porta de abrir de uma folha em madeira, com acabamento melamínico, inclusive marcos, alizares e fechadura, dim.: 1.20 x 2.10 m, conforme projeto. Tudo incluído.                                            | und | 1,00  |  |  |  | 2040,69 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.04.01.06 | COMP 06   | COMP | Porta de abrir de uma folha em madeira, com acabamento melamínico, com visor dim. 0.94 x 0.69 m, inclusive marcos, alizares e fechadura, dim.: 1.20 x 2.10 m, conforme projeto. Tudo incluído.              | und | 4,00  |  |  |  | 2139,36 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.04.01.07 | COMP 103  | COMP | Porta de correr em madeira de lei, com acabamento melamínico, com visor nas dim. 0.94 x 0.69 m, inclusive marcos, alizares e fechadura, nas dim. 1.20 x 2.10 m, conforme projeto. Tudo incluído.            | und | 2,00  |  |  |  | 1898,00 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.04.01.08 | COMP 09   | COMP | Porta de abrir de duas folhas em madeira de lei, com acabamento melamínico, com visor nas dim. 0.49 x 0.69 m, inclusive marcos, alizares e fechadura, dim.: 1.50 x 2.10 m, conforme projeto. Tudo incluído. | und | 2,00  |  |  |  | 3069,17 | R\$ | - | R\$ | - |



|             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |  |  |  |         |     |   |     |   |
|-------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|---------|-----|---|-----|---|
| 02.04.01.09 | COMP 10  | COMP | Porta de abrir de duas folhas em madeira de lei, com acabamento melamínico, com visor nas dim. 0.54 x 0.69 m, inclusive marcos, alizares e fechadura, dim.: 1.60 x 2.10 m, conforme projeto. Tudo incluído.                              | und | 5,00 |  |  |  | 2082,98 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.04.01.10 | COMP 12a | COMP | Porta de abrir de duas folhas em madeira de lei, com acabamento melamínico, inclusive marcos, alizares e fechadura, dim.: 1.40 x 2.10 m, conforme projeto. Tudo incluído.                                                                | und | 1,00 |  |  |  | 1540,97 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.04.01.11 | COMP 12b | COMP | Porta de abrir de duas folhas em madeira de lei, com acabamento melamínico, com visor nas dim. 0.34 x 0.64 m, inclusive marcos, alizares e fechadura, dim.: 1.40 x 2.10 m, inclusive chapa em aço inox, conforme projeto. Tudo incluído. | und | 1,00 |  |  |  | 2063,05 | R\$ | - | R\$ | - |

|                 |          |                             |                                                                                                                                               |     |       |  |       |  |          |     |          |     |   |
|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|-------|--|----------|-----|----------|-----|---|
| <b>02.04.02</b> |          | <b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b> |                                                                                                                                               |     |       |  |       |  |          |     |          |     |   |
| 02.04.02.01     | COMP 236 | COMP                        | Janela em alumínio anodizado cor branca, vidro liso 6mm: maxim-ar. Completa.                                                                  | m2  | 7,00  |  | 4,90  |  | 983,04   | R\$ | 4.816,90 | R\$ | - |
| 02.04.02.02     | COMP 233 | COMP                        | Janela em alumínio anodizado cor branca, vidro liso 6mm: 1F basculante + 1F fixa. Completa.                                                   | m2  | 1,30  |  | 1,30  |  | 935,11   | R\$ | 1.215,64 | R\$ | - |
| 02.04.02.03     | COMP 234 | COMP                        | Janela em alumínio anodizado cor branca, vidro liso 6mm: de correr. Completa.                                                                 | m2  | 9,20  |  | 4,20  |  | 1133,86  | R\$ | 4.762,21 | R\$ | - |
| 02.04.02.04     | COMP 250 | COMP                        | Janela em alumínio anodizado cor branca, duas folhas fixas, duas de correr, vidro 6mm. Completa.                                              | m2  | 5,40  |  | 2,25  |  | 1012,64  | R\$ | 2.278,44 | R\$ | - |
| 02.04.02.05     | COMP 251 | COMP                        | Janela em alumínio anodizado cor branca, fixa com vidro. Completa.                                                                            | m2  | 9,60  |  |       |  | 322,26   | R\$ | -        | R\$ | - |
| 02.04.02.06     | COMP 214 | COMP                        | Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro plumbífero, nas dim.: 1.40 x 1.00 m, exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. | und | 1,00  |  |       |  | 17606,53 | R\$ | -        | R\$ | - |
| 02.04.02.07     | COMP 97  | COMP                        | Janela veneziana fixa de alumínio com tela mosquiteiro, com guarnição, fixação com parafusos. Tudo incluído.                                  | m²  | 13,50 |  | 13,50 |  | 609,41   | R\$ | 8.227,04 | R\$ | - |

|                 |           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |  |  |  |         |     |   |     |   |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|---------|-----|---|-----|---|
| <b>02.04.03</b> |           | <b>ESQUADRIAS DE VIDRO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |  |  |  |         |     |   |     |   |
| 02.04.03.01     | COMP 99a  | COMP                       | Porta de correr, uma folha, em vidro temperado espessura de 10mm, com dimensões 0.90x2.10m, conforme especificações em projeto, tudo incluído.                                                                                                                             | und | 2,00 |  |  |  | 1120,62 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.04.03.02     | COMP 99b  | COMP                       | Porta de correr, uma folha, em vidro temperado espessura de 10mm, com dimensões 1.40x2.10m, conforme especificações em projeto, tudo incluído.                                                                                                                             | und | 1,00 |  |  |  | 1647,46 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.04.03.03     | COMP 99c  | COMP                       | Porta de correr, duas folhas, em vidro temperado espessura de 10mm, com dimensões 1.80x2.10m, conforme especificações em projeto, tudo incluído.                                                                                                                           | und | 1,00 |  |  |  | 2187,56 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.04.03.04     | COMP 107a | COMP                       | Painel de vidro temperado liso, espessura 10mm, nas dimensões 5.60 x 2.50 m, composto por porta de abrir dimensões 1.60 x 2.10m, duas folhas, em vidro temperado, fixada no painel de vidro, conforme especificações em projeto. Fornecimento e instalação, tudo incluído. | und | 1,00 |  |  |  | 8340,52 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.04.03.05     | COMP 107b | COMP                       | Painel de vidro temperado liso, espessura 10mm, nas dimensões 2.12 x 2.50 m, composto por porta de abrir dimensões 1.60 x 2.10m, duas folhas, em vidro temperado, fixada no painel de vidro, conforme especificações em projeto. Fornecimento e instalação, tudo incluído. | und | 1,00 |  |  |  | 4400,76 | R\$ | - | R\$ | - |

|                 |         |                             |                                                                                                                                      |     |      |  |  |  |         |     |   |     |   |
|-----------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|---------|-----|---|-----|---|
| <b>02.04.04</b> |         | <b>ESQUADRIAS ESPECIAIS</b> |                                                                                                                                      |     |      |  |  |  |         |     |   |     |   |
| 02.04.04.01     | COMP 02 | COMP                        | Fornecimento e instalacao de Porta de abrir com proteção radiológica, 2 folhas, completa, nas dim.: 1.50 x 2.10 m, conforme projeto. | und | 1,00 |  |  |  | 4530,49 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.04.04.02     | COMP 01 | COMP                        | Fornecimento e instalacao de Porta de abrir com proteção radiológica, 1 folha, completa, nas dim.: 0.80 x 2.10 m, conforme projeto.  | und | 1,00 |  |  |  | 2834,43 | R\$ | - | R\$ | - |

|                 |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>02.05</b>    |  | <b>COBERTURA</b>              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>02.05.01</b> |  | <b>ESTRUTURA PARA TELHADO</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                      |          |        |                                                                                                                                                                                            |     |        |        |  |        |         |        |     |           |               |
|--------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--|--------|---------|--------|-----|-----------|---------------|
| 02.05.01.01                          | 92543    | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019        | M2  | 488,00 |        |  |        | 22,13   | R\$    | -   | R\$       | -             |
| <b>02.05.02 TELHADO</b>              |          |        |                                                                                                                                                                                            |     |        |        |  |        |         |        |     |           |               |
| 02.05.02.01                          | COMP 222 | COMP   | Cumeeira para telha metálica ondulada, incluso acessórios de fixação e içamento                                                                                                            | m   | 20,00  |        |  |        | 63,74   | R\$    | -   | R\$       | -             |
| 02.05.02.02                          | 94213    | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                             | M2  | 488,00 |        |  |        | 87,49   | R\$    | -   | R\$       | -             |
| 02.05.02.03                          | COMP 211 | COMP   | Fornecimento e instalação de cobertura de policarbonato cristal e estrutura metálica. Tudo incluído.                                                                                       | m²  | 65,36  |        |  |        | 114,97  | R\$    | -   | R\$       | -             |
| <b>02.05.03 RUFOS E CALHAS</b>       |          |        |                                                                                                                                                                                            |     |        |        |  |        |         |        |     |           |               |
| 02.05.03.01                          | 100327   | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                   | M   | 40,57  |        |  |        | 48,22   | R\$    | -   | R\$       | -             |
| 02.05.03.02                          | 94228    | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                             | M   | 53,80  |        |  |        | 73,02   | R\$    | -   | R\$       | -             |
| <b>02.05.04 OUTROS DISPOSITIVOS</b>  |          |        |                                                                                                                                                                                            |     |        |        |  |        |         |        |     |           |               |
| 02.05.04.01                          | 200513   | IOPES  | Escada tipo marinho de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4,20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto                               | und | 2,00   |        |  |        | 1426,19 | R\$    | -   | R\$       | -             |
| <b>02.06 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>       |          |        |                                                                                                                                                                                            |     |        |        |  |        |         |        |     |           |               |
| 02.06.01                             | 98557    | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018                                                                                                                 | M2  | 90,43  |        |  |        | 30,02   | R\$    | -   | R\$       | -             |
| 02.06.02                             | 98547    | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018                                                      | M2  | 108,57 |        |  |        | 152,30  | R\$    | -   | R\$       | -             |
| 02.06.03                             | 87620    | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014                          | M2  | 178,26 |        |  |        | 27,35   | R\$    | -   | R\$       | -             |
| <b>02.07 TETOS E FORROS</b>          |          |        |                                                                                                                                                                                            |     |        |        |  |        |         |        |     |           |               |
| 02.07.01                             | 96114    | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P                                                                                                  | M2  | 531,01 |        |  |        | 59,53   | R\$    | -   | R\$       | -             |
| <b>02.08 ACABAMENTOS</b>             |          |        |                                                                                                                                                                                            |     |        |        |  |        |         |        |     |           |               |
| <b>02.08.01 ACABAMENTOS INTERNOS</b> |          |        |                                                                                                                                                                                            |     |        |        |  |        |         |        |     |           |               |
| 02.08.01.01                          | 87879    | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                   | M2  | 554,89 | 234,22 |  | 223,95 | 458,17  | 3,49   | R\$ | 781,59    | R\$ 1.599,01  |
| 02.08.01.02                          | 110302   | IOPES  | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm                                                                              | m2  | 483,88 | 142,86 |  | 236,04 | 378,90  | 52,85  | R\$ | 12.474,71 | R\$ 20.024,87 |
| 02.08.01.03                          | COMP 217 | COMP   | Reboco com argamassa baritada, espessura 25mm, aplicado em alvenaria chapiscada.                                                                                                           | m²  | 86,99  |        |  |        |         | 117,13 | R\$ | -         | R\$ -         |
| 02.08.01.04                          | 120301   | IOPES  | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm                                                                         | m2  | 81,54  |        |  |        | 0,00    | 27,28  |     | R\$       | -             |
| 02.08.01.05                          | COMP 123 | COMP   | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 33x58cm, ref. Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | m²  | 274,79 |        |  |        |         | 57,54  | R\$ | -         | R\$ -         |



|             |          |        |                                                                                                                                                                                     |    |        |  |  |  |        |     |   |     |   |
|-------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| 02.08.01.06 | 88786    | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014                | M2 | 3,06   |  |  |  | 276,07 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.08.01.07 | COMP 216 | COMP   | Fornecimento e instalação de revestimento melamínico brilhante, na cor verde, contornado por perfil de alumínio. Tudo incluído.                                                     | m² | 15,75  |  |  |  | 130,11 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.08.01.08 | COMP 218 | COMP   | Fornecimento e instalação de protetor de paredes bate macas em PVC, altura 20cm, ref.: TEC 200, marca Tecnoperfil, ou similar, fixado com parafuso e bucha plástica. Tudo incluído. | m  | 232,48 |  |  |  | 200,05 | R\$ | - | R\$ | - |

|             |         |                      |                                                                                                                                                                                  |    |        |        |        |        |        |     |           |     |           |
|-------------|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| 02.08.02    |         | ACABAMENTOS EXTERNOS |                                                                                                                                                                                  |    |        |        |        |        |        |     |           |     |           |
| 02.08.02.01 | 87905   | SINAPI               | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 554,89 |        | 137,57 | 438,21 | 7,77   | R\$ | 1.068,92  | R\$ | 3.404,89  |
| 02.08.02.02 | 110302  | IOPES                | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm                                                                    | m2 | 503,59 | 300,64 | 207,08 | 437,31 | 52,85  | R\$ | 10.944,18 | R\$ | 23.111,83 |
| 02.08.02.03 | 120301  | IOPES                | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm                                                               | m2 | 51,30  |        |        |        | 27,28  | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 02.08.02.04 | COMP 18 | COMP                 | Fornecimento e assentamento de Moisaico linha All Bricks 7x26cm Ref.: Yorkshire Light marca Portobello ou similar                                                                | m² | 16,14  |        |        |        | 284,54 | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 02.08.02.05 | COMP 19 | COMP                 | Fornecimento e assentamento de Porcelanato 20x120cm REF.: Araucária clara marca Portobello ou similar                                                                            | m² | 33,06  |        |        |        | 132,81 | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 02.08.02.06 | COMP 20 | COMP                 | Fornecimento e assentamento de Moldura em EPS, conforme projeto                                                                                                                  | m  | 42,00  |        |        |        | 47,90  | R\$ | -         | R\$ | -         |

|          |          |         |                                                                                                                                                                   |    |          |  |  |  |       |     |   |     |   |
|----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|--|-------|-----|---|-----|---|
| 02.09    |          | PINTURA |                                                                                                                                                                   |    |          |  |  |  |       |     |   |     |   |
| 02.09.01 | 88497    | SINAPI  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                          | M2 | 1.084,72 |  |  |  | 15,28 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.09.02 | 96130    | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017                                                                            | M2 | 503,59   |  |  |  | 19,91 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.09.03 | 88496    | SINAPI  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                             | M2 | 531,01   |  |  |  | 26,89 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.09.04 | COMP 212 | COMP    | Pintura com tinta epoxi a base d'agua, linha hospitalar, sobre paredes internas, marca Sherwin Williams ou similar. Inclusive lixamento e selador, a duas demãos. | m² | 1.084,72 |  |  |  | 33,94 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.09.05 | 88423    | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014                                                      | M2 | 503,59   |  |  |  | 18,32 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.09.06 | 88488    | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                             | M2 | 531,01   |  |  |  | 15,05 | R\$ | - | R\$ | - |

|             |        |                           |                                                                                                                                                       |    |        |        |  |        |       |     |   |     |        |
|-------------|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--|--------|-------|-----|---|-----|--------|
| 02.10       |        | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |                                                                                                                                                       |    |        |        |  |        |       |     |   |     |        |
| 02.10.01    |        | LASTRO DE CONTRAPISO      |                                                                                                                                                       |    |        |        |  |        |       |     |   |     |        |
| 02.10.01.01 | 130103 | IOPES                     | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm                                          | m2 | 586,51 |        |  |        | 0,00  | R\$ | - | R\$ | -      |
| 02.10.01.02 | 97113  | SINAPI                    | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017                                                                        | M2 | 534,60 | 512,08 |  | 512,08 | 1,66  | R\$ | - | R\$ | 850,05 |
| 02.10.01.03 | 94997  | SINAPI                    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 33,29  |        |  |        | 94,44 | R\$ | - | R\$ | -      |

|             |       |             |                                                                                                                                            |    |       |  |  |  |        |     |   |     |   |
|-------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| 02.10.02    |       | ACABAMENTOS |                                                                                                                                            |    |       |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 02.10.02.01 | 87261 | SINAPI      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 39,89 |  |  |  | 127,60 | R\$ | - | R\$ | - |



|             |          |        |                                                                                                                                                                                                                       |    |        |  |  |  |        |     |   |     |   |
|-------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| 02.10.02.02 | 87262    | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014                                                                        | M2 | 104,92 |  |  |  | 113,82 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.10.02.03 | 87263    | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014                                                                           | M2 | 413,57 |  |  |  | 105,23 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.10.02.04 | COMP 213 | COMP   | Piso vinílico em mantas de resina de PVC plastificante c/ dimensões 2,00x0,20m, mesclado ou pontilhado pigmentado, espessura de 2mm, juntas soldadas a quente, assentado sobre base existente devendo atender a ABNT. | m² | 28,13  |  |  |  | 71,36  | R\$ | - | R\$ | - |

|                 |          |                                              |                                                                                                                             |   |        |  |  |  |       |     |   |     |   |
|-----------------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|--|-------|-----|---|-----|---|
| <b>02.10.03</b> |          | <b>DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b> |                                                                                                                             |   |        |  |  |  |       |     |   |     |   |
| 02.10.03.01     | 98689    | SINAPI                                       | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                             | M | 56,70  |  |  |  | 52,98 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.10.03.02     | 101965   | SINAPI                                       | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 5,40   |  |  |  | 99,41 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.10.03.03     | 88650    | SINAPI                                       | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014                           | M | 494,99 |  |  |  | 11,66 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.10.03.04     | COMP 215 | COMP                                         | Rodapé hospitalar de sobrepor, marca Tarkett ou similar. Fornecimento e instalação.                                         | m | 21,10  |  |  |  | 47,98 | R\$ | - | R\$ | - |

|                 |         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |  |  |  |        |     |   |     |   |
|-----------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| <b>02.11</b>    |         | <b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |  |  |  |        |     |   |     |   |
| <b>02.11.01</b> |         | <b>ENTRADA DE ÁGUA</b>              |                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 02.11.01.01     | 140208  | IOPES                               | Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe | und | 1,00 |  |  |  | 528,19 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.11.01.02     | COMP 25 | COMP                                | Fornecimento e instalação de Pressurizador mod. TDV 300 HORIZ MARCA DANCOR                                                                                                                                                                    | und | 1,00 |  |  |  | 292,51 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.11.01.03     | COMP 26 | COMP                                | Fornecimento e instalação de Pressurizador mod. TDV 100 HORIZ MARCA DANCOR                                                                                                                                                                    | und | 1,00 |  |  |  | 266,44 | R\$ | - | R\$ | - |

|                 |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |  |  |  |        |     |   |     |   |
|-----------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| <b>02.11.02</b> |         | <b>CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 02.11.02.01     | COMP 15 | COMP                                                       | Caixa de areia 40x40x40cm em alvenaria                                                                                                                                                                                                 | und | 3,00 |  |  |  | 90,06  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.11.02.02     | 98109   | SINAPI                                                     | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020                               | UN  | 1,00 |  |  |  | 711,61 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.11.02.03     | 141110  | IOPES                                                      | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 3,00 |  |  |  | 598,34 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.11.02.04     | 141112  | IOPES                                                      | Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm | und | 2,00 |  |  |  | 645,17 | R\$ | - | R\$ | - |

|                 |        |                                                                  |                                                                           |   |        |       |  |       |       |     |   |     |          |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--|-------|-------|-----|---|-----|----------|
| <b>02.11.03</b> |        | <b>REDE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA PLUVIAL - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC</b> |                                                                           |   |        |       |  |       |       |     |   |     |          |
| 02.11.03.01     | 141409 | IOPES                                                            | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 24,28  |       |  | 0,00  | 16,52 | R\$ | - | R\$ | -        |
| 02.11.03.02     | 141410 | IOPES                                                            | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 402,91 | 37,03 |  | 37,03 | 18,92 | R\$ | - | R\$ | 700,61   |
| 02.11.03.03     | 141411 | IOPES                                                            | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões   | m | 70,30  | 42,56 |  | 42,56 | 27,09 | R\$ | - | R\$ | 1.152,95 |



|             |         |        |                                                                                                                                                                                      |   |       |  |  |      |        |     |   |     |   |
|-------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|------|--------|-----|---|-----|---|
| 02.11.03.04 | 141413  | IOPES  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (1 1/2"), inclusive conexões                                                                                                          | m | 90,92 |  |  | 0,00 | 37,24  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.11.03.05 | 141414  | IOPES  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões                                                                                                              | m | 9,60  |  |  | 0,00 | 53,19  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.11.03.06 | 141415  | IOPES  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (2 1/2"), inclusive conexões                                                                                                          | m | 8,47  |  |  | 0,00 | 79,64  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.11.03.07 | 89578   | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014                                                              | M | 55,90 |  |  | 0,00 | 45,96  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.11.03.08 | 89580   | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014                                                              | M | 2,54  |  |  | 0,00 | 91,11  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.11.03.09 | 90696   | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 06/2015 | M | 30,49 |  |  | 0,00 | 102,86 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.11.03.10 | COMP 13 | COMP   | Execução de dreno com tubos de PVC corrugado flexível perfurado - DN 100                                                                                                             | m | 15,81 |  |  | 0,00 | 30,87  | R\$ | - | R\$ | - |

| 02.11.04    |       | REDE DE ÁGUA FRIA - ADAPTADORES |                                                                                                                                                                                                   |    |      |  |  |  |       |     |   |     |   |
|-------------|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|-------|-----|---|-----|---|
| 02.11.04.01 | 94710 | SINAPI                          | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | UN | 3,00 |  |  |  | 53,05 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.11.04.02 | 94711 | SINAPI                          | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | UN | 4,00 |  |  |  | 61,56 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.11.04.03 | 94712 | SINAPI                          | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016     | UN | 1,00 |  |  |  | 84,03 | R\$ | - | R\$ | - |

| 02.11.05    |       | REDE DE ÁGUA QUENTE - TUBOS AQUATHERM |                                                                                                                |   |       |  |  |  |       |     |   |     |   |
|-------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|--|-------|-----|---|-----|---|
| 02.11.05.01 | 89633 | SINAPI                                | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | M | 4,80  |  |  |  | 21,14 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.11.05.02 | 89634 | SINAPI                                | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | M | 18,07 |  |  |  | 32,09 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.11.05.03 | 89635 | SINAPI                                | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | M | 18,07 |  |  |  | 45,82 | R\$ | - | R\$ | - |

| 02.11.06    |       | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC |                                                                                                                                        |   |        |       |  |       |       |     |   |     |          |
|-------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--|-------|-------|-----|---|-----|----------|
| 02.11.06.01 | 89711 | SINAPI                        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014  | M | 49,69  | 48    |  | 48,00 | 18,05 | R\$ | - | R\$ | 866,40   |
| 02.11.06.02 | 89712 | SINAPI                        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014  | M | 141,45 | 66,88 |  | 66,88 | 27,09 | R\$ | - | R\$ | 1.811,78 |
| 02.11.06.03 | 89713 | SINAPI                        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014  | M | 50,82  | 29,78 |  | 29,78 | 40,97 | R\$ | - | R\$ | 1.220,09 |
| 02.11.06.04 | 89714 | SINAPI                        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | M | 127,06 | 38,58 |  | 38,58 | 52,00 | R\$ | - | R\$ | 2.006,16 |





| 02.11.07 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS |          |        |                                                                                                                                              |     |       |  |  |  |        |             |
|---------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|--------|-------------|
| 02.11.07.01                           | 142107   | IOPES  | Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC                                                                                               | und | 6,00  |  |  |  | 45,66  | R\$ - R\$ - |
| 02.11.07.02                           | 142111   | IOPES  | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox                                                         | und | 12,00 |  |  |  | 99,22  | R\$ - R\$ - |
| 02.11.07.03                           | 94796    | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016                                                    | UN  | 2,00  |  |  |  | 25,63  | R\$ - R\$ - |
| 02.11.07.04                           | COMP 36  | COMP   | Fornecimento e instalacao de Ralo Linear 50 cm Inox fabr. Tigre                                                                              | und | 3,00  |  |  |  | 164,12 | R\$ - R\$ - |
| 02.11.07.05                           | COMP 109 | COMP   | Ralo sifonado de ferro fundido, 150x150mm. Fornecimento e instalação.                                                                        | und | 3,00  |  |  |  | 58,01  | R\$ - R\$ - |
| 02.11.07.06                           | COMP 105 | COMP   | Ralo semi-esférico tipo abacaxi, diâm. 150mm, tudo incluído                                                                                  | und | 4,00  |  |  |  | 53,15  | R\$ - R\$ - |
| 02.11.07.07                           | 141109   | IOPES  | Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de cantoneira de 1" x 3/16" | m   | 29,36 |  |  |  | 166,31 | R\$ - R\$ - |

| 02.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     |         |      |                                                                                                                                                                             |     |      |  |  |  |          |             |
|---------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|----------|-------------|
| 02.12.01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |         |      |                                                                                                                                                                             |     |      |  |  |  |          |             |
| 02.12.01.01                     | COMP 42 | COMP | Fornecimento e instalacao de Quadro de distribuição luz e força (qdlf-3), para 40 modulos dim barramento 3f+n+t + barra de neutro dr separada de 150a - fabricação especial | und | 1,00 |  |  |  | 11546,22 | R\$ - R\$ - |
| 02.12.01.02                     | COMP 44 | COMP | Fornecimento e instalacao de Quadro de distribuição luz e força (qdlf-5), para 30 modulos dim barramento 3f+n+t + barra de neutro dr separada de 150a - fabricação especial | und | 1,00 |  |  |  | 11563,72 | R\$ - R\$ - |
| 02.12.01.03                     | COMP 46 | COMP | Fornecimento e instalacao de Quadro de distribuição luz e força (qdlf-7), para 24 modulos dim barramento 3f+n+t + barra de neutro dr separada de 150a - fabricação especial | und | 1,00 |  |  |  | 9224,89  | R\$ - R\$ - |
| 02.12.01.04                     | COMP 48 | COMP | Fornecimento e instalacao de Quadro de distribuição ar condicionado (qdgac), para 112 modulos dim barramento 3f+n+t de 600a - fabricação especial                           | und | 1,00 |  |  |  | 8235,45  | R\$ - R\$ - |
| 02.12.01.05                     | COMP 49 | COMP | Fornecimento e instalacao de Quadro de distribuição ar condicionado (qdac 1), para 30 modulos dim barramento 3f+n+t de 150a - fabricação especial                           | und | 1,00 |  |  |  | 2493,88  | R\$ - R\$ - |
| 02.12.01.06                     | COMP 52 | COMP | Fornecimento e instalacao de Quadro de distribuição cme (qdf-cme), para 20 modulos dim barramento 3f+n+t de 300a - fabricação especial                                      | und | 1,00 |  |  |  | 3222,78  | R\$ - R\$ - |
| 02.12.01.07                     | COMP 53 | COMP | Fornecimento e instalacao de Quadro de distribuição geral de baixa tensão (qgbt-trafo 1) para 42 modulos barramento 3f+n 1200a +t de 900a. - fabricação especial            | und | 1,00 |  |  |  | 45350,57 | R\$ - R\$ - |
| 02.12.01.08                     | COMP 59 | COMP | Fornecimento e instalacao de Quadro de distribuição it (qdgit), para 12 modulos dim barramento 3f+n+t de 150a - fabricação especial                                         | und | 1,00 |  |  |  | 344,32   | R\$ - R\$ - |
| 02.12.01.09                     | COMP 55 | COMP | Fornecimento e instalação de quadro automático de comando da bóia e bomba 3/4CV completo                                                                                    | und | 2,00 |  |  |  | 1396,09  | R\$ - R\$ - |

| 02.12.02 CAIXAS DE PASSAGEM / ATERRAMENTO |         |       |                                                                                                                                                                                              |     |      |  |  |  |        |             |
|-------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--------|-------------|
| 02.12.02.01                               | 150615  | IOPES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm     | und | 3,00 |  |  |  | 147,47 | R\$ - R\$ - |
| 02.12.02.02                               | 150623  | IOPES | Caixa de passagem 4x2", chapa 18                                                                                                                                                             | und | 2,00 |  |  |  | 7,24   | R\$ - R\$ - |
| 02.12.02.03                               | 150630  | IOPES | Caixa de passagem 4x4", chapa 18                                                                                                                                                             | und | 2,00 |  |  |  | 8,43   | R\$ - R\$ - |
| 02.12.02.04                               | 150632  | IOPES | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada                                                                                                                               | und | 4,00 |  |  |  | 54,00  | R\$ - R\$ - |
| 02.12.02.05                               | 150633  | IOPES | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada                                                                                                                              | und | 1,00 |  |  |  | 81,89  | R\$ - R\$ - |
| 02.12.02.06                               | 150635  | IOPES | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada                                                                                                                              | und | 1,00 |  |  |  | 138,41 | R\$ - R\$ - |
| 02.12.02.07                               | 150610  | IOPES | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 5,00 |  |  |  | 178,25 | R\$ - R\$ - |
| 02.12.02.08                               | COMP 27 | COMP  | Fornecimento e instalacao de Caixa de passagem, em alumínio fundido com anel de vedação, com dimensões de 300x300x100mm                                                                      | und | 2,00 |  |  |  | 287,04 | R\$ - R\$ - |



|             |          |        |                                                                                                                                                                                                 |     |      |  |  |  |        |     |   |     |   |
|-------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| 02.12.02.09 | COMP 28  | COMP   | Fornecimento e instalacao de Caixa de passagem, em alumínio fundido com anel de vedação, com dimensões de 400x400x150                                                                           | und | 2,00 |  |  |  | 422,06 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.02.10 | COMP 29  | COMP   | Fornecimento e instalacao de Caixa de passagem, em alumínio fundido com anel de vedação, com dimensões de 150x150x100                                                                           | und | 1,00 |  |  |  | 92,44  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.02.11 | COMP 30  | COMP   | Fornecimento e instalacao de Caixa de passagem, em alumínio fundido com anel de vedação, com dimensões de 250x250x150                                                                           | und | 2,00 |  |  |  | 275,19 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.02.12 | 150632   | IOPES  | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada                                                                                                                                  | und | 1,00 |  |  |  | 54,00  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.02.13 | 150634   | IOPES  | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada                                                                                                                                 | und | 3,00 |  |  |  | 107,91 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.02.14 | 150635   | IOPES  | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada                                                                                                                                 | und | 1,00 |  |  |  | 138,41 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.02.15 | COMP 130 | COMP   | Caixa de passagem metálica, dimensões 500x500x150mm                                                                                                                                             | und | 2,00 |  |  |  | 304,68 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.02.16 | COMP 131 | COMP   | Caixa de passagem metálica, dimensões 600x600x400mm                                                                                                                                             | und | 1,00 |  |  |  | 897,52 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.02.17 | COMP 110 | COMP   | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 60x60x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 2,00 |  |  |  | 413,29 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.02.18 | COMP 111 | COMP   | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 70x70x70cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 1,00 |  |  |  | 568,29 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.02.19 | 100562   | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019                                      | UN  | 1,00 |  |  |  | 276,86 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.02.20 | COMP 32  | COMP   | Caixa subterrânea de passagem em alvenaria (400x400x300)mm, (entrada banda larga) com tampa em ferro fundido                                                                                    | und | 1,00 |  |  |  | 224,98 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.02.21 | COMP 33  | COMP   | Caixa de distribuição em alvenaria (1070x520x500)mm, (r2) com tampa em ferro fundido, padronizada                                                                                               | und | 1,00 |  |  |  | 557,41 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.02.22 | 100563   | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019                                                  | UN  | 1,00 |  |  |  | 395,95 | R\$ | - | R\$ | - |

| 02.12.03    |        |        | INSTALAÇÕES APARENTES                                                                                                                   |     |       |  |  |  |       |     |   |     |   |
|-------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|-------|-----|---|-----|---|
| 02.12.03.01 | 150803 | IOPES  | Caixa de ligação de alumínio sílcio, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"               | und | 29,00 |  |  |  | 23,25 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.02 | 95796  | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P     | UN  | 6,00  |  |  |  | 39,23 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.03 | 95797  | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P | UN  | 1,00  |  |  |  | 49,48 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.04 | 150804 | IOPES  | Caixa de ligação de alumínio sílcio, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"              | und | 19,00 |  |  |  | 21,62 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.05 | 95789  | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P    | UN  | 4,00  |  |  |  | 33,32 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.06 | 150805 | IOPES  | Caixa de ligação de alumínio sílcio, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato X, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"               | und | 17,00 |  |  |  | 23,49 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.07 | 95802  | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P     | UN  | 4,00  |  |  |  | 41,84 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.08 | 95805  | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016             | UN  | 28,00 |  |  |  | 21,02 | R\$ | - | R\$ | - |



|             |          |        |                                                                                                                                                                                                         |     |        |  |  |  |       |     |   |     |   |
|-------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|-------|-----|---|-----|---|
| 02.12.03.09 | 95806    | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016                                                                               | UN  | 5,00   |  |  |  | 21,65 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.10 | 150836   | IOPES  | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa                                                                                                                            | m   | 125,08 |  |  |  | 86,32 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.11 | 96563    | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF 07/2017 | M   | 16,68  |  |  |  | 17,03 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.12 | COMP 199 | COMP   | Condulete fixo em PVC com tampa, Tipo C, diâmetro 1". Tudo incluído.                                                                                                                                    | und | 18,00  |  |  |  | 30,14 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.13 | COMP 200 | COMP   | Condulete fixo em PVC com tampa, Tipo C, diâmetro 3/4". Tudo incluído.                                                                                                                                  | und | 23,00  |  |  |  | 27,41 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.14 | COMP 201 | COMP   | Condulete fixo em PVC com ø de eletroduto indicado em planta, com 01 (uma) tomada 2P+T. Tudo incluído.                                                                                                  | und | 1,00   |  |  |  | 49,24 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.15 | COMP 202 | COMP   | Condulete fixo em PVC com ø de eletroduto indicado em planta, com 02 (duas) tomadas 2P+T. Tudo incluído.                                                                                                | UND | 1,00   |  |  |  | 65,38 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.16 | COMP 203 | COMP   | Condulete fixo em PVC com ø de eletroduto indicado em planta, com 01 (um) interruptor paralelo. Tudo incluído.                                                                                          | und | 1,00   |  |  |  | 42,56 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.17 | COMP 204 | COMP   | Condulete fixo em PVC com ø de eletroduto indicado em planta, com 01 (um) interruptor dimmer. Tudo incluído.                                                                                            | und | 2,00   |  |  |  | 83,82 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.18 | 95782    | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P                                                                          | UN  | 6,00   |  |  |  | 31,88 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.19 | 95785    | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P                                                                 | UN  | 1,00   |  |  |  | 36,11 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.20 | 95785    | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P                                                                 | UN  | 6,00   |  |  |  | 36,11 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.21 | COMP 80  | COMP   | Condulete em alumínio fundido com tampa, Tipo C ø32mm (1"), tudo incluído.                                                                                                                              | und | 4,00   |  |  |  | 31,56 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.22 | COMP 208 | COMP   | Condulete em alumínio fundido com tampa, Tipo E ø40mm (1.1/4"), tudo incluído.                                                                                                                          | UND | 2,00   |  |  |  | 61,05 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.23 | COMP 207 | COMP   | Condulete em alumínio fundido com tampa, Tipo C ø60mm (2"), tudo incluído.                                                                                                                              | UND | 1,00   |  |  |  | 75,34 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.24 | 95809    | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016                                                                              | UN  | 1,00   |  |  |  | 26,96 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.25 | COMP 205 | COMP   | Condulete fixo em PVC com ø de eletroduto indicado em planta, com 01 (uma) tomada RJ-45. Tudo incluído.                                                                                                 | und | 1,00   |  |  |  | 67,22 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.03.26 | COMP 206 | COMP   | Condulete fixo em PVC com ø de eletroduto indicado em planta, com espelho com 01(um) furo para passagem de cabo câmera de CFTV. Tudo incluído.                                                          | und | 3,00   |  |  |  | 35,07 | R\$ | - | R\$ | - |

| 02.12.04    |          |       | ELETRODUTOS E CONEXÕES                                                      |   |        |  |  |      |        |     |   |     |   |
|-------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|------|--------|-----|---|-----|---|
| 02.12.04.01 | 151126   | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões    | m | 685,46 |  |  |      | 13,85  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.04.02 | 151127   | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões      | m | 279,52 |  |  |      | 20,56  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.04.03 | 151128   | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões  | m | 104,47 |  |  |      | 24,85  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.04.04 | 151130   | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões      | m | 62,40  |  |  |      | 37,17  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.04.05 | COMP 134 | COMP  | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2 1/2" (75mm), inclusive conexões. | m | 8,19   |  |  |      | 60,61  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.04.06 | 151131   | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões      | m | 7,06   |  |  |      | 65,86  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.04.07 | 151135   | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 4" (110mm), inclusive conexões     | m | 8,19   |  |  |      | 89,50  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.04.08 | 151136   | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 6" (164mm), inclusive conexões     | m | 8,19   |  |  | 0,00 | 165,94 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.04.09 | 151141   | IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente    | m | 18,07  |  |  |      | 47,03  | R\$ | - | R\$ | - |



|             |          |        |                                                                                                                          |     |      |  |  |        |     |   |     |   |
|-------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| 02.12.04.10 | COMP 128 | COMP   | Eletroduto de ferro galvanizado DN 4" , inclusive conexões, exclusive escavação e reaterro, fornecimento e assentamento. | m   | 5,36 |  |  | 137,63 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.04.11 | COMP 122 | COMP   | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.             | und | 3,00 |  |  | 371,36 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.04.12 | COMP 209 | COMP   | Fornecimento e instalação de cruzeta de madeira 2,40 - seção 90x112,5mm                                                  | und | 1,00 |  |  | 386,58 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.04.13 | 100862   | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020  | UN  | 3,00 |  |  | 39,06  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.04.14 | COMP 210 | COMP   | Fornecimento e instalação de Chave fusível classe 25kv - 100A                                                            | und | 2,00 |  |  | 511,76 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.04.15 | COMP 133 | COMP   | Para-raio de distribuicao em corpo polimerico de ZNO, para 15Kv/10Ka. Fornecimento e instalacao. Tudo incluído.          | und | 2,00 |  |  | 258,79 | R\$ | - | R\$ | - |

|                 |          |                     |                                                                                                                                 |   |          |  |  |        |     |   |     |   |
|-----------------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| <b>02.12.05</b> |          | <b>FIOS E CABOS</b> |                                                                                                                                 |   |          |  |  |        |     |   |     |   |
| 02.12.05.01     | 91926    | SINAPI              | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 4.287,12 |  |  | 3,48   | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.05.02     | 91928    | SINAPI              | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | M | 746,24   |  |  | 5,57   | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.05.03     | 91930    | SINAPI              | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | M | 147,38   |  |  | 7,61   | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.05.04     | 91932    | SINAPI              | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | M | 842,49   |  |  | 12,43  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.05.05     | 91934    | SINAPI              | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | M | 472,08   |  |  | 18,98  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.05.06     | 96972    | SINAPI              | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017                               | M | 3,11     |  |  | 38,62  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.05.07     | COMP 135 | COMP                | Cabo de cobre nú, seção de 6.0 mm2                                                                                              | m | 1,98     |  |  | 12,43  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.05.08     | 91929    | SINAPI              | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | M | 2.000,41 |  |  | 6,27   | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.05.09     | 91931    | SINAPI              | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | M | 76,52    |  |  | 8,43   | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.05.10     | 91933    | SINAPI              | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 14,12    |  |  | 13,23  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.05.11     | 92984    | SINAPI              | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015        | M | 570,90   |  |  | 22,07  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.05.12     | 92986    | SINAPI              | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015        | M | 241,69   |  |  | 29,73  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.05.13     | 92994    | SINAPI              | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015       | M | 193,69   |  |  | 96,83  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.05.14     | 92990    | SINAPI              | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015        | M | 167,43   |  |  | 56,82  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.05.15     | 93000    | SINAPI              | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015       | M | 193,69   |  |  | 191,70 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.12.05.16     | 151435   | IOPES               | Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x2,5mm2                                                             | m | 107,01   |  |  | 13,52  | R\$ | - | R\$ | - |

02.13

SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGA ATMOSFÉRICAS (SPDA)



|          |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |     |        |  |  |  |        |     |   |     |   |
|----------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| 02.13.01 | 160304   | IOPES | Pára-raios tipo franklin incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraceadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores                           | und | 1,00   |  |  |  | 660,56 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.13.02 | 160317   | IOPES | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente                                                                                                                                     | m   | 100,80 |  |  |  | 60,74  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.13.03 | 160318   | IOPES | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente                                                                                                                                     | m   | 599,14 |  |  |  | 42,79  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.13.04 | COMP 219 | COMP  | Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h = 30 cm                                                                                                                                                            | und | 41,00  |  |  |  | 30,93  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.13.05 | 160319   | IOPES | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente                                             | und | 530,00 |  |  |  | 9,56   | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.13.06 | 160303   | IOPES | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm                                                                                                                     | und | 9,00   |  |  |  | 283,94 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.13.07 | 160316   | IOPES | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro                                                                                    | und | 8,00   |  |  |  | 87,11  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.13.08 | 160325   | IOPES | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1,00   |  |  |  | 431,47 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.13.09 | 160312   | IOPES | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicates Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente                                     | und | 1,00   |  |  |  | 37,45  | R\$ | - | R\$ | - |

|              |         |                      |                                                                                                                                             |     |          |  |  |  |       |     |   |     |   |
|--------------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|--|--|-------|-----|---|-----|---|
| <b>02.14</b> |         | <b>CFTV E LÓGICA</b> |                                                                                                                                             |     |          |  |  |  |       |     |   |     |   |
| 02.14.01     | COMP 62 | COMP                 | Leito para cabos em chapa de aço galvanizado #18, sem tampa largura 200 mm x altura 100 mm, instalação superior, fornecimento e instalação. | m   | 29,36    |  |  |  | 98,03 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.14.02     | COMP 64 | COMP                 | Fornecimento e instalação de Fita de cobre (10x0,1)mm para aterramento estático                                                             | m   | 49,98    |  |  |  | 29,16 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.14.03     | COMP 65 | COMP                 | Fornecimento e instalação de Placa de cobre (300x300x0,15)mm                                                                                | und | 1,00     |  |  |  | 62,79 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.14.04     | 98295   | SINAPI               | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019                                 | M   | 1.708,19 |  |  |  | 2,00  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.14.05     | COMP 61 | COMP                 | Cabo coaxial RG-59-75 ohms, fornecimento e instalação.                                                                                      | m   | 292,51   |  |  |  | 13,28 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.14.06     | 151127  | IOPES                | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões                                                                      | m   | 134,85   |  |  |  | 20,56 | R\$ | - | R\$ | - |

|                 |        |                               |                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |  |         |     |   |     |   |
|-----------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|---------|-----|---|-----|---|
| <b>02.15</b>    |        | <b>OUTRAS INSTALAÇÕES</b>     |                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |  |         |     |   |     |   |
| <b>02.15.01</b> |        | <b>INSTALAÇÃO DE TELEFONE</b> |                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |  |         |     |   |     |   |
| 02.15.01.01     | 160115 | IOPES                         | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares                                                                                                                                     | m   | 22,31 |  |  |  | 24,27   | R\$ | - | R\$ | - |
| <b>02.15.02</b> |        | <b>INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO</b> |                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |  |         |     |   |     |   |
| 02.15.02.01     | 160602 | IOPES                         | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 60x90x17cm, com suporte e mangueira 20m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45°/ 63mm | und | 1,00  |  |  |  | 1388,02 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.02.02     | 101905 | SINAPI                        | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P                                                                    | UN  | 3,00  |  |  |  | 176,65  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.02.03     | 101908 | SINAPI                        | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P                                                                                 | UN  | 3,00  |  |  |  | 171,44  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.02.04     | 160613 | IOPES                         | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal                                                                              | und | 2,00  |  |  |  | 204,00  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.02.05     | 141216 | IOPES                         | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 65mm (21/2")                                                                                                                             | m   | 66,11 |  |  |  | 181,28  | R\$ | - | R\$ | - |

|                 |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>02.15.03</b> |  | <b>SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|             |          |        |                                                                                                                                                                         |    |        |  |  |  |        |     |   |     |   |
|-------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| 02.15.03.01 | 97327    | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M  | 150,60 |  |  |  | 20,86  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.03.02 | 97328    | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M  | 239,30 |  |  |  | 35,17  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.03.03 | 97329    | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M  | 14,10  |  |  |  | 44,43  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.03.04 | 97330    | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M  | 62,00  |  |  |  | 54,28  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.03.05 | COMP 79i | COMP   | Tubo em cobre flexível, DN 3/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado, fornecimento e instalação.                                       | m  | 38,20  |  |  |  | 105,15 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.03.06 | COMP 79j | COMP   | Fornecimento e instalação de tubo de cobre para tubulação de ar condicionado com isolante flexível poliplex no diâmetro de 7/8", tudo incluído.                         | m  | 18,90  |  |  |  | 102,41 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.03.07 | COMP 79k | COMP   | Fornecimento e instalação de tubo de cobre para tubulação de ar condicionado com isolante flexível poliplex no diâmetro de 1 1/8", tudo incluído                        | m  | 16,10  |  |  |  | 131,59 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.03.08 | COMP 79r | COMP   | Fornecimento e instalação de duto flexível de alumínio, diâmetro 150mm, para exaustão de ar                                                                             | m  | 29,40  |  |  |  | 88,29  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.03.09 | COMP 79s | COMP   | Fornecimento e instalação de duto flexível de alumínio, diâmetro 400mm, para exaustão de ar                                                                             | m  | 7,50   |  |  |  | 104,67 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.03.10 | COMP 79t | COMP   | Fornecimento e instalação de duto de chapa galvanizada, espessura 0,64mm. Tudo incluído.                                                                                | m² | 64,48  |  |  |  | 106,32 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.03.11 | COMP 79u | COMP   | Fornecimento e instalação de duto de chapa galvanizada, espessura 0,80mm. Tudo incluído.                                                                                | m² | 3,38   |  |  |  | 148,64 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.03.12 | COMP 79w | COMP   | Fornecimento e instalação de duto de chapa galvanizada, espessura 1,55mm. Tudo incluído.                                                                                | m² | 28,24  |  |  |  | 325,91 | R\$ | - | R\$ | - |

| 02.15.04    |       | GASES MEDICINAIS |                                                                                                                                    |    |        |  |  |  |        |     |   |     |   |
|-------------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| 02.15.04.01 | 97341 | SINAPI           | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M  | 48,00  |  |  |  | 41,10  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.02 | 97335 | SINAPI           | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015               | M  | 38,00  |  |  |  | 60,37  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.03 | 97336 | SINAPI           | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015               | M  | 13,00  |  |  |  | 76,66  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.04 | 97337 | SINAPI           | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015               | M  | 42,00  |  |  |  | 115,05 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.05 | 92311 | SINAPI           | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 110,00 |  |  |  | 10,08  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.06 | 92287 | SINAPI           | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015               | UN | 30,00  |  |  |  | 13,81  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.07 | 92288 | SINAPI           | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015               | UN | 5,00   |  |  |  | 21,2   | R\$ | - | R\$ | - |



|             |          |        |                                                                                                                                                                           |     |       |  |  |  |       |     |   |     |   |
|-------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|-------|-----|---|-----|---|
| 02.15.04.08 | 92289    | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                      | UN  | 45,00 |  |  |  | 36,92 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.09 | 92317    | SINAPI | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                        | UN  | 35,00 |  |  |  | 13,68 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.10 | 92299    | SINAPI | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                      | UN  | 25,00 |  |  |  | 18,22 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.11 | 92300    | SINAPI | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                      | UN  | #REF! |  |  |  | 27,01 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.12 | 92301    | SINAPI | TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                      | UN  | 10,00 |  |  |  | 52,48 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.13 | 93051    | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016                                 | UN  | 10,00 |  |  |  | 8,29  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.14 | 93057    | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016                                 | UN  | 5,00  |  |  |  | 11,42 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.15 | 93062    | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016                                 | UN  | 3,00  |  |  |  | 21,02 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.16 | 93104    | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2016                       | UN  | 50,00 |  |  |  | 14,91 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.17 | 93088    | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2016                   | UN  | 20,00 |  |  |  | 18,68 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.18 | 92329    | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                          | UN  | 30,00 |  |  |  | 6,72  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.19 | 92330    | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                          | UN  | 35,00 |  |  |  | 11,16 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.20 | 92331    | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                          | UN  | 5,00  |  |  |  | 17,42 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.21 | 92295    | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                    | UN  | 20,00 |  |  |  | 24,05 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.22 | 100741   | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 | M2  | 32,00 |  |  |  | 20,78 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.23 | COMP 237 | COMP   | TÊ REDUÇÃO BOLSA x BOLSA x BOLSA ØN28 x ØN15mm - COBRE                                                                                                                    | und | 5,00  |  |  |  | 24,52 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.24 | COMP 238 | COMP   | TÊ REDUÇÃO BOLSA x BOLSA x BOLSA ØN22 x ØN15mm - COBRE                                                                                                                    | und | 20,00 |  |  |  | 23,52 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.25 | COMP 239 | COMP   | TÊ REDUÇÃO BOLSA x BOLSA x BOLSA ØN35 x ØN15mm - COBRE                                                                                                                    | und | 20,00 |  |  |  | 34,46 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.26 | COMP 240 | COMP   | TÊ REDUÇÃO BOLSA x BOLSA x BOLSA ØN35 x ØN22mm - COBRE                                                                                                                    | und | 15,00 |  |  |  | 36,35 | R\$ | - | R\$ | - |



|             |          |      |                                                                    |     |       |  |  |  |        |     |   |     |   |
|-------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| 02.15.04.27 | COMP 241 | COMP | TÊ REDUÇÃO BOLSA x BOLSA x BOLSA ØN35 x ØN28mm - COBRE             | und | 3,00  |  |  |  | 40,03  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.28 | COMP 242 | COMP | BUCHA DE REDUÇÃO PONTA x BOLSA ØN35 x ØN15mm - COBRE               | und | 10,00 |  |  |  | 29,63  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.29 | COMP 243 | COMP | BUCHA DE REDUÇÃO PONTA x BOLSA ØN35 x ØN22mm - COBRE               | und | 10,00 |  |  |  | 31,52  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.30 | COMP 246 | COMP | VÁLVULA ESFERA MONOBLOCO - ROSCA Ø1" - BSP FÊMEA - GÁS - COBRE     | und | 6,00  |  |  |  | 83,93  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.31 | COMP 247 | COMP | VÁLVULA ESFERA MONOBLOCO - ROSCA Ø3/4" - BSP FÊMEA - GÁS - COBRE   | und | 10,00 |  |  |  | 65,82  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.32 | COMP 248 | COMP | VÁLVULA ESFERA MONOBLOCO - ROSCA Ø1/2" - BSP FÊMEA - GÁS - COBRE   | und | 25,00 |  |  |  | 55,12  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.33 | COMP 249 | COMP | VÁLVULA ESFERA MONOBLOCO - ROSCA Ø1 1/4" - BSP FÊMEA - GÁS - COBRE | und | 3,00  |  |  |  | 129,15 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.34 | COMP 244 | COMP | CONECTOR RM BOLSA x ROSCA MACHO ØN28 x 1"-BRONZE - COBRE           | und | 12,00 |  |  |  | 22,48  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.15.04.35 | COMP 244 | COMP | CONECTOR RM BOLSA x ROSCA MACHO ØN28 x 1"-BRONZE - COBRE           | und | 6,00  |  |  |  | 22,48  | R\$ | - | R\$ | - |

| 02.16       |         |        | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS                                                                                                                                                                                                    |     |       |  |  |  |         |     |   |     |   |
|-------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|---------|-----|---|-----|---|
| 02.16.01    |         |        | LOUÇAS E METAIS                                                                                                                                                                                                               |     |       |  |  |  |         |     |   |     |   |
| 02.16.01.01 | 170128  | IOPES  | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referência DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive válvula, sifão e engates, exclusive torneira | und | 28,00 |  |  |  | 873,06  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.01.02 | 170117  | IOPES  | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira                                                                                  | und | 1,00  |  |  |  | 178,16  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.01.03 | 86872   | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                                                 | UN  | 1,00  |  |  |  | 666,31  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.01.04 | 100852  | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                                         | UN  | 7,00  |  |  |  | 193,33  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.01.05 | 86900   | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                                         | UN  | 1,00  |  |  |  | 176,65  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.01.06 | COMP 82 | COMP   | Fornecimento e instalação de Cuba de despejo redonda com sifão e tampa de aço inox AISI 304 marca Palmetal ou similar                                                                                                         | und | 1,00  |  |  |  | 1227,46 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.01.07 | 170353  | IOPES  | Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol                                                                                                                                   | und | 29,00 |  |  |  | 468,28  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.01.08 | 86914   | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                                                 | UN  | 1,00  |  |  |  | 37,80   | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.01.09 | 86909   | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                    | UN  | 8,00  |  |  |  | 97,15   | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.01.10 | 170309  | IOPES  | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol                                                                                                                                                     | und | 3,00  |  |  |  | 96,90   | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.01.11 | 95472   | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                               | UN  | 2,00  |  |  |  | 709,97  | R\$ | - | R\$ | - |





|             |        |        |                                                                                                                                                                      |     |      |  |  |  |        |     |   |     |   |
|-------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| 02.16.01.12 | 86932  | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN  | 9,00 |  |  |  | 433,50 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.01.13 | 170345 | IOPES  | Válvula de descarga com canopla cromada de 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol                                                                | und | 2,00 |  |  |  | 226,72 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.01.14 | 170519 | IOPES  | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol                                                       | und | 3,00 |  |  |  | 226,94 | R\$ | - | R\$ | - |

| 02.16.02    |          | APARELHOS |                                                                                                                           |     |       |  |  |  |        |     |   |     |   |
|-------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| 02.16.02.01 | 100860   | SINAPI    | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                  | UN  | 6,00  |  |  |  | 82,91  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.02.02 | 89354    | SINAPI    | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN  | 6,00  |  |  |  | 236,44 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.02.03 | 170524   | IOPES     | Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca                    | und | 5,00  |  |  |  | 71,58  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.02.04 | COMP 125 | COMP      | Ralo sifonado em PVC com grelha cromada. Fornecimento e instalação.                                                       | und | 12,00 |  |  |  | 34,30  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.02.05 | 100868   | SINAPI    | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020      | UN  | 19,00 |  |  |  | 227,2  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.02.06 | 95544    | SINAPI    | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                               | UN  | 11,00 |  |  |  | 34,25  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.02.07 | 95547    | SINAPI    | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML., INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020    | UN  | 29,00 |  |  |  | 72,35  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.02.08 | COMP 16  | COMP      | Fornecimento e instalação de toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado.                            | und | 29,00 |  |  |  | 74,97  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.02.09 | 100849   | SINAPI    | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                    | UN  | 11,00 |  |  |  | 32,81  | R\$ | - | R\$ | - |

| 02.16.03    |          | BANCADAS |                                                                                                                                 |    |       |  |  |  |        |     |   |     |   |
|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| 02.16.03.01 | COMP 106 | COMP     | Bancada em aço inox com enchimento de concreto armado leve (espessura de 3cm), largura de 60 cm conforme projeto, tudo incluído | m  | 12,75 |  |  |  | 922,58 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.03.02 | 170220   | IOPES    | Bancada de granito com espessura de 2 cm                                                                                        | m2 | 1,67  |  |  |  | 332,70 | R\$ | - | R\$ | - |

| 02.16.04    |       | REGISTROS E RESERVATÓRIOS |                                                                                                                                                                                     |    |       |  |  |  |        |     |   |     |   |
|-------------|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| 02.16.04.01 | 89972 | SINAPI                    | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                  | UN | 55,00 |  |  |  | 47,37  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.04.02 | 94495 | SINAPI                    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016     | UN | 15,00 |  |  |  | 73,96  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.04.03 | 94496 | SINAPI                    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5,00  |  |  |  | 90,36  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.04.04 | 94497 | SINAPI                    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 14,00 |  |  |  | 105,82 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.04.05 | 94498 | SINAPI                    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016     | UN | 6,00  |  |  |  | 136,46 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.04.06 | 94799 | SINAPI                    | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016                                                                                         | UN | 9,00  |  |  |  | 79,61  | R\$ | - | R\$ | - |



|             |          |       |                                                                                                                                  |     |      |  |  |         |     |   |     |   |
|-------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|---------|-----|---|-----|---|
| 02.16.04.07 | 170528   | IOPES | Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia     | und | 3,00 |  |  | 3408,34 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.16.04.08 | COMP 104 | COMP  | Reservatório de fibra de vidro de 10.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 6,00 |  |  | 4507,95 | R\$ | - | R\$ | - |

| 02.17 APARELHOS ELÉTRICOS |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |  |  |        |     |   |     |   |
|---------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| 02.17.01 LUMINÁRIAS       |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |  |  |        |     |   |     |   |
| 02.17.01.01               | 180110  | IOPES | Arandela com lâmpada incandescente de 100W                                                                                                                                                                                                                              | und | 13,00 |  |  | 93,38  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.01.02               | COMP 86 | COMP  | Fornecimento e instalacao de Luminária a led de embutir, 20x20cm com corpo em chapa de aço com pintura microtexturizada na cor branca e difusor em poliestireno translucido 18w marca Lumicenter ou similar                                                             | und | 31,00 |  |  | 92,31  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.01.03               | COMP 87 | COMP  | Fornecimento e instalacao de Luminária a led de embutir, 30x30cm com corpo em chapa de aço com pintura microtexturizada na cor branca e difusor em poliestireno translucido 48w marca Lumicenter ou similar                                                             | und | 67,00 |  |  | 220,84 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.01.04               | COMP 88 | COMP  | Fornecimento e instalacao de Luminária a led de sobrepor com suporte para instalação em perfilado com corpo em aço laminado a frio, refletor em chapa de aço com pintura branca microtexturizada e difusor em policarbonato texturizado 18w marca Lumicenter ou similar | und | 4,00  |  |  | 98,22  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.01.05               | COMP 89 | COMP  | Fornecimento e instalacao de Luminária a led de sobrepor com corpo em policarbonato injetado, com difusores em policarbonato transparente microtexturizado (prismático) 18w                                                                                             | und | 6,00  |  |  | 146,41 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.01.06               | COMP 91 | COMP  | Fornecimento e instalacao de Luminária a led de embutir, com refletores em aluminio alto brilho combinados com difusores em policarbonato texturizado, com proteção em vidro temperado transparente e vedação através de borracha 48w Lumicenter ou similar             | und | 8,00  |  |  | 276,07 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.01.07               | COMP 92 | COMP  | Fornecimento e instalacao de Luminária a led com iluminação difusa e antiofuscante 48w marca Lumicenter ou similar                                                                                                                                                      | und | 9,00  |  |  | 199,21 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.01.08               | COMP 93 | COMP  | Fornecimento e instalacao de Luminária na parede-arandela p/lâmpada led 20w (luz vigia), em caixa 4"x2" de pvc amarelo                                                                                                                                                  | und | 8,00  |  |  | 110,51 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.01.09               | COMP 94 | COMP  | Fornecimento e instalacao de Luminária a led de embutir, com corpo em aluminio, aro de acabamento em policarbonato injetado na cor branca e difusor em poliestireno translucido 18w marca Lumicenter ou similar                                                         | und | 17,00 |  |  | 80,46  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.01.10               | COMP 95 | COMP  | Fornecimento e instalacao de Luminária a led de embutir, com fecho orientável orbital, corpo em aluminio com pintura microtexturizada cor branca marca Lumicenter ou similar                                                                                            | und | 3,00  |  |  | 167,81 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.01.11               | COMP 96 | COMP  | Fornecimento e instalacao de Luminária de embutir para lampada incandescente 100w                                                                                                                                                                                       | und | 4,00  |  |  | 108,20 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.01.12               | 160613  | IOPES | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal                                                                                                                                                          | und | 16,00 |  |  | 204,00 | R\$ | - | R\$ | - |

| 02.17.02 INTERRUPTORES E TOMADAS |        |        |                                                                                                                                     |     |        |  |  |       |     |   |     |   |
|----------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|-------|-----|---|-----|---|
| 02.17.02.01                      | 180201 | IOPES  | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"                                           | und | 155,00 |  |  | 28,79 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.02.02                      | 91953  | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                         | UN  | 34,00  |  |  | 25,91 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.02.03                      | 91959  | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                        | UN  | 4,00   |  |  | 41,02 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.02.04                      | 91955  | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                        | UN  | 8,00   |  |  | 32,07 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.02.05                      | 180207 | IOPES  | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 2,00   |  |  | 44,86 | R\$ | - | R\$ | - |



|             |           |        |                                                                                                                                                                                   |     |       |  |  |        |     |   |     |   |
|-------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| 02.17.02.06 | 180211    | IOPES  | Interruptor de três teclas simples 10 A/250 V e duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x4"                                                                                      | und | 2,00  |  |  | 95,66  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.02.07 | 180220    | IOPES  | Tomada coaxial 75 ohms para TV                                                                                                                                                    | und | 2,00  |  |  | 24,62  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.02.08 | COMP 112  | COMP   | Fornecimento e instalação de caixa 4x2" de PVC, com 02(dois) interruptores paralelos (tree-way), incluindo suporte e placa.                                                       | und | 1,00  |  |  | 61,97  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.02.09 | COMP 113  | COMP   | Fornecimento e instalação de caixa 4"x2" de PVC, com 02(dois) interruptores paralelos (four-way), incluindo suporte e placa.                                                      | und | 1,00  |  |  | 61,97  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.02.10 | COMP 114  | COMP   | Fornecimento e instalação de caixa 4"x2" de PVC, com 01(um) interruptor paralelo (tree-way) e 01(um) interruptor simples, incluindo suporte e placa.                              | und | 1,00  |  |  | 55,84  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.02.11 | COMP 115  | COMP   | Fornecimento e instalação de caixa 4"x2" de PVC, com 01(um) interruptor dimmer, incluindo suporte e placa.                                                                        | und | 1,00  |  |  | 108,47 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.02.12 | COMP 116  | COMP   | Fornecimento e instalação de caixa 4"x2" de PVC, com 01(um) interruptor dimmer e 01(um) interruptor simples e 01 (um) interruptor paralelo (tree way), incluindo suporte e placa. | und | 1,00  |  |  | 147,57 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.02.13 | COMP 117  | COMP   | Fornecimento e instalação de caixa 4"x2" de PVC, com 01(um) interruptor dimmer e 02 (dois) interruptor paralelo (tree way), incluindo suporte e placa.                            | und | 1,00  |  |  | 153,74 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.02.14 | 92025     | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                              | UN  | 1,00  |  |  | 65,93  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.02.15 | 92008     | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                 | UN  | 2,00  |  |  | 43,93  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.02.16 | COMP 118  | COMP   | Fornecimento e instalação de caixa 4"x4" de PVC, com 05(cinco) interruptor simples, incluindo suporte e placa.                                                                    | und | 1,00  |  |  | 115,01 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.02.17 | COMP 119  | COMP   | Fornecimento e instalação de caixa 4"x4" de PVC, com 01 (uma) tomada 2p+t, incluindo suporte e placa.                                                                             | und | 2,00  |  |  | 51,39  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.02.18 | 150612    | IOPES  | Caixa de passagem em chapa de aço galvanizada 4" x 4", com tampa parafusada                                                                                                       | und | 2,00  |  |  | 32,29  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.02.19 | COMP 120a | COMP   | Fornecimento e instalação de caixa 4"x2" de PVC, com espelho para 01(uma) tomada rj-45, incluindo suporte e placa.                                                                | und | 22,00 |  |  | 66,82  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.02.20 | COMP 121  | COMP   | Fornecimento e instalação de caixa 4"x2" de PVC, com espelho com furo para passagem de cabo câmera cftv, incluindo suporte e placa.                                               | und | 3,00  |  |  | 21,87  | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.02.21 | COMP 120b | COMP   | Fornecimento e instalação de caixa 4"x4" de PVC, com espelho para 02(duas) tomadas rj-45, incluindo suporte e placa.                                                              | und | 18,00 |  |  | 112,41 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.17.02.22 | 150629    | IOPES  | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"                                                                                                                              | und | 1,00  |  |  | 12,63  | R\$ | - | R\$ | - |

| 02.18    |          | CHAMADA DE ENFERMAGEM |                                                                                                                                                                                                         |     |        |  |  |         |     |   |     |   |
|----------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|---------|-----|---|-----|---|
| 02.18.01 | COMP 256 | COMP                  | Central de atendimento de posto de enfermagem de sobrepor para até 6 enfermarias com painel sonoro e luminoso, como indica COES nos números das enfermarias fixadas.                                    | und | 1,00   |  |  | 3154,84 | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.18.02 | 91834    | SINAPI                | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                               | M   | 85,09  |  |  | 7,51    | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.18.03 | 91854    | SINAPI                | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                              | M   | 30,00  |  |  | 8,47    | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.18.04 | COMP 223 | COMP                  | Eletrocalha perfurada em aço galvanizada tipo "U", 50x50mm, sem tampa.                                                                                                                                  | m   | 21,70  |  |  | 86,13   | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.18.05 | 96563    | SINAPI                | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF 07/2017 | M   | 21,70  |  |  | 17,03   | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.18.06 | 151405   | IOPES                 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2                                                                                                                         | m   | 460,36 |  |  | 14,78   | R\$ | - | R\$ | - |
| 02.18.07 | COMP 252 | COMP                  | Réguas R1 - gases (ver projeto)                                                                                                                                                                         | und | 1,00   |  |  | 1745,28 | R\$ | - | R\$ | - |



|                                            |          |        |                                                                                                                                                            |     |          |          |  |          |         |     |   |     |           |
|--------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|--|----------|---------|-----|---|-----|-----------|
| 02.18.08                                   | COMP 253 | COMP   | Régua R2 - gases (ver projeto)                                                                                                                             | und | 10,00    |          |  |          | 1036,79 | R\$ | - | R\$ | -         |
| 02.18.09                                   | COMP 254 | COMP   | Régua R3 - gases (ver projeto)                                                                                                                             | und | 2,00     |          |  |          | 1757,13 | R\$ | - | R\$ | -         |
| 02.18.10                                   | COMP 255 | COMP   | Régua R4 - gases (ver projeto)                                                                                                                             | und | 1,00     |          |  |          | 1161,29 | R\$ | - | R\$ | -         |
| 02.18.11                                   | COMP 224 | COMP   | Posto de Gases Medicinais - Oxigênio                                                                                                                       | und | 5,00     |          |  |          | 169,52  | R\$ | - | R\$ | -         |
| 02.18.12                                   | COMP 225 | COMP   | Posto de Gases Medicinais - Ar Comprimido                                                                                                                  | und | 5,00     |          |  |          | 169,52  | R\$ | - | R\$ | -         |
| 02.18.13                                   | COMP 226 | COMP   | Posto de Gases Medicinais - Óxido nítrico                                                                                                                  | und | 1,00     |          |  |          | 169,52  | R\$ | - | R\$ | -         |
| 02.18.14                                   | COMP 227 | COMP   | Posto de Gases Medicinais - Vácuo                                                                                                                          | und | 1,00     |          |  |          | 169,52  | R\$ | - | R\$ | -         |
| 02.18.15                                   | COMP 228 | COMP   | Painel de alarme para rede de gases - Ar comprimido                                                                                                        | und | 1,00     |          |  |          | 579,00  | R\$ | - | R\$ | -         |
| 02.18.16                                   | COMP 229 | COMP   | Painel de alarme para rede de gases - Oxigênio                                                                                                             | und | 1,00     |          |  |          | 579,00  | R\$ | - | R\$ | -         |
| 02.18.17                                   | COMP 230 | COMP   | Painel de alarme para rede de gases - Vácuo                                                                                                                | und | 1,00     |          |  |          | 579,00  | R\$ | - | R\$ | -         |
| 02.18.18                                   | COMP 231 | COMP   | Painel de alarme para rede de gases - Vácuo                                                                                                                | und | 1,00     |          |  |          | 579,00  | R\$ | - | R\$ | -         |
|                                            |          |        |                                                                                                                                                            |     |          |          |  |          |         |     |   |     |           |
| <b>03 EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO</b>          |          |        |                                                                                                                                                            |     |          |          |  |          |         |     |   |     |           |
| <b>03.01 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>         |          |        |                                                                                                                                                            |     |          |          |  |          |         |     |   |     |           |
| 03.01.01                                   | 30103    | IOPES  | Escavação mecânica em material de 1a. categoria                                                                                                            | m3  | 47,79    | 38,59    |  | 38,59    | 9,12    | R\$ | - | R\$ | 351,94    |
| 03.01.02                                   | 93382    | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016                                                                                            | M3  | 32,79    | 31,52    |  | 31,52    | 29,22   | R\$ | - | R\$ | 921,01    |
| 03.01.03                                   | 100575   | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019                                                                                                | M2  | 240,62   | 240,62   |  | 240,62   | 0,09    | R\$ | - | R\$ | 21,66     |
|                                            |          |        |                                                                                                                                                            |     |          |          |  |          |         |     |   |     |           |
| <b>03.02 ESTRUTURAS</b>                    |          |        |                                                                                                                                                            |     |          |          |  |          |         |     |   |     |           |
| <b>03.02.01 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)</b> |          |        |                                                                                                                                                            |     |          |          |  |          |         |     |   |     |           |
| 03.02.01.01                                | 96616    | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017                                                                          | M3  | 1,29     | 1,29     |  | 1,29     | 486,34  | R\$ | - | R\$ | 627,38    |
| 03.02.01.02                                | 40331    | IOPES  | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)    | m3  | 16,10    | 14,52    |  | 14,52    | 420,36  | R\$ | - | R\$ | 6.103,63  |
| 03.02.01.03                                | 96544    | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                            | KG  | 65,00    | 65,00    |  | 65       | 14,99   | R\$ | - | R\$ | 974,35    |
| 03.02.01.04                                | 96545    | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                              | KG  | 252,39   | 252,39   |  | 252,39   | 13,65   | R\$ | - | R\$ | 3.445,12  |
| 03.02.01.05                                | 96546    | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                             | KG  | 126,58   | 126,58   |  | 126,58   | 12,01   | R\$ | - | R\$ | 1.520,23  |
| 03.02.01.06                                | 96547    | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                           | KG  | 786,58   | 781,56   |  | 781,56   | 10,08   | R\$ | - | R\$ | 7.878,12  |
| 03.02.01.07                                | 96543    | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                               | KG  | 169,92   | 168,75   |  | 168,75   | 16,53   | R\$ | - | R\$ | 2.789,44  |
| 03.02.01.08                                | 96533    | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017                                     | M2  | 125,00   | 125,00   |  | 125      | 105,82  | R\$ | - | R\$ | 13.227,50 |
|                                            |          |        |                                                                                                                                                            |     |          |          |  |          |         |     |   |     |           |
| <b>03.02.02 SUPER-ESTRUTURA</b>            |          |        |                                                                                                                                                            |     |          |          |  |          |         |     |   |     |           |
| 03.02.02.01                                | 40331    | IOPES  | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)    | m3  | 68,9     | 68,90    |  | 68,90    | 420,36  | R\$ | - | R\$ | 28.962,80 |
| 03.02.02.02                                | 92784    | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG  | 447,00   | 447,00   |  | 447,00   | 14,33   | R\$ | - | R\$ | 6.405,51  |
| 03.02.02.03                                | 92785    | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG  | 992,00   | 992,00   |  | 992,00   | 13,30   | R\$ | - | R\$ | 13.193,60 |
| 03.02.02.04                                | 92786    | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG  | 1.183,00 | 1.173,70 |  | 1.173,70 | 12,30   | R\$ | - | R\$ | 14.436,51 |



|             |       |        |                                                                                                                                                                         |    |        |        |  |        |        |     |   |     |           |
|-------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--|--------|--------|-----|---|-----|-----------|
| 03.02.02.05 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  | KG | 194,00 | 194,00 |  | 194,00 | 13,85  | R\$ | - | R\$ | 686,90    |
| 03.02.02.06 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  | KG | 74,00  | 74     |  | 74,00  | 12,93  | R\$ | - | R\$ | 956,82    |
| 03.02.02.07 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  | KG | 39,00  | 38,87  |  | 38,87  | 12,06  | R\$ | - | R\$ | 468,77    |
| 03.02.02.08 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 98,00  | 96,01  |  | 96,01  | 10,75  | R\$ | - | R\$ | 1.032,11  |
| 03.02.02.09 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 880,00 | 863,47 |  | 863,47 | 9,06   | R\$ | - | R\$ | 7.823,04  |
| 03.02.02.10 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020  | M2 | 94,00  | 87,85  |  | 87,85  | 64,94  | R\$ | - | R\$ | 5.704,98  |
| 03.02.02.11 | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020                                  | M2 | 222,00 | 222    |  | 222,00 | 42,42  | R\$ | - | R\$ | 9.417,24  |
| 03.02.02.12 | 92452 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020                              | M2 | 115,00 | 115    |  | 115,00 | 125,04 | R\$ | - | R\$ | 14.379,60 |
| 03.02.02.13 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018                                                                                              | M2 | 121,85 | 104,87 |  | 104,87 | 30,02  | R\$ | - | R\$ | 3.148,20  |

|              |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>03.03</b> | <b>PAREDES E PAINÉIS</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|          |       |        |                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |        |        |        |     |           |     |           |
|----------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| 03.03.01 | 87489 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 | M2 | 330,58 | 299,83 |        | 299,83 | 45,18  | R\$ | -         | R\$ | 13.546,32 |
| 03.03.02 | 96367 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF 06/2017 P                                                              | M2 | 444,00 | 310,39 | 132,25 | 442,64 | 128,49 | R\$ | 16.992,80 | R\$ | 56.874,81 |
| 03.03.03 | 96372 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF 06/2017                                                                                                                                              | M2 | 444,00 | 310,39 | 132,25 | 442,64 | 19,32  | R\$ | 2.555,07  | R\$ | 8.551,80  |
| 03.03.04 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016                                                                                                                                      | M  | 8,40   | 8,4    |        | 8,40   | 81,7   | R\$ | -         | R\$ | 686,28    |
| 03.03.05 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016                                                                                                                                  | M  | 24,00  | 24     |        | 24,00  | 93,02  | R\$ | -         | R\$ | 2.232,48  |
| 03.03.06 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016                                                                                                                            | M  | 8,40   | 8,4    |        | 8,40   | 79,59  | R\$ | -         | R\$ | 668,56    |
| 03.03.07 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016                                                                                                                        | M  | 24,00  | 24     |        | 24,00  | 88,95  | R\$ | -         | R\$ | 2.134,80  |
| 03.03.08 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016                                                                                                                                       | M  | 2,60   |        |        | 0,00   | 75,69  | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 03.03.09 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016                                                                                                                                   | M  | 7,10   | 4,7    |        | 4,70   | 93,62  | R\$ | -         | R\$ | 440,01    |

|              |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>03.04</b> | <b>ESQUADRIAS</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                 |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>03.04.01</b> | <b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                        |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |        |        |         |     |           |     |           |
|----------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|-----|-----------|-----|-----------|
| 03.04.01.01                            | COMP 07   | COMP   | Porta de abrir de uma folha em madeira, com acabamento melamínico, inclusive marcos, alizares e fechadura, dim.: 0,80 x 2,10 m, inclusive chapa em aço inox, conforme projeto. Tudo incluído.                                                                              | und | 14,00  |        |        |        | 1096,8  | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 03.04.01.02                            | COMP 100a | COMP   | Porta de correr em madeira de lei, com acabamento melamínico, inclusive marcos, alizares e fechadura, inclusive chapa em aço inox, conforme projeto. Tudo incluído.                                                                                                        | m²  | 10,50  |        |        |        | 848,08  | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 03.04.01.03                            | COMP 10   | COMP   | Porta de abrir de duas folhas em madeira de lei, com acabamento melamínico, com visor nas dim. 0,54 x 0,69 m, inclusive marcos, alizares e fechadura, dim.: 1,60 x 2,10 m, conforme projeto. Tudo incluído.                                                                | und | 2,00   |        |        |        | 2082,98 | R\$ | -         | R\$ | -         |
| <b>03.04.02 ESQUADRIAS METÁLICAS</b>   |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |        |        |         |     |           |     |           |
| 03.04.02.01                            | COMP 234  | COMP   | Janela em alumínio anodizado cor branca, vidro liso 6mm: de correr. Completa.                                                                                                                                                                                              | m2  | 14,00  |        | 12,6   | 12,60  | 1133,86 | R\$ | 14.286,64 | R\$ | 14.286,64 |
| 03.04.02.02                            | COMP 236  | COMP   | Janela em alumínio anodizado cor branca, vidro liso 6mm: maxim-ar. Completa.                                                                                                                                                                                               | m2  | 4,20   |        | 4,2    | 4,20   | 983,04  | R\$ | 4.128,77  | R\$ | 4.128,77  |
| 03.04.02.04                            | COMP 251  | COMP   | Janela em alumínio anodizado cor branca, fixa com vidro. Completa.                                                                                                                                                                                                         | m2  | 2,80   |        | 2,8    | 2,80   | 322,26  | R\$ | 902,33    | R\$ | 902,33    |
| <b>03.04.03 ESQUADRIAS DE VIDRO</b>    |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |        |        |         |     |           |     |           |
| 03.04.03.01                            | COMP 98   | COMP   | Porta de abrir, uma folha, em vidro temperado espessura de 10mm, com dimensões 0,80x2,10m, conforme especificações em projeto, tudo incluído.                                                                                                                              | und | 1,00   |        |        |        | 1480,63 | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 03.04.03.02                            | COMP 99   | COMP   | Porta de correr, uma folha, em vidro temperado espessura de 10mm, com dimensões 0,80x2,10m, conforme especificações em projeto, tudo incluído.                                                                                                                             | und | 1,00   |        |        |        | 1015,25 | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 03.04.03.03                            | COMP 107c | COMP   | Painel de vidro temperado liso, espessura 10mm, nas dimensões 4,70 x 2,50 m, composto por porta de abrir dimensões 1,60 x 2,10m, duas folhas, em vidro temperado, fixada no painel de vidro, conforme especificações em projeto. Fornecimento e instalação, tudo incluído. | und | 1,00   |        |        |        | 7388,36 | R\$ | -         | R\$ | -         |
| <b>03.05 COBERTURA</b>                 |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |        |        |         |     |           |     |           |
| <b>03.05.01 ESTRUTURA PARA TELHADO</b> |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |        |        |         |     |           |     |           |
| 03.05.01.01                            | 92543     | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019                                                                                        | M2  | 240,00 | 230,26 |        | 230,26 | 22,13   | R\$ | -         | R\$ | 5.095,65  |
| <b>03.05.02 TELHADO</b>                |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |        |        |         |     |           |     |           |
| 03.05.02.01                            | COMP 222  | COMP   | Cumeeira para telha metálica ondulada, incluso acessórios de fixação e içamento                                                                                                                                                                                            | m   | 18,00  | 17,17  |        | 17,17  | 63,74   | R\$ | -         | R\$ | 1.094,42  |
| 03.05.02.02                            | 94213     | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                                                             | M2  | 240,00 | 230,26 |        | 230,26 | 87,49   | R\$ | -         | R\$ | 20.145,45 |
| 03.05.02.03                            | COMP 211  | COMP   | Fornecimento e instalação de cobertura de policarbonato cristal e estrutura metálica. Tudo incluído.                                                                                                                                                                       | m²  | 44,80  |        |        |        | 114,97  | R\$ | -         | R\$ | -         |
| <b>03.05.03 RUFOS E CALHAS</b>         |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |        |        |         |     |           |     |           |
| 03.05.03.01                            | 100327    | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019                                                                                                                                                                   | M   | 19,53  | 19,53  |        | 19,53  | 48,22   | R\$ | -         | R\$ | 941,74    |
| 03.05.03.02                            | 94228     | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019                                                                                                                                                             | M   | 26,88  |        |        |        | 73,02   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| <b>03.06 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>         |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |        |        |         |     |           |     |           |
| 03.06.01                               | 98557     | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018                                                                                                                                                                                                 | M2  | 269,69 |        |        |        | 30,02   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| <b>03.07 TETOS E FORROS</b>            |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |        |        |         |     |           |     |           |
| 03.07.01                               | 96114     | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P                                                                                                                                                                                  | M2  | 212,94 |        | 212,93 |        | 59,53   | R\$ | 12.675,72 | R\$ | -         |



| 03.08       |          |        | ACABAMENTOS                                                                                                                                                                                |    |        |        |        |        |        |     |           |     |           |
|-------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| 03.08.01    |          |        | ACABAMENTOS INTERNOS                                                                                                                                                                       |    |        |        |        |        |        |     |           |     |           |
| 03.08.01.01 | 87879    | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                   | M2 | 330,58 | 330,58 |        | 330,58 | 3,49   | R\$ | -         | R\$ | 1.153,72  |
| 03.08.01.02 | 110302   | IOPES  | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm                                                                              | m2 | 327,59 | 314,48 |        | 314,48 | 52,85  | R\$ | -         | R\$ | 16.620,27 |
| 03.08.01.03 | 120301   | IOPES  | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm                                                                         | m2 | 34,16  | 28,37  |        | 28,37  | 27,28  | R\$ | -         | R\$ | 773,93    |
| 03.08.01.04 | COMP 123 | COMP   | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 33x58cm, ref. Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | m² | 116,19 |        | 116,19 | 116,19 | 57,54  | R\$ | 6.685,57  | R\$ | 6.685,57  |
| 03.08.01.05 | 88786    | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014                       | M2 | 1,44   |        | 1,33   | 1,33   | 276,07 | R\$ | 367,17    | R\$ | 367,17    |
| 03.08.01.06 | COMP 216 | COMP   | Fornecimento e instalação de revestimento melamínico brilhante, na cor verde, contornado por perfil de alumínio. Tudo incluído.                                                            | m² | 0,88   |        |        | 0,00   | 130,11 | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 03.08.01.07 | COMP 218 | COMP   | Fornecimento e instalação de protetor de paredes bate macas em PVC, altura 20cm, ref.: TEC 200, marca Tecnoperfil, ou similar, fixado com parafuso e bucha plástica. Tudo incluído.        | m  | 42,11  |        |        | 0,00   | 200,05 | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 03.08.02    |          |        | ACABAMENTOS EXTERNOS                                                                                                                                                                       |    |        |        |        |        |        |     |           |     |           |
| 03.08.02.01 | 87905    | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014           | M2 | 330,58 | 330,58 |        | 330,58 | 7,77   | R\$ | -         | R\$ | 2.568,61  |
| 03.08.02.02 | 110302   | IOPES  | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm                                                                              | m2 | 251,11 | 237,47 |        | 237,47 | 52,85  | R\$ | -         | R\$ | 12.550,29 |
| 03.08.02.03 | 120301   | IOPES  | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm                                                                         | m2 | 79,47  | 76,48  |        | 76,48  | 27,28  | R\$ | -         | R\$ | 2.086,37  |
| 03.08.02.04 | COMP 18  | COMP   | Fornecimento e assentamento de Moisaico linha All Bricks 7x26cm Ref.: Yorkshire Light marca Portobello ou similar                                                                          | m² | 52,60  |        | 38,01  | 38,01  | 284,54 | R\$ | 10.815,37 | R\$ | 10.815,37 |
| 03.08.02.05 | COMP 19  | COMP   | Fornecimento e assentamento de Porcelanato 20x120cm REF.: Araucária clara marca Portobello ou similar                                                                                      | m² | 24,92  |        | 24,48  | 24,48  | 132,81 | R\$ | 3.251,19  | R\$ | 3.251,19  |
| 03.08.02.06 | COMP 20  | COMP   | Fornecimento e assentamento de Moldura em EPS, conforme projeto                                                                                                                            | m  | 39,00  |        | 19,5   | 19,50  | 47,90  | R\$ | 934,05    | R\$ | 934,05    |
| 03.09       |          |        | PINTURA                                                                                                                                                                                    |    |        |        |        |        |        |     |           |     |           |
| 03.09.01    | 88497    | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                   | M2 | 527,33 |        | 527,33 | 527,33 | 15,28  | R\$ | 8.057,60  | R\$ | 8.057,60  |
| 03.09.02    | 88496    | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                      | M2 | 212,94 |        | 212,93 | 212,93 | 26,89  | R\$ | 5.725,69  | R\$ | 5.725,69  |
| 03.09.03    | 96130    | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017                                                                                                     | M2 | 251,11 |        |        | 0,00   | 19,91  | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 03.09.04    | 88488    | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                      | M2 | 212,94 |        | 212,93 | 212,93 | 15,05  | R\$ | 3.204,60  | R\$ | 3.204,60  |
| 03.09.05    | 88489    | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                   | M2 | 778,44 |        | 531,99 | 531,99 | 13,23  | R\$ | 7.038,23  | R\$ | 7.038,23  |
| 03.10       |          |        | PISOS INTERNOS E EXTERNOS                                                                                                                                                                  |    |        |        |        |        |        |     |           |     |           |
| 03.10.01    |          |        | LASTRO DE CONTRAPISO                                                                                                                                                                       |    |        |        |        |        |        |     |           |     |           |
| 03.10.01.01 | 130103   | IOPES  | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5. espessura 3cm                                                                               | m2 | 248,64 | 231,02 |        | 231,02 | 19,17  | R\$ | -         | R\$ | 4.428,65  |



|                                                                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |        |        |        |     |           |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| 03.10.01.02                                                               | 97113   | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017                                                                                                                                                         | M2  | 213,04 | 213,04 |        | 213,04 | 1,66   | R\$ | -         | R\$ | 353,65    |
| 03.10.01.03                                                               | 94997   | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016                                                                                   | M2  | 41,77  |        | 35,73  | 35,73  | 94,44  | R\$ | 3.374,34  | R\$ | 3.374,34  |
| <b>03.10.02 ACABAMENTOS</b>                                               |         |        |                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |        |        |        |     |           |     |           |
| 03.10.02.01                                                               | 87261   | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014                                                                                             | M2  | 23,80  |        | 23,8   | 23,80  | 127,60 | R\$ | 3.036,88  | R\$ | 3.036,88  |
| 03.10.02.02                                                               | 87262   | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014                                                                                         | M2  | 50,60  |        | 50,6   | 50,60  | 113,82 | R\$ | 5.759,29  | R\$ | 5.759,29  |
| 03.10.02.03                                                               | 87263   | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014                                                                                            | M2  | 174,24 |        | 138,53 | 138,53 | 105,23 | R\$ | 14.577,51 | R\$ | 14.577,51 |
| <b>03.10.03 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |        |        |        |     |           |     |           |
| 03.10.03.01                                                               | 98689   | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                         | M   | 24,10  |        |        |        | 52,98  | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 03.10.03.02                                                               | 101965  | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                                            | M   | 1,40   | 1,40   |        | 1,40   | 99,41  | R\$ | -         | R\$ | 139,17    |
| 03.10.03.03                                                               | 88650   | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014                                                                                                                                      | M   | 243,89 |        |        |        | 11,66  | R\$ | -         | R\$ | -         |
| <b>03.11 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>                                 |         |        |                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |        |        |        |     |           |     |           |
| <b>03.11.01 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA</b>       |         |        |                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |        |        |        |     |           |     |           |
| 03.11.01.01                                                               | COMP 15 | COMP   | Caixa de areia 40x40x40cm em alvenaria                                                                                                                                                                                                 | und | 2,00   |        |        |        | 90,06  | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 03.11.01.02                                                               | 98109   | SINAPI | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020                               | UN  | 1,00   |        |        | 0,00   | 711,61 | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 03.11.01.03                                                               | 141110  | IOPES  | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 2,00   |        |        | 0,00   | 598,34 | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 03.11.01.04                                                               | 141112  | IOPES  | Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm | und | 1,00   |        |        |        | 645,17 | R\$ | -         | R\$ | -         |
| <b>03.11.02 REDE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA PLUVIAL - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC</b> |         |        |                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |        |        |        |     |           |     |           |
| 03.11.02.01                                                               | 141409  | IOPES  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões                                                                                                                                                              | m   | 10,00  | 5,20   |        | 5,20   | 16,52  | R\$ | -         | R\$ | 85,90     |
| 03.11.02.02                                                               | 141410  | IOPES  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões                                                                                                                                                              | m   | 165,89 | 158,75 |        | 158,75 | 18,92  | R\$ | -         | R\$ | 3.003,55  |
| 03.11.02.03                                                               | 141411  | IOPES  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões                                                                                                                                                                | m   | 28,95  | 28,95  |        | 28,95  | 25,89  | R\$ | -         | R\$ | 749,52    |
| 03.11.02.04                                                               | 141413  | IOPES  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (1 1/2"), inclusive conexões                                                                                                                                                            | m   | 37,43  |        | 16     | 16,00  | 37,24  | R\$ | 595,84    | R\$ | 595,84    |
| 03.11.02.05                                                               | 141414  | IOPES  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões                                                                                                                                                                | m   | 3,95   |        |        | 0,00   | 53,19  | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 03.11.02.06                                                               | 141415  | IOPES  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (2 1/2"), inclusive conexões                                                                                                                                                            | m   | 3,49   |        |        | 0,00   | 79,64  | R\$ | -         | R\$ | -         |





|                                                      |          |        |                                                                                                                                                                                      |     |       |       |       |         |     |        |     |          |
|------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|---------|-----|--------|-----|----------|
| 03.11.02.07                                          | 89578    | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014                                                              | M   | 23,02 | 16    | 16,00 | 45,96   | R\$ | -      | R\$ | 735,36   |
| 03.11.02.08                                          | 89580    | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014                                                              | M   | 1,05  |       | 0,00  | 91,11   | R\$ | -      | R\$ | -        |
| 03.11.02.09                                          | 90696    | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 06/2015 | M   | 12,56 |       | 0,00  | 102,86  | R\$ | -      | R\$ | -        |
| 03.11.02.10                                          | COMP 13  | COMP   | Execução de dreno com tubos de PVC corrugado flexível perfurado - DN 100                                                                                                             | m   | 6,51  |       | 0,00  | 30,87   | R\$ | -      | R\$ | -        |
| <b>03.11.04 REDE DE ÁGUA QUENTE - TUBOS AQUATERM</b> |          |        |                                                                                                                                                                                      |     |       |       |       |         |     |        |     |          |
| 03.11.04.01                                          | 89633    | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014                                                                       | M   | 1,98  |       |       | 21,14   | R\$ | -      | R\$ | -        |
| 03.11.04.02                                          | 89634    | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014                                                                       | M   | 7,44  |       |       | 32,09   | R\$ | -      | R\$ | -        |
| 03.11.04.03                                          | 89635    | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014                                                                       | M   | 7,44  |       |       | 45,82   | R\$ | -      | R\$ | -        |
| <b>03.11.05 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC</b>        |          |        |                                                                                                                                                                                      |     |       |       |       |         |     |        |     |          |
| 03.11.05.01                                          | 89711    | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014                                                | M   | 20,46 | 9,2   | 9,20  | 18,05   | R\$ | -      | R\$ | 166,06   |
| 03.11.05.02                                          | 89712    | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014                                                | M   | 58,24 | 6,55  | 19,7  | 26,25   | R\$ | 533,67 | R\$ | 711,11   |
| 03.11.05.03                                          | 89713    | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014                                                | M   | 20,93 |       | 7,18  | 7,18    | R\$ | 294,16 | R\$ | 294,16   |
| 03.11.05.04                                          | 89714    | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014                                               | M   | 52,31 | 19,37 | 17,07 | 69,38   | R\$ | 887,64 | R\$ | 3.607,76 |
| <b>03.11.06 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS</b>         |          |        |                                                                                                                                                                                      |     |       |       |       |         |     |        |     |          |
| 03.11.06.01                                          | 142107   | IOPES  | Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC                                                                                                                                       | und | 3,00  |       |       | 45,66   | R\$ | -      | R\$ | -        |
| 03.11.06.02                                          | 142111   | IOPES  | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox                                                                                                 | und | 5,00  |       |       | 99,22   | R\$ | -      | R\$ | -        |
| 03.11.06.03                                          | COMP 36  | COMP   | Fornecimento e instalacao de Ralo Linear 50 cm Inox fabr. Tigre                                                                                                                      | und | 2,00  |       |       | 164,12  | R\$ | -      | R\$ | -        |
| 03.11.06.04                                          | COMP 109 | COMP   | Ralo sifonado de ferro fundido, 150x150mm. Fornecimento e instalação.                                                                                                                | und | 2,00  |       |       | 58,01   | R\$ | -      | R\$ | -        |
| 03.11.06.05                                          | COMP 105 | COMP   | Ralo semi-esférico tipo abacaxi, diâm. 150mm, tudo incluído                                                                                                                          | und | 2,00  |       |       | 53,15   | R\$ | -      | R\$ | -        |
| 03.11.06.06                                          | 141109   | IOPES  | Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de cantoneira de 1" x 3/16"                                         | m   | 12,09 |       |       | 166,31  | R\$ | -      | R\$ | -        |
| <b>03.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                   |          |        |                                                                                                                                                                                      |     |       |       |       |         |     |        |     |          |
| <b>03.12.01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>               |          |        |                                                                                                                                                                                      |     |       |       |       |         |     |        |     |          |
| 03.12.01.01                                          | COMP 45  | COMP   | Fornecimento e instalacao de Quadro de distribuição luz e força (qdlf-6), para 30 modulos dim barramento 2f+n+t + barra de neutro dr separada de 150a - fabricação especial          | und | 1,00  |       |       | 9298,77 | R\$ | -      | R\$ | -        |
| <b>03.12.02 CAIXAS DE PASSAGEM / ATERRAMENTO</b>     |          |        |                                                                                                                                                                                      |     |       |       |       |         |     |        |     |          |



|             |          |        |                                                                                                                                                                                                 |     |      |  |  |  |        |     |   |     |   |
|-------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| 03.12.02.01 | 150615   | IOPES  | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm        | und | 2,00 |  |  |  | 147,47 | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.12.02.02 | 150623   | IOPES  | Caixa de passagem 4x2", chapa 18                                                                                                                                                                | und | 1,00 |  |  |  | 7,24   | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.12.02.03 | 150630   | IOPES  | Caixa de passagem 4x4", chapa 18                                                                                                                                                                | und | 1,00 |  |  |  | 8,43   | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.12.02.04 | 150632   | IOPES  | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada                                                                                                                                  | und | 2,00 |  |  |  | 54,00  | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.12.02.05 | 150633   | IOPES  | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada                                                                                                                                 | und | 1,00 |  |  |  | 81,89  | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.12.02.06 | 150635   | IOPES  | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada                                                                                                                                 | und | 1,00 |  |  |  | 138,41 | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.12.02.07 | 150610   | IOPES  | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm    | und | 2,00 |  |  |  | 178,25 | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.12.02.08 | COMP 27  | COMP   | Fornecimento e instalacao de Caixa de passagem, em alumínio fundido com anel de vedação, com dimensões de 300x300x100mm                                                                         | und | 1,00 |  |  |  | 287,04 | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.12.02.09 | COMP 28  | COMP   | Fornecimento e instalacao de Caixa de passagem, em alumínio fundido com anel de vedação, com dimensões de 400x400x150                                                                           | und | 1,00 |  |  |  | 422,06 | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.12.02.10 | COMP 29  | COMP   | Fornecimento e instalacao de Caixa de passagem, em alumínio fundido com anel de vedação, com dimensões de 150x150x100                                                                           | und | 1,00 |  |  |  | 92,44  | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.12.02.11 | COMP 30  | COMP   | Fornecimento e instalacao de Caixa de passagem, em alumínio fundido com anel de vedação, com dimensões de 250x250x150                                                                           | und | 1,00 |  |  |  | 275,19 | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.12.02.12 | 150632   | IOPES  | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada                                                                                                                                  | und | 1,00 |  |  |  | 54,00  | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.12.02.13 | 150634   | IOPES  | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada                                                                                                                                 | und | 2,00 |  |  |  | 107,91 | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.12.02.14 | 150635   | IOPES  | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada                                                                                                                                 | und | 1,00 |  |  |  | 138,41 | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.12.02.15 | COMP 130 | COMP   | Caixa de passagem metálica, dimensões 500x500x150mm                                                                                                                                             | und | 1,00 |  |  |  | 304,68 | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.12.02.16 | COMP 131 | COMP   | Caixa de passagem metálica, dimensões 600x600x400mm                                                                                                                                             | und | 1,00 |  |  |  | 897,51 | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.12.02.17 | COMP 110 | COMP   | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 60x60x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 1,00 |  |  |  | 413,29 | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.12.02.18 | COMP 111 | COMP   | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 70x70x70cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 1,00 |  |  |  | 568,29 | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.12.02.19 | 100562   | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019                                      | UN  | 1,00 |  |  |  | 276,86 | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.12.02.20 | COMP 32  | COMP   | Caixa subterrânea de passagem em alvenaria (400x400x300)mm, (entrada banda larga) com tampa em ferro fundido                                                                                    | und | 1,00 |  |  |  | 224,98 | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.12.02.21 | COMP 33  | COMP   | Caixa de distribuição em alvenaria (1070x520x500)mm, (r2) com tampa em ferro fundido, padronizada                                                                                               | und | 1,00 |  |  |  | 557,41 | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.12.02.22 | 100563   | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019                                                  | UN  | 1,00 |  |  |  | 395,95 | R\$ | - | R\$ | - |

| 03.12.03    |        |        | INSTALAÇÕES APARENTES                                                                                                               |     |       |  |  |  |   |       |     |   |     |   |
|-------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|---|-------|-----|---|-----|---|
| 03.12.03.01 | 150803 | IOPES  | Caixa de ligação de alumínio sílicio, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"          | und | 12,00 |  |  |  | 0 | 23,25 | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.12.03.02 | 95796  | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P | UN  | 3,00  |  |  |  | 0 | 39,23 | R\$ | - | R\$ | - |



|             |          |        |                                                                                                                                                                                                         |     |       |      |  |      |       |     |   |     |          |
|-------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--|------|-------|-----|---|-----|----------|
| 03.12.03.03 | 95797    | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                                                                 | UN  | 1,00  |      |  | 0    | 49,48 | R\$ | - | R\$ | -        |
| 03.12.03.04 | 150804   | IOPES  | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"                                                                             | und | 8,00  |      |  | 0    | 21,62 | R\$ | - | R\$ | -        |
| 03.12.03.05 | 95789    | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                                                                    | UN  | 2,00  |      |  | 0    | 33,32 | R\$ | - | R\$ | -        |
| 03.12.03.06 | 150805   | IOPES  | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato X, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"                                                                              | und | 7,00  |      |  | 0    | 23,49 | R\$ | - | R\$ | -        |
| 03.12.03.07 | 95802    | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                                                                     | UN  | 2,00  |      |  | 0    | 41,84 | R\$ | - | R\$ | -        |
| 03.12.03.08 | 95805    | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016                                                                             | UN  | 12,00 |      |  | 0    | 21,02 | R\$ | - | R\$ | -        |
| 03.12.03.09 | 95806    | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016                                                                               | UN  | 2,00  |      |  | 0    | 21,65 | R\$ | - | R\$ | -        |
| 03.12.03.10 | 150836   | IOPES  | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa                                                                                                                            | m   | 51,50 | 51,5 |  | 51,5 | 86,32 | R\$ | - | R\$ | 4.445,48 |
| 03.12.03.11 | 96563    | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M   | 6,87  | 6,87 |  | 6,87 | 17,03 | R\$ | - | R\$ | 117,00   |
| 03.12.03.12 | COMP 199 | COMP   | Condulete fixo em PVC com tampa, Tipo C, diâmetro 1". Tudo incluído.                                                                                                                                    | und | 8,00  |      |  | 0    | 30,14 | R\$ | - | R\$ | -        |
| 03.12.03.13 | COMP 200 | COMP   | Condulete fixo em PVC com tampa, Tipo C, diâmetro 3/4". Tudo incluído.                                                                                                                                  | und | 10,00 |      |  | 0    | 27,41 | R\$ | - | R\$ | -        |
| 03.12.03.14 | COMP 201 | COMP   | Condulete fixo em PVC com ø de eletroduto indicado em planta, com 01 (uma) tomada 2P+T. Tudo incluído.                                                                                                  | und | 1,00  |      |  | 0    | 49,24 | R\$ | - | R\$ | -        |
| 03.12.03.15 | COMP 202 | COMP   | Condulete fixo em PVC com ø de eletroduto indicado em planta, com 02 (duas) tomadas 2P+T. Tudo incluído.                                                                                                | UND | 1,00  |      |  | 0    | 65,38 | R\$ | - | R\$ | -        |
| 03.12.03.16 | COMP 203 | COMP   | Condulete fixo em PVC com ø de eletroduto indicado em planta, com 01 (um) interruptor paralelo. Tudo incluído.                                                                                          | und | 1,00  |      |  | 0    | 42,56 | R\$ | - | R\$ | -        |
| 03.12.03.17 | COMP 204 | COMP   | Condulete fixo em PVC com ø de eletroduto indicado em planta, com 01 (um) interruptor dimmer. Tudo incluído.                                                                                            | und | 1,00  |      |  | 0    | 83,82 | R\$ | - | R\$ | -        |
| 03.12.03.18 | 95782    | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                                                                          | UN  | 3,00  |      |  | 0    | 31,88 | R\$ | - | R\$ | -        |
| 03.12.03.19 | 95785    | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                                                                 | UN  | 1,00  |      |  | 0    | 36,11 | R\$ | - | R\$ | -        |
| 03.12.03.20 | 95781    | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                                                                     | UN  | 3,00  |      |  | 0    | 30,68 | R\$ | - | R\$ | -        |
| 03.12.03.21 | COMP 80  | COMP   | Condulete em alumínio fundido com tampa, Tipo C ø32mm (1"), tudo incluído.                                                                                                                              | und | 2,00  |      |  | 0    | 31,56 | R\$ | - | R\$ | -        |
| 03.12.03.22 | COMP 208 | COMP   | Condulete em alumínio fundido com tampa, Tipo E ø40mm (1.1/4"), tudo incluído.                                                                                                                          | UND | 1,00  |      |  | 0    | 61,05 | R\$ | - | R\$ | -        |
| 03.12.03.23 | COMP 207 | COMP   | Condulete em alumínio fundido com tampa, Tipo C ø60mm (2"), tudo incluído.                                                                                                                              | UND | 1,00  |      |  | 0    | 75,34 | R\$ | - | R\$ | -        |
| 03.12.03.24 | 95809    | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016                                                                              | UN  | 1,00  |      |  | 0    | 26,96 | R\$ | - | R\$ | -        |
| 03.12.03.25 | COMP 205 | COMP   | Condulete fixo em PVC com ø de eletroduto indicado em planta, com 01 (uma) tomada RJ-45. Tudo incluído.                                                                                                 | und | 1,00  |      |  | 0    | 67,22 | R\$ | - | R\$ | -        |
| 03.12.03.26 | COMP 206 | COMP   | Condulete fixo em PVC com ø de eletroduto indicado em planta, com espelho com 01(um) furo para passagem de cabo câmera de CFTV. Tudo incluído.                                                          | und | 2,00  |      |  | 0    | 35,07 | R\$ | - | R\$ | -        |



| 03.12.04    |          |        | ELETRODUTOS E CONEXÕES                                                                                                          |   |          |  |  |      |        |     |   |     |                                                                                     |   |
|-------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|--|------|--------|-----|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 03.12.04.01 | 151126   | IOPES  | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões                                                        | m | 282,23   |  |  | 0    | 13,85  | R\$ | - | R\$ |  | - |
| 03.12.04.02 | 151127   | IOPES  | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões                                                          | m | 115,09   |  |  | 0    | 20,56  | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |
| 03.12.04.03 | 151128   | IOPES  | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões                                                      | m | 43,01    |  |  | 0    | 24,85  | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |
| 03.12.04.04 | 151130   | IOPES  | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões                                                          | m | 25,69    |  |  | 0    | 37,17  | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |
| 03.12.04.05 | COMP 134 | COMP   | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2 1/2" (75mm), inclusive conexões.                                                     | m | 3,37     |  |  | 0    | 60,61  | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |
| 03.12.04.06 | 151131   | IOPES  | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões                                                          | m | 2,91     |  |  | 0    | 65,86  | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |
| 03.12.04.07 | 151135   | IOPES  | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 4" (110mm), inclusive conexões                                                         | m | 3,37     |  |  | 0    | 89,50  | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |
| 03.12.04.08 | 151136   | IOPES  | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 6" (164mm), inclusive conexões                                                         | m | 3,37     |  |  | 0    | 165,94 | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |
| 03.12.04.09 | 151141   | IOPES  | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente                                                        | m | 7,44     |  |  | 0    | 47,03  | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |
| 03.12.04.10 | COMP 128 | COMP   | Eletroduto de ferro galvanizado DN 4" , inclusive conexões, exclusive escavação e reaterro, fornecimento e assentamento.        | m | 2,21     |  |  | 0    | 137,63 | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |
| 03.12.05    |          |        | FIOS E CABOS                                                                                                                    |   |          |  |  |      |        |     |   |     |                                                                                     |   |
| 03.12.05.01 | 91926    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 1.765,17 |  |  | 0,00 | 3,48   | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |
| 03.12.05.02 | 91928    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | M | 307,25   |  |  | 0,00 | 5,57   | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |
| 03.12.05.03 | 91930    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | M | 60,68    |  |  |      | 7,61   | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |
| 03.12.05.04 | 91932    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | M | 346,88   |  |  |      | 12,43  | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |
| 03.12.05.05 | 91934    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | M | 194,37   |  |  |      | 18,98  | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |
| 03.12.05.06 | 96972    | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017                               | M | 1,28     |  |  |      | 38,62  | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |
| 03.12.05.07 | COMP 135 | COMP   | Cabo de cobre nú, seção de 6.0 mm2                                                                                              | m | 0,81     |  |  |      | 12,43  | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |
| 03.12.05.08 | 91929    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | M | 823,65   |  |  |      | 6,27   | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |
| 03.12.05.09 | 91931    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | M | 31,50    |  |  |      | 8,43   | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |
| 03.12.05.10 | 91933    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 5,81     |  |  |      | 13,23  | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |
| 03.12.05.11 | 92984    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015        | M | 235,06   |  |  |      | 22,07  | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |
| 03.12.05.12 | 92986    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015        | M | 99,51    |  |  |      | 29,73  | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |
| 03.12.05.13 | 92994    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015       | M | 79,75    |  |  |      | 96,83  | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |
| 03.12.05.14 | 92990    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015        | M | 68,94    |  |  |      | 56,82  | R\$ | - | R\$ |                                                                                     | - |



|                                                     |          |        |                                                                                                                                                                                                 |     |        |        |      |        |         |     |          |              |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------|--------|---------|-----|----------|--------------|
| 03.12.05.15                                         | 93000    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                       | M   | 79,75  |        |      | 191,70 | R\$     | -   | R\$      | -            |
| 03.12.05.16                                         | 151435   | IOPES  | Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x2,5mm²                                                                                                                             | m   | 44,06  |        |      | 13,52  | R\$     | -   | R\$      | -            |
| 03.13 SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGA ATMOSFÉRICAS (SPDA) |          |        |                                                                                                                                                                                                 |     |        |        |      |        |         |     |          |              |
| 03.13.01                                            | 160304   | IOPES  | Pára-raios tipo franklin incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores | und | 1,00   |        |      | 0,00   | 660,56  | R\$ | -        | R\$ -        |
| 03.13.02                                            | 160317   | IOPES  | Cabo de cobre nú 50mm², ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente                                                                                                          | m   | 41,50  |        | 41,5 | 41,50  | 60,74   | R\$ | 2.520,71 | R\$ 2.520,71 |
| 03.13.03                                            | 160318   | IOPES  | Cabo de cobre nú 35mm², ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente                                                                                                          | m   | 246,69 |        | 69,4 | 69,40  | 42,79   | R\$ | 2.969,63 | R\$ 2.969,63 |
| 03.13.04                                            | COMP 219 | COMP   | Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h = 30 cm                                                                                                                                 | und | 17,00  |        |      | 0,00   | 30,93   | R\$ | -        | R\$ -        |
| 03.13.05                                            | 160319   | IOPES  | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente                  | und | 218,00 |        |      | 0,00   | 9,56    | R\$ | -        | R\$ -        |
| 03.13.06                                            | 160303   | IOPES  | Aterramento com haste terra 5/8" x 2,40, cabo de cobre nu 6mm², inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm                                                                                          | und | 4,00   |        | 4    | 4,00   | 283,94  | R\$ | 1.135,76 | R\$ 1.135,76 |
| 03.13.07                                            | 160316   | IOPES  | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro                                                         | und | 4,00   |        |      | 0,00   | 87,11   | R\$ | -        | R\$ -        |
| 03.14 CFTV E LÓGICA                                 |          |        |                                                                                                                                                                                                 |     |        |        |      |        |         |     |          |              |
| 03.14.01                                            | COMP 62  | COMP   | Leito para cabos em chapa de aço galvanizado #18, sem tampa largura 200 mm x altura 100 mm, instalação superior, fornecimento e instalação.                                                     | m   | 12,09  |        |      |        | 98,03   | R\$ | -        | R\$ -        |
| 03.14.02                                            | COMP 64  | COMP   | Fornecimento e instalação de Fita de cobre (10x0,1)mm para aterramento estático                                                                                                                 | m   | 20,58  |        |      |        | 29,16   | R\$ | -        | R\$ -        |
| 03.14.03                                            | 98295    | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019                                                                                     | M   | 703,33 | 703,33 |      | 703,33 | 2,00    | R\$ | -        | R\$ 1.406,66 |
| 03.14.04                                            | COMP 61  | COMP   | Cabo coaxial RG-59-75 ohms, fornecimento e instalação.                                                                                                                                          | m   | 120,44 |        |      |        | 13,28   | R\$ | -        | R\$ -        |
| 03.14.05                                            | COMP 220 | COMP   | Path cord, categoria 5E, extensão de 2,50 m, fornecimento e instalação                                                                                                                          | und | 29,00  |        |      |        | 23,42   | R\$ | -        | R\$ -        |
| 03.14.06                                            | 151127   | IOPES  | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões                                                                                                                          | m   | 207,08 |        |      |        | 20,56   | R\$ | -        | R\$ -        |
| 03.14.07                                            | 151126   | IOPES  | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões                                                                                                                        | m   | 2,68   |        |      |        | 13,85   | R\$ | -        | R\$ -        |
| 03.15 OUTRAS INSTALAÇÕES                            |          |        |                                                                                                                                                                                                 |     |        |        |      |        |         |     |          |              |
| 03.15.01 OUTRAS INSTALAÇÕES                         |          |        |                                                                                                                                                                                                 |     |        |        |      |        |         |     |          |              |
| 03.15.01.01                                         | 160115   | IOPES  | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares                                                                                                                                         | m   | 9,18   |        |      |        | 24,27   | R\$ | -        | R\$ -        |
| 03.15.02 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO                     |          |        |                                                                                                                                                                                                 |     |        |        |      |        |         |     |          |              |
| 03.15.02.01                                         | 160602   | IOPES  | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 60x90x17cm, com suporte e mangueira 20m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm     | und | 1,00   |        |      |        | 1388,02 | R\$ | -        | R\$ -        |
| 03.15.02.02                                         | 101905   | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P                                                                        | UN  | 2,00   |        |      |        | 176,65  | R\$ | -        | R\$ -        |
| 03.15.02.03                                         | 101908   | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P                                                                                     | UN  | 2,00   |        |      |        | 171,44  | R\$ | -        | R\$ -        |
| 03.15.02.04                                         | 160613   | IOPES  | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal                                                                                  | und | 1,00   |        |      |        | 204,00  | R\$ | -        | R\$ -        |
| 03.15.02.05                                         | 141216   | IOPES  | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 65mm (21/2")                                                                                                                                 | m   | 27,22  |        |      |        | 181,28  | R\$ | -        | R\$ -        |



| 03.15.03    |          |        | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                       |     |       |      |      |        |        |     |          |              |
|-------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|--------|--------|-----|----------|--------------|
| 03.15.03.01 | 97327    | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                        | M   | 62,00 | 62   | 62   | 20,86  | R\$    | -   | R\$      | 1.293,32     |
| 03.15.03.02 | 97328    | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                       | M   | 98,60 | 98,6 | 98,6 | 35,17  | R\$    | -   | R\$      | 3.467,76     |
| 03.15.03.03 | 97329    | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                       | M   | 5,90  |      | 0    | 44,43  | R\$    | -   | R\$      | -            |
| 03.15.03.04 | 97330    | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                       | M   | 25,50 |      | 0    | 54,28  | R\$    | -   | R\$      | -            |
| 03.15.03.05 | COMP 79i | COMP   | Tubo em cobre flexível, DN 3/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado, fornecimento e instalação.                                                                                             | m   | 15,70 | 15,7 | 15,7 | 105,15 | R\$    | -   | R\$      | 1.650,86     |
| 03.15.03.06 | COMP 79j | COMP   | Fornecimento e instalação de tubo de cobre para tubulação de ar condicionado com isolante flexível poliplex no diâmetro de 7/8", tudo incluído.                                                                               | m   | 7,80  |      | 0    | 102,41 | R\$    | -   | R\$      | -            |
| 03.15.03.07 | COMP 79k | COMP   | Fornecimento e instalação de tubo de cobre para tubulação de ar condicionado com isolante flexível poliplex no diâmetro de 1 1/8", tudo incluído                                                                              | m   | 6,70  |      | 0    | 131,59 | R\$    | -   | R\$      | -            |
| 03.15.03.08 | COMP 79r | COMP   | Fornecimento e instalação de duto flexível de alumínio, diâmetro 150mm, para exaustão de ar                                                                                                                                   | m   | 12,10 |      | 0    | 88,29  | R\$    | -   | R\$      | -            |
| 03.15.03.09 | COMP 79s | COMP   | Fornecimento e instalação de duto flexível de alumínio, diâmetro 400mm, para exaustão de ar                                                                                                                                   | m   | 3,10  |      | 0    | 104,67 | R\$    | -   | R\$      | -            |
| 03.15.03.10 | COMP 79t | COMP   | Fornecimento e instalação de duto de chapa galvanizada, espessura 0,64mm. Tudo incluído.                                                                                                                                      | m²  | 29,46 |      | 0    | 106,32 | R\$    | -   | R\$      | -            |
| 03.15.03.11 | COMP 79v | COMP   | Fornecimento e instalação de duto de chapa galvanizada, espessura 1,11mm. Tudo incluído.                                                                                                                                      | m²  | 15,26 |      | 0    | 228,03 | R\$    | -   | R\$      | -            |
| 03.15.03.12 | COMP 79w | COMP   | Fornecimento e instalação de duto de chapa galvanizada, espessura 1,55mm. Tudo incluído.                                                                                                                                      | m²  | 15,23 |      | 0    | 325,91 | R\$    | -   | R\$      | -            |
| 03.15.03.13 | COMP 79x | COMP   | Fornecimento e instalação de duto de chapa galvanizada, espessura 1,95mm. Tudo incluído.                                                                                                                                      | m²  | 7,00  |      | 0    | 411,10 | R\$    | -   | R\$      | -            |
| 03.15.03.14 | COMP 79y | COMP   | Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado, diâm 6".                                                                                                                                                                | m   | 10,40 |      | 0    | 483,60 | R\$    | -   | R\$      | -            |
|             |          |        |                                                                                                                                                                                                                               |     |       |      |      |        |        |     |          |              |
| 03.16       |          |        | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS                                                                                                                                                                                                    |     |       |      |      |        |        |     |          |              |
| 03.16.01    |          |        | LOUÇAS E METAIS                                                                                                                                                                                                               |     |       |      |      |        |        |     |          |              |
| 03.16.01.01 | 170128   | IOPES  | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira | und | 6,00  |      | 5    | 5,00   | 873,06 | R\$ | 4.365,30 | R\$ 4.365,30 |
| 03.16.01.02 | 170117   | IOPES  | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira                                                                                  | und | 2,00  |      | 2    | 2,00   | 178,16 | R\$ | 356,32   | R\$ 356,32   |
| 03.16.01.03 | 86872    | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                 | UN  | 1,00  |      | 1    | 1,00   | 666,31 | R\$ | 666,31   | R\$ 666,31   |
| 03.16.01.04 | 86900    | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                         | UN  | 1,00  |      | 1    | 1,00   | 176,65 | R\$ | 176,65   | R\$ 176,65   |
| 03.16.01.05 | 170353   | IOPES  | Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol                                                                                                                                   | und | 8,00  |      | 8    | 8,00   | 468,28 | R\$ | 3.746,24 | R\$ 3.746,24 |
| 03.16.01.06 | 86914    | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                 | UN  | 1,00  |      | 1    | 1,00   | 37,80  | R\$ | 37,80    | R\$ 37,80    |



|             |        |        |                                                                                                                                                                                                 |     |      |   |      |        |     |          |     |          |
|-------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|------|--------|-----|----------|-----|----------|
| 03.16.01.07 | 86909  | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                      | UN  | 1,00 | 1 | 1,00 | 97,15  | R\$ | 97,15    | R\$ | 97,15    |
| 03.16.01.08 | 170309 | IOPES  | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol                                                                                                                       | und | 2,00 |   | 0,00 | 96,90  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 03.16.01.09 | 95472  | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN  | 1,00 |   | 0,00 | 709,97 | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 03.16.01.10 | 86932  | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                            | UN  | 6,00 | 6 | 6,00 | 433,50 | R\$ | 2.601,00 | R\$ | 2.601,00 |
| 03.16.01.11 | 170345 | IOPES  | Válvula de descarga com canopla cromada de 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol                                                                                           | und | 1,00 |   | 0,00 | 226,72 | R\$ | -        | R\$ | -        |

|                 |          |                  |                                                                                                                       |     |      |   |      |        |     |        |     |        |
|-----------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|------|--------|-----|--------|-----|--------|
| <b>03.16.02</b> |          | <b>APARELHOS</b> |                                                                                                                       |     |      |   |      |        |     |        |     |        |
| 03.16.02.01     | COMP 125 | COMP             | Ralo sifonado em PVC com grelha cromada. Fornecimento e instalação.                                                   | und | 7,00 | 7 | 7,00 | 34,30  | R\$ | 240,10 | R\$ | 240,10 |
| 03.16.02.02     | 100868   | SINAPI           | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN  | 2,00 |   | 0,00 | 227,20 | R\$ | -      | R\$ | -      |
| 03.16.02.03     | 95544    | SINAPI           | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                            | UN  | 7,00 | 7 | 7,00 | 34,25  | R\$ | 239,75 | R\$ | 239,75 |
| 03.16.02.04     | 95547    | SINAPI           | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN  | 8,00 | 8 | 8,00 | 72,35  | R\$ | 578,80 | R\$ | 578,80 |
| 03.16.02.05     | COMP 16  | COMP             | Fornecimento e instalação de toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado.                        | und | 8,00 | 8 | 8,00 | 74,97  | R\$ | 599,76 | R\$ | 599,76 |
| 03.16.02.06     | 100849   | SINAPI           | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                | UN  | 7,00 | 6 | 6,00 | 32,81  | R\$ | 196,86 | R\$ | 196,86 |

|                 |        |                 |                                          |    |      |      |      |        |     |        |     |        |
|-----------------|--------|-----------------|------------------------------------------|----|------|------|------|--------|-----|--------|-----|--------|
| <b>03.16.03</b> |        | <b>BANCADAS</b> |                                          |    |      |      |      |        |     |        |     |        |
| 03.16.03.01     | 170220 | IOPES           | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 332,70 | R\$ | 422,53 | R\$ | 422,53 |

|                 |       |                  |                                                                                                                                                                                     |    |       |    |  |        |     |        |     |   |
|-----------------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|--|--------|-----|--------|-----|---|
| <b>03.16.04</b> |       | <b>REGISTROS</b> |                                                                                                                                                                                     |    |       |    |  |        |     |        |     |   |
| 03.16.04.01     | 89972 | SINAPI           | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                | UN | 16,00 | 11 |  | 47,37  | R\$ | 521,07 | R\$ | - |
| 03.16.04.02     | 94495 | SINAPI           | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016     | UN | 2,00  |    |  | 73,96  | R\$ | -      | R\$ | - |
| 03.16.04.03     | 94496 | SINAPI           | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00  |    |  | 90,36  | R\$ | -      | R\$ | - |
| 03.16.04.04     | 94497 | SINAPI           | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2,00  |    |  | 105,82 | R\$ | -      | R\$ | - |
| 03.16.04.05     | 94498 | SINAPI           | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016     | UN | 1,00  |    |  | 136,46 | R\$ | -      | R\$ | - |

|                 |        |                            |                                            |     |      |  |      |       |     |   |     |   |
|-----------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------|-----|------|--|------|-------|-----|---|-----|---|
| <b>03.17</b>    |        | <b>APARELHOS ELÉTRICOS</b> |                                            |     |      |  |      |       |     |   |     |   |
| <b>03.17.01</b> |        | <b>LUMINÁRIAS</b>          |                                            |     |      |  |      |       |     |   |     |   |
| 03.17.01.01     | 180110 | IOPES                      | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 6,00 |  | 0,00 | 93,38 | R\$ | - | R\$ | - |



|             |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |  |    |       |        |     |          |     |          |
|-------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|----|-------|--------|-----|----------|-----|----------|
| 03.17.01.02 | COMP 86 | COMP  | Fornecimento e instalacao de Luminária a led de embutir, 20x20cm com corpo em chapa de aço com pintura microtexturizada na cor branca e difusor em poliestireno translucido 18w marca Lumicenter ou similar                                                             | und | 16,00 |  | 16 | 16,00 | 92,31  | R\$ | 1.476,96 | R\$ | 1.476,96 |
| 03.17.01.03 | COMP 87 | COMP  | Fornecimento e instalacao de Luminária a led de embutir, 30x30cm com corpo em chapa de aço com pintura microtexturizada na cor branca e difusor em poliestireno translucido 48w marca Lumicenter ou similar                                                             | und | 36,00 |  | 34 | 34,00 | 220,84 | R\$ | 7.508,56 | R\$ | 7.508,56 |
| 03.17.01.04 | COMP 88 | COMP  | Fornecimento e instalacao de Luminária a led de sobrepor com suporte para instalação em perfilado com corpo em aço laminado a frio, refletor em chapa de aço com pintura branca microtexturizada e difusor em policarbonato texturizado 18w marca Lumicenter ou similar | und | 2,00  |  |    | 0,00  | 98,22  | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 03.17.01.05 | COMP 89 | COMP  | Fornecimento e instalacao de Luminária a led de sobrepor com corpo em policarbonato injetado, com difusores em policarbonato transparente microtexturizado (prismático) 18w                                                                                             | und | 3,00  |  |    | 0,00  | 146,41 | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 03.17.01.06 | COMP 91 | COMP  | Fornecimento e instalacao de Luminária a led de embutir, com refletores em aluminio alto brilho combinados com difusores em policarbonato texturizado, com proteção em vidro temperado transparente e vedação através de borracha 48w Lumicenter ou similar             | und | 4,00  |  |    | 0,00  | 276,07 | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 03.17.01.07 | COMP 92 | COMP  | Fornecimento e instalacao de Luminária a led com iluminação difusa e antiofuscante 48w marca Lumicenter ou similar                                                                                                                                                      | und | 4,00  |  |    | 0,00  | 199,21 | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 03.17.01.08 | COMP 93 | COMP  | Fornecimento e instalacao de Luminária na parede-arandela p/lâmpada led 20w (luz vigia), em caixa 4"x2" de pvc amarelo                                                                                                                                                  | und | 4,00  |  |    | 0,00  | 110,51 | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 03.17.01.09 | COMP 94 | COMP  | Fornecimento e instalacao de Luminária a led de embutir, com corpo em aluminio, aro de acabamento em policarbonato injetado na cor branca e difusor em poliestireno translucido 18w marca Lumicenter ou similar                                                         | und | 7,00  |  | 7  | 7,00  | 80,46  | R\$ | 563,22   | R\$ | 563,22   |
| 03.17.01.10 | COMP 95 | COMP  | Fornecimento e instalacao de Luminária a led de embutir, com fecho orientável orbital, corpo em aluminio com pintura microtexturizada cor branca marca Lumicenter ou similar                                                                                            | und | 2,00  |  | 2  | 2,00  | 167,81 | R\$ | 335,62   | R\$ | 335,62   |
| 03.17.01.11 | COMP 96 | COMP  | Fornecimento e instalacao de Luminária de embutir para lampada incandescente 100w                                                                                                                                                                                       | und | 2,00  |  |    | 0,00  | 108,20 | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 03.17.01.12 | 160613  | IOPES | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal                                                                                                                                                          | und | 7,00  |  |    | 0,00  | 204,00 | R\$ | -        | R\$ | -        |

| 03.17.02    |          |        | INTERRUPTORES E TOMADAS                                                                                                             |     |       |  |    |  |       |     |          |     |   |
|-------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|----|--|-------|-----|----------|-----|---|
| 03.17.02.01 | 180201   | IOPES  | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"                                           | und | 64,00 |  | 37 |  | 28,79 | R\$ | 1.065,23 | R\$ | - |
| 03.17.02.02 | 91953    | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                         | UN  | 14,00 |  | 14 |  | 25,91 | R\$ | 362,74   | R\$ | - |
| 03.17.02.03 | 91959    | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                        | UN  | 2,00  |  |    |  | 41,02 | R\$ | -        | R\$ | - |
| 03.17.02.04 | 91955    | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                        | UN  | 4,00  |  |    |  | 32,07 | R\$ | -        | R\$ | - |
| 03.17.02.05 | 180207   | IOPES  | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 1,00  |  |    |  | 44,86 | R\$ | -        | R\$ | - |
| 03.17.02.06 | 180211   | IOPES  | Interruptor de três teclas simples 10 A/250 V e duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x4"                                        | und | 1,00  |  |    |  | 95,66 | R\$ | -        | R\$ | - |
| 03.17.02.07 | 180220   | IOPES  | Tomada coaxial 75 ohms para TV                                                                                                      | und | 1,00  |  |    |  | 24,62 | R\$ | -        | R\$ | - |
| 03.17.02.08 | COMP 112 | COMP   | Fornecimento e instalação de caixa 4x2" de PVC, com 02(dois) interruptores paralelos (tree-way), incluindo suporte e placa.         | und | 1,00  |  |    |  | 61,97 | R\$ | -        | R\$ | - |
| 03.17.02.09 | COMP 113 | COMP   | Fornecimento e instalação de caixa 4"x2" de PVC, com 02(dois) interruptores paralelos (four-way), incluindo suporte e placa.        | und | 1,00  |  |    |  | 61,97 | R\$ | -        | R\$ | - |





|                                            |           |        |                                                                                                                                                                                   |     |        |  |  |  |        |     |   |     |   |
|--------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| 03.17.02.10                                | COMP 114  | COMP   | Fornecimento e instalação de caixa 4"x2" de PVC, com 01(um) interruptor paralelo (tree-way) e 01(um) interruptor simples, incluindo suporte e placa.                              | und | 1,00   |  |  |  | 55,84  | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.17.02.11                                | COMP 115  | COMP   | Fornecimento e instalação de caixa 4"x2" de PVC, com 01(um) interruptor dimmer, incluindo suporte e placa.                                                                        | und | 1,00   |  |  |  | 108,47 | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.17.02.12                                | COMP 116  | COMP   | Fornecimento e instalação de caixa 4"x2" de PVC, com 01(um) interruptor dimmer e 01(um) interruptor simples e 01 (um) interruptor paralelo (tree way), incluindo suporte e placa. | und | 1,00   |  |  |  | 147,57 | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.17.02.13                                | COMP 117  | COMP   | Fornecimento e instalação de caixa 4"x2" de PVC, com 01(um) interruptor dimmer e 02 (dois) interruptor paralelo (tree way), incluindo suporte e placa.                            | und | 1,00   |  |  |  | 153,74 | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.17.02.14                                | 92025     | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                              | UN  | 1,00   |  |  |  | 65,93  | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.17.02.15                                | 92008     | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                 | UN  | 1,00   |  |  |  | 43,93  | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.17.02.16                                | COMP 118  | COMP   | Fornecimento e instalação de caixa 4"x4" de PVC, com 05(cinco) interruptor simples, incluindo suporte e placa.                                                                    | und | 1,00   |  |  |  | 115,01 | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.17.02.17                                | COMP 119  | COMP   | Fornecimento e instalação de caixa 4"x4" de PVC, com 01 (uma) tomada 2p+t, incluindo suporte e placa.                                                                             | und | 1,00   |  |  |  | 51,39  | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.17.02.18                                | 150612    | IOPES  | Caixa de passagem em chapa de aço galvanizada 4" x 4", com tampa parafusada                                                                                                       | und | 1,00   |  |  |  | 32,29  | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.17.02.19                                | COMP 120a | COMP   | Fornecimento e instalação de caixa 4"x2" de PVC, com espelho para 01(uma) tomada rj-45, incluindo suporte e placa.                                                                | und | 9,00   |  |  |  | 66,82  | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.17.02.20                                | COMP 121  | COMP   | Fornecimento e instalação de caixa 4"x2" de PVC, com espelho com furo para passagem de cabo câmera cftv, incluindo suporte e placa.                                               | und | 1,00   |  |  |  | 21,87  | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.17.02.21                                | COMP 120b | COMP   | Fornecimento e instalação de caixa 4"x4" de PVC, com espelho para 02(duas) tomadas rj-45, incluindo suporte e placa.                                                              | und | 8,00   |  |  |  | 112,41 | R\$ | - | R\$ | - |
| 03.17.02.22                                | 150629    | IOPES  | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"                                                                                                                              | und | 1,00   |  |  |  | 12,63  | R\$ | - | R\$ | - |
| <b>04 CENTRAL DE GÁS</b>                   |           |        |                                                                                                                                                                                   |     |        |  |  |  |        |     |   |     |   |
| <b>04.01 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>         |           |        |                                                                                                                                                                                   |     |        |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 04.01.01                                   | 30103     | IOPES  | Escavação mecânica em material de 1a. categoria                                                                                                                                   | m3  | 6,85   |  |  |  | 9,12   | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.01.02                                   | 93382     | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016                                                                                                                   | M3  | 4,05   |  |  |  | 29,22  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.01.03                                   | 100575    | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019                                                                                                                       | M2  | 20,97  |  |  |  | 0,09   | R\$ | - | R\$ | - |
| <b>04.02 ESTRUTURAS</b>                    |           |        |                                                                                                                                                                                   |     |        |  |  |  |        |     |   |     |   |
| <b>04.02.01 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)</b> |           |        |                                                                                                                                                                                   |     |        |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 04.02.01.01                                | 96616     | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017                                                                                                 | M3  | 0,16   |  |  |  | 486,34 | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.02.01.02                                | 40331     | IOPES  | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)                           | m3  | 3,00   |  |  |  | 420,36 | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.02.01.03                                | 96545     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                                                     | KG  | 3,00   |  |  |  | 13,65  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.02.01.04                                | 96546     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                                                    | KG  | 28,00  |  |  |  | 12,01  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.02.01.05                                | 96547     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                                                  | KG  | 100,91 |  |  |  | 10,08  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.02.01.06                                | 96543     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                                                      | KG  | 35,53  |  |  |  | 16,53  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.02.01.07                                | 96533     | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017                                                            | M2  | 23,00  |  |  |  | 105,82 | R\$ | - | R\$ | - |



| 04.02.02SUPER-ESTRUTURA      |         |        |                                                                                                                                                                                                                      |    |       |  |  |  |        |     |   |     |   |
|------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| 04.02.02.01                  | 40331   | IOPES  | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)                                                              | m3 | 6,10  |  |  |  | 420,36 | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.02.02.02                  | 92784   | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015                                                           | KG | 61,00 |  |  |  | 14,33  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.02.02.03                  | 92785   | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015                                                           | KG | 86,00 |  |  |  | 13,30  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.02.02.04                  | 92759   | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015                                               | KG | 24,00 |  |  |  | 13,85  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.02.02.05                  | 92762   | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015                                              | KG | 11,00 |  |  |  | 10,75  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.02.02.06                  | 92763   | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015                                              | KG | 83,00 |  |  |  | 9,06   | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.02.02.07                  | 92419   | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020                                               | M2 | 15,00 |  |  |  | 64,94  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.02.02.08                  | 92510   | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020                                                                               | M2 | 19,00 |  |  |  | 42,42  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.02.02.09                  | 92452   | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020                                                                           | M2 | 19,00 |  |  |  | 125,04 | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.02.02.10                  | 98557   | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018                                                                                                                                           | M2 | 9,53  |  |  |  | 30,02  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.03PAREDES E PAINÉIS       |         |        |                                                                                                                                                                                                                      |    |       |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 04.03.01                     | 87489   | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 | M2 | 69,94 |  |  |  | 45,18  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.03.02                     | 93186   | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016                                                                                                                                      | M  | 7,40  |  |  |  | 81,70  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.03.03                     | 93196   | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016                                                                                                                            | M  | 7,40  |  |  |  | 79,59  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.03.04                     | 93188   | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016                                                                                                                                       | M  | 1,50  |  |  |  | 75,69  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.03.05                     | 93189   | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016                                                                                                                                   | M  | 4,40  |  |  |  | 93,62  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.04ESQUADRIAS              |         |        |                                                                                                                                                                                                                      |    |       |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 04.04.01GRADES E PORTÕES     |         |        |                                                                                                                                                                                                                      |    |       |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 04.04.01.01                  | 71107   | IOPES  | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento                                                                                                                                         | m2 | 9,87  |  |  |  | 754,08 | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.04.02ESQUADRIAS METÁLICAS |         |        |                                                                                                                                                                                                                      |    |       |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 04.04.02.01                  | COMP 97 | COMP   | Janela veneziana fixa de alumínio com tela mosquiteiro, com quarnição, fixação com parafusos. Tudo incluído.                                                                                                         | m² | 2,90  |  |  |  | 609,41 | R\$ | - | R\$ | - |



| 04.05       |         |        | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                |     |        |  |  |  |        |     |   |     |   |
|-------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| 04.05.01    | 98547   | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF 06/2018                                            | M2  | 23,46  |  |  |  | 152,30 | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.05.02    | 87620   | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014                | M2  | 36,62  |  |  |  | 27,35  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.06       |         |        | ACABAMENTOS                                                                                                                                                                      |     |        |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 04.06.01    |         |        | ACABAMENTOS INTERNOS                                                                                                                                                             |     |        |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 04.06.01.01 | 87879   | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014                         | M2  | 69,94  |  |  |  | 3,49   | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.06.01.02 | 110302  | IOPES  | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm                                                                    | m2  | 69,94  |  |  |  | 52,85  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.06.02    |         |        | ACABAMENTOS EXTERNOS                                                                                                                                                             |     |        |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 04.06.02.01 | 87905   | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2  | 69,94  |  |  |  | 7,77   | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.06.02.02 | 110302  | IOPES  | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm                                                                    | m2  | 69,94  |  |  |  | 52,85  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.07       |         |        | PINTURA                                                                                                                                                                          |     |        |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 04.07.01    | 88497   | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014                                                                                                         | M2  | 69,94  |  |  |  | 15,28  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.07.02    | 88496   | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014                                                                                                            | M2  | 17,89  |  |  |  | 26,89  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.07.03    | 96130   | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017                                                                                           | M2  | 69,94  |  |  |  | 19,91  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.07.04    | 88488   | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014                                                                                            | M2  | 17,89  |  |  |  | 15,05  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.07.05    | 88489   | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014                                                                                         | M2  | 139,88 |  |  |  | 13,23  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.08       |         |        | PISOS INTERNOS E EXTERNOS                                                                                                                                                        |     |        |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 04.08.01    |         |        | LASTRO DE CONTRAPISO                                                                                                                                                             |     |        |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 04.08.01.01 | 130103  | IOPES  | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm                                                                     | m2  | 17,89  |  |  |  | 19,17  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.08.01.02 | 97113   | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 11/2017                                                                                                   | M2  | 18,19  |  |  |  | 1,66   | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.08.02    |         |        | ACABAMENTOS                                                                                                                                                                      |     |        |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 04.08.02.01 | 98679   | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020                                                        | M2  | 17,89  |  |  |  | 28,23  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.08.03    |         |        | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS                                                                                                                                            |     |        |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 04.08.03.01 | 98689   | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020                                                                                                                  | M   | 6,04   |  |  |  | 52,98  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.09       |         |        | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS                                                                                                                                                     |     |        |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 04.09.01    |         |        | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA                                                                                                                              |     |        |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 04.09.01.01 | COMP 15 | COMP   | Caixa de areia 40x40x40cm em alvenaria                                                                                                                                           | und | 1,00   |  |  |  | 90,06  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.09.02    |         |        | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC                                                                                                                                                    |     |        |  |  |  |        |     |   |     |   |



|             |       |        |                                                                                                                                       |   |      |  |  |  |       |     |   |     |   |
|-------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|--|-------|-----|---|-----|---|
| 04.09.02.01 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1,82 |  |  |  | 40,97 | R\$ | - | R\$ | - |
|-------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|--|-------|-----|---|-----|---|

|                 |          |      |                                                             |     |      |  |  |  |       |     |   |     |   |
|-----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|-------|-----|---|-----|---|
| <b>04.09.03</b> |          |      | <b>EQUIPAMENTOS</b>                                         |     |      |  |  |  |       |     |   |     |   |
| 04.09.03.01     | COMP 105 | COMP | Ralo semi-esférico tipo abacaxi, diâm. 150mm, tudo incluído | und | 1,00 |  |  |  | 53,15 | R\$ | - | R\$ | - |

|                 |        |        |                                                                                                                                                                           |    |      |  |  |  |        |     |   |     |   |
|-----------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| <b>04.10</b>    |        |        | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                              |    |      |  |  |  |        |     |   |     |   |
| <b>04.10.01</b> |        |        | <b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>                                                                                                                                             |    |      |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 04.10.01.01     | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |  |  |  | 507,32 | R\$ | - | R\$ | - |

|                 |        |       |                                                                                                                                                                                                 |     |      |  |  |  |        |     |   |     |   |
|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| <b>04.10.02</b> |        |       | <b>CAIXAS DE PASSAGEM / ATERRAMENTO</b>                                                                                                                                                         |     |      |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 04.10.02.01     | 151001 | IOPES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 25x25x25cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 3,00 |  |  |  | 108,51 | R\$ | - | R\$ | - |

|                 |        |       |                                                                                                                       |     |       |  |  |  |        |     |   |     |   |
|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| <b>04.10.03</b> |        |       | <b>ELETRODUTOS E CONEXÕES</b>                                                                                         |     |       |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 04.10.03.01     | 151138 | IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diâm. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente                                          | m   | 10,00 |  |  |  | 18,29  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.10.03.02     | 151310 | IOPES | Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente  | und | 2,00  |  |  |  | 81,18  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.10.03.03     | 151301 | IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2,00  |  |  |  | 19,13  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.10.03.04     | 151337 | IOPES | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corrente de surto máxima 40KA.      | und | 4,00  |  |  |  | 158,86 | R\$ | - | R\$ | - |

|                 |        |        |                                                                                                                                                                             |     |      |  |  |  |        |     |   |     |   |
|-----------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| <b>04.10.04</b> |        |        | <b>INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINÁRIAS</b>                                                                                                                                  |     |      |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 04.10.04.01     | 91953  | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                 | UN  | 3,00 |  |  |  | 25,91  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.10.04.02     | 180210 | IOPES  | Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2"                                                                                                                                  | und | 3,00 |  |  |  | 31,29  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.10.04.03     | 180108 | IOPES  | Luminária para uma lâmpada fluorescente 20W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | und | 3,00 |  |  |  | 70,78  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.10.04.04     | 160613 | IOPES  | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal                                                              | und | 3,00 |  |  |  | 204,00 | R\$ | - | R\$ | - |

|              |          |       |                                                                                                                                                                                |     |       |  |  |  |        |     |   |     |   |
|--------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|--------|-----|---|-----|---|
| <b>04.11</b> |          |       | <b>SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGA ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>                                                                                                                           |     |       |  |  |  |        |     |   |     |   |
| 04.11.01     | 160317   | IOPES | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente                                                                                         | m   | 3,62  |  |  |  | 60,74  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.11.02     | 160318   | IOPES | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente                                                                                         | m   | 21,50 |  |  |  | 42,79  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.11.03     | COMP 219 | COMP  | Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h = 30 cm                                                                                                                | und | 2,00  |  |  |  | 30,93  | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.11.04     | 160319   | IOPES | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 19,00 |  |  |  | 9,56   | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.11.05     | 160303   | IOPES | Aterramento com haste terra 5/8" x 2,40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm                                                                         | und | 1,00  |  |  |  | 283,94 | R\$ | - | R\$ | - |
| 04.11.06     | 160316   | IOPES | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro                                        | und | 1,00  |  |  |  | 87,11  | R\$ | - | R\$ | - |

|              |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>05</b>    |  |  | <b>REFORMA</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>05.01</b> |  |  | <b>PAREDES</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                               |             |        |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      |      |      |           |            |                   |     |          |
|-------------------------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|------|------|-----------|------------|-------------------|-----|----------|
| 05.01.01                      | 87530       | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014                          | M2  | 153,81 |      |      |      | 34,06     | R\$        | -                 | R\$ | -        |
| 05.01.02                      | 190103      | IOPES  | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvini, Coral ou Metalatex                                                                                                     | m2  | 116,75 |      |      |      | 14,29     | R\$        | -                 | R\$ | -        |
| 05.01.03                      | 88489       | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014                                                                                                                                | M2  | 73,08  |      |      |      | 13,23     | R\$        | -                 | R\$ | -        |
| 05.01.04                      | 120236      | IOPES  | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO<br>Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | m2  | 37,06  |      |      |      | 58,05     | R\$        | -                 | R\$ | -        |
| 05.01.05                      | 120221      | IOPES  | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe                                                          | m2  | 0,62   |      |      |      | 199,00    | R\$        | -                 | R\$ | -        |
| 05.01.06                      | 190106      | IOPES  | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvini, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos                                                                             | m2  | 43,67  |      |      |      | 20,75     | R\$        | -                 | R\$ | -        |
| 05.01.07                      | 133310051-0 | EMOP   | Rodapé em Porcelanato esmaltado ref. Cimento avorio 60x60cm Marca Biancogres com junta de 2mm com rejunte epóxi h= 10cm                                                                                                 | M2  | 25,28  |      |      |      | 79,98     | R\$        | -                 | R\$ | -        |
| <b>05.02 TETOS E FORROS</b>   |             |        |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      |      |      |           |            |                   |     |          |
| 05.02.01                      | 96114       | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P                                                                                                                               | M2  | 42,46  |      |      |      | 59,53     | R\$        | -                 | R\$ | -        |
| <b>05.03 PISOS</b>            |             |        |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      |      |      |           |            |                   |     |          |
| 05.03.01                      | 87620       | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014                                                       | M2  | 42,46  |      |      |      | 27,35     | R\$        | -                 | R\$ | -        |
| 05.03.02                      | 98557       | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018                                                                                                                                              | M2  | 9,59   |      |      |      | 30,02     | R\$        | -                 | R\$ | -        |
| 05.03.03                      | 130234      | IOPES  | Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato                         | m2  | 25,66  |      |      |      | 151,19    | R\$        | -                 | R\$ | -        |
| 05.03.04                      | COMP 21     | COMP   | Fornecimento e assentamento de Piso vinílico em manta condutivo espessura de 2mm marca Tarkett Fadamac linha IQ Toro REF.: Green 3093576 ou similar com cordão de solda multicolor Ref.: CS 9413576                     | m2  | 16,80  |      |      |      | 431,05    | R\$        | -                 | R\$ | -        |
| <b>06 SERVIÇOS FINAIS</b>     |             |        |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      |      |      |           |            |                   |     |          |
| 06.01                         | 200401      | IOPES  | Limpeza geral da obra (edificação)                                                                                                                                                                                      | m2  | 845,99 |      |      |      | 9,75      | R\$        | -                 | R\$ | -        |
| <b>07 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b> |             |        |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      |      |      |           |            |                   |     |          |
| 07.01                         | ADM-01      | COMP   | Administração Local                                                                                                                                                                                                     | und | 1,00   | 0,25 | 0,08 | 0,33 | 90.543,97 | R\$        | 7.243,52          | R\$ | 3.621,76 |
| <b>TOTAL</b>                  |             |        |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      |      |      |           | <b>R\$</b> | <b>213.277,35</b> |     |          |

Assinado por STELLA MARYS PEREIRA CORRÊA  
135.919.417-78  
Prefeitura Municipal de Pancas  
04/07/2023 16:33:06



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PROJETO EXECUTIVO DO HOSPITAL MATERNIDADE DO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES

| ITEM        | CÓDIGO               | REF                         | CÁLCULO                                                                                                                                                  |           |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
|             |                      |                             | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                   |           |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 02          | PRONTO SOCORRO       |                             |                                                                                                                                                          |           |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.04       | ESQUADRIAS           |                             |                                                                                                                                                          |           |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.04.02    | ESQUADRIAS METÁLICAS |                             |                                                                                                                                                          |           |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.04.02.01 | COMP 236             | COMP                        | Janela em alumínio anodizado cor branca, vidro liso 6mm: maxm-ar. Completa.                                                                              | m²        | 4,90      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBIENTE    | ESQUADRIA            | LARG. (m)                   | ALTURA (m)                                                                                                                                               | ÁREA (m²) |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3        | J1                   | 1,00                        | 0,70                                                                                                                                                     | 0,70      |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7        | J1                   | 1,00                        | 0,70                                                                                                                                                     | 0,70      |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.17       | J1                   | 1,00                        | 0,70                                                                                                                                                     | 0,70      |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.34       | J1                   | 1,00                        | 0,70                                                                                                                                                     | 0,70      |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.35       | J1                   | 1,00                        | 0,70                                                                                                                                                     | 0,70      |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.30       | J1                   | 1,00                        | 0,70                                                                                                                                                     | 0,70      |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.29       | J1                   | 1,00                        | 0,70                                                                                                                                                     | 0,70      |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                      |                             | TOTAL                                                                                                                                                    |           | 4,90      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.04.02.02 | COMP 233             | COMP                        | Janela em alumínio anodizado cor branca, vidro liso 6mm: 1F basculante + 1F fixa. Completa.                                                              | m²        | 1,30      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBIENTE    | ESQUADRIA            | LARG. (m)                   | ALTURA (m)                                                                                                                                               | ÁREA (m²) |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.23       | J23                  | 0,65                        | 2                                                                                                                                                        | 1,3       |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                      |                             | TOTAL                                                                                                                                                    |           | 1,3       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.04.02.03 | COMP 234             | COMP                        | Janela em alumínio anodizado cor branca, vidro liso 6mm: de correr. Completa.                                                                            | m²        | 4,20      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBIENTE    | ESQUADRIA            | LARG. (m)                   | ALTURA (m)                                                                                                                                               | ÁREA (m²) |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.24       | J2                   | 2                           | 0,7                                                                                                                                                      | 1,4       |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.25       | J2                   | 2                           | 0,7                                                                                                                                                      | 1,4       |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.27       | J2                   | 2                           | 0,7                                                                                                                                                      | 1,4       |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                      |                             | TOTAL                                                                                                                                                    |           | 4,2       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.04.02.04 | COMP 250             | COMP                        | Janela em alumínio anodizado cor branca, duas folhas fixas, duas de correr, vidro 6mm. Completa.                                                         | m²        | 2,25      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBIENTE    | ESQUADRIA            | LARG. (m)                   | ALTURA (m)                                                                                                                                               | ÁREA (m²) |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.16       | J8                   | 2,5                         | 0,9                                                                                                                                                      | 2,25      |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                      |                             | TOTAL                                                                                                                                                    |           | 2,25      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.04.02.07 | COMP 97              | COMP                        | Janela veneziana fixa de alumínio com tela mosquito, com guarnição, fixação com parafusos. Tudo incluído.                                                | m²        | 13,50     |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBIENTE    | ESQUADRIA            | LARG. (m)                   | ALTURA (m)                                                                                                                                               | ÁREA (m²) |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2        | J5                   | 5                           | 0,9                                                                                                                                                      | 4,5       |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4        | J5                   | 5                           | 0,9                                                                                                                                                      | 4,5       |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5        | J5                   | 5                           | 0,9                                                                                                                                                      | 4,5       |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                      |                             | TOTAL                                                                                                                                                    |           | 13,5      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.08       | ACABAMENTOS          |                             |                                                                                                                                                          |           |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.08.01    | ACABAMENTOS INTERNOS |                             |                                                                                                                                                          |           |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.08.01.01 | 87879                | SINAPI                      | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m²        | 223,95    |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPRIMENTO | ALTURA               | ÁREA (m²)                   |                                                                                                                                                          |           |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.06        | 3,9                  | 27,53                       |                                                                                                                                                          |           |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.89       | 3,9                  | 42,47                       |                                                                                                                                                          |           |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2         | 3,9                  | 24,18                       |                                                                                                                                                          |           |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 3           | 3,9                  | 11,70                       |                                                                                                                                                          |           |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4         | 3,9                  | 13,26                       |                                                                                                                                                          |           |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.7        | 3,9                  | 80,73                       |                                                                                                                                                          |           |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.81        | 3,9                  | 22,66                       |                                                                                                                                                          |           |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7         | 3,9                  | 22,23                       |                                                                                                                                                          |           |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.57        | 3,9                  | 10,02                       |                                                                                                                                                          |           |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                      | TOTAL ÁREA PAREDES INTERNAS |                                                                                                                                                          |           | 254,79    |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                      |                             | Descontos esquadrias (subtraindo área que exceder, em cada, vão 2m²)                                                                                     |           |           |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| ESQUADRIA   | AMBIENTE             | LARG                        | ALTURA                                                                                                                                                   | QUANT     | ÁREA ESQ. | ÁREA | DESCONTO |  |  |  |  |  |  |  |
| J1          | 11 1 F 11 2          | 1                           | 0,7                                                                                                                                                      | 1         | 0,7       | 5,2  | 3,20     |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                      |                      |           |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| J5                                                                   |                      | 5         | 0,9                                                                                                                                                      | 1     | 4,5                        |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J1                                                                   | 11.3 E 11.4          | 1         | 0,7                                                                                                                                                      | 1     | 0,7                        | 5,2  | 3,20     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J5                                                                   |                      | 5         | 0,9                                                                                                                                                      | 1     | 4,5                        |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J5                                                                   | 11.5                 | 1         | 0,9                                                                                                                                                      | 1     | 4,5                        | 4,5  | 2,50     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J1                                                                   | 11.16 E 11.17        |           | 0,7                                                                                                                                                      | 1     | 0,7                        | 2,95 | 0,95     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J8                                                                   |                      | 2,5       | 0,9                                                                                                                                                      | 1     | 2,25                       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P6                                                                   | 11.2 E ENTRADA       | 1,6       | 2,1                                                                                                                                                      | 1     | 3,36                       | 3,36 | 1,36     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J9                                                                   | 11.18                | 3,5       | 0,9                                                                                                                                                      | 1     | 3,15                       | 3,15 | 1,15     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P6 (Pa2)                                                             | 11.32 E 11.35        | 2,1       | 2,5                                                                                                                                                      | 1     | 5,25                       | 5,25 | 3,25     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P6 (Pa1)                                                             | 13.5                 | 5,6       | 2,5                                                                                                                                                      | 1     | 14                         | 14   | 12,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P7a                                                                  | 9.1 E 11.2           | 1,4       | 2,1                                                                                                                                                      | 1     | 2,94                       | 2,94 | 0,94     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE DESCONTOS                                                   |                      |           |                                                                                                                                                          |       |                            |      | 28,55    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.08.01.02                                                          | 110302               | IOPEs     | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm                                            | m²    | 236,04                     |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPRIMENTO                                                          | ALTURA               | ÁREA (m²) |                                                                                                                                                          |       | Descontei a área do emboco |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,84                                                                | 3,9                  | 89,08     |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,06                                                                 | 3,9                  | 27,53     |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,89                                                                | 3,9                  | 42,47     |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,2                                                                  | 3,9                  | 24,18     |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                                    | 3,9                  | 11,70     |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,4                                                                  | 3,9                  | 13,26     |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,7                                                                 | 3,9                  | 80,73     |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,81                                                                 | 3,9                  | 22,66     |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,7                                                                  | 3,9                  | 22,23     |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,57                                                                 | 3,9                  | 10,02     |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ÁREA PAREDES INTERNAS                                          |                      | 343,86    |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descontos esquadrias (subtraindo área que exceder, em cada, vão 2m²) |                      |           |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESQUADRIA                                                            | AMBIENTE             | LARG      | ALTURA                                                                                                                                                   | QUANT | ÁREA ESQ.                  | ÁREA | DESCONTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J1                                                                   | 11.1 E 11.2          | 1         | 0,7                                                                                                                                                      | 1     | 0,7                        | 5,2  | 3,20     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J5                                                                   |                      | 5         | 0,9                                                                                                                                                      | 1     | 4,5                        |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J1                                                                   | 11.3 E 11.4          | 1         | 0,7                                                                                                                                                      | 1     | 0,7                        | 5,2  | 3,20     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J5                                                                   |                      | 5         | 0,9                                                                                                                                                      | 1     | 4,5                        |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J5                                                                   | 11.5                 | 5         | 0,9                                                                                                                                                      | 1     | 4,5                        | 4,5  | 2,50     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J1                                                                   | 11.16 E 11.17        | 1         | 0,7                                                                                                                                                      | 1     | 0,7                        | 2,95 | 0,95     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J8                                                                   |                      | 2,5       | 0,9                                                                                                                                                      | 1     | 2,25                       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P6                                                                   | 11.2 E ENTRADA       | 1,6       | 2,1                                                                                                                                                      | 1     | 3,36                       | 3,36 | 1,36     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J9                                                                   | 11.18                | 3,5       | 0,9                                                                                                                                                      | 1     | 3,15                       | 3,15 | 1,15     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P6 (Pa2)                                                             | 11.32 E 11.35        | 2,1       | 2,5                                                                                                                                                      | 1     | 5,25                       | 5,25 | 3,25     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P6 (Pa1)                                                             | 13.5                 | 5,6       | 2,5                                                                                                                                                      | 1     | 14                         | 14   | 12,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P7a                                                                  | 9.1 E 11.2           | 1,4       | 2,1                                                                                                                                                      | 1     | 2,94                       | 2,94 | 0,94     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE DESCONTOS                                                   |                      |           |                                                                                                                                                          |       |                            |      | 28,55    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.08.01.04                                                          | 120301               | IOPEs     | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm                                       | m2    | 79,27                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPRIMENTO                                                          | ALTURA               | ÁREA (m²) |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5                                                                  | 2,6                  | 11,70     |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,42                                                                | 2,6                  | 27,09     |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                    | 2,6                  | 5,20      |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,41                                                                 | 2,6                  | 3,67      |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2                                                                  | 2,6                  | 8,32      |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,38                                                                 | 2,6                  | 6,19      |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,18                                                                 | 2,6                  | 8,27      |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,4                                                                  | 2,6                  | 8,84      |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ÁREA PAREDES INTERNAS                                          |                      | 79,27     |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.08.02                                                             | ACABAMENTOS EXTERNOS |           |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.08.02.01                                                          | 87905                | SINAPI    | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m²    | 137,57                     |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAREDE                                                               | COMP. (m)            | ALT. (m)  | ÁREA (m²)                                                                                                                                                |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      | 21                   | 2,2       | 46,20                                                                                                                                                    |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAREDES EXTERNAS                                                     | 6                    | 2,2       | 13,20                                                                                                                                                    |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      | 5,97                 | 2,2       | 13,13                                                                                                                                                    |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      | 6,15                 | 2,2       | 13,53                                                                                                                                                    |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAREDES EXTERNAS                                                     | 21                   | 1,5       | 31,50                                                                                                                                                    |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      | 6                    | 1,5       | 9,00                                                                                                                                                     |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLATIBANDA                                                           | 7,34                 | 1,5       | 11,01                                                                                                                                                    |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL                                                                |                      |           | 137,57                                                                                                                                                   |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descontos esquadrias (subtraindo área que exceder, em cada, vão 2m²) |                      |           |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os vãos foram descontados na medição anterior                        |                      |           |                                                                                                                                                          |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.08.02.02                                                          | 110302               | SINAPI    | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm                                            | m²    | 207,8                      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAREDE                                                               | COMP. (m)            | ALT. (m)  | ÁREA (m²)                                                                                                                                                |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      | 21                   | 4         | 84,00                                                                                                                                                    |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAREDES EXTERNAS                                                     | 6                    | 4         | 24,00                                                                                                                                                    |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      | 5,97                 | 4         | 23,88                                                                                                                                                    |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      | 6,15                 | 4         | 24,60                                                                                                                                                    |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      | 2,71                 | 4         | 10,84                                                                                                                                                    |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAREDES                                                              | 21                   | 1,5       | 31,50                                                                                                                                                    |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLATIBANDA                                                           | 6                    | 1,5       | 9,00                                                                                                                                                     |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL                                                                |                      |           | 207,8                                                                                                                                                    |       |                            |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                      |                             |        |                                                                                                                                                         |        |                |                      |                      |             |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|--|--|
| 03                                                                   | EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO     |        |                                                                                                                                                         |        |                |                      |                      |             |  |  |
| 03.03                                                                | PAREDES E PAINÉIS           |        |                                                                                                                                                         |        |                |                      |                      |             |  |  |
| 03.03.02                                                             | 96367                       | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2     | 132,25         |                      |                      |             |  |  |
|                                                                      | DESCRIÇÃO                   | QNT    | COMP                                                                                                                                                    | ALTURA | ÁREA           | PERCENTUAL EXECUTADO | EXECUTADO            |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.2               | 1      | 2,15                                                                                                                                                    | 3,9    | 8,39           | 30%                  | 2,52                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.3               | 1      | 3,47                                                                                                                                                    | 3,9    | 13,53          | 30%                  | 4,06                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.4 e 15.5 e 15.6 | 1      | 4,89                                                                                                                                                    | 3,9    | 19,07          | 30%                  | 5,72                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.4               | 1      | 1,85                                                                                                                                                    | 3,9    | 7,22           | 30%                  | 2,16                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.5               | 1      | 1,85                                                                                                                                                    | 3,9    | 7,22           | 30%                  | 2,16                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.6               | 1      | 1,85                                                                                                                                                    | 3,9    | 7,22           | 30%                  | 2,16                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.6               | 1      | 1,85                                                                                                                                                    | 3,9    | 7,22           | 30%                  | 2,16                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.7               | 1      | 4                                                                                                                                                       | 3,9    | 15,60          | 30%                  | 4,68                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.8 e 14.1        | 1      | 9,46                                                                                                                                                    | 3,9    | 36,89          | 30%                  | 11,07                |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.8 e 15.9        | 1      | 4,31                                                                                                                                                    | 3,9    | 16,81          | 30%                  | 5,04                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.8 e 15.9        | 1      | 2,9                                                                                                                                                     | 3,9    | 11,31          | 30%                  | 3,39                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.10              | 1      | 15,62                                                                                                                                                   | 3,9    | 60,92          | 30%                  | 18,28                |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.10              | 1      | 13,7                                                                                                                                                    | 3,9    | 53,43          | 30%                  | 16,03                |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.11              | 1      | 4                                                                                                                                                       | 3,9    | 15,60          | 30%                  | 4,68                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.12              | 1      | 4                                                                                                                                                       | 3,9    | 15,60          | 30%                  | 4,68                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.13              | 1      | 4                                                                                                                                                       | 3,9    | 15,60          | 30%                  | 4,68                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.14              | 1      | 4                                                                                                                                                       | 3,9    | 15,60          | 30%                  | 4,68                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.15              | 1      | 4                                                                                                                                                       | 3,9    | 15,60          | 30%                  | 4,68                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.16              | 1      | 2,51                                                                                                                                                    | 3,9    | 9,79           | 30%                  | 2,94                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.17              | 1      | 1,5                                                                                                                                                     | 3,9    | 5,85           | 30%                  | 1,76                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.18              | 1      | 4,3                                                                                                                                                     | 3,9    | 16,77          | 30%                  | 5,03                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.19              | 1      | 4,3                                                                                                                                                     | 3,9    | 16,77          | 30%                  | 5,03                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.20              | 1      | 1,6                                                                                                                                                     | 3,9    | 6,24           | 30%                  | 1,87                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.20 e 14.4       | 1      | 3,73                                                                                                                                                    | 3,9    | 14,55          | 30%                  | 4,36                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 14.1 e 14.4        | 1      | 3,86                                                                                                                                                    | 3,9    | 15,05          | 30%                  | 4,52                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 14.2               | 1      | 2,02                                                                                                                                                    | 3,9    | 7,88           | 30%                  | 2,36                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 14.2               | 1      | 1,25                                                                                                                                                    | 3,9    | 4,88           | 30%                  | 1,46                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 14.3               | 1      | 1,25                                                                                                                                                    | 3,9    | 4,88           | 30%                  | 1,46                 |             |  |  |
|                                                                      |                             |        |                                                                                                                                                         |        | ÁREA EXECUTADA |                      | 133,64               |             |  |  |
| Descontos esquadrias (subtraindo área que exceder, em cada, vão 2m³) |                             |        |                                                                                                                                                         |        |                |                      |                      |             |  |  |
| AMBIENTE                                                             | ESQUADRIA                   | QUANT. | COMP.                                                                                                                                                   | ALTURA | Área esquadria | TOTAL POR VÃO        | Percentual executado | Desconto m² |  |  |
| 15.2                                                                 | P3a                         | 1,00   | 1,00                                                                                                                                                    | 2,1    | 2,1            | 0,10                 | 30%                  | 0,03        |  |  |
| 14.1                                                                 | P6a                         | 1,00   | 1,60                                                                                                                                                    | 2,1    | 3,36           | 1,36                 | 30%                  | 1,36        |  |  |
| TOTAL DE DESCONTO                                                    |                             |        |                                                                                                                                                         |        |                |                      |                      |             |  |  |
| 03.03.03                                                             | 96372                       | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017                                                                                 | M2     | 132,25         |                      |                      |             |  |  |
|                                                                      | DESCRIÇÃO                   | QNT    | COMP                                                                                                                                                    | ALTURA | ÁREA           | PERCENTUAL           | EXECUTADO            |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.2               | 1      | 2,15                                                                                                                                                    | 3,9    | 8,39           | 30%                  | 2,52                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.3               | 1      | 3,47                                                                                                                                                    | 3,9    | 13,53          | 30%                  | 4,06                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.4 e 15.5 e 15.6 | 1      | 4,89                                                                                                                                                    | 3,9    | 19,07          | 30%                  | 5,72                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.4               | 1      | 1,85                                                                                                                                                    | 3,9    | 7,22           | 30%                  | 2,16                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.5               | 1      | 1,85                                                                                                                                                    | 3,9    | 7,22           | 30%                  | 2,16                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.6               | 1      | 1,85                                                                                                                                                    | 3,9    | 7,22           | 30%                  | 2,16                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.6               | 1      | 1,85                                                                                                                                                    | 3,9    | 7,22           | 30%                  | 2,16                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.7               | 1      | 4                                                                                                                                                       | 3,9    | 15,60          | 30%                  | 4,68                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.8 e 14.1        | 1      | 9,46                                                                                                                                                    | 3,9    | 36,89          | 30%                  | 11,07                |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.8 e 15.9        | 1      | 4,31                                                                                                                                                    | 3,9    | 16,81          | 30%                  | 5,04                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.8 e 15.9        | 1      | 2,9                                                                                                                                                     | 3,9    | 11,31          | 30%                  | 3,39                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.10              | 1      | 15,62                                                                                                                                                   | 3,9    | 60,92          | 30%                  | 18,28                |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.10              | 1      | 13,7                                                                                                                                                    | 3,9    | 53,43          | 30%                  | 16,03                |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.11              | 1      | 4                                                                                                                                                       | 3,9    | 15,60          | 30%                  | 4,68                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.12              | 1      | 4                                                                                                                                                       | 3,9    | 15,60          | 30%                  | 4,68                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.13              | 1      | 4                                                                                                                                                       | 3,9    | 15,60          | 30%                  | 4,68                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.14              | 1      | 4                                                                                                                                                       | 3,9    | 15,60          | 30%                  | 4,68                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.15              | 1      | 4                                                                                                                                                       | 3,9    | 15,60          | 30%                  | 4,68                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.16              | 1      | 2,51                                                                                                                                                    | 3,9    | 9,79           | 30%                  | 2,94                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.17              | 1      | 1,5                                                                                                                                                     | 3,9    | 5,85           | 30%                  | 1,76                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.18              | 1      | 4,3                                                                                                                                                     | 3,9    | 16,77          | 30%                  | 5,03                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.19              | 1      | 4,3                                                                                                                                                     | 3,9    | 16,77          | 30%                  | 5,03                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.20              | 1      | 1,6                                                                                                                                                     | 3,9    | 6,24           | 30%                  | 1,87                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 15.20 e 14.4       | 1      | 3,73                                                                                                                                                    | 3,9    | 14,55          | 30%                  | 4,36                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 14.1 e 14.4        | 1      | 3,86                                                                                                                                                    | 3,9    | 15,05          | 30%                  | 4,52                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 14.2               | 1      | 2,02                                                                                                                                                    | 3,9    | 7,88           | 30%                  | 2,36                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 14.2               | 1      | 1,25                                                                                                                                                    | 3,9    | 4,88           | 30%                  | 1,46                 |             |  |  |
|                                                                      | Ambiente 14.3               | 1      | 1,25                                                                                                                                                    | 3,9    | 4,88           | 30%                  | 1,46                 |             |  |  |
|                                                                      |                             |        |                                                                                                                                                         |        | ÁREA EXECUTADA |                      | 133,64               |             |  |  |
| Descontos esquadrias (subtraindo área que exceder, em cada, vão 2m³) |                             |        |                                                                                                                                                         |        |                |                      |                      |             |  |  |
| AMBIENTE                                                             | ESQUADRIA                   | QUANT. | COMP.                                                                                                                                                   | ALTURA | Área esquadria | TOTAL POR VÃO        | Percentual           | Desconto m² |  |  |
| 15.2                                                                 | P3a                         | 1,00   | 1,00                                                                                                                                                    | 2,1    | 2,1            | 0,10                 | 30%                  | 0,03        |  |  |
| 14.1                                                                 | P6a                         | 1,00   | 1,60                                                                                                                                                    | 2,1    | 3,36           | 1,36                 | 30%                  | 1,36        |  |  |
| TOTAL DE DESCONTO                                                    |                             |        |                                                                                                                                                         |        |                |                      |                      |             |  |  |
| 03.04                                                                | ESQUADRIAS                  |        |                                                                                                                                                         |        |                |                      |                      |             |  |  |
| 03.04.02                                                             | ESQUADRIAS METÁLICAS        |        |                                                                                                                                                         |        |                |                      |                      |             |  |  |





|             |                      |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--|--|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 03.04.02.01 | COMP 234             | COMP      | Janela em alumínio anodizado cor branca, vidro liso 6mm: de correr. Completa.                                                                                                              | m2        | 12,60  |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBIENTE    | ESQUADRIA            | LARG. (m) | ALTURA (m)                                                                                                                                                                                 | ÁREA (m²) |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.19       | J2                   | 2         | 0,7                                                                                                                                                                                        | 1,4       |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.18       | J2                   | 2         | 0,7                                                                                                                                                                                        | 1,4       |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.16       | J2                   | 2         | 0,7                                                                                                                                                                                        | 1,4       |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.15       | J2                   | 2         | 0,7                                                                                                                                                                                        | 1,4       |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.14       | J2                   | 2         | 0,7                                                                                                                                                                                        | 1,4       |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.13       | J2                   | 2         | 0,7                                                                                                                                                                                        | 1,4       |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.12       | J2                   | 2         | 0,7                                                                                                                                                                                        | 1,4       |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.11       | J2                   | 2         | 0,7                                                                                                                                                                                        | 1,4       |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7        | J2                   | 2         | 0,7                                                                                                                                                                                        | 1,4       |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL       |                      |           |                                                                                                                                                                                            | 12,6      |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.04.02.02 | COMP 236             | COMP      | Janela em alumínio anodizado cor branca, vidro liso 6mm: maxim-ar. Completa.                                                                                                               | m2        | 4,20   |  |  | ACRÉSCIMO | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBIENTE    | ESQUADRIA            | LARG. (m) | ALTURA (m)                                                                                                                                                                                 | ÁREA (m²) |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2        | J1                   | 1         | 0,7                                                                                                                                                                                        | 0,7       |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.17       | J1                   | 1         | 0,7                                                                                                                                                                                        | 0,7       |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6        | J1                   | 1         | 0,7                                                                                                                                                                                        | 0,7       |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5        | J1                   | 1         | 0,7                                                                                                                                                                                        | 0,7       |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4        | J1                   | 1         | 0,7                                                                                                                                                                                        | 0,7       |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2        | J1                   | 1         | 0,7                                                                                                                                                                                        | 0,7       |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3        | J1'                  | 1         | 0,7                                                                                                                                                                                        | 0,7       |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3        | J1'                  | 1         | 0,7                                                                                                                                                                                        | 0,7       |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL       |                      |           |                                                                                                                                                                                            | 5,6       |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.04.02.04 | COMP 251             | COMP      | Janela em alumínio anodizado cor branca, fixa com vidro. Completa.                                                                                                                         | m2        | 2,80   |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBIENTE    | ESQUADRIA            | LARG. (m) | ALTURA (m)                                                                                                                                                                                 | ÁREA (m²) |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.8        | V3                   |           | 1                                                                                                                                                                                          | 1,4       |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.9        | V3                   | 1,4       | 1                                                                                                                                                                                          | 1,4       |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL       |                      |           |                                                                                                                                                                                            | 2,8       |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.07       | TETOS E FORROS       |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.07.01    | 96114                | SINAPI    | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P                                                                                                  | M2        | 212,93 |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBIENTE    | ÁREA                 |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1        | 39,16                |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2        | 2,53                 |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3        | 2,52                 |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4        | 3,58                 |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2        | 2,36                 |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3        | 12,78                |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4        | 2,22                 |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5        | 2,22                 |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6        | 3,91                 |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7        | 11,59                |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.8        | 6,09                 |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.9        | 6,1                  |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.11       | 9,6                  |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.12       | 9,6                  |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.13       | 9,61                 |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.14       | 9,6                  |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.15       | 13,99                |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.16       | 10,03                |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.17       | 2,25                 |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.18       | 11,69                |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.19       | 10,82                |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.20       | 2,21                 |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.10       | 28,47                |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL       | 212,93               |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.08       | ACABAMENTOS          |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.08.01    | ACABAMENTOS INTERNOS |           |                                                                                                                                                                                            |           |        |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.08.01.04 | COMP 123             | COMP      | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 33x58cm, ref. Blancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | m²        | 116,19 |  |  | ACRÉSCIMO | 3,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBIENTE    | COMP. TOTAL          | ALTURA    | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                 | DESCONTO  | TOTAL  |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2        | 6,5                  | 2,7       | J1 e P3a                                                                                                                                                                                   | 2,8       | 14,75  |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2        | 6,54                 | 2,65      | J1 e P1                                                                                                                                                                                    | 2,38      | 14,95  |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3        | 6,54                 | 2,65      | P1                                                                                                                                                                                         | 1,68      | 15,65  |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4        | 7,68                 | 2,65      | P1a                                                                                                                                                                                        | 1,68      | 18,67  |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.20       | 5,96                 | 2,65      | P1                                                                                                                                                                                         | 1,68      | 14,11  |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4        | 6,1                  | 2,7       | J1 e P1                                                                                                                                                                                    | 2,38      | 14,09  |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5        | 6,1                  | 2,7       | J1 e P1                                                                                                                                                                                    | 2,38      | 14,09  |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.17       | 6                    | 2,65      | J1 e P1                                                                                                                                                                                    | 2,38      | 13,52  |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL       |                      |           |                                                                                                                                                                                            |           | 119,84 |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.08.01.05 | 88786                | SINAPI    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS. AF_10/2014                       | M2        | 1,34   |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBIENTE    | COMP. TOTAL          | ALTURA    | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                 | DESCONTO  | TOTAL  |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2        | 6,54                 | 0,05      | J1 e P1                                                                                                                                                                                    | 0,09      | 0,24   |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3        | 6,54                 | 0,05      | P1                                                                                                                                                                                         | 0,04      | 0,29   |  |  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                   |                                        |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 14.4              | 7,68                                   | 0,05   | P1a                                                                                                               | 0,04     | 0,34   | Foi atestado na plataforma 1,33 m², pois a contratada já havia lançado a medição sem antes passar pela análise da fiscalização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.20             | 5,96                                   | 0,05   | P1                                                                                                                | 0,04     | 0,26   |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.17             | 6                                      | 0,05   | J1 e P1                                                                                                           | 0,09     | 0,21   |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL             |                                        |        |                                                                                                                   |          | 1,34   |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.08.02          | ACABAMENTOS EXTERNOS                   |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.08.02.04       | COMP 18                                | COMP   | Fornecimento e assentamento de Moisaico linha All Bricks 7x26cm Ref.: Yorkshire Light marca Portobello ou similar | m²       | 38,01  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                        | COMPR. | ALTURA                                                                                                            | ÁREA     |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | FACHADA FRONTAL                        | 5,91   | 5,5                                                                                                               | 32,51    |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | FACHADA LATERAL                        | 5,5    | 1                                                                                                                 | 5,50     |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL             |                                        |        |                                                                                                                   |          | 38,01  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.08.02.05       | COMP 19                                | COMP   | Fornecimento e assentamento de Porcelanato 20x120cm REF.: Araucária clara marca Portobello ou similar             | m²       | 24,48  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                        | COMPR. | ALTURA                                                                                                            | ÁREA     |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | FACHADA FRONTAL                        | 4,45   | 5,50                                                                                                              | 24,48    |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.08.02.06       | COMP 20                                | COMP   | Fornecimento e assentamento de Moldura em EPS, conforme projeto                                                   | m        | 39,00  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                        | COMPR. | TOTAL                                                                                                             |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | FACHADA LATERAL SOBRE E SOB AS JANELAS | 19,5*2 |                                                                                                                   | 39,00    |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.09             | PINTURA                                |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.09.01          | 88497                                  | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                          | M2       | 527,33 |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBIENTE          | COMP. TOTAL                            | ALTURA | ESQUADRIAS                                                                                                        | DESCONTO | TOTAL  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1              | 23,99                                  | 2,7    | Pa3, 2 x P1, P1a, P1d                                                                                             | 10,08    | 54,69  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrada próx. DML | 6,85                                   | 2,7    | P3a, P6a, P1c                                                                                                     | 7,14     | 11,36  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3              | 12,91                                  | 2,7    | 2 x J1', P1c, P1d                                                                                                 | 4,76     | 30,10  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6              | 7,94                                   | 2,7    | J1 e P1a                                                                                                          | 2,38     | 19,06  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7              | 13,8                                   | 2,7    | J2 e P1                                                                                                           | 3,08     | 34,18  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.11             | 12,8                                   | 2,7    | J2 e P1                                                                                                           | 3,08     | 31,48  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.12             | 12,8                                   | 2,7    | J2 e P1                                                                                                           | 3,08     | 31,48  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.13             | 12,8                                   | 2,7    | J2 e P1                                                                                                           | 3,08     | 31,48  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.14             | 12,8                                   | 2,7    | J2 e P1                                                                                                           | 3,08     | 31,48  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.15             | 15                                     | 2,7    | J2 e P1a                                                                                                          | 3,08     | 37,42  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.16             | 13,02                                  | 2,7    | 2 x P1, J2                                                                                                        | 4,76     | 30,39  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.8              | 10                                     | 2,7    | 2 x V3, P1a                                                                                                       | 4,48     | 22,52  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.9              | 10                                     | 2,7    | V3, P1a                                                                                                           | 3,08     | 23,92  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.19             | 13,66                                  | 2,7    | J2 e P1                                                                                                           | 3,08     | 33,80  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.18             | 14,06                                  | 2,7    | J2 e P1                                                                                                           | 3,08     | 34,88  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.10             | 39,37                                  | 2,7    | 10 x P1, 4 x P1a, V3                                                                                              | 24,92    | 81,38  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL             |                                        |        |                                                                                                                   |          | 539,62 |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.09.02          | 88496                                  | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                             | M2       | 212,93 |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBIENTE          | ÁREA                                   |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1              | 39,16                                  |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2              | 2,53                                   |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3              | 2,52                                   |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4              | 3,58                                   |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2              | 2,36                                   |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3              | 12,78                                  |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4              | 2,22                                   |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5              | 2,22                                   |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6              | 3,91                                   |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7              | 11,59                                  |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.8              | 6,09                                   |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.9              | 6,1                                    |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.11             | 9,6                                    |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.12             | 9,6                                    |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.13             | 9,61                                   |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.14             | 9,6                                    |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.15             | 13,99                                  |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.16             | 10,03                                  |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.17             | 2,25                                   |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.18             | 11,69                                  |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.19             | 10,82                                  |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.20             | 2,21                                   |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.10             | 28,47                                  |        |                                                                                                                   |          |        |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL             |                                        |        |                                                                                                                   |          | 212,93 |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.09.03          | 96130                                  | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017                            | M2       | 245,91 |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBIENTE          | COMP. TOTAL                            | ALTURA | ESQUADRIAS                                                                                                        | DESCONTO | TOTAL  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                        | ALTURA | ESQUADRIAS                                                                                                        | DESCONTO | TOTAL  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FACH. FRONTAL     | 14,52                                  | 5,50   | Pa3, 2 x J1, 2 x J2                                                                                               | 15,95    | 63,91  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FACH. LATERAL     | 19,5                                   | 5,50   | 7 x J2 e acabamento cerâmico                                                                                      | 19,5     | 87,75  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FACH. FUNDOS      | 15,23                                  | 5,50   | 2 x J1, 2 x J1'                                                                                                   | 4,2      | 79,57  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





|                  |                                              |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 03.10.02.03      | 87263                                        | SINAPI        | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014                                                                                  | M2  | 138,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <b>AMBIENTE</b>  | <b>ÁREA</b>                                  |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 15.16            | 10,03                                        |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 15.19            | 10,82                                        |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 15.7             | 11,59                                        |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 15.18            | 11,69                                        |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 15.3             | 12,78                                        |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 15.15            | 13,99                                        |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 15.10            | 28,47                                        |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 14.1             | 39,16                                        |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <b>TOTAL</b>     | <b>138,53</b>                                |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <b>03.10.03</b>  | <b>DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b> |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 03.10.03.02      | 101965                                       | SINAPI        | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020                                                                                                  | M   | 2,80   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <b>ESQUADRIA</b> | <b>DIMENSÃO</b>                              | <b>QUANT</b>  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| V3               | 1,4                                          | 2             | 2,8                                                                                                                                                                                                                           |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <b>03.11</b>     |                                              |               | <b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>                                                                                                                                                                                           |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| <b>03.11.02</b>  |                                              |               | <b>REDE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA PLUVIAL - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC</b>                                                                                                                                                              |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 03.11.02.04      | 141413                                       | IOPES         | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões                                                                                                                                                    | m   | 16,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  |                                              | <b>COMP.</b>  |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  | Drenos do ar-condicionado                    | 16            |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  | Conforme projeto                             |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <b>03.11.05</b>  |                                              |               | <b>REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC</b>                                                                                                                                                                                          |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 03.11.05.02      | 89712                                        | SINAPI        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014                                                                                        | M   | 19,70  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  |                                              | <b>Comp.</b>  |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  | Bebedouro                                    | 12,78         |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  | Pia da copa                                  | 6,92          |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  |                                              | 19,7          |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 03.11.05.03      | 89713                                        | SINAPI        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014                                                                                        | M   | 7,18   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  |                                              | <b>COMP.</b>  |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  | TV-07                                        | 2,43          |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  | TV-08                                        | 4,75          |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  |                                              | 7,18          |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 03.11.05.04      | 89714                                        | SINAPI        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014                                                                                       | M   | 17,07  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  | <b>AMBIENTE</b>                              | <b>COMP.</b>  |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  | 15.4 e 15.5                                  | 17,07         |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <b>03.13</b>     |                                              |               | <b>SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGA ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>                                                                                                                                                                          |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 03.13.02         | 160317                                       | IOPES         | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente                                                                                                                                        | m   | 41,50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  | <b>DESCRIÇÃO</b>                             | <b>COMP.</b>  |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  | Entre as caixas de aterram.                  | 45,7          |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  | Conferir no LOCAL                            |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 03.13.03         | 160318                                       | IOPES         | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente                                                                                                                                        | m   | 69,40  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  | <b>DESCRIÇÃO</b>                             | <b>COMP.</b>  |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  | Perímetro do ADM                             | 69,4          |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 03.13.06         | 160303                                       | IOPES         | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm                                                                                                                        | und | 4,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  | <b>DESCRIÇÃO</b>                             | <b>QUANT.</b> |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  | Caixas de aterram.                           | 7             |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <b>03.16</b>     |                                              |               | <b>APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS</b>                                                                                                                                                                                             |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| <b>03.16.01</b>  |                                              |               | <b>LOUÇAS E METAIS</b>                                                                                                                                                                                                        |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 03.16.01.01      | 170128                                       | IOPES         | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive válvula, sifão e engates, exclusive torneira | und | 5,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  | <b>AMBIENTE</b>                              | <b>QUANT.</b> |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  | 15.4                                         | 1             |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                  | 15.5                                         | 1             |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |



|                 |                 |               |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
|                 | 14.4            | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | 14.2            | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | 14.3            | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | <b>TOTAL</b>    | <b>5</b>      |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 03.16.01.02     | 170117          | IOPES         | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira                          | und | <b>2,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | <b>AMBIENTE</b> | <b>QUANT.</b> |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | 15.17           | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | 15.20           | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | <b>TOTAL</b>    | <b>2</b>      |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 03.16.01.03     | 86872           | SINAPI        | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                        | UN  | <b>1,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | <b>AMBIENTE</b> | <b>QUANT.</b> |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | 15.20           | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | <b>TOTAL</b>    | <b>1</b>      |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 03.16.01.04     | 86900           | SINAPI        | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                | UN  | <b>1,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | <b>AMBIENTE</b> | <b>QUANT.</b> |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | 15.6            | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | <b>TOTAL</b>    | <b>1</b>      |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 03.16.01.05     | 170353          | IOPES         | Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol                                                                           | und | <b>8,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | <b>AMBIENTE</b> | <b>QUANT.</b> |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | Ambiente 14.2   | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | Ambiente 14.3   | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | Ambiente 14.4   | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | Ambiente 15.4   | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | Ambiente 15.5   | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | Ambiente 15.17  | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | Ambiente 15.14  | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | Ambiente 15.20  | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | <b>TOTAL</b>    | <b>8</b>      |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 03.16.01.06     | 86914           | SINAPI        | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                        | UN  | <b>1,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | <b>AMBIENTE</b> | <b>QUANT.</b> |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | 15.2            | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | <b>TOTAL</b>    | <b>1</b>      |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 03.16.01.07     | 86909           | SINAPI        | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                           | UN  | <b>1,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | <b>AMBIENTE</b> | <b>QUANT.</b> |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | 15.6            | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | <b>TOTAL</b>    | <b>1</b>      |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 03.16.01.10     | 86932           | SINAPI        | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN  | <b>6,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | <b>AMBIENTE</b> | <b>QUANT.</b> |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | Ambiente 15.4   | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | Ambiente 15.5   | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | Ambiente 14.2   | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | Ambiente 14.3   | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | Ambiente 15.20  | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | Ambiente 15.17  | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | <b>TOTAL</b>    | <b>6</b>      |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| <b>03.16.02</b> |                 |               | <b>APARELHOS</b>                                                                                                                                                      |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>0,00</b> |
| 03.16.02.01     | COMP 125        | COMP          | Ralo sifonado em PVC com grelha cromada. Forneimento e instalação.                                                                                                    | und | <b>7,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | <b>AMBIENTE</b> | <b>QUANT.</b> |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | 15.4            | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | 15.5            | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | 14.2            | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | 14.3            | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | 15.17           | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | 15.20           | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | 15.2            | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | 14.4            | 1             |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                 | <b>TOTAL</b>    | <b>8</b>      |                                                                                                                                                                       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 03.16.02.03     | 95544           | SINAPI        | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                          | UN  | <b>7,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |







|             |                           |        |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 03.17.01.03 | COMP 87                   | COMP   | Fornecimento e instalacao de Luminária a led de embutir, 30x30cm com corpo em chapa de aço com pintura microtexturizada na cor branca e difusor em poliestireno translucido 48w marca Lumicenter ou similar     | und | 34,00 |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | AMBIENTE                  | QUANT. |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | 15.7                      | 4      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | 15.11                     | 1      | Só havia uma luminária instalada                                                                                                                                                                                |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | 15.12                     | 2      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | 15.13                     | 1      | Só havia uma luminária instalada                                                                                                                                                                                |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | 15.14                     | 2      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | 15.15                     | 4      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | 15.16                     | 2      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | 14.10                     | 2      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | 15.9                      | 2      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | 15.8                      | 2      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | 18.18                     | 3      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | 15.19                     | 3      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Entrada principal         | 6      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | TOTAL                     | 34     |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 03.17.01.09 | COMP 94                   | COMP   | Fornecimento e instalacao de Luminária a led de embutir, com corpo em aluminio, aro de acabamento em policarbonato injetado na cor branca e difusor em poliestireno translucido 18w marca Lumicenter ou similar | und | 7,00  | ACRÉSCIMO | 2,00 |  | Considerando a luminária do ambiente 15.20, terá um acréscimo de 2 luminárias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | AMBIENTE                  | QUANT. |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | 15.2                      | 1      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | 15.4                      | 1      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | 15.5                      | 1      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | 15.6                      | 1      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | 15.17                     | 1      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | 15.20                     | 0      | Não havia luminária instalada                                                                                                                                                                                   |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | 14.4                      | 1      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | 14.2                      | 1      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | 14.3                      | 1      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | TOTAL                     | 8      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 03.17.01.10 | COMP 95                   | COMP   | Fornecimento e instalacao de Luminária a led de embutir, com facho orientável orbital, corpo em aluminio com pintura microtexturizada cor branca marca Lumicenter ou similar                                    | und | 2,00  | ACRÉSCIMO | 1,00 |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | AMBIENTE                  | QUANT. |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | 14.10                     | 3      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 03.17.02    |                           |        | INTERRUPTORES E TOMADAS                                                                                                                                                                                         |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 03.17.02.01 | 180201                    | IOPES  | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"                                                                                                                       | und | 37,00 |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | AMBIENTE                  | QUANT. |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Copa - 15.6               | 3      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Secretaria - 15.3         | 4      | Faltou um ponto de tomada na parede de divisa com a entrada principal                                                                                                                                           |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Same - 15.7               | 4      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Compras - 15.11           | 3      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | RH - 15.12                | 3      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | CCIH - 15.13              | 3      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Sesmt - 15.14             | 1      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Faturamento - 15.15       | 6      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Diretor Clínico - 15.16   | 3      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Entrada Principal         | 3      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Bebedouro                 | 1      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Recepção - 14.10          | 3      | JÁ ACRESCENTEI A TOMADA BAIXA                                                                                                                                                                                   |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Psicologo - 15.9          | 2      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Assistente Social - 15.8  | 2      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Reunião - 15.18           | 4      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Diretor Adm - 15.19       | 3      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | TOTAL                     | 37     |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 03.17.02.02 | 91953                     | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                                                     | UN  | 14,00 | ACRÉSCIMO | 5,00 |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | AMBIENTE                  | QUANT. |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | DML - 15.2                | 1      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Sanit. Funcionário - 15.4 | 1      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Sanit. Funcionário - 15.5 | 1      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Copa - 15.6               | 1      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Sanitário - 15.17         | 1      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Sanitário - 15.20         | 0      | Não tem interruptor instalado                                                                                                                                                                                   |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Sanitário PCD - 14.4      | 1      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Sanitário Público - 14.2  | 1      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|             | Sanitário Público - 14.3  | 1      |                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |      |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |






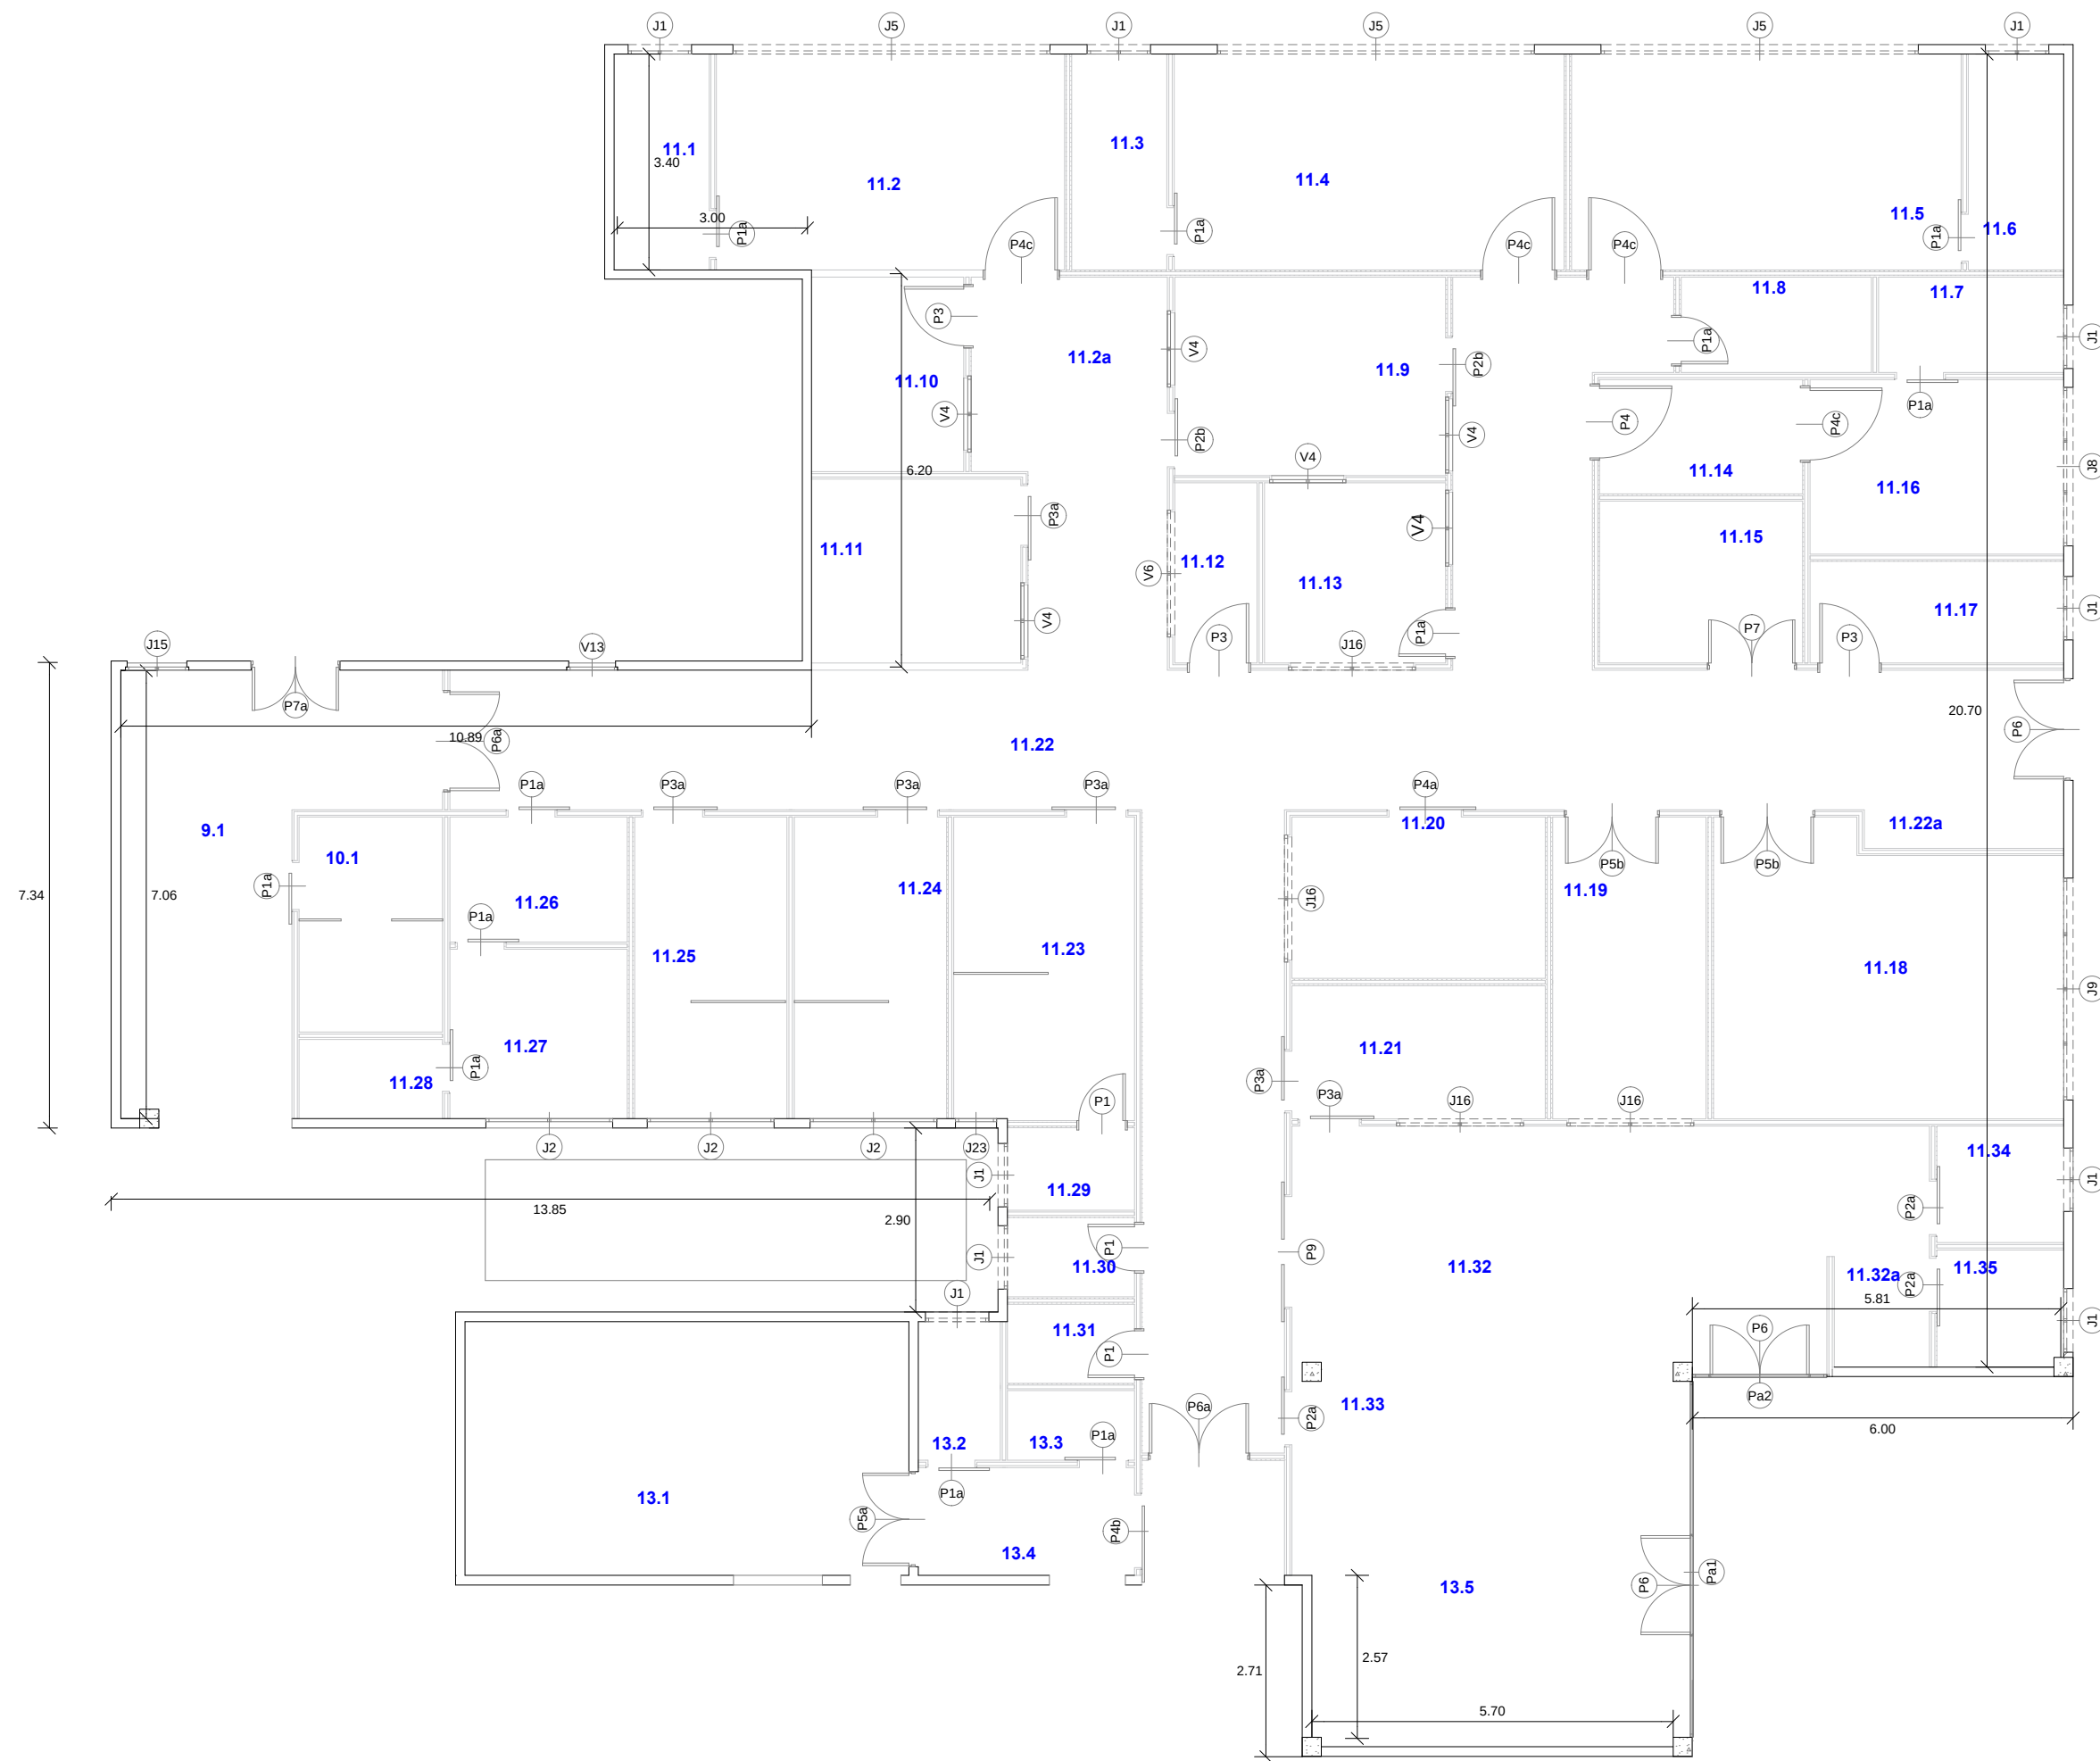


CHAPISCO INTERNO - PRONTO SOCORRO

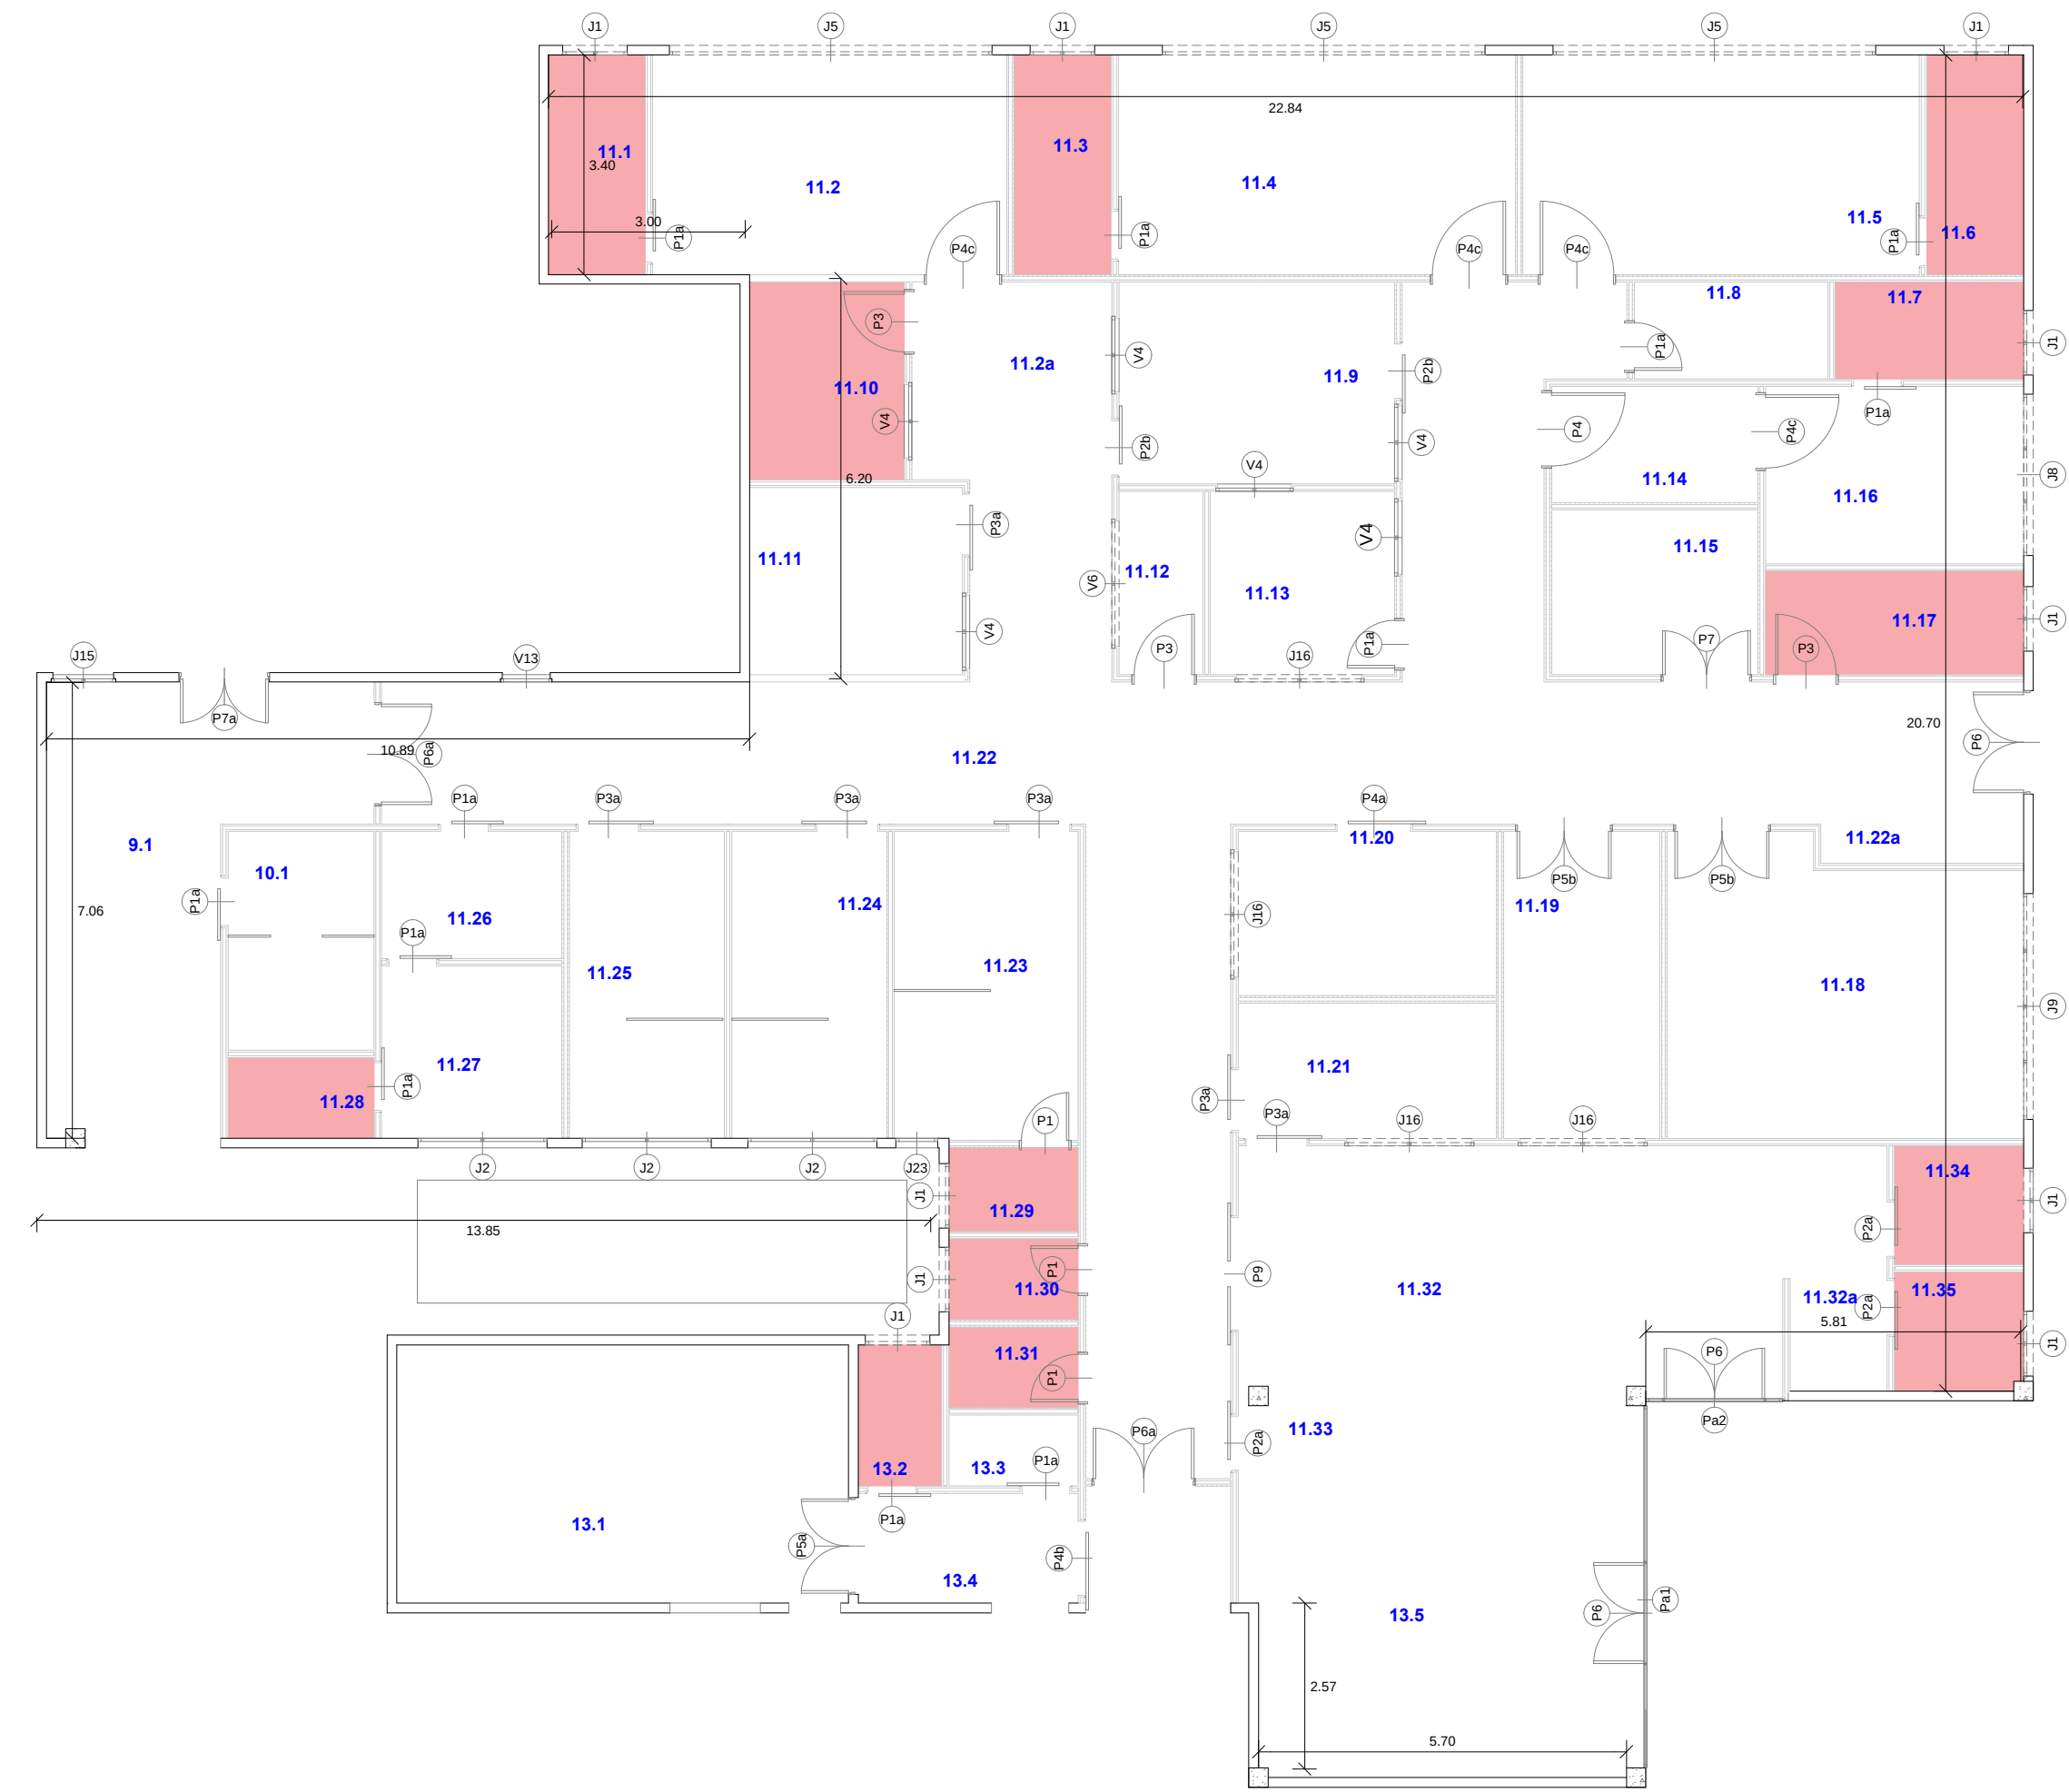

REBOCO INTERNO - PRONTO SOCORRO

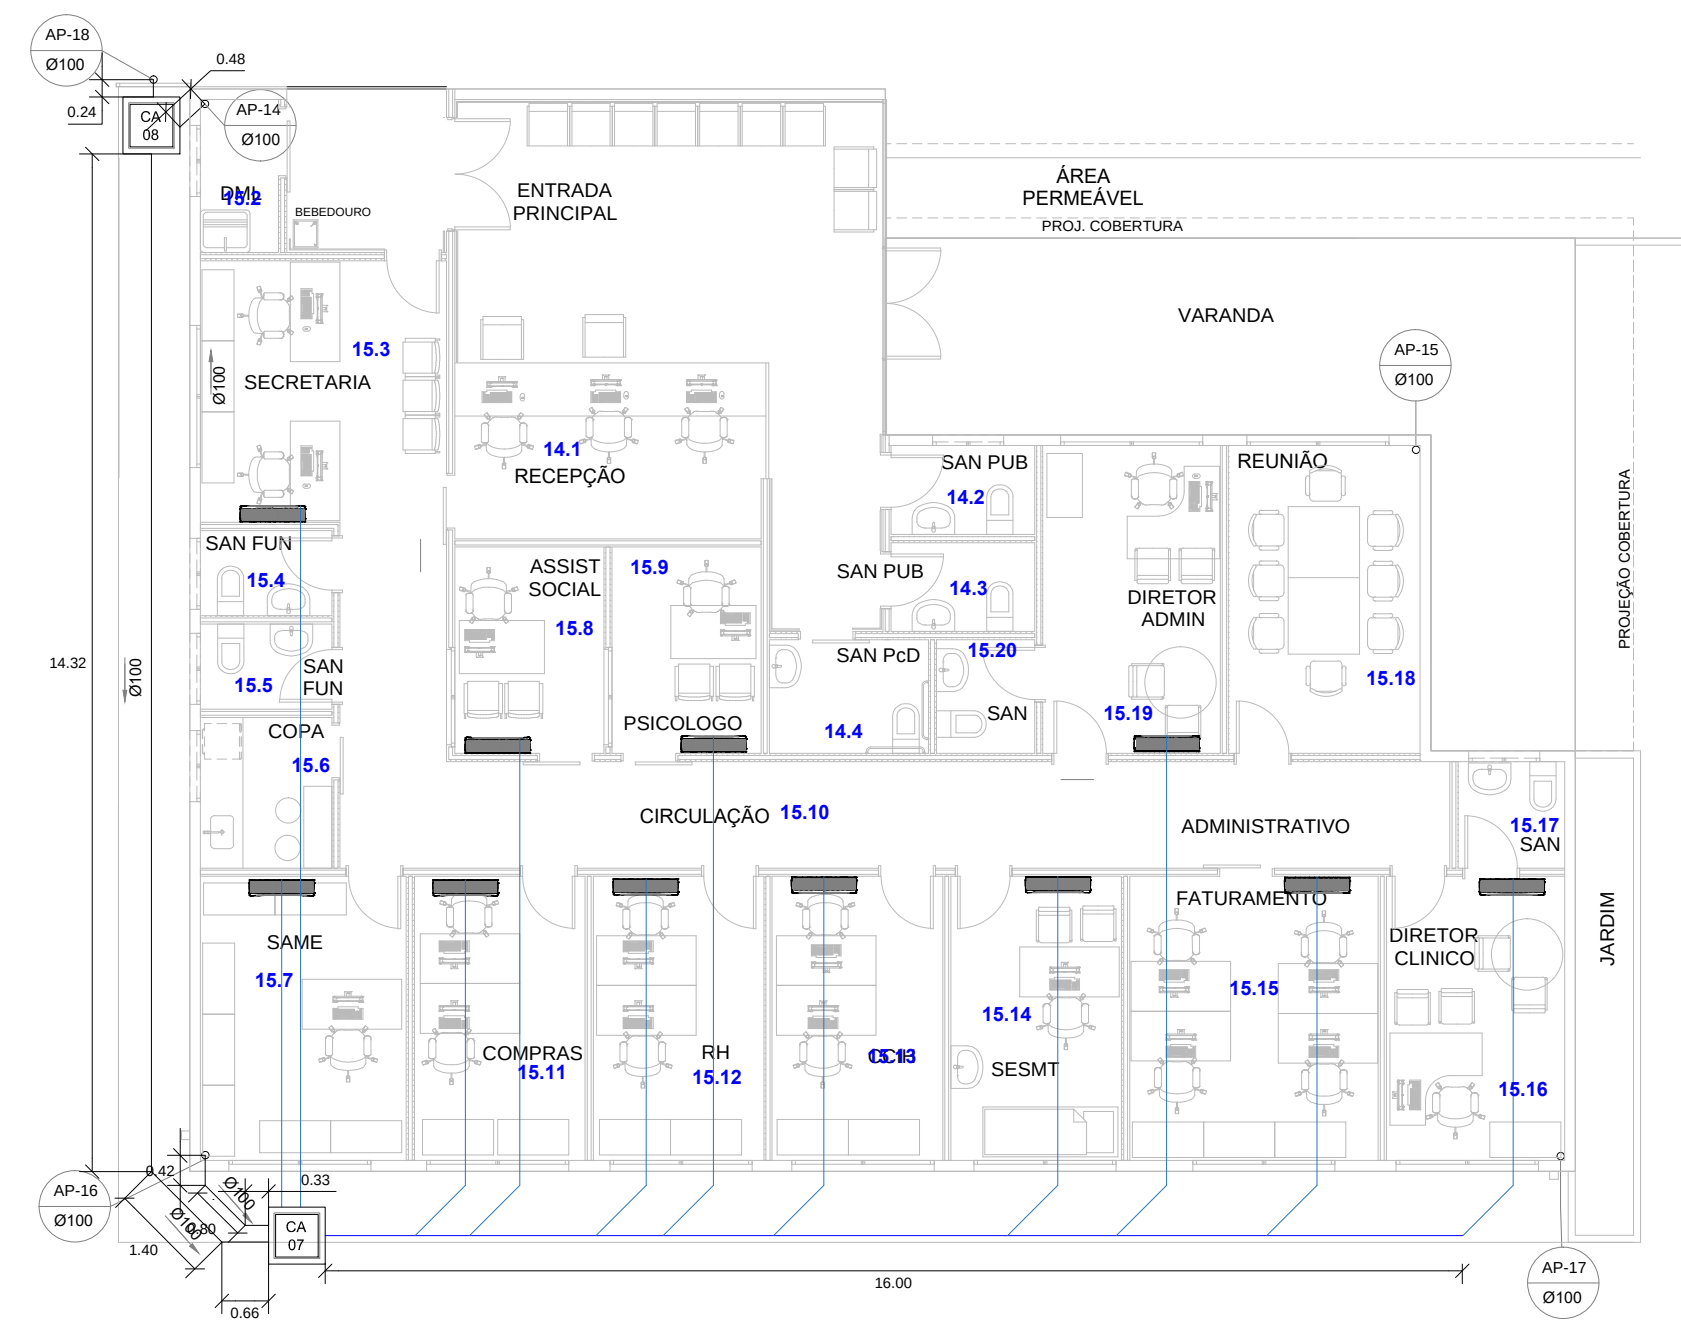

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ADMINISTRATIVO

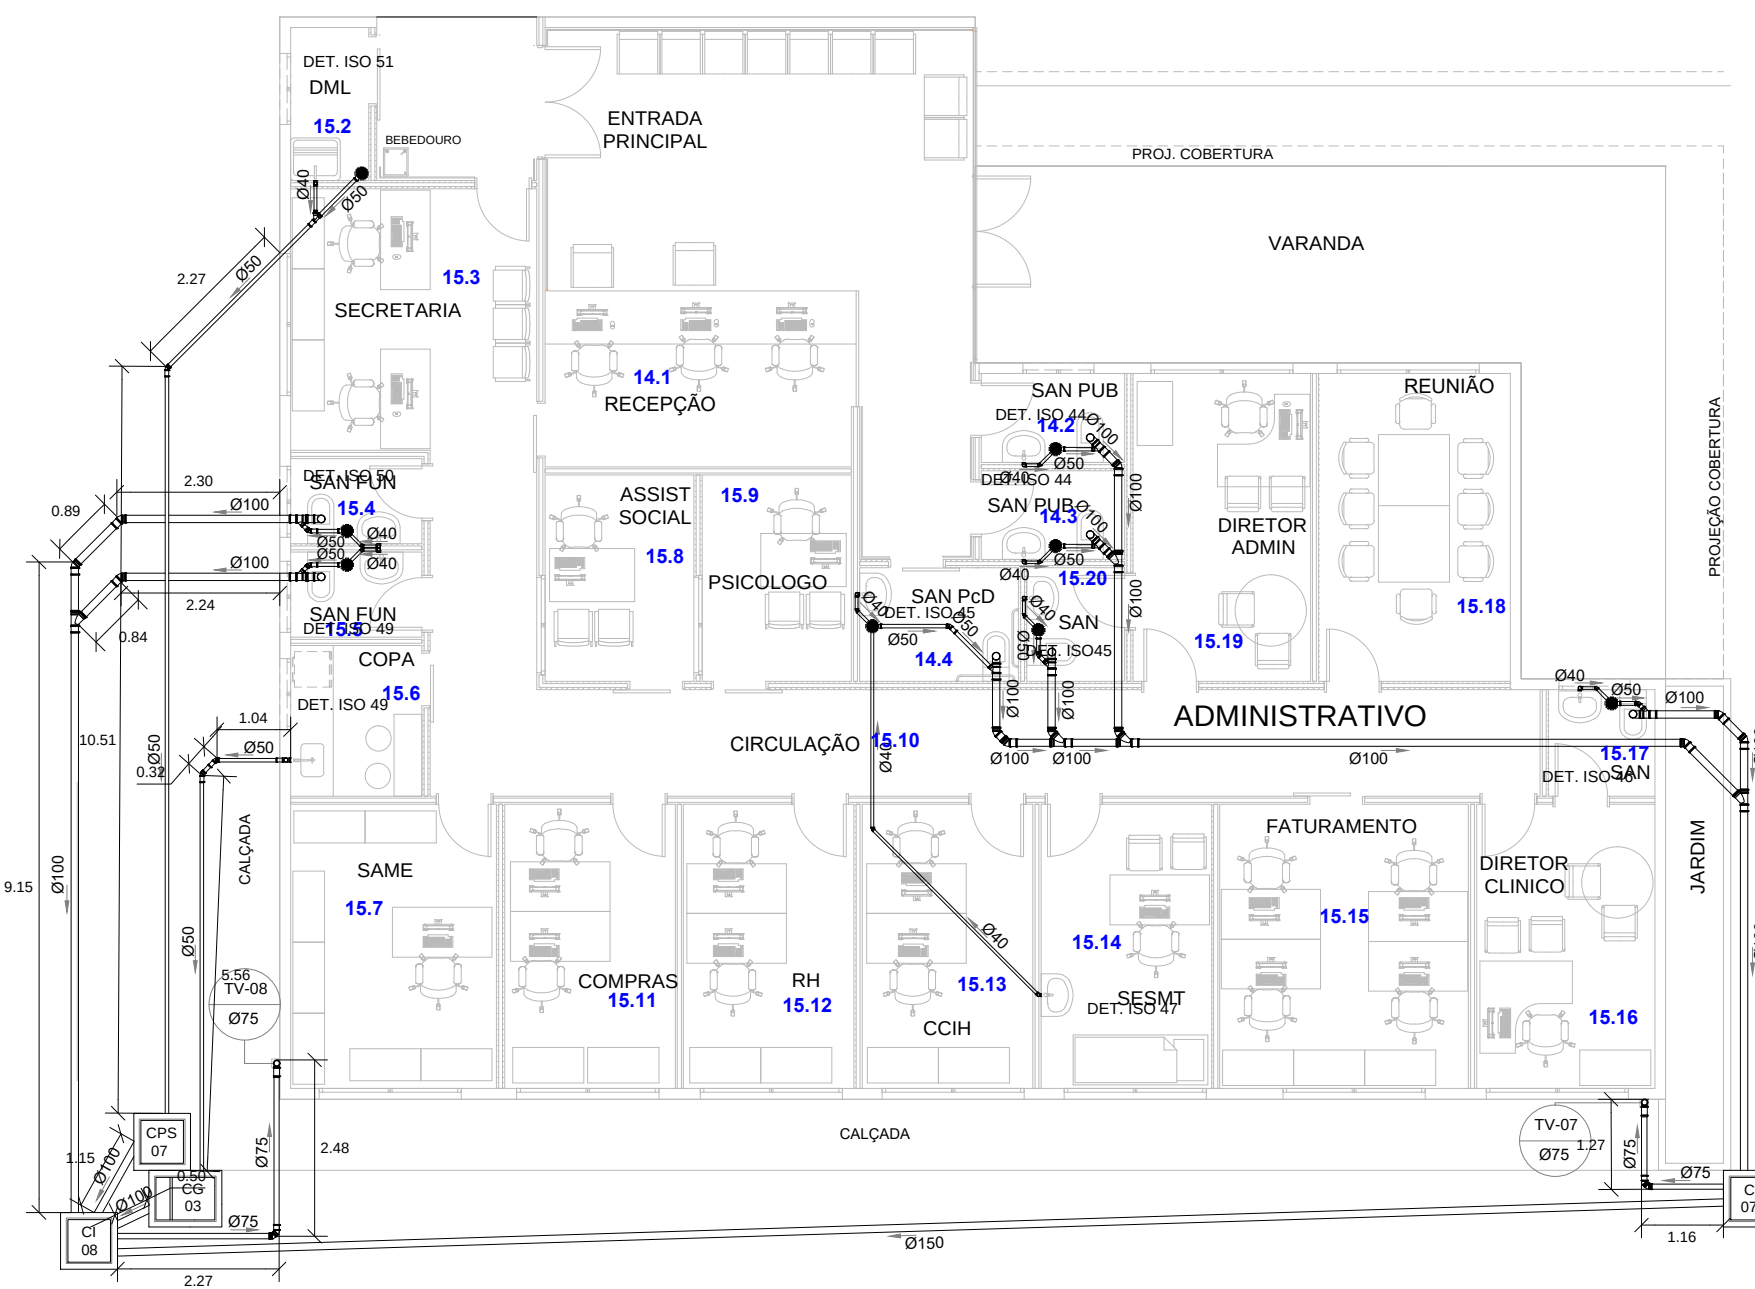

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ADMINISTRATIVO

**LEGENDA**

Ambientes com emboço nas paredes de alvenaria



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS**

**CROQUI - 9ª MEDIÇÃO**

TÍTULO: CROQUI

LOCAL: HOSPITAL E MATERNIDADE DE PANCAS - PANCAS/ES

FISCAL:   
STELLA MARYS PEREIRA CORRÊA  
Engenheira Civil  
CREA ES-043178/D

ESCALA: SEM ESCALA  
DATA: 2023



FORMATO: A1

FRANCHA: **01/03**









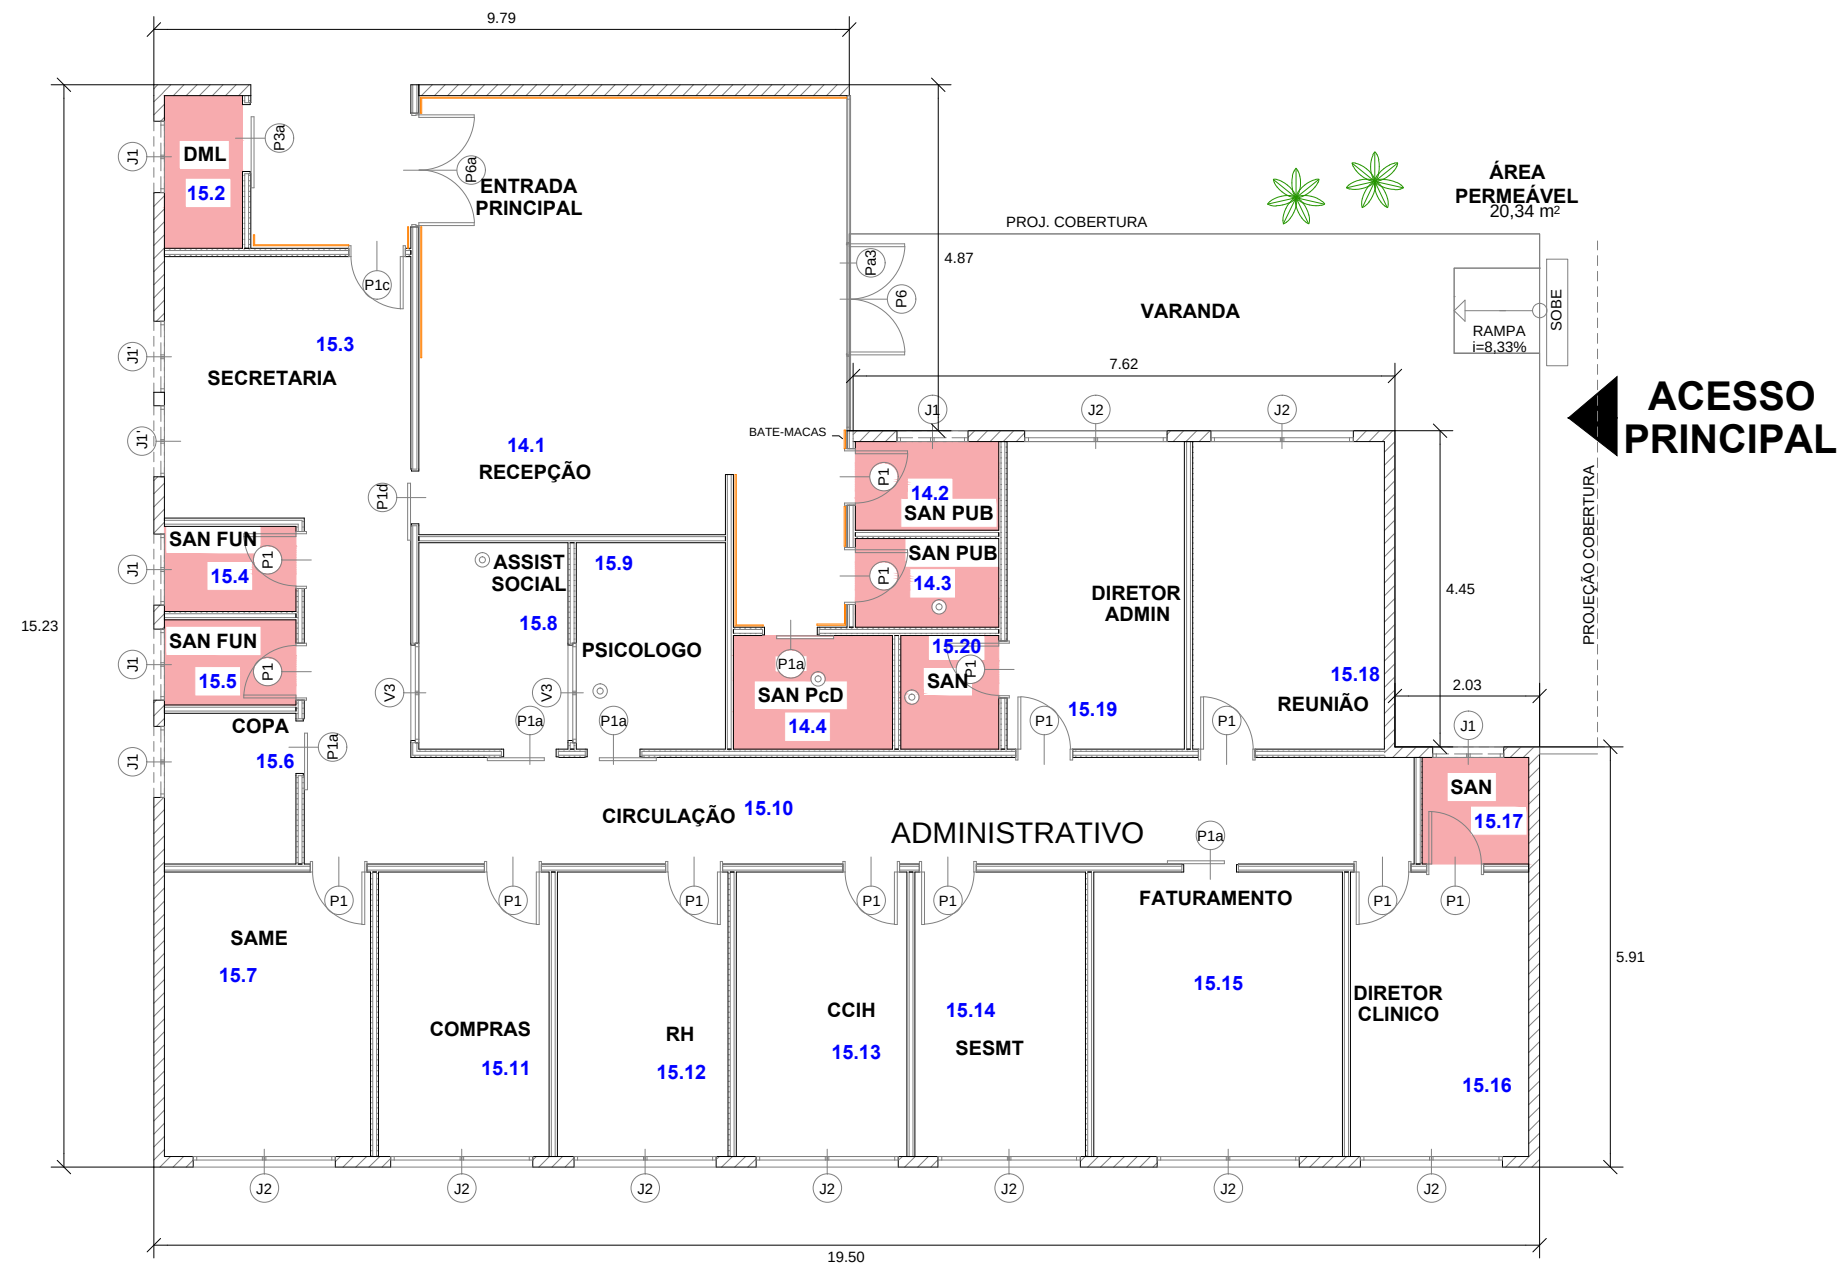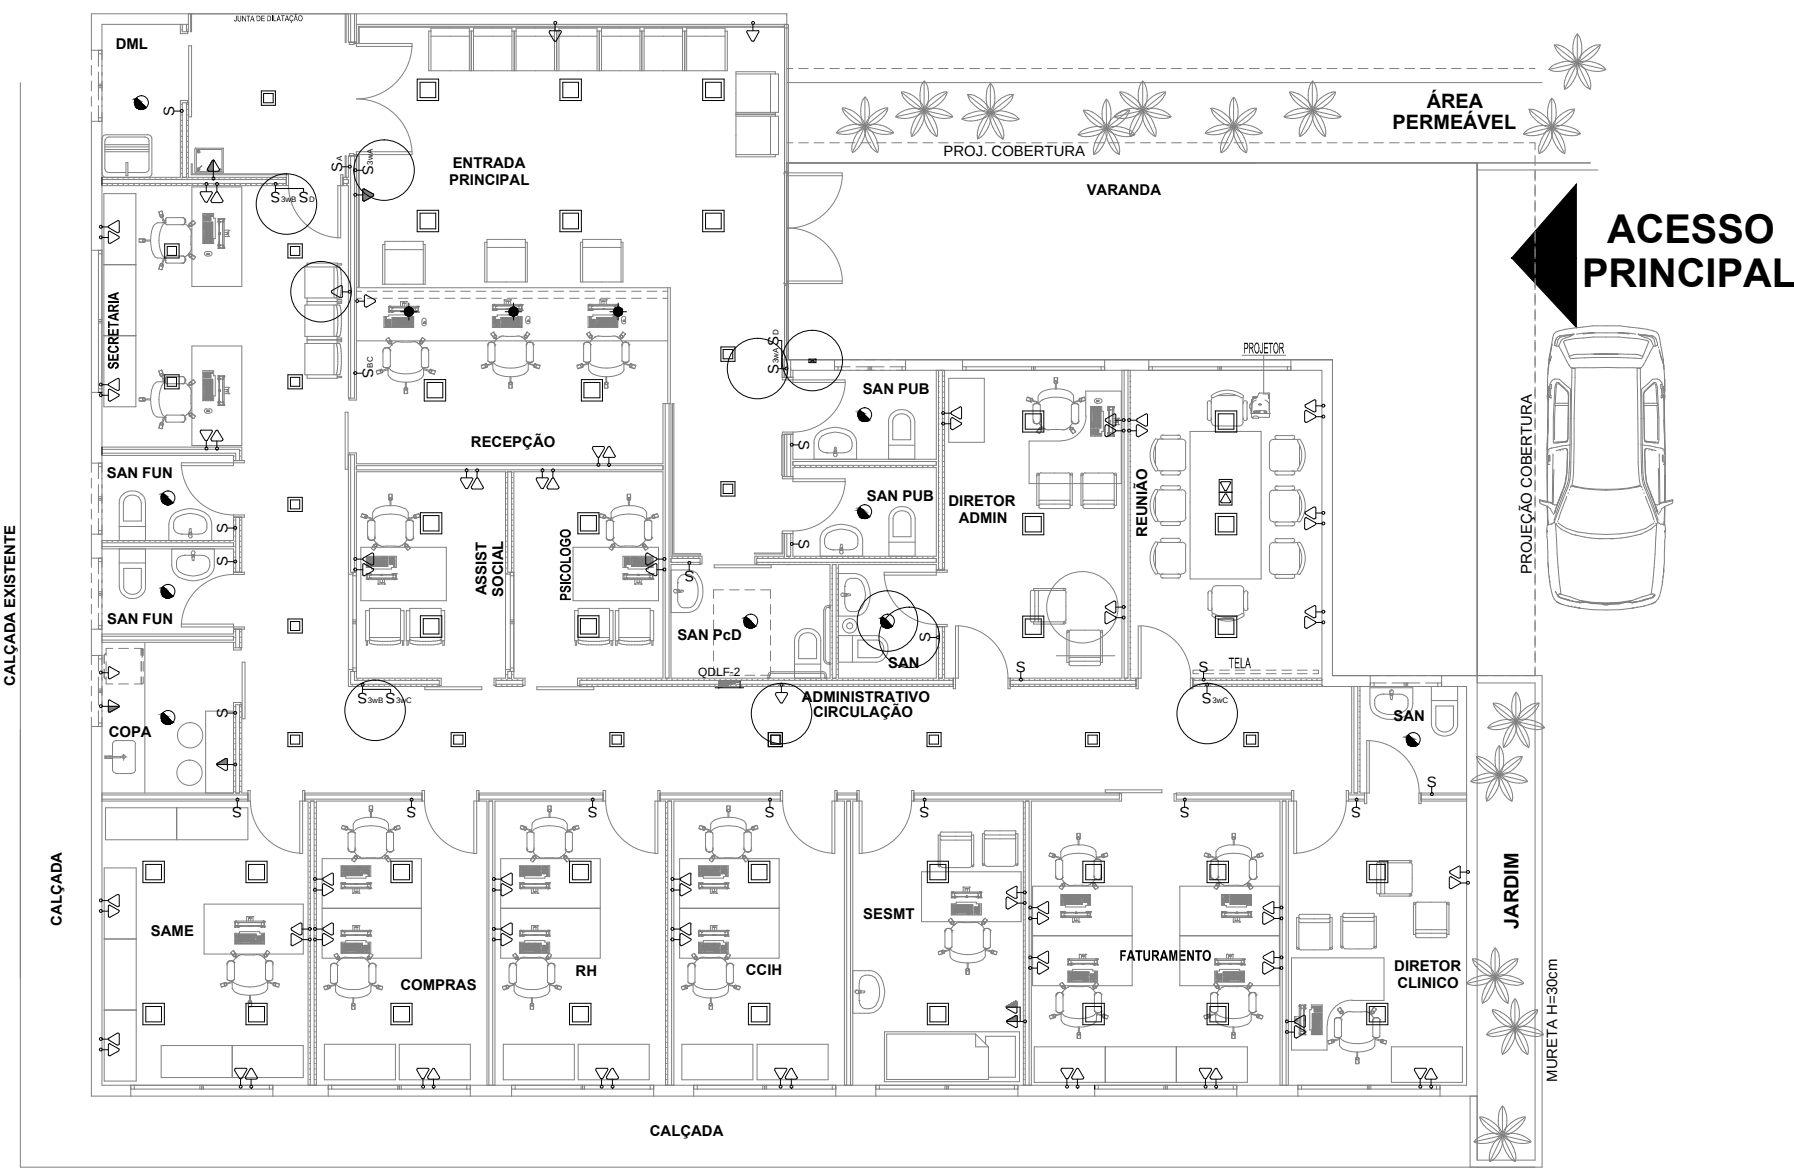

ELÉTRICO - ADMINISTRATIVO

SPDA - CABO SOBRE CHAPIM DO ADMINISTRATIVO

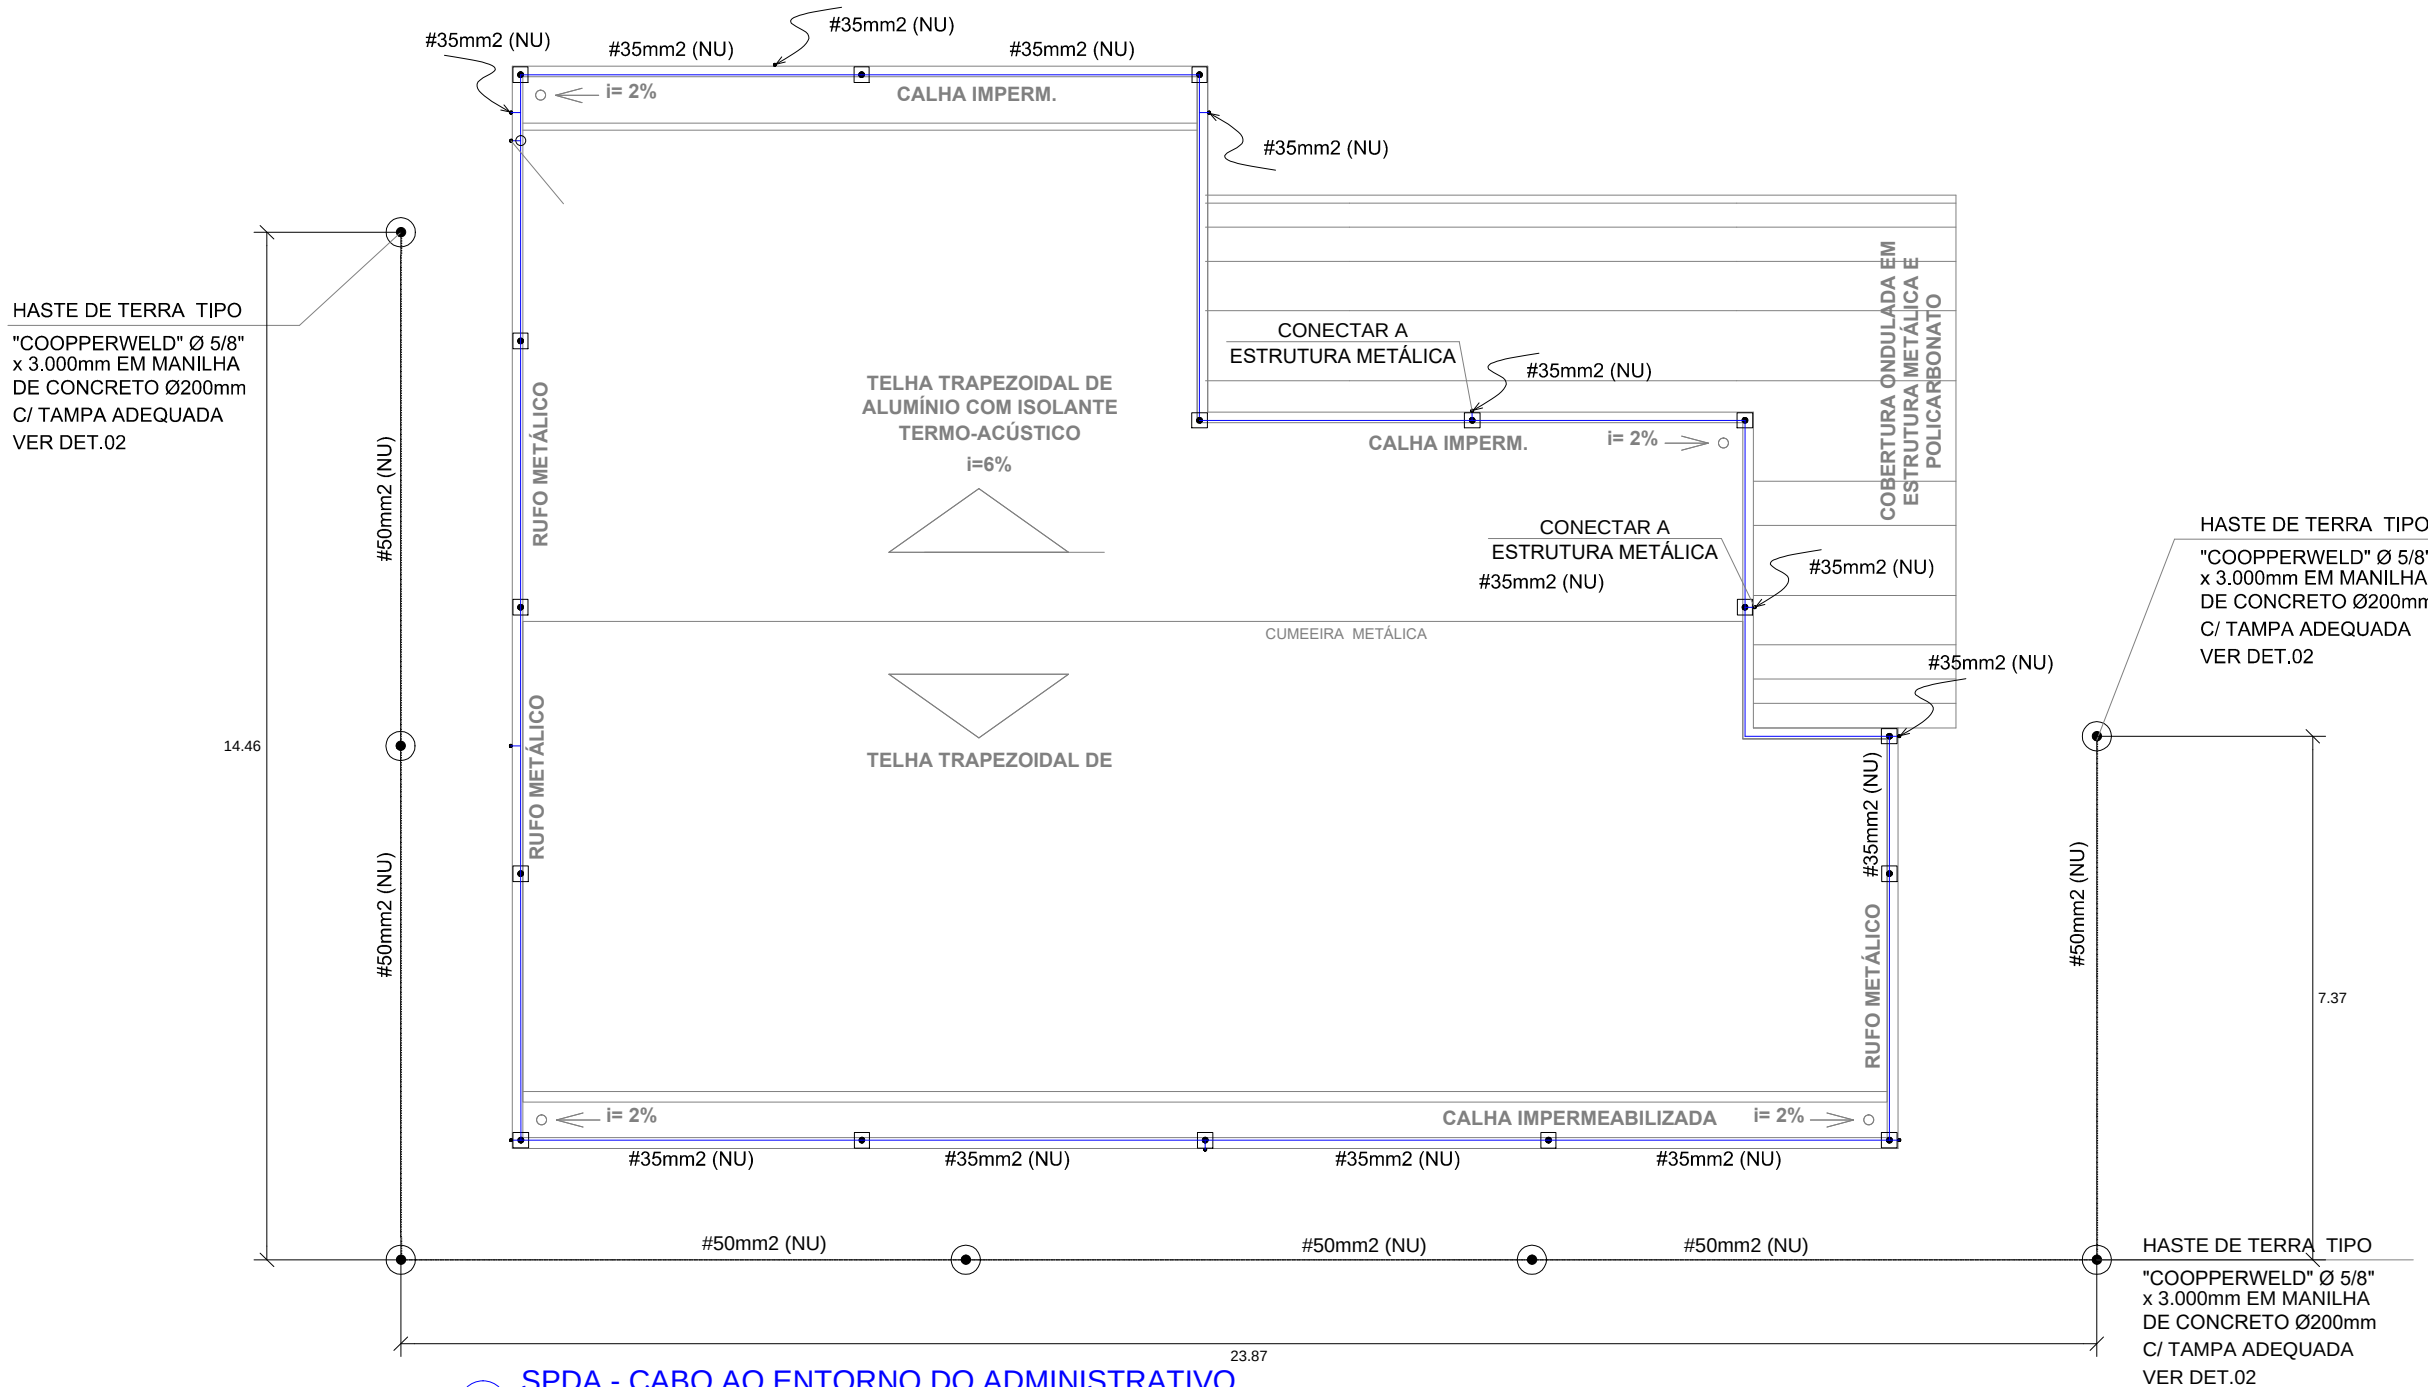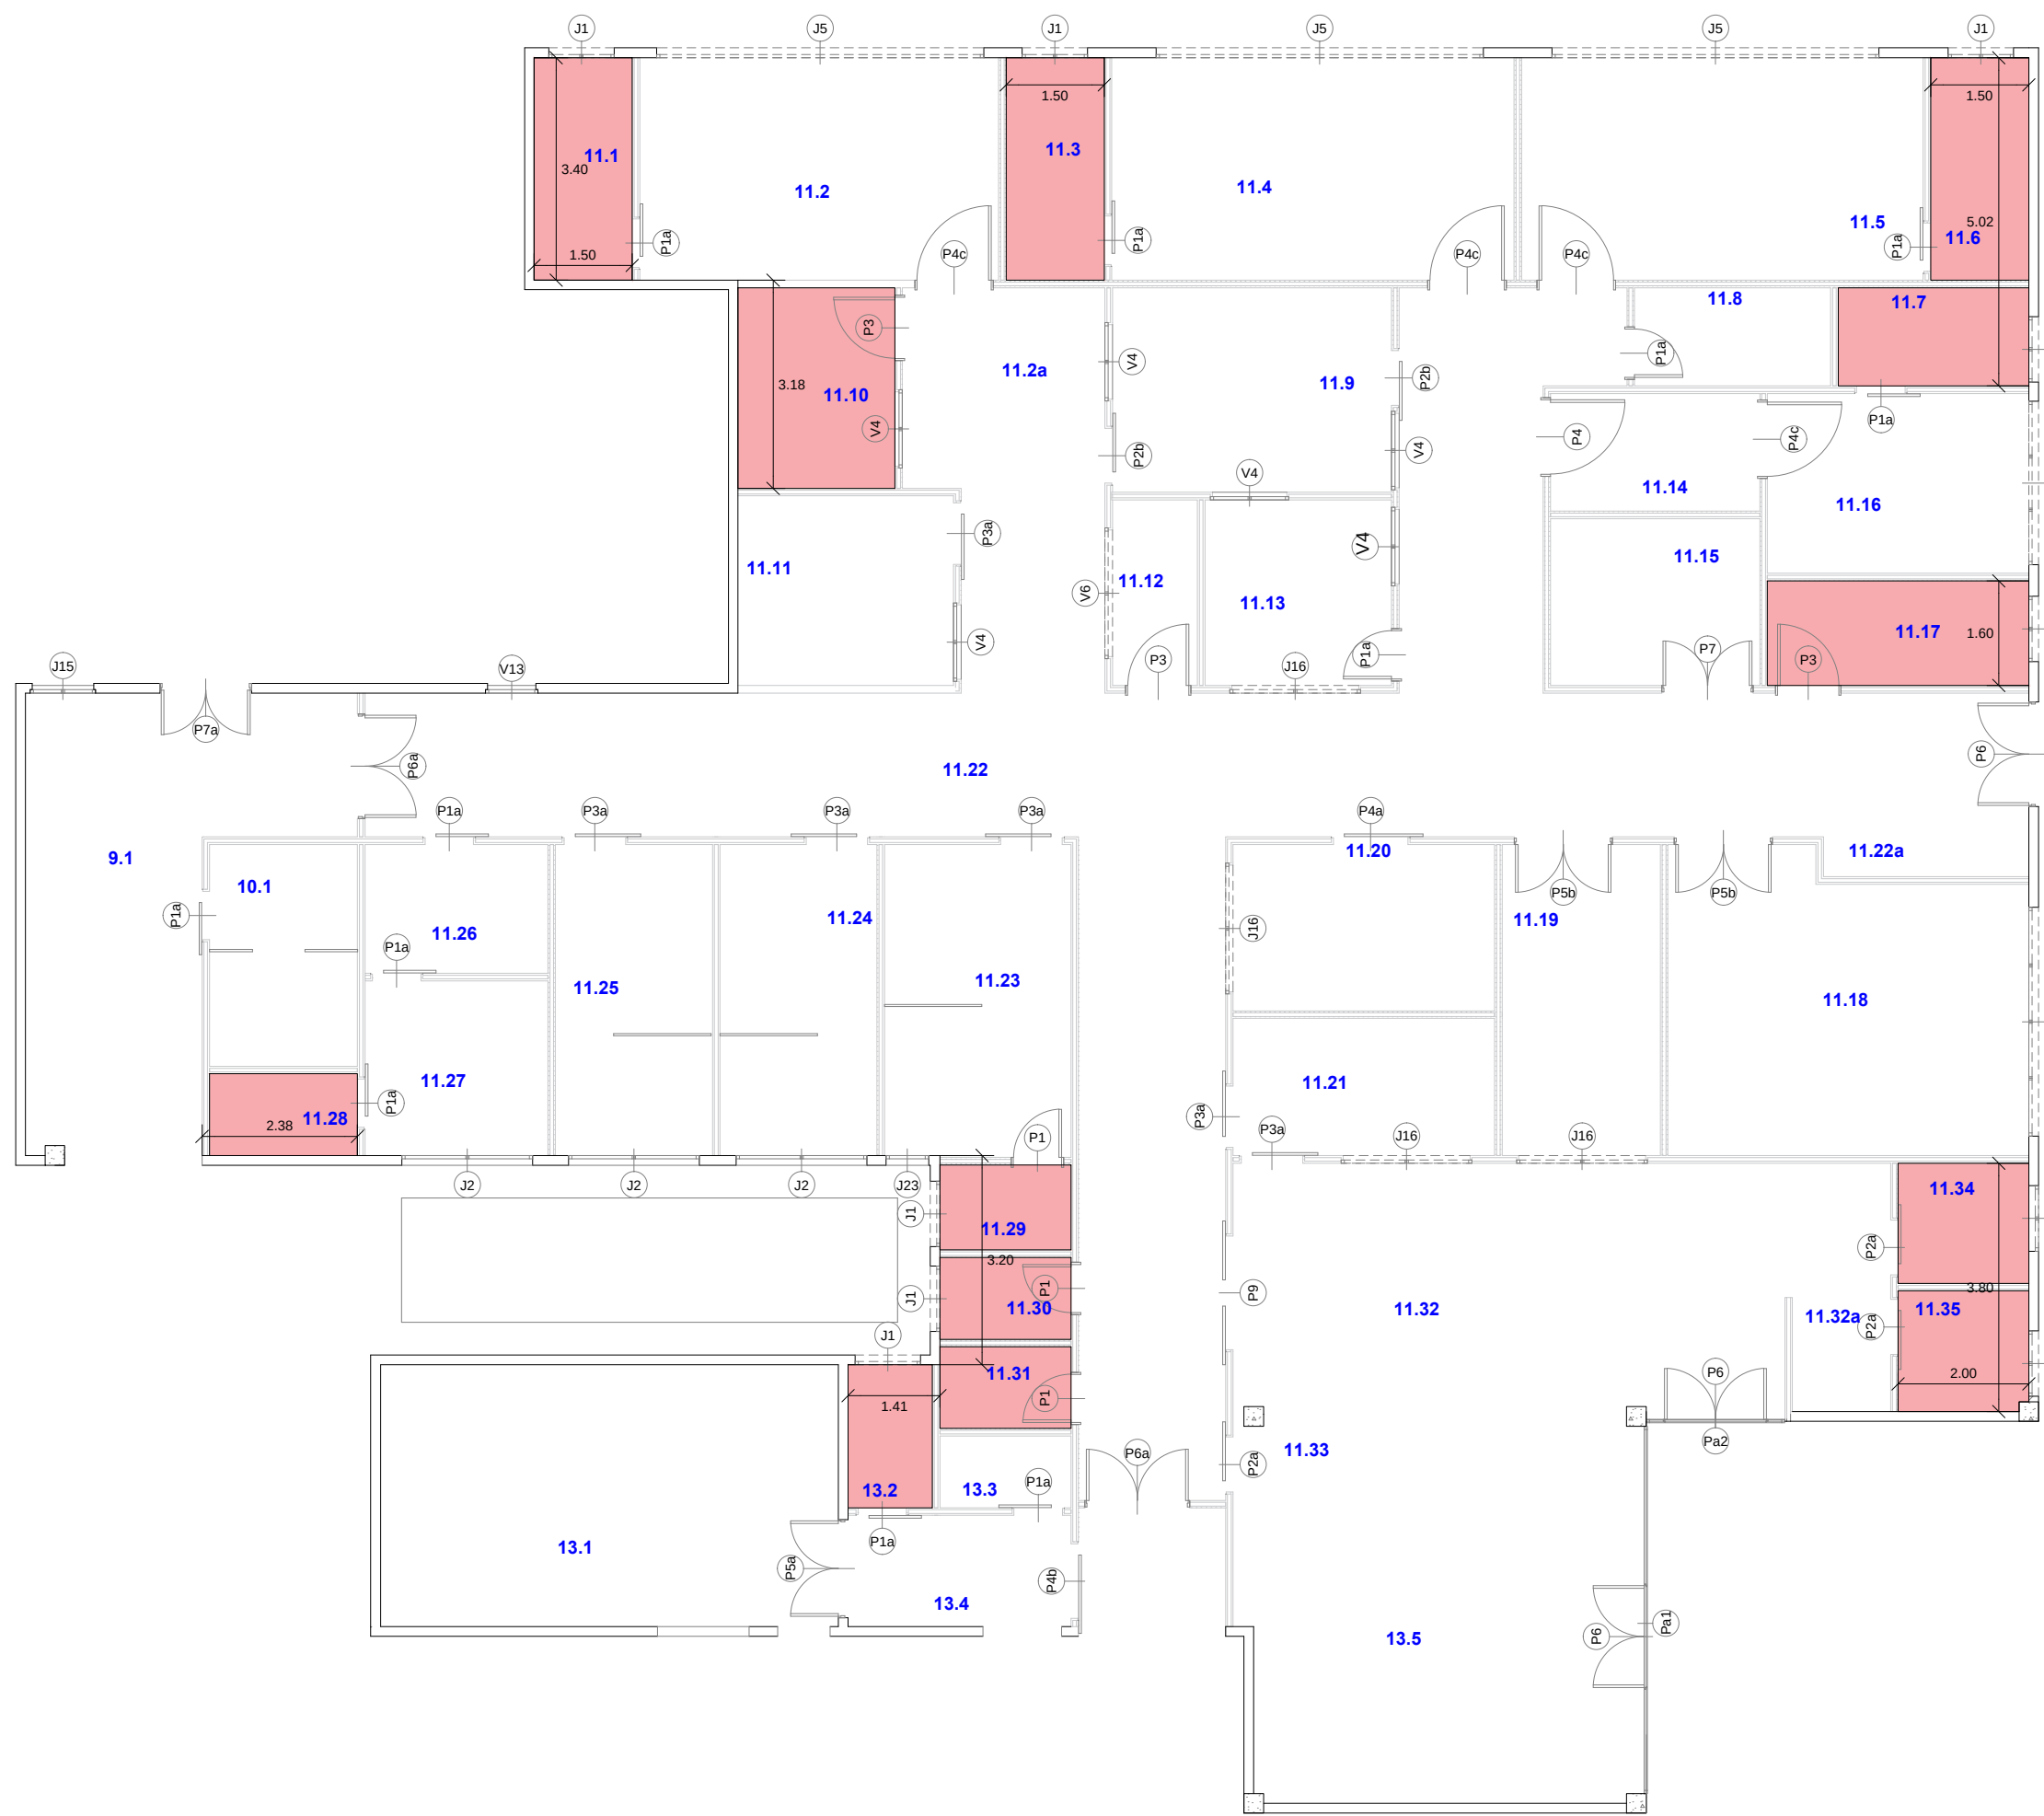

EMBOÇO INTERNO - PRONTO SOCORRO

|                                                                                       |                                                                     |       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|  |                                                                     |       |          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS                                                        |                                                                     |       |          |
| CROQUI - 9ª MEDIÇÃO                                                                   |                                                                     |       |          |
| TÍTULO: CROQUI                                                                        |                                                                     |       |          |
| LOCAL: HOSPITAL E MATERNIDADE DE PANCAS - PANCAS/ES                                   |                                                                     |       |          |
| FISCAL:                                                                               | STELLA MARYS PEREIRA CORRÊA<br>Engenheira Civil<br>CREA ES-043178/D |       | FRANCHA: |
| ESCALA: SEM ESCALA                                                                    | FORMATO: A1                                                         | 03/03 |          |
| DATA: 2023                                                                            |                                                                     |       |          |
