QUINTA COMISSÃO
Fls: 64
SINDRA

previsão do art. 77, da Lei n.º 8.666/93, sendo reconhecidos pela CONTRATADA os direitos da CONTRATANTE.

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78, da Lei n.º 8.666 de 1993, com as consequências indicadas no art. 80, da mesma Lei, sem prejuízo das sanções previstas no mesmo diploma legal.

13.1.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, de acordo com o parágrafo único do art. 78, da lei acima referida;

13.1.2. Em quaisquer das formas de rescisão contratual, unilateral, amigável ou judicial, será observado o art. 79, da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Décima Primeira - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, respeitadas as disposições legais, nos seguintes casos:

12.1 Unilateralmente pelo **CONTRATANTE**:

12.1.1Quando houver modificações das especificações, para melhor adequação técnica dos seus objetivos;

12.1.2Quando necessária a modificação do projeto ou das especificações em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

12.2. Por acordo entre as partes, quando conveniente a substituição da garantia da execução; quando necessária a modificação dos termos de execução do objeto do contrato, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários e, ainda, nos demais casos previstos na lei.

Cláusula Décima Segunda – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Rubrica Orçamentária da Secretaria Municipal de Educação -SMED: **Atividade (s) 1092 e 2020, Elemento (s) 44.90.51.00.000, Subelemento (s) 44.90.51.01.000 e Fonte (s) de Recurso: 01 e 19, Empenho 442/2021.**

Cláusula Décima Terceira – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

Integram o presente contrato, como se nele estivem na íntegra transcritas, as cláusulas, condições e especificações estabelecidas no Instrumento Convocatório do processo licitatório referido no preâmbulo deste contrato, bem assim todos os seus anexos.

PGM
Gabriella de Andrade Lopes

QUINTA COMISSÃO
Fls: 65
SINDIPA

Cláusula Décima Quarta – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

A CONTRATADA deverá comprovar, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação e em seus anexos, por meio da atualização das Certidões no Cadastro de Fornecedores do Município de Vitória da Conquista – SICAD, na forma do art. 1°, § 4° e art. 4° do Decreto Municipal n.° 14.872, de 28 de dezembro de 2012.

Cláusula Décima Quinta – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Vitória da Conquista – BA, para dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas do presente Termo, com renuncia expressa de qualquer outro por mais especial que seja.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente CONTRATO, digitado por mim _____ (Leila Brito Fagundes, Matrícula 13081-3), mantendo todas as cláusulas constantes no anexo VII, da Concorrência Pública n.° 002/2021, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o assinam, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Vitória da Conquista – BA, 15 de outubro de 2021.

_____
Secretária Municipal de Educação

_____
Contratada

TESTEMUNHAS:

1._____
CPF:

2. _____
CPF:

PGM
Gabriella de Andrade Lopes

CONTRATO 124/2021-SMED

QUINTA COMISSÃO Fls: 66 SIND/PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SMED
CNPJ: 06.071.702/0001-42
RESUMO DO CONTRATO 124/2021-SMED

CONTRATADO: AR ENGENHARIA EIRELI
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA.
OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS ESTRUTURAIS E AMPLIAÇÃO, REPAROS E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA.
CONCORRÊNCIA n.º 002/2021- SMED.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.579.246,07(Um milhão, quinhentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e seis reais e sete centavos).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 15/10/2021 até 15/04/2022
ELEMENTO(S): 44.90.51.00.000.
ATIVIDADE(S): 1092 e 2020

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO 125/2021-SMED

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SMED
CNPJ: 06.071.702/0001-42
RESUMO DO CONTRATO 125/2021-SMED

CONTRATADO: GILVAN RODRIGUES BRITO.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA.
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO, COM VEÍCULO AUTOMOTOR, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R$ 58.980,00** (Cinquenta e oito mil novecentos e oitenta reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 15/10/2021 até 15/10/2022.
ELEMENTO(S): 33.90.39.00.000
ATIVIDADE(S): 2024

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO ADITIVO

RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2017-FSVC

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
CNPJ 15.329.734/0001-96
RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2017

CONTRATADO: JOSÉ BERNARDINO SANTOS NETO – ME
CONTRATANTE: Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
Processo Administrativo nº 354/2021, Parecer Jurídico n.º 288/2021
OBJETO DO ADITIVO AO CONTRATO: O presente contrato tem por **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E MATERIAIS.**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do contrato de gestão entre o Município de Vitória da Conquista e a Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA.
DATA DA ASSINATURA: 22/10/2021.
VIGENCIA DO ADITIVO: 22/10/2021 a 04/07/2022

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

QUINTA COMISSÃO
Fls: 67
SIMOI/PA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

QUINTA COMISSÃO
Fls: 68
SINDIPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.286.217/0001-57 MATRIZ		06/02/2020

NOME EMPRESARIAL
AR ENGENHARIA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
AR ENGENHARIA EIRELI	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R HORMINDO BARROS	770	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.029-094	CANDEIAS	VITORIA DA CONQUISTA	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ARENGENHARIACONSTRUTORA@GMAIL.COM	(77) 9109-9040

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	06/02/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/11/2022** às **11:10:48** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

QUINTA COMISSÃO
Fls: 69
SINDIPA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.286.217/0001-57 MATRIZ		06/02/2020

NOME EMPRESARIAL
AR ENGENHARIA EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R HORMINDO BARROS	770	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.029-094	CANDEIAS	VITORIA DA CONQUISTA	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ARENGENHARIACONSTRUTORA@GMAIL.COM	(77) 9109-9040

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	06/02/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/11/2022** às **11:10:48** (data e hora de Brasília).

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista no dia 1º de setembro de 2022, por mais 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 172 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º 1.902/2013, tendo em vista a impossibilidade de conclusão de instrução do processo, e, portanto, de elaboração do relatório conclusivo no prazo anteriormente fixado;

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Corregedoria-Geral do Município, 31 de outubro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA ARAÚJO
CORREGEDOR-GERAL DO MUNICÍPIO

QUINTA COMISSÃO Fls: 70

PORTARIA CRGM-STPC N.º 065, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2022.

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INADIMPLÊNCIA

O CORREGEDOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 2.647/2022 e pelos Decretos Municipais n.º, 18.484 de 13 de março de 2018, nº 19.827, de 04 de outubro de 2019 e nº 22.028, de 30 de junho de 2022, expedidos pelo(a) Chefe do Poder Executivo Municipal e,

CONSIDERANDO a denúncia nº 041/2022, de suposta infração praticada por AR ENGENHARIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.071.702/0001-42, em virtude de descumprimento do Contrato Administrativo nº 124/2021, decorrente do Processo Licitatório de Concorrência nº 002/2021 e Processo Administrativo nº 14.980/2021, consoante informações contidas nas Comunicação Internas nº 189/2022-SMED (GEP 56739/2022), e documentos anexos, oriundos da Coordenação de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação (SMED), relacionadas, em tese, a inexecução parcial de obra de ampliação da Escola Municipal Moisés Meira, localizada no distrito de José Gonçalves, o que representa, caso seja comprovada, violação à Cláusula Primeira, Cláusula Segunda (itens 2.1 e 2.4) e Cláusula Sexta (itens 6.1 e 6.4) do Contrato Administrativo nº 124/2021;

CONSIDERANDO que tal situação contraria o interesse público, bem como as legislações pertinentes;

CONSIDERANDO que a representação formalizada por meio da Comunicação Interna nº 189/2022-SMED (GEP 56739/2022), bem como documentos anexos, oriundos da Coordenação de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação (SMED), preenche todos os requisitos previstos no art. 11, §1º, 12 e 58 do Decreto Municipal n.º 18.484/2018;

CONSIDERANDO a garantia constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório (Art. 5º, LV da CRFB/88) e o previsto no art. 33 Decreto Municipal n.º 18.484/2018;

CONSIDERANDO que a Procuradoria Geral do Município recomendou, por meio do Parecer n.º 213/2022 a instauração de Processo Administrativo de Inadimplência para apurar os fatos relatados na denúncia;

CONSIDERANDO que o Processo Administrativo de Inadimplência tramita, no âmbito da Administração Pública Municipal, de acordo com as normas processuais contidas no Decreto Municipal n.º 18.484/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo de Inadimplência, na forma dos art. 16 do Decreto Municipal n.º 18.484/2018, para apurar representação de descumprimento, por parte da AR ENGENHARIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.071.702/0001-42, em virtude de descumprimento do Contrato Administrativo nº 124/2021, decorrente do Processo Licitatório de Concorrência nº 002/2021 e Processo Administrativo nº 14.980/2021, consoante informações contidas nas Comunicação Internas nº 189/2022-SMED (GEP 56739/2022), e documentos anexos, oriundos da Coordenação de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação (SMED), relacionadas, em tese, a inexecução parcial de obra de ampliação da Escola Municipal Moisés Meira, localizada no distrito de José Gonçalves, o que representa, caso seja comprovada, violação à Cláusula Primeira, Cláusula Segunda (itens 2.1 e 2.4) e Cláusula Sexta (itens 6.1 e 6.4) do Contrato Administrativo nº 124/2021;

Art. 2º - Suspender, de forma cautelar, AR ENGENHARIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

CNPJ sob o nº 06.071.702/0001-42, do Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Vitória da Conquista, nos termos do art. 22 do Decreto Municipal n.º 18.484/2018;

Art. 3º - Nomear os servidores públicos municipais **MEG DE SOUSA MARQUES** (matrícula 07-18644-4, lotada na Secretaria Municipal de Gestão e Inovação), **NAYARA FERRAZ OLIVEIRA** (matrícula 07-15111-0, lotada na Procuradoria Geral do Município) e **ELBERT CLEBER DE SANTANA MOREIRA** (matrícula 07-14424-9, lotado na Secretaria Municipal de Gestão e Inovação) para, sob a presidência da primeira, formarem a comissão responsável pela apuração dos fatos relatados na representação supracitada.

Art. 4º - Garantir autonomia à comissão designada, para apurar tanto a conduta já denunciada, quanto eventuais irregularidades conexas verificadas no curso do procedimento.

Art. 5º - A Comissão poderá requisitar 01 (um) assessor jurídico e 01 (um) estagiário de Direito à Procuradoria Geral do Município.

Art. 6º - Estabelecer o prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta portaria, para a conclusão do Processo Administrativo de Inadimplência, salvo a imposição de circunstâncias excepcionais, conforme determina o art. 18 do Decreto Municipal n.º 18.484/2018;

Art. 7º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

QUINTA COMISSÃO
Fls: 71

Gabinete do Corregedor-Geral do Município, 1º de novembro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA ARAÚJO
CORREGEDOR-GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA CRGM-STPC N.º 066, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2022.

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INADIMPLÊNCIA

O CORREGEDOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 2.647/2022 e pelos Decretos Municipais n.º 18.484 de 13 de março de 2018, nº 19.827, de 04 de outubro de 2019 e nº 22.028, de 30 de junho de 2022, expedidos pelo(a) Chefe do Poder Executivo Municipal e,

CONSIDERANDO a denúncia nº 001/2022, de suposta infração praticada por ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 39.368.629/0001-24, em virtude de descumprimento total da Ata de Registro de Preços nº 051/2021, decorrente do Pregão Eletrônico (SRP) n.º 0[illegible]/2021, cujo objeto trata-se do fornecimento de aparelhos ar-condicionados, em especial por não entregar à Administração os materiais licitados, o que em tese configura infração prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002 (Lei do Pregão), consoante informações contidas na Comunicação Interna nº 500/2021-SEMAD-GS (GEP 77138/2021), bem como documentos anexos, oriundos da Coordenação de Material e Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD);

CONSIDERANDO que tal situação contraria o interesse público, bem como as legislações pertinentes;

CONSIDERANDO que a representação formalizada por meio da Comunicação Interna nº 500/2021-SEMAD-GS (GEP 77138/2021), bem como documentos anexos, oriundos da Coordenação de Material e Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), preenche todos os requisitos previstos no art. 11, §1º, 12 e 58 do Decreto Municipal n.º 18.484/2018;

CONSIDERANDO a garantia constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório (Art. 5º, LV da CRFB/88) e o previsto no art. 33 Decreto Municipal n.º 18.484/2018;

CONSIDERANDO que a Procuradoria Geral do Município recomendou, por meio do Parecer n.º 123/2021, a instauração de Processo Administrativo de Inadimplência para apurar os fatos relatados na denúncia;

CONSIDERANDO que o Processo Administrativo de Inadimplência tramita, no âmbito da Administração Pública Municipal, de acordo com as normas processuais contidas no Decreto Municipal n.º 18.484/2018.

RESOLVE:

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

QUINTA COMISSÃO
Fls: 72
SINDPA

Protocolo - **72291/2022**

PAI 068/2022 - Comunica o início dos trabalhos

Vitória da Conquista, 03 de novembro de 2022

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022

Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57

Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

Ao Ilmo. Sr.

Antônio Gabriel Oliveira Araújo

Corregedor-Geral do Município

Na condição de Presidente da Comissão de Inquérito designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, objeto do Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022, **COMUNICO** que, no dia 03 de novembro, a comissão instalou-se na sala de reuniões das Comissões de Processos Administrativos, situada na Rua João Norberto n.º 46, Alto Maron, neste Município e deu início aos seus trabalhos, com o intuito de apurar a denúncia interposta em desfavor da pessoa jurídica **AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57.**

Atenciosamente,

MEG DE SOUSA MARQUES
AGENTE ADMINISTRATIVO
18644-4
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - STPC

Recebido em: 03/11/22 às 16:45
Ass:
Matrícula: 023978-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

73

Protocolo - **72240/2022**

PAI 068/2022 - Suspensão Cautelar

Vitória da Conquista, 03 de novembro de 2022

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022

Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57

Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

A Ilma. Sra.

Lara Betânia Lélis Oliveira

Coordenação de Material e Patrimônio

Na condição de Presidente da Comissão de Inquérito designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, objeto do Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022, COMUNICO que, no dia 03 de novembro, a comissão instalou-se na sala de reuniões das Comissões de Processos Administrativos, situada na Rua João Norberto n.º 46, Alto Maron, neste Município e deu início aos seus trabalhos, com o intuito de apurar a denúncia interposta em desfavor da pessoa jurídica **AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57**. Diante disso, solicitamos a suspensão, de forma cautelar, da empresa citada anteriormente do Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Vitória da Conquista, a fim de resguardar o interesse público e evitar a participação da empresa supracitada em futuras licitações, nos termos do art.22 do Decreto Municipal n.°18.484/2018 de 13 de março de 2018 , publicado no Diário Oficial do Município em 16 de março de 2018, Edição n.°2.080, ano 11, de 16 de março de 2018, até a conclusão do Processo Administrativo de Inadimplência supracitado.

Atenciosamente,

RECEBIDO EM:
04 / 11 / 2022
15 : 08 hs

Endereço: Praça Joaquim Correia - Nº 55
Centro - Vitória da Conquista - Ba - CEP: 45000-907
Telefone(s): (77) 3424-8947 -
1881

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

74

MEG DE SOUSA MARQUES
AGENTE ADMINISTRATIVO
18644-4
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO - STPC

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

75

Protocolo - **72193/2022**

PAI 068/2022 - Comunica o início dos trabalhos

Vitória da Conquista, 03 de novembro de 2022

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022

Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57

Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

Ao Ilmo. Sr.

Edivaldo Ferreira Júnior

Secretário Municipal de Gestão e Inovação

Na condição de Presidente da Comissão de Inquérito designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, objeto do Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022, COMUNICO que, no dia 03 de novembro, a comissão instalou-se na sala de reuniões das Comissões de Processos Administrativos, situada na Rua João Norberto n.º 46, Alto Maron, neste Município e deu início aos seus trabalhos, com o intuito de apurar a denúncia interposta em desfavor da pessoa jurídica **AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57**. Diante disso, informamos que houve a suspensão, de forma cautelar, da empresa citada anteriormente do Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Vitória da Conquista, a fim de resguardar o interesse público e evitar a participação da empresa supracitada em futuras licitações, nos termos do art.22 do Decreto Municipal n.°18.484/2018 de 13 de março de 2018 , publicado no Diário Oficial do Município em 16 de março de 2018, Edição n.°2.080, ano 11, de 16 de março de 2018, até a conclusão do Processo Administrativo de Inadimplência supracitado.

Atenciosamente,

Endereço: Praça Joaquim Correia - Nº 55
Centro - Vitória da Conquista - Ba - CEP: 45000-907
Telefone(s): (77) 3424-8947 -
1881

Secretaria Mun. de Gestão e Inovação
Recebido em 04/11/2022
Responsável: Maria Eunice

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

76

MEG DE SOUSA MARQUES
AGENTE ADMINISTRATIVO
18644-4
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO - STPC

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

77

Protocolo - **72195/2022**

PAI 068/2022 - Suspensão Cautelar

Vitória da Conquista, 03 de novembro de 2022

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022

Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57

Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

A Ilma. Sra.

Ramona Cerqueira Pereira

Secretária Municipal de Saúde

Na condição de Presidente da Comissão de Inquérito designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, objeto do Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022, COMUNICO que, no dia 03 de novembro, a comissão instalou-se na sala de reuniões das Comissões de Processos Administrativos, situada na Rua João Norberto n.º 46, Alto Maron, neste Município e deu início aos seus trabalhos, com o intuito de apurar a denúncia interposta em desfavor da pessoa jurídica **AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57**. Diante disso, informamos que houve a suspensão, de forma cautelar, da empresa citada anteriormente do Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Vitória da Conquista, a fim de resguardar o interesse público e evitar a participação da empresa supracitada em futuras licitações, nos termos do art.22 do Decreto Municipal n.°18.484/2018 de 13 de março de 2018 , publicado no Diário Oficial do Município em 16 de março de 2018, Edição n.°2.080, ano 11, de 16 de março de 2018, até a conclusão do Processo Administrativo de Inadimplência supracitado.

Atenciosamente,

Rozana Lucena
Gabinete Saúde
04-11-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

78

MEG DE SOUSA MARQUES
AGENTE ADMINISTRATIVO
18644-4
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - STPC

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

79

Protocolo - **72203/2022**

PAI 068/2022 - Comunica o início dos trabalhos/Suspensão Cautelar

Vitória da Conquista, 03 de novembro de 2022

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022

Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57

Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

Ao Ilmo. Sr.

Edgard Larry Andrade Soares

Secretário Municipal de Educação

Na condição de Presidente da Comissão de Inquérito designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, objeto do Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022, COMUNICO que, no dia 03 de novembro, a comissão instalou-se na sala de reuniões das Comissões de Processos Administrativos, situada na Rua João Norberto n.º 46, Alto Maron, neste Município e deu início aos seus trabalhos, com o intuito de apurar a denúncia interposta em desfavor da pessoa jurídica **AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57**. Diante disso, informamos que houve a suspensão, de forma cautelar, da empresa citada anteriormente do Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Vitória da Conquista, a fim de resguardar o interesse público e evitar a participação da empresa supracitada em futuras licitações, nos termos do art.22 do Decreto Municipal n °18.484/2018 de 13 de março de 2018 , publicado no Diário Oficial do Município em 16 de março de 2018, Edição n.°2.080, ano 11, de 16 de março de 2018, até a conclusão do Processo Administrativo de Inadimplência supracitado.

Atenciosamente,

RECEBIDO EM: 07/11/22
Isabel
SMED - Assessoria de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO A COMI
CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

80

MEG DE SOUSA MARQUES
AGENTE ADMINISTRATIVO
18644-4
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - STPC

COMISSÃO

PORTARIA CRGM-STPC N.º 080, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022.

Diário Eletrônico / PMVC
Publicado em 16/11/2022
Edição nº 3309
Página(s)

ERRATA

O CORREGEDOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 2.647/2022 e pelo Decreto Municipal nº 22.028/2022 e

CONSIDERANDO a constatação de erro material nas Portarias CRGM-STPC nº 038 e 040, de 30 de setembro de 2022, publicadas no Diário Oficial do Município em 05 de outubro de 2022; e 065, 066 e 067 de 01º de Novembro de 2022, publicadas no Diário Oficial do Município em 03 de Novembro de 2022;

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam retificadas as Portarias CRGM-STPC nº 038 e 040, de 30 de setembro de 2022, publicadas no Diário Oficial do Município em 05 de outubro de 2022; e 065, 066 e 067 de 01º de Novembro de 2022, publicadas no Diário Oficial do Município em 03 de Novembro de 2022, passando a nelas constar o seguinte:

ONDE SE LÊ:

ELBERT CLEBER DE SANTANA MOREIRA (matrícula 07-14424-9, lotado na Secretaria Municipal de Gestão e Inovação)

LEIA-SE:

ELBERT CLEBER DE SANTANA MONTEIRO (matrícula 07-14727-9, lotado na Secretaria Municipal de Gestão e Inovação)

Gabinete do Corregedor-Geral do Município, 11 de novembro de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA ARAÚJO
CORREGEDOR-GERAL DO MUNICÍPIO

QUINTA COMISSÃO 82

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

Vitória da Conquista, 08 de novembro de 2022.

Ofício nº. 1013/2022 - CRGM
À **AR ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ nº 36.286.217/0001-57
Rua Hormindo Barros, nº 770, Candeias
Vitória da Conquista - BA
CEP: 45.029-094

Na condição de Presidente da Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022, designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, instaurado para apurar suposta infração, em tese, no âmbito da Concorrência nº 002/2021, decorrente do Processo Administrativo nº 14.980/2021, em virtude da inexecução parcial de obra de ampliação da Escola Municipal Moisés Meira, localizada no distrito de José Gonçalves, o que representa, caso seja comprovada, violação à Cláusula Primeira, Cláusula Segunda (itens 2.1 e 2.4) e Cláusula Sexta (itens 6.1 e 6.4) do Contrato Administrativo nº 124/2021, consoante informações contidas na Comunicação Interna nº 189/2022-SMED (GEP 56739/2022), oriunda da Secretaria Municipal de Educação e documentos anexos, considerando que os fatos denunciados podem configurar situações descritas como puníveis, sendo passível, portanto, da aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal

QUINTA COMISSÃO 82

n.º 8.666/1993, art. 58 do Decreto Municipal n.º 18.484/2018, bem como do disposto na Cláusula Sétima - DAS PENALIDADES do Contrato nº 124/2021-SMED e da Cláusula 20 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS do Edital da Concorrência nº 002/2021, fica a empresa **AR ENGENHARIA EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o **nº 36.286.217/0001-57,** ***CITADA*** na pessoa do seu representante legal, para, querendo, apresentar defesa e indicar as provas que pretende produzir, por escrito, **no prazo de 10 (dez) dias úteis,** contados do recebimento da citação, conforme o disposto no art. 34 do Decreto Municipal n.º 18.484 de 13 de março de 2018, publicado no Diário Oficial do Município em 16 de março de 2018, edição n.º 2.080, ano II, sob pena de revelia, uma vez que a tramitação do processo em epígrafe continuará independente da manifestação desta empresa, consoante as disposições contidas no art. 36, VII, do mesmo Decreto.

Ademais, informamos que os autos do processo encontram-se na sala de reuniões das Comissões de Processos Administrativos, situada na Rua João Norberto, n.º 46 - Alto Maron, neste Município, que funciona de segunda a sexta-feira de 08h às 12h e 14h às 18h, à disposição para vistas ou extração de cópias fora da repartição, que só poderão ser concedidos ao representante legal ou procurador da empresa legalmente habilitado nos autos. Impede destacar que a defesa pode ser promovida por representante legal ou advogado legalmente constituído nos autos, devendo a mesma ser entregue no local e horário supracitados.

Por seu turno, fica a empresa ciente de que a Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência nº 058/2022 é composta por 03 (três) servidores públicos municipais estáveis, a saber, Meg de Sousa Marques (matrícula 07-18644-4, agente administrativa, lotada na Secretaria Municipal de Gestão e Inovação), Elbert Cleber de Santana Monteiro (matrícula 07-14727-9, auxiliar

Rua João Norberto n.º 46, Alto Maron
Fone: (77) 3421-8001
CEP 45005-040 - Vitória da Conquista - Bahia
www.pmvc.ba.gov.br

QUINTA COMISSÃO
84

administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Gestão e Inovação) e Nayara Ferraz Oliveira (matrícula 07-15111-0, agente administrativa, lotada na Procuradoria Geral do Município), que se reúne às terças-feiras, das 08h às 12h, e às quintas-feiras, das 14h às 18h, na sala das Comissões de Processos Administrativos situada na Rua João Norberto n.º 46, Alto Maron, neste Município.

Os autos digitalizados do PAI nº 068/2022, contendo 69 (sessenta e nove) páginas, podem ser acessados através do link: encurtador.com.br/hkopL

Meg de Sousa Marques
Presidente

Rua João Norberto n.º 46, Alto Maron
Fone: (77) 3421-8001
CEP 45005-040 - Vitória da Conquista - Bahia
www.pmvc.ba.gov.br

QUINTA COMISSÃO
85

CERTIDÃO

Certifico que não pude dar cumprimento ao Ofício n.º 1.013/2022- CRGM/STPC, vez que ao me dirigir ao endereço da AR Engenharia EIRELI, situado na Rua Hormindo Barros, nº 770, Bairro Candeias, nesta cidade, POR NÃO MAIS EXERCER SUAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS, no supramencionado endereço. O referido é verdade e dou fé.

Vitória da Conquista – BA, 21 de novembro de 2022.

Rielson Mendes de Souza Lima
Matrícula nº 07-11047-2

QUINTA COMISSÃO
86

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

ATA DE DELIBERAÇÃO

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro do ano de 2022, às 09h, na sala de reuniões das Comissões de Processos Administrativos, situada na Rua João Norberto, nº 46 - Alto Maron, CEP. 45.005-040, Nesta, aí presentes ***Meg de Sousa Marques, Elbert Cleber de Santana Monteiro e Nayara Ferraz Oliveira,*** respectivamente presidente e vogais da Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022, designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, **considerando** a devolutiva da citação sem cumprimento, **DELIBEROU-SE** por realizar nova citação à empresa no endereço constando na proposta de preços do processo licitatório Concorrência nº 002/2021, na mídia (fl. 67). Isto posto, eu, *Meg de Sousa Marques*, na condição de Presidente da Comissão, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos.

Meg de Sousa Marques
Presidente

Nayara Ferraz Oliveira
Membro

Elbert Cleber de Santana Monteiro
Secretário

JUNTA COMIS. SAT
87

CERTIDÃO

Certifico que não pude dar cumprimento ao Ofício n.º 1.103/2022- CRGM, vez que ao me dirigir ao endereço da Pessoa Jurídica AR Engenharia EIRELI, Av. Deputado Ulisses Guimarães, nº 450 D, Sl. 03, Andar 01, Bairro Felícia, nesta cidade, no dia 06 de dezembro de 2022, às 08hs:30min, pois, o supracitado endereço é da CONTABILIDADE que PRESTAVA SERVIÇO À SUPRAMENCIONADA PESSOA JURÍDICA, contudo, não mais o fazendo. O referido é verdade e dou fé.

Vitória da Conquista – BA, 07 de dezembro de 2022.

Rielson Mendes de Souza Lima
Matrícula nº 07-11047-2

QUINTA COMISSÃO
88

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

Vitória da Conquista, 29 de novembro de 2022.

Ofício nº. 1103/2022 - CRGM
À **AR ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ nº 36.286.217/0001-57
Av. Deputado Ulisses Guimarães, nº 450 D- SI 03, Andar 1, Bairro Felícia
Vitória da Conquista - BA
CEP: 45055-155

Na condição de Presidente da Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022, designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-SIPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, instaurado para apurar suposta infração, em tese, no âmbito da Concorrência nº 002/2021, decorrente do Processo Administrativo nº 14.980/2021, em virtude da inexecução parcial de obra de ampliação da Escola Municipal Moisés Meira, localizada no distrito de José Gonçalves, o que representa, caso seja comprovada, violação à Cláusula Primeira, Cláusula Segunda (itens 2.1 e 2.4) e Cláusula Sexta (itens 6.1 e 6.4) do Contrato Administrativo nº 124/2021, consoante informações contidas na Comunicação Interna nº 189/2022-SMED (CEP 36739/2022), oriunda da Secretaria Municipal de Educação e documentos anexos, considerando que os fatos denunciados podem configurar situações descritas como puníveis, sendo passível, portanto, da aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993, art. 58 do Decreto Municipal n.º 18.484/2018, bem como

Rua João Norberto nº 46, Alto Maron
Fone: (77) 3421-8001
CEP 45000-040 Vitoria da Conquista - Bahia
www.pmvc.ba.gov.br

QUINTA COMISSÃO 89

do disposto na Cláusula Sétima - DAS PENALIDADES do Contrato nº 124/2021-SMED e da Cláusula 20 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS do Edital da Concorrência nº 002/2021, fica a empresa **AR ENGENHARIA EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o **nº 36.286.217/0001-57,** ***CITADA*** na pessoa do seu representante legal, para, querendo, apresentar defesa e indicar as provas que pretende produzir, por escrito, **no prazo de 10 (dez) dias úteis,** contados do recebimento da citação, conforme o disposto no art. 34 do Decreto Municipal n.º 18.484 de 13 de março de 2018, publicado no Diário Oficial do Município em 16 de março de 2018, edição n.º 2.080, ano 11, sob pena de revelia, uma vez que a tramitação do processo em epígrafe continuará independente da manifestação desta empresa, consoante as disposições contidas no art. 36, VII, do mesmo Decreto.

Ademais, informamos que os autos do processo encontram-se na sala de reuniões das Comissões de Processos Administrativos, situada na Rua João Norberto, n.º 46 - Alto Maron, neste Município, que funciona de segunda a sexta-feira de 08h às 12h e 14h às 18h, à disposição para vistas ou extração de cópias fora da repartição, que só poderão ser concedidos ao representante legal ou procurador da empresa legalmente habilitado nos autos. Impede destacar que a defesa pode ser promovida por representante legal ou advogado legalmente constituído nos autos, devendo a mesma ser entregue no local e horário supracitados.

Por seu turno, fica a empresa ciente de que a Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência nº 058/2022 é composta por 03 (três) servidores públicos municipais estáveis, a saber, Meg de Sousa Marques (matrícula 07-18644-4, agente administrativa, lotada na Secretaria Municipal de Gestão e Inovação), Elbert Cleber de Santana Monteiro (matrícula 07-14727-9, auxiliar administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Gestão e Inovação) e Nayara Ferraz Oliveira (matrícula 07-15111-0, agente administrativa, lotada na Procuradoria Geral do Município), que se reúne às terças-feiras, das 08h às 12h, e às quintas-feiras,

Rua João Norberto n.º 46, Alto Maron
Fone: (77) 3421-8001
CEP 45005-040 - Vitória da Conquista - Bahia
www.pmvc.ba.gov.br

90

das 14h às 18h, na sala das Comissões de Processos Administrativos situada na Rua João Norberto n.º 46, Alto Maron, neste Município.

Os autos digitalizados do PAI nº 068/2022, contendo 69 (sessenta e nove) páginas, podem ser acessados através do link: [illegible]

Meg de Sousa Marques
Presidente

Rua João Norberto n.º 46, Alto Maron
Fone (77) 3421-8001
CEP 45005-040 - Vitória da Conquista - Bahia
www.pmvc.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE
E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO
Corregedoria-Geral do Município
www.pmvc.ba.gov.br

07 - 12
14/12/22

PORTARIA STPC Nº 621, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022.

Diário Eletrônico / PMVC
Publicado em 14/12/22
Edição nº 3332
Página(s) _____

REGULAMENTA O RECESSO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE CORREIÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, Lei Complementar Municipal nº 2.647, de 27 de junho de 2022 e pelos Decretos Municipais n.ºs 18.484, de 13 de março de 2018, nº 19.827 de 04 de outubro de 2019, e 20.920 de 07 de abril de 2021 expedidos pelo(a) Chefe do Poder Executivo Municipal e,

CONSIDERANDO o recesso forense previsto no art. 220 do Código de Processo Civil e sua aplicação subsidiária aos procedimentos correcionais; e

CONSIDERANDO o pleito da advocacia local em regulamentar a suspensão da realização de atos e contagem de prazos processuais,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam suspensos, no período compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2022 e 06 de janeiro de 2023, no âmbito do Sistema de Correição do Poder Executivo Municipal, os prazos processuais, a realização de audiências, a publicação de julgamentos e decisões no Diário Oficial do Município, bem como a intimação de partes ou advogados, assegurado o atendimento ininterrupto aos atos processuais de natureza urgente e necessários à preservação de direitos.

Art. 2º No período do recesso forense, compreendido entre 20/12/2022 e 06/01/2023, ressalvados fins de semana, feriados e pontos facultativos, o expediente da Corregedoria-Geral do Município permanecerá em seu horário normal de funcionamento, inclusive para atendimento ao público.

Art. 3º Não se aplica o disposto no art. 1º quando da realização de atos e publicação de decisões que não importem a concessão de prazos para manifestação, apresentação de defesas ou recursos, ou intimações de qualquer natureza, ressalvadas aquelas destinadas à mera ciência.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

92

Gabinete do Secretário Municipal de Transparência, Controle e Prevenção à Corrupção, 08 de dezembro de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MATEUS NASCIMENTO NOVAIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

QUINTA COMISSÃO
93

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

ATA DE DELIBERAÇÃO

Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 09h, na sala de reuniões das Comissões de Processos Administrativos, situada na Rua João Norberto, nº 46 - Alto Maron, CEP. 45.005-040, Nesta, aí presentes ***Meg de Sousa Marques, Elbert Cleber de Santana Monteiro e Nayara Ferraz Oliveira,*** respectivamente presidente e vogais da Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022, designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, **DELIBERARAM** por CITAR POR EDITAL a pessoa jurídica **AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57**, para apresentar defesa no prazo de 20 (vinte) dias úteis, conforme Art. 39 do Decreto Municipal nº 18.484/2018, em razão da Comissão não ter logrado êxito na citação pessoal da empresa no endereço da sede constante no Cartão CNPJ e na proposta de preços, bem como a inexistência de outros endereços nos autos, conforme certidões constantes às fls. 85 e 87, do que, para constar, eu, Meg de Sousa Marques, na condição de Presidente da Comissão, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos demais membros.

Meg de Sousa Marques
Presidente

Nayara Ferraz Oliveira
Membro

Elbert Cleber de Santana Monteiro
Secretário

Rua João Norberto, 46 - Alto Maron
Fone: (77) 3421-8001 / 3424-8505
CEP 45005-040 - Vitória da Conquista - Bahia
www.pmvc.ba.gov.br

Diário Eletrônico / PMVC
Publicado em 14/12/2022
Edição nº 3334
Página(s)

QUINTA COMISSÃO
94

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

Vitória da Conquista, 13 de dezembro de 2022.

Na condição de Presidente da Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022, designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, instaurado para apurar representação de irregularidades praticadas, em tese, no âmbito da Concorrência nº 002/2021, decorrente do Processo Administrativo nº 14.980/2021, em virtude da inexecução parcial de obra de ampliação da Escola Municipal Moisés Meira, localizada no distrito de José Gonçalves, o que representa, caso seja comprovada, violação à Cláusula Primeira, Cláusula Segunda (itens 2.1 e 2.4) e Cláusula Sexta (itens 6.1 e 6.4) do Contrato Administrativo nº 124/2021, consoante informações contidas na Comunicação Interna nº 189/2022-SMED (GEP 56739/2022), oriunda da Secretaria Municipal de Educação e documentos anexos, considerando que os fatos denunciados podem configurar situações descritas como puníveis, sendo passível, portanto, da aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993, art. 58 do Decreto Municipal n.º 18.484/2018, bem como do disposto na Cláusula Sétima - DAS PENALIDADES do Contrato nº 124/2021-SMED e da Cláusula 20 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS do Edital da Concorrência nº 002/2021, fica a empresa **AR ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 36.286.217/0001-57, *CITADA*** por meio do presente EDITAL, em razão do insucesso da citação pessoal, para, querendo, apresentar defesa e indicar as provas que pretende produzir, por escrito, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da data de publicação do edital, conforme o disposto no art. 39, do Decreto Municipal n.º 18.484 de 13 de março de 2018, publicado no Diário Oficial do Município em 16 de março de 2018, edição n.º 2.080, ano 11, sob pena de revelia, uma vez que a tramitação do processo em epígrafe continuará independente da manifestação desta empresa, consoante as disposições contidas no art. 36, VII, do mesmo Decreto.

Ademais, informamos que os autos do processo encontram-se na Corregedoria Geral do Município, situada na Rua João Norberto, n.º 46 - Alto Maron, neste Município, que funciona de segunda a sexta-feira de 08h às 12h e 14h às 18h, à disposição para vistas ou extração de cópias fora da repartição, que só poderão ser concedidos ao representante legal ou procurador da empresa legalmente habilitado nos autos. Impede destacar que a defesa pode ser promovida por representante legal ou advogado legalmente constituído nos autos, devendo a mesma ser entregue no local e horário supracitados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Publicado no dia 19/12 à 21/12/22 na forma da Lei Orgânica
Funcionário

Rua João Norberto n.º 46, Alto Maron
Fone: (77) 3421-8001
CEP 45005-040 - Vitória da Conquista - Bahia
www.pmvc.ba.gov.br

QUINTA COMISSÃO 95

Por seu turno, fica a empresa ciente de que a Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022 é composta por 03 (três) servidores públicos municipais estáveis, a saber, Meg de Sousa Marques (matrícula 07-18644-4, agente administrativa, lotada na Secretaria Municipal de Gestão e Inovação), Nayara Ferraz Oliveira (matrícula 07-15111-0, agente administrativa, lotada na Procuradoria Geral do Município) e Elbert Cleber de Santana Monteiro (matrícula 07-14424-9, auxiliar administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Gestão e Inovação), que se reúnem às terças-feiras, das 08h às 12h, e às quintas-feiras, das 14h às 18h, na sala das Comissões de Processos Administrativos situada na Rua João Norberto n.º 46, Alto Maron, neste Município.

Meg de Sousa Marques
Presidente

Rua João Norberto n.º 46, Alto Maron
Fone: (77) 3421-8001
CEP 45005-040 - Vitória da Conquista - Bahia
www.pmvc.ba.gov.br

TORNO SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 058/2021 SMS – GEP 53576/2019 SMS

A Coordenação de Contratos da Secretária Municipal de Saúde do Município de Vitória da Conquista torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a publicação do Primeiro Termo Apostilamento ao contrato 058/2021 SMS. Motivo: Erro Material. Data de Publicação: Diário Oficial do Município de Vitória da Conquista, página 18 de 44 da Edição 3.299 de 28 de outubro de 2022.

QUINTA COMISSÃO 96

Vitória da Conquista, Bahia, 12 de dezembro de 2022.

Vera Santos Moreira
Coord. de Contratos

EDITAL

EDITAL DE CITAÇÃO - PAI Nº 068/2022

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

Vitória da Conquista, 13 de dezembro de 2022.

Na condição de Presidente da Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022. designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022. de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, instaurado para apurar representação de irregularidades praticadas, em tese, no âmbito da Concorrência nº 002/2021, decorrente do Processo Administrativo nº 14.980/2021, em virtude da inexecução parcial de obra de ampliação da Escola Municipal Moisés Meira, localizada no distrito de José Gonçalves, o que representa, caso seja comprovada, violação à Cláusula Primeira, Cláusula Segunda (itens 2.1 e 2.4) e Cláusula Sexta (itens 6.1 e 6.4) do Contrato Administrativo nº 124/2021, consoante informações contidas na Comunicação Interna nº 189/2022-SMED (GEP 56739/2022), oriunda da Secretaria Municipal de Educação e documentos anexos, considerando que os fatos denunciados podem configurar situações descritas como puníveis, sendo passível, portanto, da aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993, art. 58 do Decreto Municipal n.º 18.484/2018. bem como do disposto na Cláusula Sétima - DAS PENALIDADES do Contrato nº 124/2021-SMED e da Cláusula 20 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS do Edital da Concorrência nº 002/2021 , fica a empresa **AR ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 36.286.217/0001-57, *CITADA*** por meio do presente EDITAL, em razão do insucesso da citação pessoal, para, querendo, apresentar defesa e indicar as provas que pretende produzir, por escrito, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da data de publicação do edital, conforme o disposto no art. 39, do Decreto Municipal n.º 18.484 de 13 de março de 2018, publicado no Diário Oficial do Município em 16 de março de 2018, edição n.º 2.080, ano 11, sob pena de revelia, uma vez que a tramitação do processo em epígrafe continuará independente da manifestação desta empresa, consoante as disposições contidas no art. 36. VII, do mesmo Decreto.

Ademais. informamos que os autos do processo encontram-se na Corregedoria Geral do Município. situada na Rua João Norberto, n.º 46 - Alto Maron, neste Município, que funciona de segunda a sexta-feira de 08h às 12h e 14h às 18h, à disposição para vistas ou extração de cópias fora da repartição, que só poderão ser concedidos ao representante legal ou procurador da empresa legalmente habilitado nos autos. Impede destacar que a defesa pode ser promovida por representante legal ou advogado legalmente constituído nos autos. devendo a mesma ser entregue no local e horário supracitados.

Por seu turno, fica a empresa ciente de que a Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022 é composta por 03 (três) servidores públicos municipais estáveis, a saber, Meg de Sousa Marques (matrícula 07-18644-4, agente administrativa, lotada na Secretaria Municipal de Gestão e Inovação). Nayara Ferraz Oliveira (matrícula 07-15111-0. agente administrativa, lotada na Procuradoria Geral do Município) e Elbert Cleber de Santana Monteiro (matrícula 07-14424-9, auxiliar administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Gestão e Inovação), que se reúnem às terças-feiras, das 08h às 12h, e às quintas-feiras. das 14h às 18h, na sala das Comissões de Processos Administrativos situada na Rua João Norberto n.º 46, Alto Maron, neste Município.

Meg de Sousa Marques
Presidente

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

97

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

ATA DE DELIBERAÇÃO

Ao vigésimo sexto dia do mês de janeiro do ano de 2023, às 14:30h, na sala de reuniões das Comissões de Processos Administrativos, situada na Rua João Norberto, nº 46, CEP. 45.005-040, Alto Maron, Nesta, aí presentes ***Meg de Sousa Marques, Elbert Cleber de Santana Monteiro e Nayara Ferraz Oliveira,*** respectivamente presidente e vogais da Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022, designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, DELIBERARAM por solicitar prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos, por 90 (noventa) dias, haja vista a impossibilidade de elaboração do relatório conclusivo no prazo anteriormente fixado, considerando a citação por Edital da pessoa jurídica AR ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ n. 36.286.217/0001-57, do que, para constar, eu, Meg de Sousa Marques, na condição de Presidente da Comissão, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os membros da Comissão.

Meg de Sousa Marques
Presidente

Nayara Ferraz Oliveira
Membro

Elbert Cleber de Santana Monteiro
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO
Corregedoria-Geral do Município
www.pmvc.ba.gov.br

98

01 02

07 02 23

PORTARIA STPC Nº 022, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023

Diário Eletrônico / PMVC
Publicado em 03/02/23
Edição nº 3324
Página(s)

DESIGNA SUBSTITUTO PARA MEMBRO AUXILIAR DA COMISSÃO N.º 05 DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO EM EXERCÍCIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, designada pela Portaria STPC Nº 018, de 23 de janeiro de 2023 e no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011 e Lei Complementar Municipal nº 2.647, de 27 de junho de 2022,

CONSIDERANDO que a Srª. NAYARA FERRAZ OLIVEIRA, matricula 15111-0, membro auxiliar da Comissão n.º 05 de Processos Administrativos Disciplinares, encontra-se em gozo de férias, no período compreendido entre os dias 01 a 20 de fevereiro de 2023;

RESOLVE:

Art. 1° - Designar a servidora pública municipal Srª. LILIA GUSMÃO LOPES MENEZES, matricula 151594, lotada na Secretaria Municipal de Transparência, Controle e Prevenção à Corrupção, para substituir a Srª. NAYARA FERRAZ OLIVEIRA, matricula 15111-0, na função de membro auxiliar da Comissão n.º 05 de Processos Administrativos Disciplinares, nos atos processuais a serem praticados no período de compreendido entre os dias 01 a 20 de fevereiro de 2023.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2023.

Gabinete do Secretário Municipal de Transparência , Controle e Prevenção à Corrupção, 01 de fevereiro de 2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LARISSA ALMEIDA DE FREITAS NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA,
CONTROLE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO EM EXERCÍCIO

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

TERMO DE REVELIA

Aos 2 (dois) dias do mês de fevereiro de 2023, na condição de Presidente da Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022 designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, DECLARO a revelia a denunciada **AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57**, que, regularmente citada por meio do Edital de Citação, conforme comprova o documento de fl. 96, não apresentou a defesa no prazo legal e nem nomeou procurador para fazê-la.

Meg de Sousa Marques
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

300

Protocolo - **05751/2023**

PAI 068/2022 - Prorrogação de prazo

Vitória da Conquista, 26 de janeiro de 2023

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022

Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57

Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

Ao Ilmº. Sr.

Antônio Gabriel Oliveira Araújo

Corregedor-Geral do Muncípio

Rua João Norberto, n.º 46, Alto Maron - Vitória da Conquista - BA

Na condição de Presidente da Comissão de Inquérito designada por V. Sª, por meio da Portaria Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, tendo em vista que o prazo para conclusão dos trabalhos do Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022, nos termos do *caput* do art. 18 do Decreto Municipal n.º18.484 de 13 de março de 2018, publicado no Diário Oficial do Município em 16 de março de 2018, edição n. 2.080, ano 11, encerra-se no dia 03 de fevereiro de 2023, venho, respeitosamente, SOLICITAR PRORROGAÇÃO do prazo para conclusão dos trabalhos, por 90 (noventa) dias, considerando a citação por Edital a pessoa jurídica AR ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ n. 36.286.217/0001-57.

Assim, esta Comissão de Inquérito submete o pleito à apreciação de V. S.ª, pois as circunstâncias exigem a dilação do prazo, nos termos do art. 18, *caput*, do Decreto Municipal nº 18.484/2018 de 13 de março de 2018, publicado no Diário Oficial do Município em 16 de março de 2018, edição nº 2.080, ano 11.

RECEBIDO EM 03/02/23
Por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO

MEG DE SOUSA MARQUES
AGENTE ADMINISTRATIVO
18644-4
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO - SEPC

101

RECEBIDO EM ___/___/___
Por: _____

Endereço: Praça Joaquim Correia - Nº 55
Centro - Vitória da Conquista - Ba - CEP: 45000-907
Telefone(s): (77) 3424-8947 -
1881

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO
Corregedoria-Geral do Município
www.pmvc.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Publicado em 03/02/23 na forma da Lei Orgânica
Funcionário

PORTARIA CRGM-STPC Nº 045, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023.

Diário Eletrônico / PMVC
Publicado em 06/02/23
Edição nº 3315
Página(s)

PRORROGA O PRAZO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INADIMPLÊNCIA

O CORREGEDOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, Lei Complementar Municipal nº 2.647, de 27 de junho de 2022, bem como pelo Decreto Municipal nº 22.028 de 30 de junho de 2022, expedidos pelo(a) Chefe do Poder Executivo Municipal e,

CONSIDERANDO a solicitação registrada por meio do Protocolo GEP n.º 05751/2023 pela Comissão n.º 05 de Processos Administrativos de Inadimplência;

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar o prazo para conclusão do **Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022**, instaurado por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 1º de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, por mais 90 (noventa) dias, nos termos do art. 18, caput, do Decreto Municipal n.º 18.484/2018 de 13 de março de 2018, publicado no Diário Oficial do Município em 16 de março de 2018, edição n.º 2.080, ano 11, tendo em vista que houve Citação por Edital da Pessoa Jurídica, e, portanto, houve a impossibilidade da elaboração do relatório conclusivo no prazo anteriormente fixado;

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Corregedoria-Geral do Município, 03 de fevereiro de 2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA ARAÚJO
CORREGEDOR-GERAL DO MUNICÍPIO

a impossibilidade da elaboração do relatório conclusivo no prazo anteriormente fixado;

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Corregedoria-Geral do Município, 03 de fevereiro de 2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA ARAÚJO
CORREGEDOR-GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA CRGM-STPC Nº 046, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023

PRORROGA O PRAZO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, SOB O RITO SUMÁRIO.

O CORREGEDOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, Lei Complementar Municipal nº 2.647, de 27 de junho de 2022, bem como pelo Decreto Municipal nº 22.028 de 30 de junho de 2022, expedidos pelo(a) Chefe do Poder Executivo Municipal e,

CONSIDERANDO a solicitação registrada por meio do Protocolo GEP nº 06261/2023 pela Comissão n.º 07 de Processos Administrativos Disciplinares;

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar o prazo para conclusão do **Processo Administrativo Disciplinar nº 071/2022**, sob o rito sumário, instaurado por meio da Portaria CRGM-STPC nº 068 de 03 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município em 04 de novembro de 2022, por mais 15 (quinze) dias, nos termos do §5º, do art. 170 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011 com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º 1.902/2013, tendo em vista que que não foi possível concluir a instrução processual, bem como em virtude da publicação da Portaria STPC 621, de 08 de dezembro de 2022, que suspendeu a realização de audiências no período de 20 de dezembro de 2022 e 06 de janeiro de 2023, impossibilitando, portanto, a elaboração do relatório conclusivo no prazo anteriormente fixado;

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 03 de fevereiro de 2023.

Corregedoria-Geral do Município, 03 de fevereiro de 2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA ARAÚJO
CORREGEDOR-GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA CRGM-STPC Nº 047, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023

PRORROGA O PRAZO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, SOB O RITO SUMÁRIO.

O CORREGEDOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, Lei Complementar Municipal nº 2.647, de 27 de junho de 2022, bem como pelo Decreto Municipal nº 22.028 de 30 de junho de 2022, expedidos pelo(a) Chefe do Poder Executivo Municipal e,

CONSIDERANDO a solicitação registrada por meio do Protocolo GEP nº 06263/2023 pela Comissão n.º 07 de Processos Administrativos Disciplinares;

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar o prazo para conclusão do **Processo Administrativo Disciplinar nº 072/2022**, sob o rito sumário, instaurado por meio da Portaria STPC nº 069 de 03 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município em 04 de novembro de 2022, por mais 15 (quinze) dias, nos termos do §5º, do art. 170 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011 com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º 1.902/2013, tendo em vista que que não foi possível concluir a instrução processual, bem como em virtude da

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista - BA, conforme Termo de Referência, Ata de Dispensa de Licitação DL Nº 031/2022 e Processo Administrativo Nº 61982/2022., conforme discriminado abaixo, e nos termos constantes do Ata de Dispensa de Licitação DL Nº 031/2022, em conformidade com o instrumento Contratual nº 045-35/2022, celebrado com a **EMPRESA LIGA ENGENHARIA LTDA.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana, em 02 de fevereiro de 2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Jackson Apolinário Yoshiura
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

PORTARIA CRGM-STPC Nº 044, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023

PRORROGA O PRAZO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA

O CORREGEDOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 2.647/2022 e pelos Decretos Municipais nº 19.827/2019 e nº 22.028/2022, expedidos pelo(a) chefe do Poder Executivo Municipal, e,

CONSIDERANDO a solicitação registrada por meio do Protocolo GEP nº 71651/2022 pela Comissão n.º 06 de Sindicâncias Administrativas;

RESOLVE:

Art. 1° - Prorrogar o prazo para conclusão da **Sindicância Administrativa Investigativa nº 064/2022**, instaurada por meio da Portaria CRGM-STPC nº 043 de 06 de outubro de 2022, publicada no mural da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista em 06 de outubro de 2022, por mais 30 (trinta) dias, nos termos do art. 167, § 3º, da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011 com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º 1.902/2013, tendo em vista a impossibilidade de elaboração de relatório conclusivo no prazo anteriormente fixado;

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 03 de fevereiro de 2023.

Gabinete do Corregedor Geral do Município, 03 de fevereiro de 2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA ARAÚJO
CORREGEDOR-GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA CRGM-STPC Nº 045, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023

PRORROGA O PRAZO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INADIMPLÊNCIA

O CORREGEDOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, Lei Complementar Municipal nº 2.647, de 27 de junho de 2022, bem como pelo Decreto Municipal nº 22.028 de 30 de junho de 2022, expedidos pelo(a) Chefe do Poder Executivo Municipal e,

CONSIDERANDO a solicitação registrada por meio do Protocolo GEP n.º 05751/2023 pela Comissão n.º 05 de Processos Administrativos de Inadimplência;

RESOLVE:

Art. 1° - Prorrogar o prazo para conclusão do **Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022**, instaurado por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 1º de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, por mais 90 (noventa) dias, nos termos do art. 18, caput, do Decreto Municipal n.º 18.484/2018 de 13 de março de 2018, publicado no Diário Oficial do Município em 16 de março de 2018, edição n.º 2.080, ano 11, tendo em vista que houve Citação por Edital da Pessoa Jurídica, e, portanto, houve

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

305

ATA DE DELIBERAÇÃO

Aos 7 (sete) dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 14:30h, na sala da Corregedoria-Geral do Município, situada na Rua João Norberto, nº 46, CEP. 45.005-040, Alto Maron, Nesta, aí presentes ***Meg de Sousa Marques, Lília Gusmão Lopes Menezes e Elbert Cleber de Santana Monteiro,*** respectivamente presidente e vogais da Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022, designada por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, pelo Ilmo. Corregedor-Geral do Município, o Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, **DELIBEROU-SE** pelo encerramento da fase instrutória e, em ato contínuo, proceder com a confecção do relatório do processo. E para constar, eu, Meg de Sousa Marques, na condição de Presidente da Comissão, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os membros.

Meg de Sousa Marques
Presidente

Elbert Cleber de Santana Monteiro
Secretário

Lília Gusmão Lopes Menezes
Membro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

106

Protocolo - **09736/2023**

PAI 068/2022 - Garantia contratual e medição da obra

Vitória da Conquista, 09 de fevereiro de 2023

RECEBIDO EM: 13/02/23
Isabel
SMTA - Assessoria de Gabinete

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022

Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57

Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

Ao Ilmº. Sr.

Edgard Larry Andrade Soares

Secretário Municipal de Educação

Rua Siqueira Campos, nº 1.842, Vila Emurc, Candeias.

Na condição de Presidente da Comissão de Inquérito designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, com o intuito de **apurar** denúncia de infração cometida, em tese, pela pessoa jurídica intitulada **AR ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no **CNPJ** sob o **n.º 36.286.217/0001-57,** no âmbito do Processo Licitatório da Concorrência Pública nº 002/2021, decorrente do Processo Administrativo nº 14.980/2021, relacionada a inexecução parcial de obra de ampliação da Escola Municipal Moisés Meira, localizada no Distrito de José Gonçalves, solicitamos que V.Sa., **no prazo de 5 (cinco) dias úteis, informe sobre o pagamento da garantia contratual da obra licitada se por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme item 21 do Edital da Concorrência Pública nº 002/2021, bem como a medição de obras e o registro dos quantitativos de serviços efetivamente executados, conforme a especificação técnica do projeto**. O boletim de medição de obras deve ser encaminhado a esta comissão com quantitavivos na **forma percentual** para garantir a melhor apuração dos fatos. Ressalte-se que quanto mais detalhadas as informações, mais segurança jurídica será conferida ao Processo Administrativo de Inadimplência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

107

MEG DE SOUSA MARQUES
AGENTE ADMINISTRATIVO
18644-4
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - STPC

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

408

Protocolo - **09730/2023**

PAI 068/2022 - Garantia contratual

Vitória da Conquista, 09 de fevereiro de 2023

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022

Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57

Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

Ao Ilmº. Sr.

Jonas Sala

Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária

Praça Joaquim Correia, 55, Centro.

Na condição de Presidente da Comissão de Inquérito designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, com o intuito de apurar denúncia de infração cometida, em tese, pela pessoa jurídica intitulada **AR ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no **CNPJ** sob o **n.º 36.286.217/0001-57,** no âmbito do Processo Licitatório da Concorrência Pública nº 002/2021, decorrente do Processo Administrativo nº 14.980/2021, relacionada a inexecução parcial de obra de ampliação da Escola Municipal Moisés Meira, localizada no Distrito de José Gonçalves, solicitamos que V.Sa., **no prazo de 5 (cinco) dias úteis**, **informe sobre o pagamento da garantia contratual da obra licitada se por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária,** conforme item 21 do Edital da Concorrência Pública nº 002/2021.

Atenciosamente,

Endereço: Praça Joaquim Correia - Nº 55
Centro - Vitória da Conquista - Ba - CEP: 45000-907
Telefone(s): (77) 3424-8947 -
1881

Recebido em 10/02/23
10 : 10 hs
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO

MEG DE SOUSA MARQUES
AGENTE ADMINISTRATIVO
18644-4
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO - STPC

Endereço: Praça Joaquim Correia - Nº 55
Centro - Vitória da Conquista - Ba - CEP: 45000-907
Telefone(s): (77) 3424-8947 -
1881

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS E EXEC. ORÇAMENTÁRIA
DEPARTAMENTO DO TESOURO

Protocolo - **09730/2023**

PAI 068/2022 - Garantia contratual

Vitória da Conquista, 14 de fevereiro de 2023

Mateus Nascimento Novais
Secretário Mun. de Transparência
Controle e Prevenção à Corrupção
Mat. 24553-2
14/02/23

Prezada Meg,

Conforme solicitado de V. Sa., encaminhamos a demanda para a Secretaria de Educação a qual foi repondido pelo Jurídico. Segue anexo a resposta.

ROSA CRISTINA ALVES ATAÍDE
TESOUREIRA
24192-6
DEPARTAMENTO DO TESOURO - SEFIN

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria-SMED

111

C. I. nº 04/2023 - PGM/SMED

Vitória da Conquista/BA, 14 de fevereiro de 2023.

À Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária

Sra. Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira

Prezada,

Foi recepcionado por esta Procuradoria consulta referente a existência de garantia contratual da obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Moisés Meira, localizada no Distrito de José Gonçalves, neste Município, licitada através de Concorrência Pública nº 002/2021/SMED, em que a empresa AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 36.286.217/0001-57, sagrou-se vencedora do certame, encontrando-se, atualmente, em apuração de denúncia por inexecução contratual.

Desse modo, após consulta realizada junto ao Núcleo de Licitações/SMED, constatou-se que a empresa apresentou apólice seguro garantia, cópia em anexo.

Sem mais, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Maria José Viana Santos

Advogada Pública Municipal

OAB/BA nº 40.978

Rua Siqueira Campos, nº 1842, Vila Emurc, Bairro Candeias
CEP 45028-548 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3429-7750 - (77) 3429-7774
pgm@smed.pmvc.ba.gov.br

APÓLICE DIGITAL

Junto SEGUROS

SÉRGIO NASCIMENTO
MAT. 13413-4
DE LICITAÇÃO

Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da Internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.
CNPJ: 84.948.157/0001-33; registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 17/09/2021 16:07:25
Nº Apólice Seguro Garantia [redacted]
Proposta: 3114253
Controle Interno (Código Controle): 898542219
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0005.0775.0298571.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ: 14.239.578/0001-00 RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1.842 - Vitória da Conquista - BA

DADOS DO TOMADOR: AR ENGENHARIA EIRELI ME
CNPJ: 36.286.217/0001-57 - AV DEP ULISSES GUIMARAES 450 D AND 1 SL 3 - VITORIA DA CONQUISTA - BA

DADOS DA CORRETORA:
000002.0.205166-9 BAHIA ADVISER CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil — Assinado digitalmente por: Gustavo Hayrich

ICP Brasil — Assinado digitalmente por: Bloque Jr. de M. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(a): Gustavo Hayrich Nº de Série do Certificado: 373F089CC287073 Bloque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 6CB89C02A51A8BA4

627

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após este dia da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. As condições contratuais / regulamento desta apólice foram cadastradas pela sociedade / entidade junto à Susep podendo ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo informado na apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado sob o nº de Processo SUSEP 15414.900192/2014-17 e nº 15414.900192/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301.Ouvidoria Junto: 0800 943 0301.

Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0298571
Proposta: 3114253
Controle Interno (Código Controle): 898542219
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0005.0775.0298571.000000

junto SEGUROS

SÉRGIO NASCIMENTO
MAT. 15413-4
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Gicele Bersan de Souza
Comissão de Licitação

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R$ 20.685,91	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R$ 20.685,91	17/09/2021	26/12/2021

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R$	190,00
Adicional de Fracionamento	R$	0,00
I.O.F	R$	0,00
Prêmio Total	R$	190,00

Condições de Pagamento	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R$)
	1	24/09/2021	11073214	190,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, conforme determinado em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), dígito(s) divisão(ões) ou combo deste contratação de cobertura(s) Produto(s) outras observação(ões) quando contratado(s) isoladamente ou em outra composição.

628

APÓLICE DIGITAL

Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0298571
Proposta: 3114253
Controle Interno (Código Controle): 898542219
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0005.0775.0298571.000000

SÉRGIO NASCIMENTO
MAT.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Comissão de Licitação

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.980/2021.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU [illegible] DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

629

Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0298571
Proposta: 3114253
Controle Interno (Código Controle): 898542219
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0005.0775.0298571.000000

junto SEGUROS

SÉRGIO ALEXANDRE DE SOUSA
MAT. 134134-4
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONDIÇÕES GERAIS

Comissão de Licitação

115

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao , tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações a pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente to de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades turas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das parte es.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas re alidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições e Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

630

SÉRGIO NASCIMENTO
MAT.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos decorrentes pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que comprove que a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros, endossos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

631

junto SEGUROS

SÉRGIO NASCIMENTO MARQUES
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo [illegible] aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração [illegible] resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador [illegible] manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a conseqüente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio de emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

632

Gicele Pereira de Sousa
Comissão de Licitação

junto SEGUROS

118

SERGIO NASCIMENTO
MAT. 13413-4
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no [redacted] principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo [redacted]

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento [redacted] iu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações [redacted] que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de end[redacted]

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificad[redacted] cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que [redacted] ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar [redacted] ação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realiz[redacted] nte o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará [redacted] nte ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando [redacted] razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

633

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos da reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da [redacted] dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a [redacted] ver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo [redacted] so de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir [redacted] o dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice [redacted] os ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [redacted] que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre [redacted] índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior [redacted] prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

634

Gicele Farsura de Souza

junto SEGUROS

SÉRGIO NASCIMENTO
MAT. 5918-4
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo [redacted] pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de ineficácia do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais garantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma [redacted] cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

635

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido prazo nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta retém o prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora terá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção do prazo em dias	% do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção do prazo em dias	% do Prêmio
15/365	13%	195/365	[illegible]
30/365	20%	210/365	[illegible]
45/365	27%	225/365	[illegible]
60/365	30%	240/365	[illegible]
75/365	37%	255/365	[illegible]
90/365	40%	270/365	[illegible]
105/365	48%	285/365	[illegible]
120/365	50%	300/365	90%
135/365	55%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

636

SERGIO NASCIMENTO
MAT. 1254
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

122

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se [illegible] a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no for[illegible]icílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das [illegible]ra tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia [illegible]o ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verific[illegible]ce ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.g[illegible]

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode [illegible]a no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep[illegible]pelo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

637

SÉRGIO NASCIMENTO
MAT. 13413-4
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

exterior ficarão totalmente a cargo da Seguradora.

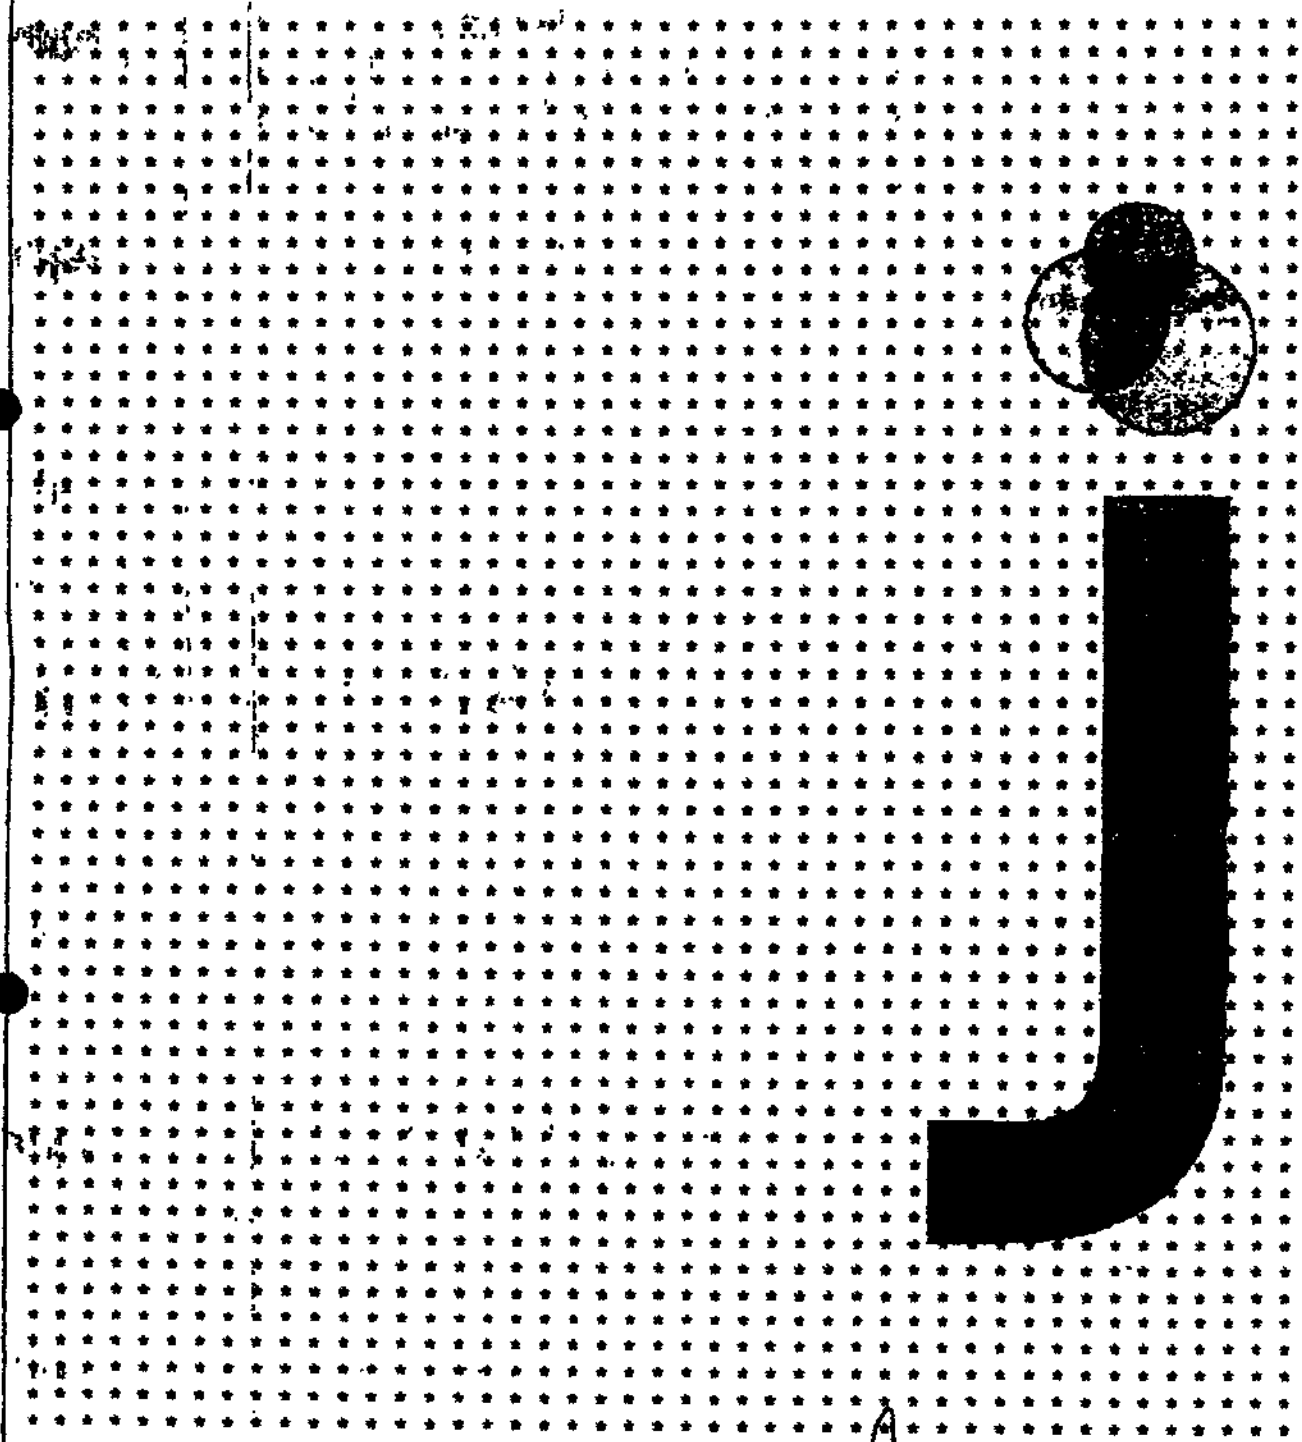

junto SEGUROS

SÉRGIO NASCIMENTO
MAT. 45413-4
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONDIÇÕES ESPECIAIS

124

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do a[illegible] Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais [illegible]ge a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está rest[illegible]scos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador a[illegible]o em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabeleci[illegible]al de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatu[illegible]trato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora [illegible] tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições pr[illegible]ntro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

639

SÉRGIO NASCIMENTO
MAT. 19413-4
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações [illegible] do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na [illegible] não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, [illegible] social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a [illegible] nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência [illegible] apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de [illegible] qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/anuência do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento, o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenização alguma, quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito das Condições Gerais.

640

126

SERGIO NASCIMENTO
MAT. 13413-4
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

641

junto SEGUROS

Comissão de Licitação

127

SÉRGIO NASCIMENTO
MAT. 13413-4
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabbleclido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá qualsquer prejuizos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endosso.

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice/endosso, estando de pleno acordo que à Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento."

642

Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0298571
Proposta: 3113253
Controle Interno (Código Controle): 898542219
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0005.0775.0298571.000000

junto SEGUROS

Gisela Fer[illegible] de Souza
[illegible] de Licitação

128
SÉRGIO NASCIMENTO
MAT. 6413-4
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 05-0775-0298571

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

Nome:
RG:
Cargo:

623

APÓLICE DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

129

Protocolo - **09736/2023**

PAI 068/2022 - Garantia contratual e medição da obra

Vitória da Conquista, 28 de fevereiro de 2023

RECEBIDO EM: 01/03/23
Isabel
SMED - Assessoria de Gabinete

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022

Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57

Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

Ao Ilmº. Sr.

Edgard Larry Andrade Soares

Secretário Municipal de Educação

Rua Siqueira Campos, nº 1.842, Vila Emurc, Candeias.

Na condição de Presidente da Comissão de Inquérito designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, com o intuito de **apurar** denúncia de infração cometida, em tese, pela pessoa jurídica intitulada **AR ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no **CNPJ** sob o **n.º 36.286.217/0001-57,** no âmbito do Processo Licitatório da **Concorrência Pública nº 002/2021**, decorrente do Processo Administrativo nº 14.980/2021, relacionada a inexecução parcial de obra de ampliação da Escola Municipal Moisés Meira, localizada no Distrito de José Gonçalves, **REITERO** a solicitação feita a V.Sa. para que, **no prazo de 5 (cinco) dias úteis, informe sobre a medição de obras e o registro dos quantitativos de serviços efetivamente executados, conforme a especificação técnica do projeto**. O boletim de medição de obras deve ser encaminhado a esta comissão com quantitavivos na **forma percentual** para garantir a melhor apuração dos fatos. Ressalte-se que quanto mais detalhadas as informações, mais segurança jurídica será conferida ao Processo Administrativo de Inadimplência**. Em tempo, ressaltamos que a informação, solicitada anteriormente, sobre o seguro garantia já foi enviada pela Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

130

MEG DE SOUSA MARQUES
AGENTE ADMINISTRATIVO
18644-4
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - STPC

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
NUCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

131

Protocolo - **09736/2023**

PAI 068/2022 - Garantia contratual e medição da obra

Vitória da Conquista, 07 de março de 2023

Prezados,

Segue cópias das notas e medições da Empresa **AR ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no **CNPJ** sob o **n.º 36.286.217/0001-57, referente ao Contrato Nº 104-2021,** para prosseguimento da apuração.

Atenciosamente,

MAXIMILIANO LEANDRO ALVES
COORDENAÇÃO
22979
NUCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA - SMED

Município de Vitória da Conquista

Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária

Gerência de Fiscalização

Praça Joaquim Correia, 55, Centro - Vitória da Conquista/BA - CEP:45.040.040

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

Nota: 2021000

00000036

Código Verificação

ISLI-GJXZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

132

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
22/11/2021 14:15	**11/2021**	**Vitória da Conquista - BA**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Vitória da Conquista**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ
AR ENGENHARIA EIRELI	**36.286.217/0001-57**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
589872	(77)3081-1081	Sim	Não	LIDER@CONTABILLIDER.COM.BR

Endereço

AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES*, 450 D; SALA 3; ANDAR 1 Bairro FELÍCIA CEP 45055-155 Vitória da Con

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**06.071.702/0001-42**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
9214	(77)3429-7750	

Endereço

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1842 Bairro Candeias CEP 45000-000 Vitória da Conquista - BA

Código Tributação Município: 0702-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA EM VITÓRIA DA CONQUISTA BAHIA.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
61.894,62	0,00	0,00	61.894,62	5,0000

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
0,00	3.094,73	0,00	58.799,89	**61.894,62**

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R$8.324,83 FEDERAL E R$3.094,73 MUNICIPAL. FONTE: IBPT BA21D5.

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

André Luis R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro civil
CREA-BA- 27678/D

22/11/2021 14:15:37

AR ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 36.286.217/0001-57
AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, 450 D - SL 3
ANDAR 1 FELÍCIA, CEP: 45055-155 VIT. DA CONQUISTA
TEL: (77) 9 9109-9040 andre.rocha.moura@hotmail.com

André Luis P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.39[illegible]

CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA - BA	INÍCIO DA OBRA: 15/10/2021
N°CONTRATO: 104-2021	PERÍODO: 15/10/2021 À 20/11/2021
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.579.246,07	DATA DA EMISSÃO: 20/11/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI I	29,67%
Obra:	ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA - REFORMA E AMPLIAÇÃO (MÓDULO NOVO)	REF.:	SINAPI 03/2021
Local:	DISTRITO DE JOSÉ GONÇALVES - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA	DATA	09/2021

BM 01	DATA	VALOR	PORCENTAGEM
	20/11/2021	61.894,62	4%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATADO QUANT.	CONTRATADO PREÇO (COM BDI)	CONTRATADO VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR QUANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ATUAL QUANT.	ATUAL VALOR	ACUMULADO QUANT.	ACUMULADO VALOR	SALDO QUANT.	SALDO VALOR	EXECUTADO (%)
	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					**SUBTOTAL**	**R$55.239,72**		***R$ 0,00***		***R$ 9.280,66***		***R$ 9.280,66***		***R$ 45.959,06***	***17%***
1	AR ENG.	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$104,42	R$7.519,05		R$ 0,00	12	R$ 1.253,04	12	R$ 1.253,04	60,00	R$ 6.266,01	17%
2	AR ENG.	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00	R$33,99	R$44.865,65		R$ 0,00	220	R$ 7.477,80	220	R$ 7.477,80	1.100,00	R$ 37.387,85	17%
3	AR ENG.	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$38,42	R$2.766,24		R$ 0,00	12	R$ 461,04	12	R$ 461,04	60,00	R$ 2.305,20	17%
4	AR ENG.	CPU	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	1,00	R$88,78	R$88,78		R$ 0,00	1	R$ 88,78	1	R$ 88,78	0,00	R$ 0,00	100%
	SERVIÇOS PRELIMINARES					**SUBTOTAL**	**R$44.431,75**		***R$ 0,00***		***R$ 30.061,77***		***R$ 30.061,77***		***R$ 14.369,99***	***68%***
1	AR ENG.	CPU-1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO (SALAS EXISTENTES E CIRCULAÇÃO)	M2	249,66	R$30,57	R$7.631,35		R$ 0,00	212	R$ 6.480,20	212	R$ 6.480,20	37,66	R$ 1.151,15	85%
2	AR ENG.	CPU-2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	354,06	R$14,11	R$4.994,83		R$ 0,00	212,43	R$ 2.996,98	212,43	R$ 2.996,98	141,61	R$ 1.997,85	60%
3	AR ENG.	CPU-3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA	M2	354,06	R$35,78	R$12.667,86		R$ 0,00	212,43	R$ 7.600,93	212,43	R$ 7.600,93	141,61	R$ 5.066,93	60%
4	AR ENG.	CPU-4	REMOÇÃO DE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	M	37,21	R$5,15	R$191,63		R$ 0,00	22,33	R$ 115,00	22,33	R$ 115,00	14,88	R$ 76,63	60%
5	AR ENG.	CPU-5	RETIRADA DE PILARES DE MADEIRA, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO	UN	12,00	R$123,55	R$1.482,60		R$ 0,00	6	R$ 741,30	6	R$ 741,30	6,00	R$ 741,30	50%
6	AR ENG.	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	95,77	R$5,04	R$482,68		R$ 0,00	57,47	R$ 289,65	57,47	R$ 289,65	38,30	R$ 193,03	60%
7	AR ENG.	97914	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 14 KM	M3XKM	478,87	R$1,56	R$747,04		R$ 0,00	300	R$ 468,00	300	R$ 468,00	178,87	R$ 279,04	63%
8	AR ENG.	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	25,41	R$447,45	R$11.369,70		R$ 0,00	25,41	R$ 11.369,70	25,41	R$ 11.369,70	0,00	R$ 0,00	100%
9	AR ENG.	CPU-6	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	467,40	R$7,56	R$3.533,54		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	467,40	R$ 3.533,54	0%
10	AR ENG	CPU-7	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	R$295,67	R$1.330,52	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,50	R$ 1.330,52	0%
	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM					**SUBTOTAL**	**R$6.965,68**		***R$ 0,00***		***R$ 4.212,01***		***R$ 4.212,01***		***R$ 2.753,67***	***60%***
1	AR ENG.	CPU-8	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	788,33	R$0,49	R$386,28		R$ 0,00	630,66	R$ 309,02	630,66	R$ 309,02	157,67	R$ 77,26	80%
2	AR ENG.	CPU-9	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	358,69	R$2,61	R$936,18		R$ 0,00	286,96	R$ 748,97	286,96	R$ 748,97	71,73	R$ 187,21	80%
3	AR ENG.	97918	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT= 5,0 KM(BOTA FORA)	M3XKM	1.290,89	R$1,04	R$1.342,51		R$ 0,00	1032,71	R$ 1.074,02	1032,71	R$ 1.074,02	258,18	R$ 268,50	80%
4	AR ENG.	97918	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT= 14,0 KM (EMPRESTIMO)	M3XKM	2.510,83	R$1,04	R$2.611,26		R$ 0,00	2000	R$ 2.080,00	2000	R$ 2.080,00	510,83	R$ 531,26	80%
5	AR ENG	CPU-10	ESPALHAMENTO DE MATERIAL TERROSO	M3	358,69	R$0,31	R$111,19		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	358,69	R$ 111,19	0%
6	AR ENG.	CPU-11	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M3	358,69	R$4,40	R$1.578,24		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	358,69	R$ 1.578,24	0%
	INFRAESTRUTURA					**SUBTOTAL**	**R$80.011,35**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 80.011,35***	***0%***
1	AR ENG.	CPU-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES, ATÉ 1,50M	M3	125,74	R$54,57	R$6.861,63		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	125,74	R$ 6.861,63	0%
2	AR ENG.	CPU-13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COMACO DE 30KG	M2	163,82	R$30,89	R$5.060,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	163,82	R$ 5.060,40	0%
3	AR ENG.	94962	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M3	4,91	R$294,27	R$1.444,87		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,91	R$ 1.444,87	0%
4	AR ENG.	96995	ATERRO MANUAL DA CAIXA DA OBRA	M3	71,60	R$49,38	R$3.535,61		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	71,60	R$ 3.535,61	0%
5	AR ENG.	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	63,91	R$61,45	R$3.927,27		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	63,91	R$ 3.927,27	0%
6	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	2.116,23	R$10,88	R$23.024,58		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2.116,23	R$ 23.024,58	0%
7	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	116,76	R$13,84	R$1.615,96		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	116,76	R$ 1.615,96	0%
8	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	M3	52,64	R$341,81	R$17.992,88		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	52,64	R$ 17.992,88	0%
9	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	52,64	R$201,87	R$10.626,44		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	52,64	R$ 10.626,44	0%
10	AR ENG.	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	232,68	R$25,45	R$5.921,71		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	232,68	R$ 5.921,71	0%
	SUPERESTRUTURA					**SUBTOTAL**	**R$106.627,19**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 106.627,19***	***0%***
1	AR ENG.	CPU-14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	173,49	R$77,95	R$13.523,55		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	173,49	R$ 13.523,55	0%
2	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	1.989,69	R$10,88	R$21.647,83		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.989,69	R$ 21.647,83	0%
3	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	575,20	R$13,84	R$7.960,77		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	575,20	R$ 7.960,77	0%
4	AR ENG.	94965	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=25,0 MPA	M3	27,97	R$369,96	R$10.319,81		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	27,97	R$ 10.319,81	0%
5	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	27,97	R$201,87	R$5.646,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	27,97	R$ 5.646,30	0%
6	AR ENG.	CPU-15	LAJE PRÉ-MOLDADA DE FORRO, E=8 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO E CAPEAMENTO	M2	303,24	R$49,52	R$15.016,44		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	303,24	R$ 15.016,44	0%
7	**LAJE MACIÇA DE CONCRETO, E=0,10M**						**R$22.714,32**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 22.714,32***	***0%***
7.1	AR ENG.	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	M2	135,81	R$28,12	R$3.818,98		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	135,81	R$ 3.818,98	0%
7.2	AR ENG.	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.096,97	R$12,59	R$13.810,85		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.096,97	R$ 13.810,85	0%

José Hadyl Moura de Oliveira
Engenheiro civil
CREA-BA- 27678/D

7.3	AR ENG.	99439	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015	M3	13,58	R$384,49	R$5.084,49		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	13,58	R$ 5.084,49	0%
8	**RAMPA DE CONCRETO**						**R$9.798,17**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 9.798,17***	***0%***
8.1	AR ENG.	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_09/2020	M2	80,53	R$28,12	R$2.258,88		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	80,53	R$ 2.258,88	0%
8.2	AR ENG.	92778	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO (UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	360,03	R$12,59	R$4.532,78		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	360,03	R$ 4.532,78	0%
8.3	AR ENG.	99439	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015	M3	8,03	R$374,41	R$3.006,51		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,03	R$ 3.006,51	0%
9	**VEDAÇÃO**						**SUBTOTAL**	**R$57.116,83**	***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 57.116,83***	***0%***
9.1	AR ENG.	CPU-16	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X30CM, E=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 12MM	M2	1.081,83	R$36,25	R$39.220,89		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.081,83	R$ 39.220,89	0%
9.2	AR ENG.	CPU-17	COBOGÓ CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), DE 9X20X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA	M2	125,72	R$104,75	R$13.166,18		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	125,72	R$ 13.166,18	0%
9.3	AR ENG.	93182	VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO DE 10X20CM	M	119,80	R$39,48	R$4.729,76		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	119,80	R$ 4.729,76	0%
10	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**						**SUBTOTAL**	**R$25.496,64**	***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 25.496,64***	***0%***
10.1	AR ENG.	CPU-18	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.60 X 1.60 M, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FECHADURA	UN	6,00	R$1.002,73	R$6.016,38		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 6.016,38	0%
10.2	AR ENG.	CPU-19	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	19,00	R$999,97	R$18.999,43		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	19,00	R$ 18.999,43	0%
10.3	AR ENG.	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	7,00	R$68,69	R$480,83		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	7,00	R$ 480,83	0%
11	**ESQUADRIAS METÁLICAS**						**SUBTOTAL**	**R$13.838,11**	***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 13.838,11***	***0%***
11.1	AR ENG.	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	63,00	R$162,33	R$10.226,82		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	63,00	R$ 10.226,82	0%
11.2	AR ENG.	CPU-20	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TIPO FANTASIA, PADRONIZADA	M2	3,96	R$328,81	R$1.281,57		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,96	R$ 1.281,57	0%
11.3	AR ENG.	CPU-21	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	3,15	R$739,59	R$2.329,72		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,15	R$ 2.329,72	0%
12	**COBERTURA**						**SUBTOTAL**	**R$209.163,66**	***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 209.163,66***	***0%***
12.1	AR ENG.	CPU-22	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIGA TRELIÇADA DE AÇO, VÃO DE 12,60 M. INCLUSO IÇAMENTO.	UN	5,00	R$1.337,07	R$6.685,35		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 6.685,35	0%
12.2	AR ENG.	CPU-23	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIGA TRELIÇADA DE AÇO, VÃO DE 6,50 M. INCLUSO IÇAMENTO	UN	5,00	R$1.092,60	R$5.463,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 5.463,00	0%
12.3	AR ENG.	CPU-24	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TERÇA EM PERFIL U ENRIJECIDO 150X60X20	M	551,22	R$23,38	R$12.887,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	551,22	R$ 12.887,52	0%
12.4	AR ENG.	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMO ACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	900,72	R$201,09	R$181.121,32		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	900,72	R$ 181.121,32	0%
12.5	AR ENG.	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,15	R$53,52	R$329,17		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,15	R$ 329,17	0%
12.6	AR ENG.	94231	RUFO METÁLICO, L=25 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	64,56	R$41,47	R$2.677,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	64,56	R$ 2.677,30	0%
13	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**						**SUBTOTAL**	**R$12.860,06**	***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 12.860,06***	***0%***
13.1	AR ENG.	89482	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$19,64	R$39,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 39,28	0%
13.2	AR ENG.	86904	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSO, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$100,00	R$200,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 200,00	0%
13.3	AR ENG.	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$108,02	R$432,08		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 432,08	0%
13.4	AR ENG.	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA DE 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO OU CUBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$42,94	R$257,64		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 257,64	0%
13.5	AR ENG.	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$8,66	R$51,96		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 51,96	0%
13.6	AR ENG.	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$12,42	R$74,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 74,52	0%
13.7	AR ENG.	95470	BACIA SIFONADA DE LOUÇA COM ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$149,99	R$1.199,92		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,00	R$ 1.199,92	0%
13.8	AR ENG.	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	R$29,91	R$239,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,00	R$ 239,28	0%
13.9	AR ENG.	95544	PAPELEIRA DE METAL DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$27,69	R$221,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,00	R$ 221,52	0%
13.10	AR ENG.	CPU-25	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40MM, INCLUSIVE TUBO DE DESCIDA COM JOELHO	UN	8,00	R$422,83	R$3.382,64		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,00	R$ 3.382,64	0%
13.11	AR ENG.	95547	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$60,96	R$121,92		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 121,92	0%
13.12	AR ENG.	CPU-26	DISPENSER PARA TOALHAS INTERFOLHADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$66,54	R$133,08		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 133,08	0%
13.13	AR ENG.	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$62,82	R$125,64		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 125,64	0%
13.14	AR ENG.	100869	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PCD EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38 MM	UN	4,00	R$217,82	R$871,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 871,28	0%
13.15	AR ENG.	CPU-27	BANCADA DE GRANITO, LARG.= 60	M2	1,92	R$291,24	R$559,18		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,92	R$ 559,18	0%
13.16	AR ENG.	CPU-28	PONTO DE ÁGUA FRIA	UN	6,00	R$120,16	R$720,96		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 720,96	0%
13.17	AR ENG.	CPU-29	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM	UN	6,00	R$88,23	R$529,38		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 529,38	0%
13.18	AR ENG.	CPU-30	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM	UN	8,00	R$127,30	R$1.018,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,00	R$ 1.018,40	0%
13.19	AR ENG.	89495	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X40 MM	UN	6,00	R$7,13	R$42,78		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 42,78	0%
13.20	AR ENG.	89353	REGISTRO DE GAVETA - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$33,57	R$67,14		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 67,14	0%
13.21	AR ENG.	CPU-31	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS	UN	2,00	R$1.285,73	R$2.571,46		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 2.571,46	0%
14	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**SUBTOTAL**	**R$51.880,17**	***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 51.880,17***	***0%***
14.1	AR ENG.	CPU-32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ, EMBUTIR, 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$161,85	R$323,70		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 323,70	0%
14.2	AR ENG.	CPU-33	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA, 200X200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$97,31	R$194,62		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 194,62	0%
14.3	AR ENG.	101890	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 15 A, EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	12,00	R$12,13	R$145,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	12,00	R$ 145,56	0%
14.4	AR ENG.	96985	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE COBRE COPPERWELD 5/8X2,40M, COM CONECTOR	UN	3,00	R$51,91	R$155,73		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 155,73	0%
14.5	AR ENG.	CPU-34	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PLÁSTICO, COM BASE E27 E FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	112,00	R$9,57	R$1.071,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	112,00	R$ 1.071,84	0%

André Luis C. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

José [illegible]
Engenheiro civil
CREA-BA- 27678/D

1.6	AR ENG.	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	112,00	R$19,95		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	112,00	R$ 2.234,40	0%
1.7	AR ENG.	CPU-35	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	112,00	R$320,96		R$ 35.947,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	112,00	R$ 35.947,52	0%
1.8	AR ENG.	CPU-36	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	UN	30,00	R$272,51		R$ 8.175,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	30,00	R$ 8.175,30	0%
1.9	AR ENG.	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	30,00	R$121,05		R$ 3.631,50		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	30,00	R$ 3.631,50	0%
2	**FORRO DE GESSO**					**SUBTOTAL**		**R$ 1.702,80**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***	***R$ 1.702,80***	***0%***
2.1	AR ENG.	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	41,33	R$41,20		R$1.702,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	41,33	R$ 1.702,80	0%
3	**REVESTIMENTO DE FORRO E PAREDES**					**SUBTOTAL**		**R$92.686,37**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***	***R$ 92.686,37***	***0%***
3.1	AR ENG.		CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS. COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	2.163,65	R$4,17		R$9.022,42		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2.163,65	R$ 9.022,42	0%
3.2	AR ENG.	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	419,67	R$8,82		R$3.701,49		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	419,67	R$ 3.701,49	0%
3.3	AR ENG.	90408	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:9, PREPARO COM BETONEIRA	M2	2.034,99	R$32,51		R$66.157,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2.034,99	R$ 66.157,52	0%
3.4	AR ENG.	87531	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	142,96	R$30,36		R$4.340,27		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	142,96	R$ 4.340,27	0%
3.5	AR ENG.	87274	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA 33X45 CM, JUNTA A PRUMO, COM CIMENTO COLANTE	M2	142,96	R$66,21		R$9.464,67		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	142,96	R$ 9.464,67	0%
4	**PISOS**					**SUBTOTAL**		**R$103.072,40**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***	***R$ 103.072,40***	***0%***
4.1	AR ENG.	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	1.211,36	R$39,94		R$48.381,72		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.211,36	R$ 48.381,72	0%
4.2	AR ENG.	CPU-37	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	42,19	R$28,37		R$1.196,93		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	42,19	R$ 1.196,93	0%
4.3	AR ENG.	93393	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA TIPO A, 42X42 CM, PEI 5, COM CIMENTO COLANTE	M2	42,19	R$30,04		R$1.267,39		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	42,19	R$ 1.267,39	0%
4.4	AR ENG.	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	1.169,17	R$36,66		R$42.861,77		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.169,17	R$ 42.861,77	0%
4.5	AR ENG.	101741	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, 10 CM	M	395,60	R$23,38		R$9.249,13		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	395,60	R$ 9.249,13	0%
4.6	AR ENG.	98689	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA DE GRANITO, L=15CM	M	1,68	R$68,73		R$115,46		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,68	R$ 115,46	0%
5	**PINTURA**					**SUBTOTAL**		**R$73.725,23**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***	***R$ 73.725,23***	***0%***
5.1	AR ENG.	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 1 DEMÃO, MASSA PVA	M2	1.090,00	R$14,22		R$15.499,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.090,00	R$ 15.499,80	0%
5.2	AR ENG.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	M2	1.557,32	R$11,74		R$18.282,94		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.557,32	R$ 18.282,94	0%
5.3	AR ENG.	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	419,67	R$27,94		R$11.725,58		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	419,67	R$ 11.725,58	0%
5.4	AR ENG.	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	419,67	R$11,08		R$4.649,94		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	419,67	R$ 4.649,94	0%
5.5	AR ENG.	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M2	794,46	R$14,22		R$11.297,22		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	794,46	R$ 11.297,22	0%
5.6	AR ENG.	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	1.057,92	R$9,95		R$10.526,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.057,92	R$ 10.526,30	0%
5.7	AR ENG.	102219	APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS, SOBRE MADEIRA	M2	160,36	R$15,08		R$1.513,43		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	160,36	R$ 1.513,43	0%
5.8	AR ENG.	CPU-38	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPÓXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA. UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	6,30	R$11,12		R$70,06		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,30	R$ 70,06	0%
5.9	AR ENG.	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	6,30	R$25,39		R$159,96		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,30	R$ 159,96	0%
6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**SUBTOTAL**		**R$29.858,65**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***	***R$ 29.858,65***	***0%***
6.1	AR ENG.	98855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	88,00	R$96,78		R$8.516,64		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	88,00	R$ 8.516,64	0%
6.2	**RAMPA DE ACESSO**							**R$21.342,01**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***	***R$ 21.342,01***	***0%***
6.2.1	AR ENG.	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	2,40	R$61,45		R$147,48		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,40	R$ 147,48	0%
6.2.2	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	M3	3,60	R$341,81		R$1.230,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,60	R$ 1.230,52	0%
6.2.3	AR ENG.	92873	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M3	3,60	R$201,87		R$726,73		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,60	R$ 726,73	0%
6.3	AR ENG.	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	142,96	R$3,31		R$473,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	142,96	R$ 473,20	0%
6.4	AR ENG.	99605	LIMPEZA DE PISO CERÂMICOS	M2	42,19	R$10,31		R$434,98		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	42,19	R$ 434,98	0%
6.5	AR ENG.	CPU-39	LIMPEZA DE VIDROS	M2	66,90	R$12,87		R$861,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	66,90	R$ 861,00	0%
6.6	AR ENG.	CPU-40	LIMPEZA GERAL	M2	1.211,38	R$14,42		R$17.468,10		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.211,38	R$ 17.468,10	0%
7	**MURO (L=148,73M H=2,6M)**					**SUBTOTAL**		**R$93.317,53**								
7.1	**INFRAESTRUTURA**							**R$22.938,50**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***	***R$ 22.938,50***	***0%***
7.1.1	AR ENG.	CPU-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES, ATÉ 1,50M	M3	37,60	R$54,57		R$2.051,65		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	37,60	R$ 2.051,65	0%
7.1.2	AR ENG.	CPU-13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COMAÇO DE 30KG	M2	65,91	R$30,89		R$2.035,79		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	65,91	R$ 2.035,79	0%
7.1.3	AR ENG.	94962	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M3	1,98	R$294,27		R$582,66		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,98	R$ 582,66	0%
7.1.4	AR ENG.	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	55,69	R$61,45		R$3.422,26		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	55,69	R$ 3.422,26	0%
7.1.5	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	644,09	R$10,88		R$7.006,27		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	644,09	R$ 7.006,27	0%
7.1.6	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	86,84	R$13,84		R$1.201,64		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	86,84	R$ 1.201,64	0%
7.1.7	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	M3	12,21	R$341,81		R$4.173,64		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	12,21	R$ 4.173,64	0%
7.1.8	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	12,21	R$201,87		R$2.464,79		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	12,21	R$ 2.464,79	0%
7.2	**SUPERESTRUTURA**							**R$25.210,98**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***	***R$ 25.210,98***	***0%***
7.2.1	AR ENG.	CPU-14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	78,44	R$77,95		R$6.114,62		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	78,44	R$ 6.114,62	0%
7.2.2	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	868,17	R$10,88		R$9.443,77		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	868,17	R$ 9.443,77	0%
7.2.3	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	259,06	R$13,84		R$3.584,71		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	259,06	R$ 3.584,71	0%
7.2.4	AR ENG.	94965	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=25,0 MPA	M3	10,63	R$368,96		R$3.922,04		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,63	R$ 3.922,04	0%
7.2.5	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	10,63	R$201,87		R$2.145,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,63	R$ 2.145,84	0%
7.3	**VEDAÇÃO**							**R$14.828,33**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***	***R$ 14.828,33***	***0%***
7.3.1	AR ENG.	CPU-16	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X30CM, E=10CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 12MM	M2	409,01	R$36,25		R$14.828,33		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	409,01	R$ 14.828,33	0%
7.4	**REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDES**							**R$3.411,90**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***	***R$ 3.411,90***	***0%***
7.4.1	AR ENG.	87873	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	818,02	R$4,17		R$3.411,90		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	818,02	R$ 3.411,90	0%

7,5	PINTURA						R$26.927,82		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 26.927,82	0%
7,5.1	AR ENG.	CPU-41	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	818,02	R$26.927,82		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	818,02	R$ 26.927,82	0%		

TOTAL	R$1.057.994,14	TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL ATUAL	TOTAL ACUMULADO	SALDO TOTAL	(%)
		0,00	43.554,44	43.554,44	R$ 1.014.439,71	96%

UM MILHÃO, CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI 1	19,67%
Obra:	ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BLOCO PRINCIPAL	REF.:	SINAPI 03/2021
Local:	DISTRITO DE JOSÉ GONÇALVES - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA	DATA	09/2021

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO (COM BDI)	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	(%)
	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					SUBTOTAL	R$55.240,02		R$ 0,00		R$ 9.280,66		R$ 9.280,66		R$ 45.959,36	17%
1.1	AR ENG.	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$104,42	R$7.519,05		R$ 0,00	12	R$ 1.253,04	12	R$ 1.253,04	60,00	R$ 6.266,01	17%
1.2	AR ENG.	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00	R$33,99	R$44.865,65		R$ 0,00	220	R$ 7.477,80	220	R$ 7.477,80	1.100,00	R$ 37.387,85	17%
1.3	AR ENG.	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$38,42	R$2.766,54		R$ 0,00	12	R$ 461,04	12	R$ 461,04	60,00	R$ 2.305,50	17%
1.4	AR ENG.	CPU	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	1,00	R$88,78	R$88,78		R$ 0,00	1	R$ 88,78	1	R$ 88,78	0,00	R$ 0,00	100%
	SERVIÇOS PRELIMINARES					SUBTOTAL	R$52.066,09		R$ 0,00		R$ 19.420,19		R$ 19.420,19		R$ 32.645,91	37%
2.1	AR ENG.	CPU-1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO (SALAS EXISTENTES E CIRCULAÇÃO)	M2	916,13	R$30,57	R$28.008,33		R$ 0,00	600	R$ 18.340,19	600	R$ 18.340,19	316,13	R$ 9.668,14	65%
2.2	AR ENG.	CPU-41	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	191,79	R$32,92	R$6.313,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	191,79	R$ 6.313,40	0%
2.3	AR ENG.	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	178,74	R$22,63	R$4.044,42		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	178,74	R$ 4.044,42	0%
2.4	AR ENG.	CPU-2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	136,94	R$14,11	R$1.932,22		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	136,94	R$ 1.932,22	0%
2.5	AR ENG.	CPU-3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA	M2	136,94	R$35,78	R$4.899,71		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	136,94	R$ 4.899,71	0%
2.6	AR ENG.	CPU-4	REMOÇÃO DE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	M	4,15	R$5,15	R$21,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,15	R$ 21,37	0%
2.7	AR ENG.	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO, SEM REAPROVEITAMENTO (MURO)	M2	63,42	R$54,42	R$3.451,32		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	63,42	R$ 3.451,32	0%
2.8	AR ENG.	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	156,63	R$5,04	R$789,42		R$ 0,00	75	R$ 378,00	75	R$ 378,00	81,63	R$ 411,42	48%
2.9	AR ENG.	97914	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 14 KM	M3xKM	783,15	R$1,56	R$1.221,71		R$ 0,00	450	R$ 702,00	450	R$ 702,00	333,15	R$ 519,71	57%
2.10	AR ENG.	CPU-6	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	7,76	R$7,56	R$58,67		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	7,76	R$ 58,67	0%
2.10	AR ENG.	CPU-7	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	R$295,67	R$1.330,52		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,50	R$ 1.330,52	0%
	INFRAESTRUTURA					SUBTOTAL	R$5.163,76		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 5.163,76	0%
3.1	AR ENG.	CPU-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES, ATÉ 1,50M	M3	6,54	R$54,57	R$356,89		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,54	R$ 356,89	0%
3.2	AR ENG.	CPU-13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COMAÇO DE 30KG	M2	10,94	R$30,89	R$337,94		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,94	R$ 337,94	0%
3.3	AR ENG.	94962	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M³	0,33	R$294,27	R$97,11		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,33	R$ 97,11	0%
3.4	AR ENG.	96995	ATERRO MANUAL DA CAIXA DA OBRA	M3	1,36	R$49,38	R$67,16		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,36	R$ 67,16	0%
3.5	AR ENG.	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	17,32	R$61,45	R$1.064,31		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	17,32	R$ 1.064,31	0%
3.6	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	109,27	R$10,88	R$1.189,86		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	109,27	R$ 1.189,86	0%
3.7	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	13,50	R$13,84	R$186,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	13,50	R$ 186,84	0%
3.8	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	M3	2,17	R$341,81	R$741,73		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,17	R$ 741,73	0%
3.9	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	2,17	R$201,87	R$438,06		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,17	R$ 438,06	0%
3.10	AR ENG.	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM EMULSÃO ASFALTICA	M2	26,91	R$25,45	R$684,86		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	26,91	R$ 684,86	0%
	SUPERESTRUTURA					SUBTOTAL	R$6.385,69		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 6.385,69	0%
4.1	AR ENG.	CPU-14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	34,87	R$72,95	R$2.718,12		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	34,87	R$ 2.718,12	0%
4.2	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	157,40	R$10,88	R$1.712,51		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	157,40	R$ 1.712,51	0%
4.3	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	48,46	R$13,84	R$670,69		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	48,46	R$ 670,69	0%
4.4	AR ENG.	94965	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=25,0 MPA	M3	2,25	R$368,96	R$830,16		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,25	R$ 830,16	0%
4.5	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	2,25	R$201,87	R$454,21		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,25	R$ 454,21	0%
	VEDAÇÃO					SUBTOTAL	R$3.353,54		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.353,54	0%
5.1	AR ENG.	CPU-43	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, E=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 12MM	M2	76,48	R$42,30	R$3.235,10		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	76,48	R$ 3.235,10	0%
5.2	AR ENG.	93182	VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO DE 10X20CM	M	3,00	R$39,48	R$118,44		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 118,44	0%
	ESQUADRIA DE MADEIRA					SUBTOTAL	R$41.628,68		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 41.628,68	0%
6.1	AR ENG.	CPU-18	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,60 X 1,60 M, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FECHADURA	UN	10,00	R$1.002,73	R$10.027,27		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R$ 10.027,27	0%
6.2	AR ENG.	CPU-44	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 1,60 M, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FECHADURA	UN	2,00	R$1.119,30	R$2.238,59		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 2.238,59	0%
6.3	AR ENG.	CPU-45	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,60 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	5,00	R$897,87	R$4.489,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 4.489,37	0%
6.4	AR ENG.	CPU-46	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,70 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	3,00	R$915,29	R$2.745,88		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 2.745,88	0%
6.5	AR ENG.	CPU-47	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,70 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	21,00	R$1.014,44	R$21.303,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	21,00	R$ 21.303,30	0%
6.6	AR ENG.	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	12,00	R$68,69	R$824,27		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	12,00	R$ 824,27	0%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA					SUBTOTAL	R$15.342,88		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 15.342,88	0%

José Flávio Matt
Engenheiro Civil
CREA/BA 27.078/D

.1	AR ENG.	94579	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	65,59	R$ 169,22	R$ 10.647,22		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	65,59	R$ 10.647,22	0%
.2	AR ENG.	CPU-20	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TIPO FANTASIA, PADRONIZADA	M2	10,58	R$ 328,00	R$ 3.470,69		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,58	R$ 3.470,69	0%
.3	AR ENG.	CPU-48	PORTA TIPO GRADIL EM PERFIL DE METALON GALVANIZADO COM SEÇÃO 20X20 MM (SANITÁRIOS)	M2	5,04	R$241,86	R$1.218,97		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,04	R$ 1.218,97	0%
	COBERTURA					**SUBTOTAL**	**R$31.212,47**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 31.212,47***	***0%***
.1	AR ENG	CPU-24	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRIÇA EM PERFIL U ENRIJECIDO 150X60X20	M	99,40	R$23,38	R$2.323,71		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	99,40	R$ 2.323,71	0%
.2	AR ENG.	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMO ACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	136,94	R$201,09	R$27.536,59		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	136,94	R$ 27.536,59	0%
.3	AR ENG.	CPU-49	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA METÁLICA PARA TELHA TERMOACÚSTICA	M	11,80	R$76,22	R$899,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	11,80	R$ 899,37	0%
.4	AR ENG.	94231	RUFO METÁLICO, L=25 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,92	R$41,47	R$452,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,92	R$ 452,80	0%
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					**SUBTOTAL**	**R$34.247,83**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 34.247,83***	***0%***
.1	AR ENG.	89482	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R$19,64	R$176,76		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	9,00	R$ 176,76	0%
.2	AR ENG.	89495	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X40 MM	UN	4,00	R$7,13	R$28,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 28,52	0%
.3	AR ENG.	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 35X50 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$171,79	R$858,95		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 858,95	0%
.4	AR ENG.	86904	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSO, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$100,00	R$200,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 200,00	0%
.5	AR ENG.	86907	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R$195,62	R$1.956,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R$ 1.956,20	0%
.6	AR ENG.	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$36,86	R$184,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 184,30	0%
.7	AR ENG.	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA DE 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO OU CUBA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$42,94	R$429,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R$ 429,40	0%
.8	AR ENG.	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R$8,66	R$86,60		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R$ 86,60	0%
.9	AR ENG.	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R$12,42	R$124,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R$ 124,20	0%
.10	AR ENG.	95470	BACIA SIFONADA DE LOUÇA COM ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R$149,99	R$2.399,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 2.399,84	0%
.11	AR ENG.	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	R$29,91	R$478,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 478,56	0%
.12	AR ENG	95544	PAPEL BIBA DE METAL DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R$27,69	R$443,04		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 443,04	0%
.13	AR ENG.	CPU-25	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40MM, INCLUSIVE TUBO DE DESCIDA COM JOELHO	UN	16,00	R$422,83	R$6.765,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 6.765,28	0%
.14	AR ENG.	100858	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$437,35	R$1.312,05		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 1.312,05	0%
.15	AR ENG	93547	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$60,96	R$243,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 243,84	0%
.16	AR ENG	CPU-26	DISPENSER PARA TOALHAS INTERFOLHADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$66,54	R$266,16		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 266,16	0%
.17	AR ENG	100866	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$62,82	R$251,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 251,28	0%
.18	AR ENG	100869	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38 MM	UN	4,00	R$217,82	R$871,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 871,28	0%
.19	AR ENG.	CPU-27	BANCADA DE GRANITO, LARG.= 60	M2	17,69	R$291,24	R$5.152,04		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	17,69	R$ 5.152,04	0%
.20	AR ENG.	CPU-28	PONTO DE ÁGUA FRIA	UN	16,00	R$120,16	R$1.922,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 1.922,56	0%
.21	AR ENG.	CPU-29	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM	UN	16,00	R$88,23	R$1.411,68		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 1.411,68	0%
.22	AR ENG.	CPU-30	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM	UN	16,00	R$127,30	R$2.036,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 2.036,80	0%
.23	AR ENG.	89495	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X40 MM	UN	12,00	R$7,13	R$85,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	12,00	R$ 85,56	0%
.24	AR ENG.	89353	REGISTRO DE GAVETA - 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$33,57	R$134,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 134,28	0%
.25	AR ENG.	CPU-31	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS	UN	5,00	R$1.285,73	R$6.428,65		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 6.428,65	0%
.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**SUBTOTAL**	**R$50.036,52**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 50.036,52***	***0%***
0.1	AR ENG.	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$327,74	R$327,74		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	R$ 327,74	0%
0.2	AR ENG.	CPU-33	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA, 200X200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$97,31	R$97,31		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	R$ 97,31	0%
0.3	AR ENG	101890	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 15 A, EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	12,00	R$12,13	R$145,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	12,00	R$ 145,56	0%
0.4	AR ENG.	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$69,96	R$69,96		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	R$ 69,96	0%
0.5	AR ENG.	96985	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE COBRE COOPERWELD 5/8X2,40M, COM CONECTOR	UN	3,00	R$51,91	R$155,73		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 155,73	0%
0.6	AR ENG.	CPU-34	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PLÁSTICO, COM BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	97,00	R$9,57	R$928,29		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	97,00	R$ 928,29	0%
0.7	AR ENG.	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	97,00	R$19,95	R$1.935,15		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	97,00	R$ 1.935,15	0%
0.8	AR ENG.	CPU-35	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	97,00	R$320,96	R$31.133,12		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	97,00	R$ 31.133,12	0%
0.9	AR ENG.	CPU-50	PONTO DE INTERRUPTOR DI SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN	11,00	R$274,09	R$3.014,66		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	11,00	R$ 3.014,66	0%
0.10	AR ENG.	CPU-36	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	UN	20,00	R$272,51	R$5.450,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	20,00	R$ 5.450,20	0%
0.11	AR ENG.	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	56,00	R$121,05	R$6.778,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	56,00	R$ 6.778,80	0%
1	**FORRO DE PVC**					**SUBTOTAL**	**R$3.749,41**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 3.749,41***	***0%***
1.1	AR ENG.	96111	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA E FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC), INSTALADO	M2	56,93	R$65,86	R$3.749,41		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	56,93	R$ 3.749,41	0%
2	**REVESTIMENTO DE FORRO E PAREDES**					**SUBTOTAL**	**R$35.275,37**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 35.275,37***	***0%***

2.1	AR ENG.	87873	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	331,69	R$4,16	R$1.380,15		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	331,69	R$ 1.380,15	0%
2.2	AR ENG.	90408	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	152,95	R$32,04	R$4.972,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	152,95	R$ 4.972,40	0%
2.3	AR ENG.	87531	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	299,47	R$30,36	R$9.091,91		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	299,47	R$ 9.091,91	0%
2.4	AR ENG.	87274	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA 33X45 CM, JUNTA A PRUMO, COM CIMENTO COLANTE	M2	299,47	R$66,21	R$19.827,91		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	299,47	R$ 19.827,91	0%
3	**PISOS**					**SUBTOTAL**	**R$100.847,67**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 100.847,67***	***0%***
3.1	AR ENG.	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	1.107,92	R$39,94	R$44.250,32		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.107,92	R$ 44.250,32	0%
3.2	AR ENG.	CPU-37	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, FSP MÉDIA = 2,5CM	M2	87,63	R$28,37	R$2.486,06		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	87,63	R$ 2.486,06	0%
3.3	AR ENG.	93391	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA TIPO A, 42X42 CM, PEI 5, COM CIMENTO COLANTE	M2	87,63	R$30,04	R$2.632,41		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	87,63	R$ 2.632,41	0%
3.4	AR ENG.	CPU-51	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	22,04	R$114,29	R$2.518,95		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	22,04	R$ 2.518,95	0%
3.5	AR ENG.	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	1.020,29	R$36,66	R$37.403,83		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.020,29	R$ 37.403,83	0%
3.6	AR ENG.	101741	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, 10 CM	M	472,30	R$23,38	R$11.042,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	472,30	R$ 11.042,37	0%
3.7	AR ENG.	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	13,14	R$6,25	R$82,13		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	13,14	R$ 82,13	0%
3.8	AR ENG.	98689	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA DE GRANITO, L=15CM	M	6,28	R$69,73	R$437,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,28	R$ 437,80	0%
4	**PINTURA**					**SUBTOTAL**	**R$44.678,73**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 44.678,73***	***0%***
4.1	AR ENG.	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 1 DEMÃO, MASSA PVA	M2	256,05	R$14,22	R$3.641,03		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	256,05	R$ 3.641,03	0%
4.2	AR ENG.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	M2	1.030,98	R$11,74	R$12.103,71		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.030,98	R$ 12.103,71	0%
4.3	AR ENG.	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	225,03	R$16,90	R$3.803,01		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	225,03	R$ 3.803,01	0%
4.4	AR ENG.	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	2.250,34	R$9,95	R$22.390,88		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2.250,34	R$ 22.390,88	0%
4.5	AR ENG.	102219	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M2	157,30	R$15,08	R$2.372,08		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	157,30	R$ 2.372,08	0%
4.6	AR ENG.	CPU-38	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPÓXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA. UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	10,08	R$11,12	R$112,09		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,08	R$ 112,09	0%
4.7	AR ENG.	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	10,08	R$25,39	R$255,93		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,08	R$ 255,93	0%
5	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**SUBTOTAL**	**R$42.023,26**									
5.1	**RAMPA DE ACESSO**						**R$3.871,40**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 3.871,40***	***0%***
5.1.1	AR ENG.	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	1,50	R$61,45	R$92,18		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,50	R$ 92,18	0%
5.1.2	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	M3	6,05	R$341,31	R$2.065,95		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,05	R$ 2.065,95	0%
5.1.3	AR ENG.	92873	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M3	6,08	R$201,87	R$1.227,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,08	R$ 1.227,37	0%
5.1.4	AR ENG.	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	5,00	R$96,78	R$483,90		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 483,90	0%
5.2	**BANCO EM GRANITO (2 UN)**						**R$12.945,75**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 12.945,75***	***0%***
5.2.1	AR ENG.	CPU-52	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE RE-GULARIZAÇÃO DE BASE	M2	15,75	R$209,61	R$3.301,39		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,75	R$ 3.301,39	0%
5.2.2	AR ENG.	90408	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	31,50	R$32,51	R$1.024,12		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	31,50	R$ 1.024,12	0%
5.2.3	AR ENG.	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	31,50	R$16,90	R$532,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	31,50	R$ 532,30	0%
5.2.4	AR ENG.	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	31,50	R$9,95	R$313,36		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	31,50	R$ 313,36	0%
5.2.5	AR ENG.	CPU-53	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	17,50	R$444,26	R$7.774,55		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	17,50	R$ 7.774,55	0%
5.3	**ESCOVODROMO COM 5 TORNEIRA**						**R$2.867,56**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 2.867,56***	***0%***
5.3.1	AR ENG.	101159	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM E VEZ (ESPESSURA 20CM)	M2	10,28	R$127,60	R$1.311,74		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,28	R$ 1.311,74	0%
5.3.2	AR ENG.	96995	ATERRO MANUAL DA CAIXA DA OBRA	M3	0,57	R$49,38	R$28,15		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,57	R$ 28,15	0%
5.3.3	AR ENG.	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	1,44	R$39,94	R$57,51		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,44	R$ 57,51	0%
5.3.4	AR ENG.	87531	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	5,54	R$30,36	R$168,21		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,54	R$ 168,21	0%
5.3.5	AR ENG.	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	5,54	R$53,08	R$294,06		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,54	R$ 294,06	0%
5.3.6	AR ENG.	89495	TORNEIRA DE PRESSÃO PLÁSTICA COMUM, USO GERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$7,13	R$14,26		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 14,26	0%
5.3.7	AR ENG.	86916	TORNEIRA DE PRESSÃO PLÁSTICA COMUM, USO GERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$36,56	R$182,78		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 182,78	0%
5.3.8	AR ENG.	CPU-28	PONTO DE ÁGUA FRIA	UN	5,00	R$120,16	R$600,82		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 600,82	0%
5.3.9	AR ENG.	CPU-29	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM	UN	2,00	R$88,23	R$176,46		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 176,46	0%
5.3.10	AR ENG.	89953	REGISTRO DE GAVETA - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$33,57	R$33,57		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	R$ 33,57	0%
5.4	**CASA DE GÁS**						**R$3.421,89**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 3.421,89***	***0%***
5.4.1	AR ENG.	CPU-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES, ATÉ 1,50M	M3	0,74	R$54,57	R$40,38		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,74	R$ 40,38	0%
5.4.2	AR ENG.	CPU-13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COMAÇO DE 30KG	M2	1,86	R$30,89	R$57,45		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,86	R$ 57,45	0%
5.4.3	AR ENG.	94962	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M3	0,06	R$294,27	R$17,66		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,06	R$ 17,66	0%
5.4.4	AR ENG.	CPU-14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03 INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	2,53	R$77,95	R$197,22		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,53	R$ 197,22	0%

José Flávio
Engenheiro civil
CREA-BA- 27678/D

5.4.5	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	31,25	R$10,88	R$339,93		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	31,25	R$ 339,93	0%
5.4.6	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	6,84	R$13,84	R$94,65		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,84	R$ 94,65	0%
5.4.7	AR ENG.	94965	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=25,0 MPA	M3	0,37	R$368,96	R$136,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,37	R$ 136,52	0%
5.4.8	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	0,37	R$201,87	R$74,69		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,37	R$ 74,69	0%
5.4.9	AR ENG.	CPU-15	LAJE PRÉ-MOLDADA DE FORRO, E=8 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO E CAPEAMENTO	M2	2,40	R$49,52	R$118,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,40	R$ 118,84	0%
5.4.10	AR ENG.	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	6,82	R$25,45	R$173,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,82	R$ 173,56	0%
5.4.11	AR ENG.	CPU-16	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X30CM, E=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 12MM	M2	8,06	R$36,25	R$292,21		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,06	R$ 292,21	0%
5.4.12	AR ENG.	87873	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	19,99	R$4,17	R$83,38		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	19,99	R$ 83,38	0%
5.4.13	AR ENG.	96602	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	19,99	R$32,51	R$649,91		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	19,99	R$ 649,91	0%
5.4.14	AR ENG.	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	1,47	R$39,94	R$58,71		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,47	R$ 58,71	0%
5.4.15	AR ENG.	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	1,47	R$30,12	R$44,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,47	R$ 44,28	0%
5.4.16	AR ENG.	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 1 DEMÃO, MASSA PVA	M2	19,99	R$14,22	R$284,19		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	19,99	R$ 284,19	0%
5.4.17	AR ENG.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	M2	19,99	R$11,74	R$234,74		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	19,99	R$ 234,74	0%
5.4.18	AR ENG.	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3,57	R$25,39	R$90,63		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,57	R$ 90,63	0%
5.4.19	AR ENG.	CPU-48	PORTA TIPO GRADIL EM PERFIL DE METALON GALVANIZADO COM SEÇÃO 20X20 MM (CAIXILHOS)	M2	1,79	R$241,86	R$432,94		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,79	R$ 432,94	0%
5.5	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**R$18.916,66**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 18.916,66***	***0%***
5.1	AR ENG.	99809	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	299,47	R$3,31	R$991,91		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	299,47	R$ 991,91	0%
5.2	AR ENG.	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICOS	M2	87,63	R$10,31	R$903,85		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	87,63	R$ 903,85	0%
5.3	AR ENG.	CPU-39	LIMPEZA DE VIDROS	M2	81,21	R$12,87	R$1.045,46		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	81,21	R$ 1.045,46	0%
5.4	AR ENG.	CPU-40	LIMPEZA GERAL	M2	1.107,92	R$14,42	R$15.975,44		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.107,92	R$ 15.975,44	0%
TOTAL							**R$521.251,92**	**TOTAL ACUMULADO**		**TOTAL ATUAL**		**TOTAL ACUMULADO**		**SALDO TOTAL**		**(%)**
									0,00		**18.340,19**		**18.340,19**		**R$ 502.911,74**	**96%**
QUINHENTOS E VINTE E UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS																

TOTAL GERAL	**R$1.579.246,07**
UM MILHÃO, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS	

BM	NÚMERO	VALOR	(%)
1		61.894,62	4%

Vitória da Conquista - BA, 20 de setembro de 2021.

AR Engenharia Eireli
CNPJ: 36.286.217/0001-57
André Luís Prates Rocha Moura
Engenheiro civil
CPF: [redacted]

André Luís P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

José Flávio Araújo de Oliveira
Engenheiro civil
CREA-BA- 27678/D

140

Relatório fotográfico BM 01

Modalidade: Tomada de preço

Contrato n°: 104-2021

Objeto: ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA - REFORMA E AMPLIAÇÃO (MÓDULO NOVO)

Contratante: Prefeitura Municipal

Contratada: Empresa AR Engenharia Eirelli

Cidade: José Gonçalves - Ba

Período de execução: 15/10/2021 à 22/11/2021

Número da medição: 01

Coordenadas geométricas: 14°43'41.6"S 40°43'35.3"W

André Luis R. de Moura
ENGENHEIRO CIVIL

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro civil

141

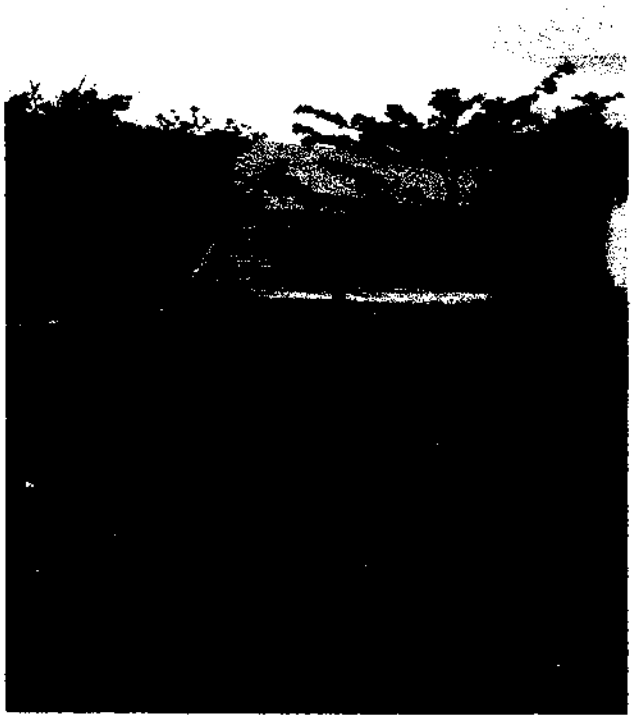

FOTO 01: ANTES – Área de circulação da área de ampliação

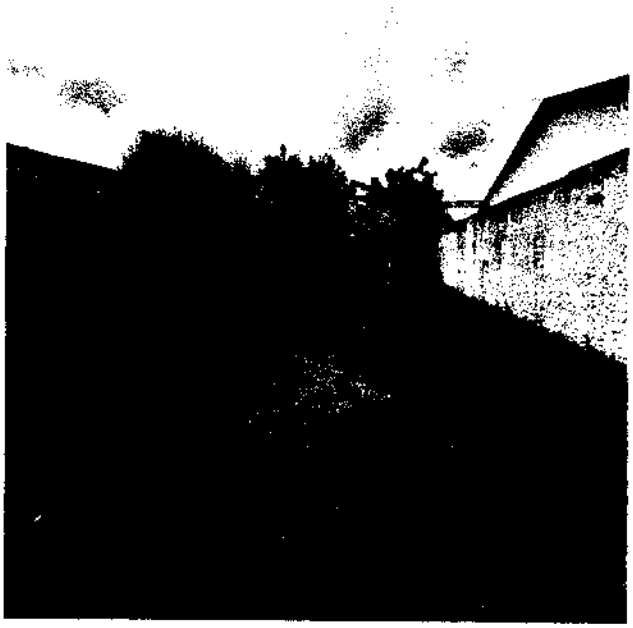

FOTO 02: DEPOIS – Piso removido da área de circulação do local da ampliação

André Luiz R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SA 95.390

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro Civil

142

FOTO 03 – ÁREA DE CIRCULAÇÃO INTERNA DO LOCAL DA REFORMA

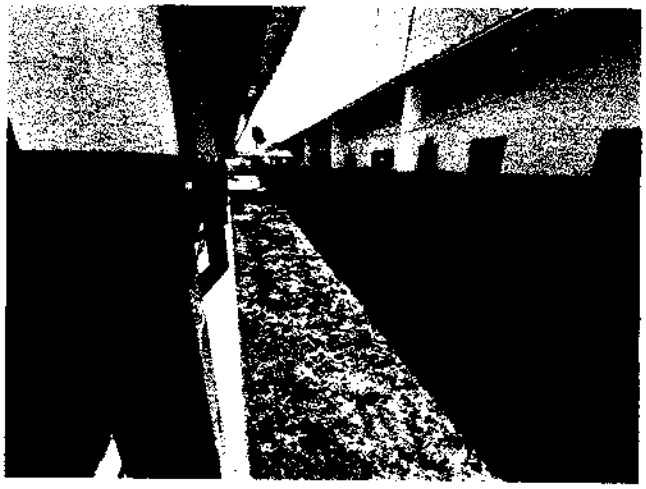

FOTO 04 – PISO REMOVIDO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO INTERNA DO LOCAL DA REFORMA.

ENGENHEIRO CIVIL.

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro civil
CREA-BA- 27678/D

FOTO 05 – ÁREA DE CIRCULAÇÃO FRONTAL DA ESCOLA

FOTO 06 – PISO REMOVIDO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO FRONTAL DA ESCOLA

Jose Tiago Madra de Oliveira
Engenheiro civil
CREA-BA- 27678/D

144

FOTO 07 – ÁREA DE CIRCULAÇÃO FRONTAL DA ESCOLA

FOTO 08 – PISO REMOVIDO DE ÁREA DE CIRCULAÇÃO FRONTAL DA ESCOLA

André Luiz [illegible]
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 97.330

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro civil
CREA-BA 27617/D

145

FOTO 09 – EXECUÇÃO DE BARRAÇÃO DE OBRA

André Luís Prates Rocha Moura

Engenheiro civil

CEO - AR Engenharia Eirelli

36.286.217/0001-57

André Luís P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro civil
CREA-BA- 27678/D

Gerência de Fiscalização

Praça Joaquim Correia, 55, Centro - Vitória da Conquista/BA - CEP:45.040.040

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

Código Verificação
6Q7Y-PEJ3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

146

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
20/12/2021 09:56	**12/2021**	**Vitória da Conquista - BA**

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Vitória da Conquista

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
AR ENGENHARIA EIRELI

CPF/CNPJ
36.286.217/0001-57

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
589872	(77)3081-1081	Sim	Não	LIDER@CONTABILLIDER.COM.BR

Endereço
AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES*, 450 D; SALA 3; ANDAR 1 Bairro FELÍCIA CEP 45055-155 Vitória da Con

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF/CNPJ
06.071.702/0001-42

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
[illegible]9214	(77)3429-7750	

Endereço
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1842 Bairro Candeias CEP 45000-000 Vitória da Conquista - BA

Código Tributação Município: 0702-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOISÉIS MEIRA EM VITÓRIA DA CONQUISTA JÁ EXECULTADO 11% DA OBRA PARA ESSA MEDIÇÃO.

BANCO BRADESCO
AG: 270
CONTA CORRENTE: 421028-0
PIX: 36. 286.217/0001-57

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
170.300,71	0,00	0,00	170.300,71	2,8200

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
0,00	4.802,48	0,00	165.498,23	**170.300,71**

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R$22.905,45 FEDERAL E R$8.515,04 MUNICIPAL. FONTE: IBPT D9E24F.

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-BA- 276760

20/12/2021 09:56:10

AR ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 36.286.217/0001-57
AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, 450 D - SL 3
ANDAR 1 FELÍCIA, CEP: 45055-155 VIT. DA CONQUISTA
TEL: (77) 9 9109-9040 andre.rocha.moura@hotmail.com

CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA - BA	INÍCIO DA OBRA: 15/10/2021
Nº CONTRATO: 104-2021	PERÍODO: 21/11/2021 À 20/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.579.246,07	DATA DA EMISSÃO: 20/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI:	29,67%
Obra:	ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA - REFORMA E AMPLIAÇÃO (MODULO NOVO)	REF.:	SINAPI 03/2021
Local:	DISTRITO DE JOSÉ GONÇALVES - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA	DATA:	09/2021

BM 02	DATA	VALOR	PORCENTAGEM
	20/12/2021	170.300,71	11%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO UNID	QUANT.	PREÇO (COM BDI)	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR QUANT.	VALOR	ATUAL QUANT.	VALOR	ACUMULADO QUANT.	VALOR	SALDO QUANT.	VALOR	EXECUTADO (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					SUBTOTAL	R$55.239,72		R$ 9.280,66		R$ 9.191,88		R$ 18.472,54		R$ 36.767,18	33%
1.1	AR ENG.	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$104,42	R$7.519,03	12	R$ 1.253,04	12	R$ 1.253,04	24	R$ 2.506,08	48,00	R$ 5.012,95	33%
1.3	AR ENG.	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00	R$33,99	R$44.866,67	220	R$ 7.477,80	220	R$ 7.477,80	440	R$ 14.955,60	880,00	R$ 29.910,03	33%
1.4	AR ENG.	CPU	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	H	72,00	R$38,42	R$2.766,24	12	R$ 461,04	12	R$ 461,04	24	R$ 922,08	48,00	R$ 1.844,16	33%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			UN	1,00	R$88,78	R$88,78	1	R$ 88,78		R$ 0,00	1	R$ 88,78	0,00	R$ 0,00	100%
2.1	AR ENG.	CPU-1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO (SALAS EXISTENTES E CIRCULAÇÃO)	M2	249,66	SUBTOTAL R$30,51	R$44.431,75 R$7.631,35	212	R$ 30.061,77 R$ 6.480,20	37,66	R$ 14.369,99 R$ 1.151,15	249,66	R$ 44.431,76 R$ 7.631,35	0,00	-R$ 0,01 R$ 0,00	100% 100%
2.2	AR ENG.	CPU-2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	354,04	R$14,11	R$4.994,83	212,43	R$ 2.996,98	141,61	R$ 1.997,85	354,04	R$ 4.994,83	0,00	R$ 0,00	100%
2.3	AR ENG.	CPU-3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA	M2	354,04	R$35,79	R$12.667,95	212,43	R$ 7.600,93	141,61	R$ 5.066,93	354,04	R$ 12.667,86	0,00	R$ 0,00	100%
2.4	AR ENG.	CPU-4	REMOÇÃO DE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	M	37,21	R$5,15	R$191,63	22,33	R$ 115,00	14,88	R$ 76,63	37,21	R$ 191,63	0,00	R$ 0,00	100%
2.5	AR ENG.	CPU-5	RETIRADA DE PILARES DE MADEIRA, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO	UN	12,00	R$121,53	R$1.482,60	6	R$ 741,30	6	R$ 741,30	12	R$ 1.482,60	0,00	R$ 0,00	100%
2.6	AR ENG.	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	95,77	R$5,04	R$482,68	57,47	R$ 289,65	38,3	R$ 193,03	95,77	R$ 482,68	0,00	R$ 0,00	100%
2.7	AR ENG.	97914	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 14 KM	M3XKM	478,87	R$1,51	R$747,04	300	R$ 468,00	178,87	R$ 279,04	478,87	R$ 747,04	0,00	R$ 0,00	100%
2.8	AR ENG.	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	75,41	R$147,45	R$11.369,70	25,41	R$ 11.369,70		R$ 0,00	25,41	R$ 11.369,70	0,00	R$ 0,00	100%
2.9	AR ENG.	CPU-6	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	467,4	R$7,55	R$3.535,54		R$ 0,00	467,4	R$ 3.535,54	467,4	R$ 3.535,54	0,00	R$ 0,00	100%
2.10	AR ENG.	CPU-7	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	R$295,67	R$1.330,52		R$ 0,00	4,5	R$ 1.330,52	4,5	R$ 1.330,52	0,00	R$ 0,00	100%
3	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM					SUBTOTAL	R$6.965,68		R$ 4.212,01		R$ 2.753,67		R$ 6.965,68		R$ 0,00	100%
3.1	AR ENG.	CPU-8	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	788,33	R$0,49	R$386,28	680,66	R$ 369,02	107,67	R$ 77,26	788,33	R$ 386,28	0,00	R$ 0,00	100%
3.2	AR ENG.	CPU-9	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	358,69	R$2,61	R$936,18	286,96	R$ 748,97	71,73	R$ 187,22	358,69	R$ 936,18	0,00	R$ 0,00	100%
3.3	AR ENG.	97918	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT= 5,0 KM(BOTA FORA)	M3XKM	1.290,89	R$1,04	R$1.342,53	1032,71	R$ 1.074,02	258,18	R$ 268,51	1290,89	R$ 1.342,53	0,00	R$ 0,00	100%
3.4	AR ENG.	97918	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT= 14,0 KM (EMPRESTIMO)	M3XKM	2.510,83	R$1,01	R$2.611,26	2000	R$ 2.080,00	510,83	R$ 531,26	2510,83	R$ 2.611,26	0,00	R$ 0,00	100%
3.5	AR ENG.	CPU-10	ESPALHAMENTO DE MATERIAL TERROSO	M3	358,69	R$0,31	R$111,19		R$ 0,00	358,69	R$ 111,19	358,69	R$ 111,19	0,00	R$ 0,00	100%
3.6	AR ENG.	CPU-11	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M3	358,69	R$4,41	R$1.578,24		R$ 0,00	358,69	R$ 1.578,24	358,69	R$ 1.578,24	0,00	R$ 0,00	100%
4	INFRAESTRUTURA					SUBTOTAL	R$80.011,35		R$ 0,00		R$ 38.926,46		R$ 38.926,46		R$ 41.084,89	49%
4.1	AR ENG.	CPU-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DU FUNDAÇÕES, ATÉ 1,50M	M3	125,73	R$34,57	R$4.346,63		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0%
4.2	AR ENG.	CPU-13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COMAÇO DE 10KG	M2	103,92	R$30,09	R$3.127,20	66	R$ 1.985,94	66	R$ 1.274,20	66	R$ 3.260,14	65,74	R$ 3.587,43	48%
4.3	AR ENG.	94962	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M3	4,91	R$294,37	R$1.444,87	80	R$ 2.471,20	80	R$ 2.471,20	80	R$ 2.471,20	83,82	R$ 2.589,20	49%
4.4	AR ENG.	96995	ATERRO MANUAL DA CAIXA DA OBRA	M3	71,60	R$49,38	R$3.535,61	2,45	R$ 720,96	2,45	R$ 720,96	2,45	R$ 720,96	2,46	R$ 723,91	50%
4.5	AR ENG.	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	63,91	R$61,61	R$3.937,27	53	R$ 3.265,33	33	R$ 2.032,85	86	R$ 5.298,18	36,60	R$ 1.807,31	49%
4.6	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	2.116,25	R$10,88	R$23.024,58		R$ 0,00	33	R$ 2.027,85	33	R$ 2.027,85	30,91	R$ 1.899,42	52%
4.7	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	116,76	R$13,84	R$1.615,90	1030	R$ 11.424,00	1050	R$ 11.424,00	1050	R$ 11.424,00	1.066,25	R$ 11.600,58	50%
4.8	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	M3	32,64	R$341,81	R$11.156,00	55	R$ 761,20	53	R$ 761,20	53	R$ 761,20	61,76	R$ 854,76	47%
4.9	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	32,64	R$201,87	R$10.626,44	25	R$ 8.545,25	25	R$ 8.545,25	25	R$ 8.545,25	27,64	R$ 9.447,63	47%
4.10	AR ENG.	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM EMULSÃO ASFALTICA	M2	232,68	R$25,41	R$5.921,71	25	R$ 5.046,75	25	R$ 5.046,75	25	R$ 5.046,75	27,64	R$ 5.579,69	47%
5	SUPERESTRUTURA					SUBTOTAL	R$106.627,19	115	R$ 2.926,75	115	R$ 2.926,75	115	R$ 2.926,75	117,68	R$ 2.994,96	49%
5.1	AR ENG.	CPU-14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	179,49	R$77,93	R$13.983,55		R$ 0,00		R$ 26.328,05		R$ 26.328,05		R$ 90.299,14	25%
5.2	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	1.999,69	R$10,88	R$21.647,93	85	R$ 6.625,75	85	R$ 6.625,75	85	R$ 6.625,75	88,49	R$ 6.897,60	49%
5.3	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	575,20	R$13,84	R$7.960,77	1000	R$ 10.880,00	1000	R$ 10.880,00	1000	R$ 10.880,00	989,69	R$ 10.767,83	50%
5.4	AR ENG.	94965	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=25,0 MPA	M3	27,97	R$368,96	R$10.319,81	225	R$ 3.114,00	225	R$ 3.114,00	225	R$ 3.114,00	350,20	R$ 4.846,77	39%
5.5	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	27,97	R$201,87	R$5.646,50	10	R$ 5.689,60	10	R$ 5.689,60	10	R$ 5.689,60	17,97	R$ 6.630,21	36%
5.6	AR ENG.	CPU-15	LAJE PRÉ-MOLDADA DE FORRO, E=8 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO E CAPEAMENTO	M2	303,24	R$49,52	R$15.016,44	10	R$ 2.018,70	10	R$ 2.018,70	10	R$ 2.018,70	17,97	R$ 3.627,66	36%
5.7	LAJE MACIÇA DE CONCRETO, E=0,10M						R$22.714,32		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 22.714,32	0%
5.7.1	AR ENG.	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	135,81	R$29,12	R$3.818,98		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	135,81	R$ 3.818,98	0%
5.7.2	AR ENG.	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.696,95	R$12,59	R$13.810,85		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	1.696,95	R$ 13.810,85	0%
5.7.3	AR ENG.	99839	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇAL AF_06/2015	M3	13,58	R$376,41	R$5.084,49		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	13,58	R$ 5.084,49	0%

José Flávio Magalhães de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-BA- 276781D

André Luis P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

5.8	RAMPA DE CONCRETO						R$9.798,17		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 9.798,17	0%
5.8.1	AR ENG.	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	80,33	R$28,12	R$2.259,89		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	80,33	R$ 2.259,89	0%
5.8.2	AR ENG	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTADEM. AF_12/2015	KG	360,03	R$12,39	R$4.532,78		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	360,03	R$ 4.532,78	0%
5.8.3	AR ENG.	99439	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015	M3	8,01	R$374,41	R$3.000,51		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,01	R$ 3.000,51	0%
6	VEDAÇÃO					SUBTOTAL	R$57.116,83		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 57.116,83	0%
6.1	AR ENG.	CPU-16	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X30CM, E=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 12MM	M2	1.081,83	R$36,25	R$39.220,89		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.081,83	R$ 39.220,89	0%
6.2	AR ENG.	CPU-17	CUBOGÓ CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), DE 9X20X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA	M2	125,72	R$104,73	R$13.166,18		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	125,72	R$ 13.166,18	0%
6.3	AR ENG.	93182	VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO DE 10X20CM	M	119,80	R$39,48	R$4.729,76		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	119,80	R$ 4.729,76	0%
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA					SUBTOTAL	R$25.496,64		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 25.496,64	0%
7.1	AR ENG.	CPU-18	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 0,60 X 1,60 M, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FECHADURA	UN	6,00	R$1.002,73	R$6.016,38		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 6.016,38	0%
7.2	AR ENG.	CPU-19	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	19,00	R$999,97	R$18.999,43		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	19,00	R$ 18.999,43	0%
7.3	AR ENG.	100703	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	7,00	R$68,69	R$480,83		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	7,00	R$ 480,83	0%
8	ESQUADRIAS METÁLICAS					SUBTOTAL	R$13.838,11		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 13.838,11	0%
8.1	AR ENG.	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	63,00	R$162,33	R$10.226,82		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	63,00	R$ 10.226,82	0%
8.2	AR ENG	CPU-20	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TIPO FANTASIA, PADRONIZADA	M2	3,90	R$328,61	R$1.281,57		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,90	R$ 1.281,57	0%
8.3	AR ENG	CPU-21	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	3,15	R$739,50	R$2.329,72		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,15	R$ 2.329,72	0%
9	COBERTURA					SUBTOTAL	R$209.163,66		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 209.163,66	0%
9.1	AR ENG.	CPU-22	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIGA TRELIÇADA DE AÇO, VÃO DE 12.60 M. INCLUSO ICAMENTO	UN	5,00	R$1.337,07	R$6.685,35		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 6.685,35	0%
9.2	AR ENG.	CPU-23	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIGA TRELIÇADA DE AÇO, VÃO DE 6.50 M. INCLUSO ICAMENTO	UN	5,00	R$1.092,60	R$5.463,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 5.463,00	0%
9.3	AR ENG.	CPU-24	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TERÇA EM PERFIL U ENRIJECIDO 150X60X20	M	551,22	R$23,38	R$12.887,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	551,22	R$ 12.887,52	0%
9.4	AR ENG.	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMO ACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO	M2	900,72	R$201,09	R$181.121,32		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	900,72	R$ 181.121,32	0%
9.5	AR ENG	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,15	R$53,52	R$329,17		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,15	R$ 329,17	0%
9.6	AR ENG	94231	RUFO METÁLICO, L=25 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	64,56	R$41,47	R$2.677,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	64,56	R$ 2.677,30	0%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					SUBTOTAL	R$12.860,06		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 12.860,06	0%
10.1	AR ENG.	89482	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$19,64	R$39,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 39,28	0%
10.2	AR ENG.	86904	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSO, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$100,00	R$200,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 200,00	0%
10.3	AR ENG.	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$108,02	R$432,08		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 432,08	0%
10.4	AR ENG.	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA DE 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO OU CUBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$42,94	R$257,64		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 257,64	0%
10.5	AR ENG.	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$8,66	R$51,96		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 51,96	0%
10.6	AR ENG	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$12,42	R$74,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 74,52	0%
10.7	AR ENG	95472	BACIA SIFONADA DE LOUÇA COM ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$149,99	R$1.199,92		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,00	R$ 1.199,92	0%
10.8	AR ENG.	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R$29,91	R$239,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,00	R$ 239,28	0%
10.9	AR ENG.	95544	PAPELEIRA DE METAL DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$27,69	R$221,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,00	R$ 221,52	0%
10.10	AR ENG.	CPU-25	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40MM, INCLUSIVE TUBO DE DESCIDA COM JOELHO	UN	8,00	R$422,83	R$3.382,64		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,00	R$ 3.382,64	0%
10.11	AR ENG.	95547	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$60,96	R$121,92		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 121,92	0%
10.12	AR ENG.	CPU-26	DISPENSER PARA TOALHAS INTERFOLHADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$66,54	R$133,08		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 133,08	0%
10.13	AR ENG.	100850	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$62,82	R$125,64		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 125,64	0%
10.14	AR ENG.	190869	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RTO EM AÇO INOX POLIDO, L= 90CM, D=1 MM	UN	4,00	R$217,82	R$871,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 871,28	0%
10.15	AR ENG.	CPU-27	BANCADA DE GRANITO, LARG.= 60	M2	1,92	R$291,34	R$559,18		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,92	R$ 559,18	0%
10.16	AR ENG.	CPU-28	PONTO DE ÁGUA FRIA	UN	6,00	R$120,16	R$720,96		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 720,96	0%
10.17	AR ENG.	CPU-29	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE O 40 MM	UN	6,00	R$86,23	R$529,38		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 529,38	0%
10.18	AR ENG.	CPU-30	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE O 100 MM	UN	8,00	R$127,30	R$1.018,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,00	R$ 1.018,40	0%
10.19	AR ENG.	89495	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X40 MM	UN	6,00	R$7,13	R$42,78		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 42,78	0%
10.20	AR ENG.	89355	REGISTRO DE GAVETA - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$33,57	R$67,14		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 67,14	0%
10.21	AR ENG.	CPU-31	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS	UN	2,00	R$1.285,73	R$2.571,46		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 2.571,46	0%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					SUBTOTAL	R$51.880,17		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 51.880,17	0%
11.1	AR ENG.	CPU-32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ, EMBUTIR, 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$161,85	R$323,70		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 323,70	0%
11.2	AR ENG.	CPU-33	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA, 200X200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$97,31	R$194,62		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 194,62	0%
11.3	AR ENG.	101890	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 15 A, EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	12,00	R$12,13	R$145,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	12,00	R$ 145,56	0%
11.4	AR ENG.	96985	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE COBRE COOPERWELD 5/8X2,4MM, COM CONECTOR	UN	3,00	R$51,91	R$155,73		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 155,73	0%
11.5	AR ENG.	CPU-34	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PLÁSTICO, COM BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	112,00	R$9,57	R$1.071,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	112,00	R$ 1.071,84	0%
11.6	AR ENG.	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	112,00	R$19,95	R$2.234,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	112,00	R$ 2.234,40	0%
11.7	AR ENG	CPU-35	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	112,00	R$320,96	R$35.947,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	112,00	R$ 35.947,52	0%
11.8	AR ENG.	CPU-36	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN	30,00	R$272,51	R$8.175,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	30,00	R$ 8.175,30	0%

José Flávio M. de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-BA 2

Antônio Luiz R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

11.9	AR ENG.	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	30,00	R$121,05	R$3 631,50		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	30,00	R$ 3.631,50	0%
12	FORRO DE GESSO					SUBTOTAL	R$1.702,80		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 1.702,80	0%
12.1	AR ENG.	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF_05/2017_P	M2	41,33	R$41,20	R$1.702,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	41,33	R$ 1.702,80	0%
13	REVESTIMENTO DE FORRO E PAREDES					SUBTOTAL	R$92.686,37		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 92.686,37	0%
13.1	AR ENG.	87871	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	2.163,65	R$4,17	R$9.022,42		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2163,65	R$ 9.022,42	0%
13.2	AR ENG	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	419,67	R$8,92	R$3 701,49		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	419,67	R$ 3.701,49	0%
13.3	AR ENG.	90408	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	2 034,99	R$32,51	R$66 157,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2 034,99	R$ 66.157,52	0%
13.4	AR ENG	87531	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	142,96	R$30,36	R$4.340,27		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	142,96	R$ 4.340,27	0%
13.5	AR ENG.	87274	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA 33X45 CM, JUNTA A PRUMO, COM CIMENTO COLANTE	M2	142,96	R$66,21	R$9.464,67		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	142,96	R$ 9.464,67	0%
14	PISOS					SUBTOTAL	R$103.072,40		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 103.072,40	0%
14.1	ENG.		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	1 211,36	R$39,94	R$48 381,72		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1 211,36	R$ 48 381,72	0%
14.2	AR ENG.	CPU-37	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM ARGAMASSA TRAÇO T4, ESP MÉDIA = 2,5CM	M2	42,19	R$26,37	R$1 196,93		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	42,19	R$ 1 196,93	0%
14.3	AR ENG	93391	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA TIPO A, 42X42 CM, PEI 5, COM CIMENTO COLANTE	M2	42,19	R$30,04	R$1.267,39		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	42,19	R$ 1.267,39	0%
14.4	AR ENG.	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, AF_09/2020	M2	1.169,17	R$36,66	R$42.861,77		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1169,17	R$ 42.861,77	0%
14.5	AR ENG.	101741	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, 10 CM	M	395,60	R$23,38	R$9 249,13		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	395,60	R$ 9.249,13	0%
14.6	AR ENG.	98689	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA DE GRANITO, E=15CM	M	1,68	R$68,73	R$115,48		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,68	R$ 115,48	0%
15	PINTURA					SUBTOTAL	R$73.725,23		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 73.725,23	0%
15.1	AR ENG.	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 1 DEMÃO, MASSA PVA	M2	1 090,00	R$14,22	R$15.499,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1 090,00	R$ 15.499,80	0%
15.2	AR ENG.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	M2	1.557,32	R$11,74	R$18.282,94		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1 557,32	R$ 18.282,94	0%
15.3	AR ENG.	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	419,67	R$27,94	R$11.725,58		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	419,67	R$ 11.725,58	0%
15.4	AR ENG.	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	419,67	R$11,06	R$4.640,94		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	419,67	R$ 4.640,94	0%
15.5	AR ENG.	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M2	754,46	R$14,52	R$11 297,32		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	754,46	R$ 11.297,32	0%
15.6	AR ENG.	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	1 057,92	R$9,93	R$10.526,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1 057,92	R$ 10.526,30	0%
15.7	AR ENG	102219	APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS, SOBRE MADEIRA	M2	100,36	R$15,06	R$1 513,43		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	100,36	R$ 1.513,43	0%
15.8	AR ENG.	CPU-38	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	6,30	R$11,12	R$70,06		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,30	R$ 70,06	0%
15.9	AR ENG.	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	6,30	R$25,39	R$159,96		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,30	R$ 159,96	0%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					SUBTOTAL	R$29.858,65		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 29.858,65	0%
16.1	AR ENG.	99853	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	88,00	R$96,78	R$8 516,64		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	88,00	R$ 8.516,64	0%
16.2	RAMPA DE ACESSO						R$21.342,01		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 21.342,01	0%
16.2.1	AR ENG.	96536	FORMA TABUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	2,40	R$61,45	R$147,48		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,40	R$ 147,48	0%
16.2.2	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	M3	3,60	R$341,81	R$1 230,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,60	R$ 1 230,52	0%
16.2.3	AR ENG.	92873	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M3	3,60	R$201,87	R$726,73		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,60	R$ 726,73	0%
16.3	AR ENG.	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	142,96	R$3,31	R$473,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	142,96	R$ 473,20	0%
16.4	AR ENG.	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICOS	M2	42,19	R$10,31	R$434,98		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	42,19	R$ 434,98	0%
16.5	AR ENG.	CPU-39	LIMPEZA DE VIDROS	M2	66,90	R$12,87	R$861,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	66,90	R$ 861,00	0%
16.6	AR ENG.	CPU-40	LIMPEZA GERAL	M2	1.211,38	R$14,42	R$17.468,10		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1 211,38	R$ 17.468,10	0%
17	MURO (L=148,73M H=2,6M)					SUBTOTAL	R$93.317,53									
17.1	INFRAESTRUTURA						R$22.938,50		R$ 0,00		R$ 22.938,50		R$ 22.938,50		R$ 0,00	100%
17.1.1	AR ENG.	CPU-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES, ATÉ 1,50M	M3	37,60	R$54,53	R$2 051,65		R$ 0,00	37,6	R$ 2.051,65	37,6	R$ 2.051,65	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.2	AR ENG.	CPU-13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COMAÇO DE 30KG	M2	65,91	R$30,99	R$2 035,79		R$ 0,00	65,91	R$ 2.035,79	65,91	R$ 2.035,79	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.3	AR ENG	96536	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M3	1,98	R$184,27	R$382,66		R$ 0,00	1,98	R$ 382,66	1,98	R$ 382,66	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.4	AR ENG	96536	FORMA TABUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	55,69	R$61,45	R$3 422,26		R$ 0,00	55,69	R$ 3 422,26	55,69	R$ 3.422,26	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.5	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MEDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	644,09	R$10,88	R$7 006,27		R$ 0,00	644,09	R$ 7.006,27	644,09	R$ 7.006,27	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.6	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	86,84	R$15,84	R$1.201,64		R$ 0,00	86,84	R$ 1 201,64	86,84	R$ 1.201,64	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.7	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	M3	12,21	R$341,91	R$4.173,44		R$ 0,00	12,21	R$ 4.173,44	12,21	R$ 4.173,44	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.8	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	12,21	R$201,87	R$2.464,79		R$ 0,00	12,21	R$ 2.464,79	12,21	R$ 2.464,79	0,00	R$ 0,00	100%
17.2	SUPERESTRUTURA						R$25.210,98		R$ 0,00		R$ 25.210,98		R$ 25.210,98		R$ 0,00	100%
17.2.1	AR ENG.	CPU-14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	78,44	R$77,95	R$6.114,62		R$ 0,00	78,44	R$ 6.114,62	78,44	R$ 6.114,62	0,00	R$ 0,00	100%
17.2.2	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MEDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	868,17	R$10,89	R$9.443,77		R$ 0,00	868,17	R$ 9.443,77	868,17	R$ 9.443,77	0,00	R$ 0,00	100%
17.2.3	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	239,06	R$15,84	R$3 584,71		R$ 0,00	239,06	R$ 3 584,71	239,06	R$ 3.584,71	0,00	R$ 0,00	100%
17.2.4	AR ENG.	94965	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=25,0 MPA	M3	10,63	R$368,06	R$3.922,04		R$ 0,00	10,63	R$ 3.922,04	10,63	R$ 3.922,04	0,00	R$ 0,00	100%
17.2.5	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	10,63	R$201,87	R$2.145,84		R$ 0,00	10,63	R$ 2.145,84	10,63	R$ 2.145,84	0,00	R$ 0,00	100%
17.3	VEDAÇÃO						R$14.828,33		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 14.828,33	0%
17.3.1	AR ENG.	CPU-16	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X30CM, E=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 12MM	M2	409,01	R$36,25	R$14.828,33		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	409,01	R$ 14.828,33	0%
17.4	REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDES						R$3.411,90		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.411,90	0%
17.4.1	AR ENG.	87873	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	818,02	R$4,17	R$3.411,90		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	818,02	R$ 3.411,90	0%
17.5	PINTURA						R$26.927,82		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 26.927,82	0%
17.5.1	AR ENG.	CPU-41	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	818,02	R$32,92	R$26 927,82		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	818,02	R$ 26.927,82	0%

TOTAL	R$1.057.994,14	TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL ATUAL	TOTAL ACUMULADO	SALDO TOTAL	(%)
UM MILHÃO, CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS		43.554,04	139.719,53	183.273,97	R$ 874.720,18	83%

José Flávio Mota de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-SP 267810

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI 1	29,67%
Obra:	ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BLOCO PRINCIPAL	REF.:	SINAPI 03/2021
Local:	DISTRITO DE JOSÉ GONÇALVES - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA	DATA	09/2021

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO (COM BDI)	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	(%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					SUBTOTAL	R$55.240,02		R$ 9.280,66		R$ 9.280,66		R$ 18.561,32		R$ 36.678,70	34%
1.1	AR ENG.	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$101,42	R$7.302,24	72	R$ 7.302,24	72	R$ 7.302,24	144	R$ 14.604,48	144,00	R$ 29.908,96	33%
1.2	AR ENG.	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$70,65	R$5.086,80	72	R$ 5.086,80	72	R$ 5.086,80	144	R$ 10.173,60	144,00	R$ 20.847,24	33%
1.3	AR ENG.	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00	R$33,99	R$44.866,65	220	R$ 7.477,80	220	R$ 7.477,80	440	R$ 14.955,60	880,00	R$ 29.910,05	33%
1.4	AR ENG.	CPU	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	1,00	R$88,78	R$88,78	1	R$ 88,78	1	R$ 88,78	2	R$ 177,56	1,00	R$ 88,78	20%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					SUBTOTAL	R$52.066,09		R$ 19.420,19		R$ 1.330,52		R$ 20.750,70		R$ 31.315,39	40%
2.1	AR ENG.	CPU-1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO (SALAS EXISTENTES E CIRCULAÇÃO)	M2	916,13	R$30,57	R$28.003,33	600	R$ 18.340,19		R$ 0,00	600	R$ 18.340,19	316,13	R$ 9.663,14	65%
2.2	AR ENG.	CPU-41	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	191,79	R$32,92	R$6.313,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	191,79	R$ 6.313,40	0%
2.3	AR ENG.	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	178,74	R$22,65	R$4.044,42		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	178,74	R$ 4.044,42	0%
2.4	AR ENG.	CPU-2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	136,94	R$14,11	R$1.932,22		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	136,94	R$ 1.932,22	0%
2.5	AR ENG.	CPU-3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA	M2	136,94	R$35,38	R$4.899,71		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	136,94	R$ 4.899,71	0%
2.6	AR ENG.	CPU-4	REMOÇÃO DE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	M	4,15	R$5,15	R$21,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,15	R$ 21,37	0%
2.7	AR ENG.	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO, SEM REAPROVEITAMENTO (MURO)	M2	63,42	R$54,42	R$3.451,32		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	63,42	R$ 3.451,32	0%
2.8	AR ENG.	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	126,63	R$35,04	R$4.889,42	75	R$ 378,00		R$ 0,00	75	R$ 378,00	81,63	R$ 411,42	48%
2.9	AR ENG.	97914	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 14 KM	M3XKM	769,15	R$1,56	R$1.221,71	450	R$ 702,00		R$ 0,00	450	R$ 702,00	333,15	R$ 519,71	57%
2.10	AR ENG.	CPU-5	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	7,76	R$37,56	R$291,47		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	7,76	R$ 291,47	0%
3	INFRAESTRUTURA			M2	4,50	R$295,03	R$1.330,52		R$ 0,00	4,5	R$ 1.330,52	4,5	R$ 1.330,52	0,00	R$ 0,00	100%
3.1	AR ENG.	CPU-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES, ATÉ 1,50M			SUBTOTAL	R$5.163,76		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 5.163,76	0%
3.2	AR ENG.	CPU-13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COMAÇO DE SOLO	M3	6,54	R$54,57	R$356,89		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,54	R$ 356,89	0%
3.3	AR ENG.	94962	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M2	10,94	R$30,89	R$337,94		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,94	R$ 337,94	0%
3.4	AR ENG.	96995	ATERRO MANUAL DA CAIXA DA OBRA	M3	0,33	R$294,27	R$97,11		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,33	R$ 97,11	0%
3.5	AR ENG.	96536	FORMA TABUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	1,36	R$49,38	R$67,16		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,36	R$ 67,16	0%
3.6	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MEDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	M2	17,32	R$61,45	R$1.064,31		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	17,32	R$ 1.064,31	0%
3.7	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	169,27	R$10,88	R$1.189,86		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	109,27	R$ 1.189,86	0%
3.8	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	KG	13,50	R$13,84	R$186,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	13,50	R$ 186,84	0%
3.9	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	2,17	R$341,81	R$741,73		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,17	R$ 741,73	0%
3.10	AR ENG.	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M3	2,17	R$201,87	R$438,06		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,17	R$ 438,06	0%
4	SUPERESTRUTURA			M2	26,91	R$25,45	R$684,86		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	26,91	R$ 684,86	0%
4.1	AR ENG.	CPU-14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO			SUBTOTAL	R$6.385,69		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 6.385,69	0%
4.2	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MEDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	M2	34,87	R$77,95	R$2.718,12		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	34,87	R$ 2.718,12	0%
4.3	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	157,40	R$10,89	R$1.712,51		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	157,40	R$ 1.712,51	0%
4.4	AR ENG.	94965	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=25,0 MPA	KG	48,46	R$13,84	R$670,69		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	48,46	R$ 670,69	0%
4.5	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	2,25	R$368,96	R$830,16		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,25	R$ 830,16	0%
5	VEDAÇÃO			M3	2,25	R$101,87	R$454,21		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,25	R$ 454,21	0%
5.1	AR ENG.	CPU-43	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, E=19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 12MM			SUBTOTAL	R$3.353,54		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.353,54	0%
5.2	AR ENG.	93182	VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO DE 10X20CM	M2	76,48	R$42,30	R$3.235,10		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	76,48	R$ 3.235,10	0%
6	ESQUADRIA DE MADEIRA			M	3,00	R$39,48	R$118,44		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 118,44	0%
6.1	AR ENG.	CPU-18	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,60 X 1,60 M, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FECHADURA			SUBTOTAL	R$41.628,68		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 41.628,68	0%
6.2	AR ENG.	CPU-44	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 1,60 M, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FECHADURA	UN	10,00	R$1.002,73	R$10.027,27		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R$ 10.027,27	0%
6.3	AR ENG.	CPU-45	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,60 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	2,00	R$1.119,30	R$2.238,59		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 2.238,59	0%
6.4	AR ENG.	CPU-16	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,70 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	5,00	R$897,87	R$4.489,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 4.489,37	0%
6.5	AR ENG.	CPU-47	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,70 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	3,00	R$915,29	R$2.745,88		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 2.745,88	0%
6.6	AR ENG.	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	21,00	R$1.014,44	R$21.303,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	21,00	R$ 21.303,30	0%
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA			UN	12,00	R$68,69	R$824,27		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	12,00	R$ 824,27	0%
7.1	AR ENG.	94579	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BAIXA, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE AJUDA E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			SUBTOTAL	R$15.342,88		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 15.342,88	0%
7.2	AR ENG.	CPU-20	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TIPO FANTASIA, PADRONIZADA	M2	65,59	R$162,33	R$10.647,22		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	65,59	R$ 10.647,22	0%
7.3	AR ENG.	CPU-48	PORTA TIPO GRADIL EM PERFIL DE METALON GALVANIZADO COM SEÇÃO 20X20 MM (SANITÁRIOS)	M2	10,58	R$318,61	R$3.476,69		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,58	R$ 3.476,69	0%
8	COBERTURA			M2	5,04	R$241,86	R$1.218,97		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,04	R$ 1.218,97	0%
8.1	AR ENG.	CPU-24	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TERÇA EM PERFIL U ENRIJECIDO 150X60X20			SUBTOTAL	R$31.212,47		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 31.212,47	0%
8.2	AR ENG.	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMO-ACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUA INCLUSO ISOLAMENTO	M	99,40	R$23,38	R$2.323,71		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	99,40	R$ 2.323,71	0%
				M2	136,94	R$201,09	R$27.536,59		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	136,94	R$ 27.536,59	0%

8.3	AR ENG	CPU-49	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEIRA METÁLICA PARA TELHA TERMOACÚSTICA	M	11,80	R$76,22	R$899,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	11,80	R$ 899,37	0%
8.4	AR ENG	94231	RUFO METÁLICO, L=25 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,92	R$41,47	R$452,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,92	R$ 452,80	0%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						SUBTOTAL	R$34.247,83		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 34.247,83	0%
9.1	AR ENG.	89482	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R$19,64	R$176,76		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	9,00	R$ 176,76	0%
9.2	AR ENG.	89495	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X40 MM	UN	4,00	R$7,13	R$28,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 28,52	0%
9.3	AR ENG.	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 15X30 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$171,79	R$858,95		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 858,95	0%
9.4	AR ENG	86904	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSO, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$100,00	R$200,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 200,00	0%
9.5	AR ENG	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R$195,62	R$1.956,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R$ 1.956,20	0%
9.6	AR ENG.	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$36,86	R$184,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 184,30	0%
9.7	AR ENG.	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA DE 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO OU CUBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$42,94	R$429,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R$ 429,40	0%
9.8	AR ENG.	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	R$8,66	R$86,60		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 86,60	0%
9.9	AR ENG.	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	R$12,42	R$124,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R$ 124,20	0%
9.10	AR ENG.	95870	BACIA SIFONADA DE LOUÇA COM ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R$149,99	R$2.399,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 2.399,84	0%
9.11	AR ENG.	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	R$29,91	R$478,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 478,56	0%
9.12	AR ENG.	95544	PAPELEIRA DE METAL DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R$27,69	R$443,04		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 443,04	0%
9.13	AR ENG.	CPU-25	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40MM, INCLUSIVE TUBO DE DESCIDA COM JOELHO	UN	16,00	R$422,83	R$6.765,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 6.765,28	0%
9.14	AR ENG	100858	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$437,33	R$1.312,05		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 1.312,05	0%
9.15	AR ENG.	95547	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$60,86	R$243,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 243,84	0%
9.16	AR ENG.	CPU-26	DISPENSER PARA TOALHAS INTERFOLHADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$66,54	R$266,16		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 266,16	0%
9.17	AR ENG.	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$62,82	R$251,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 251,28	0%
9.18	AR ENG.	100869	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PCD EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38 MM	UN	4,00	R$217,82	R$871,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 871,28	0%
9.19	AR ENG.	CPU-27	BANCADA DE GRANITO, LARG = 60	M2	17,69	R$291,24	R$5.152,04		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	17,69	R$ 5.152,04	0%
9.20	AR ENG.	CPU-28	PONTO DE ÁGUA FRIA	UN	16,00	R$120,16	R$1.922,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 1.922,56	0%
9.21	AR ENG.	CPU-29	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE D 40 MM	UN	16,00	R$88,23	R$1.411,68		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 1.411,68	0%
9.22	AR ENG.	CPU-30	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE D 100 MM	UN	16,00	R$127,30	R$2.036,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 2.036,80	0%
9.23	AR ENG.	89493	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X40 MM	UN	12,00	R$7,13	R$85,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	12,00	R$ 85,56	0%
9.24	AR ENG.	89553	REGISTRO DE GAVETA - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$33,57	R$134,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 134,28	0%
9.25	AR ENG	CPU-31	CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS	UN	5,00	R$1.285,73	R$6.428,65		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 6.428,65	0%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						SUBTOTAL	R$50.036,52		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 50.036,52	0%
10.1	AR ENG	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$327,74	R$327,74		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	R$ 327,74	0%
10.2	AR ENG	CPU-33	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA, 200X200X110MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$97,31	R$97,31		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	R$ 97,31	0%
10.3	AR ENG.	101890	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 15 A, EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	12,00	R$12,13	R$145,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	12,00	R$ 145,56	0%
10.4	AR ENG.	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$69,96	R$69,96		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	R$ 69,96	0%
10.5	AR ENG	96985	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE COBRE COOPERWELD 5/8X2,40M, COM CONECTOR	UN	3,00	R$51,91	R$155,73		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 155,73	0%
10.6	AR ENG.	CPU-34	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PLÁSTICO, COM BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	97,00	R$9,57	R$928,29		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	97,00	R$ 928,29	0%
10.7	AR ENG.	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022	UN	97,00	R$19,95	R$1.935,15		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	97,00	R$ 1.935,15	0%
10.8	AR ENG.	CPU-35	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	97,00	R$320,96	R$31.133,12		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	97,00	R$ 31.133,12	0%
10.9	AR ENG.	CPU-50	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN	11,00	R$274,06	R$3.014,66		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	11,00	R$ 3.014,66	0%
10.10	AR ENG.	CPU-36	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	UN	20,00	R$272,51	R$5.450,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	20,00	R$ 5.450,20	0%
10.11	AR ENG.	95141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	56,00	R$121,05	R$6.778,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	56,00	R$ 6.778,80	0%
11	FORRO DE PVC						SUBTOTAL	R$3.749,41		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.749,41	0%
11.1	AR ENG.	96111	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	56,93	R$65,86	R$3.749,41		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	56,93	R$ 3.749,41	0%
12	REVESTIMENTO DE FORRO E PAREDES						SUBTOTAL	R$35.275,37		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 35.275,37	0%
12.1	AR ENG.	87873	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	331,69	R$4,17	R$1.383,15		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	331,69	R$ 1.383,15	0%
12.2	AR ENG.	90408	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	152,95	R$32,51	R$4.972,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	152,95	R$ 4.972,40	0%
12.3	AR ENG	87531	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	299,47	R$30,36	R$9.091,91		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	299,47	R$ 9.091,91	0%
12.4	AR ENG	87274	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA 33X45 CM, JUNTA A PRUMO, COM CIMENTO COLANTE	M2	299,47	R$66,21	R$19.827,91		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	299,47	R$ 19.827,91	0%
13	PISOS						SUBTOTAL	R$100.847,67		R$ 0,00		R$ 19.970,00		R$ 0,00		R$ 80.877,67	20%
13.1	AR ENG.	87649	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5 CM. AF_06/2015	M2	1.107,92	R$39,94	R$44.250,32		R$ 0,00	500	R$ 19.970,00	0	R$ 0,00	607,92	R$ 24.280,32	45%
13.2	AR ENG.	CPU-37	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM ARGAMASSA TRAÇO [illegible] ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	87,63	R$28,37	R$2.486,06		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	87,63	R$ 2.486,06	0%
13.3	AR ENG	93391	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA TIPO A, 42X42 CM, PI. CIMENTO COLANTE	M2	87,63	R$30,04	R$2.632,41		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	87,63	R$ 2.632,41	0%

José Tarcio Alves de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-BA 167610

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

13.1	AR ENG	CPU-51	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	22,04	R$114,29	R$2.518,95		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	22,04	R$ 2.518,95	0%
13.5	AR. ENG.	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	1.020,29	R$36,66	R$37.403,83		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.020,29	R$ 37.403,83	0%
13.6	AR ENG.	101741	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, 10 CM	M	472,30	R$23,38	R$11.042,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	472,30	R$ 11.042,37	0%
13.7	AR ENG.	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	13,14	R$6,25	R$82,13		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	13,14	R$ 82,13	0%
13.8	AR ENG.	98689	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA DE GRANITO, L=15CM	M	6,28	R$68,73	R$431,60		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,28	R$ 431,60	0%
14	**PINTURA**						**SUBTOTAL**		**R$44.678,73**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 44.678,73***	***0%***
14.1	AR ENG.	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 1 DEMÃO, MASSA PVA	M2	256,05	R$14,22	R$3.641,03		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	256,05	R$ 3.641,03	0%
14.2	AR ENG.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	M2	1.030,98	R$11,73	R$12.103,71		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.030,98	R$ 12.103,71	0%
14.3	AR ENG.	88485	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	225,03	R$16,90	R$3.803,01		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	225,03	R$ 3.803,01	0%
14.4	AR ENG.	94623	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	2.250,34	R$9,95	R$22.390,88		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2.250,34	R$ 22.390,88	0%
14.5	AR ENG.	102219	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M2	157,36	R$15,08	R$2.372,08		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	157,36	R$ 2.372,08	0%
14.6	AR ENG	CPU-38	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPÓXI PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	10,08	R$11,12	R$112,09		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,08	R$ 112,09	0%
14.7	AR ENG.	100926	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	16,08	R$25,39	R$253,93		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,08	R$ 255,93	0%
15	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**SUBTOTAL**		**R$42.023,26**							
15.1	**RAMPA DE ACESSO**								**R$3.871,40**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 3.871,40***	***0%***
15.1.1	AR ENG.	96546	FORMA TABUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	1,50	R$61,45	R$92,18		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,50	R$ 92,18	0%
15.1.2	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	M3	6,05	R$341,81	R$2.067,95		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,05	R$ 2.067,95	0%
15.1.3	AR ENG.	92873	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M3	6,08	R$201,87	R$1.227,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,08	R$ 1.227,37	0%
15.1.4	AR ENG.	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_01/2019_P	M	5,00	R$96,78	R$483,90		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 483,90	0%
15.2	**BANCO EM GRANITO (2 UN)**								**R$12.945,75**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 12.945,75***	***0%***
15.2.1	AR ENG	CPU-52	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	15,75	R$209,61	R$3.301,39		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,75	R$ 3.301,39	0%
15.2.2	AR ENG	90408	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	31,50	R$32,51	R$1.024,12		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	31,50	R$ 1.024,12	0%
15.2.3	AR ENG.	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	31,50	R$16,90	R$532,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	31,50	R$ 532,30	0%
15.2.4	AR ENG	94623	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	31,50	R$9,93	R$313,36		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	31,50	R$ 312,86	0%
15.2.5	AR ENG.	CPU-53	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	17,50	R$444,26	R$7.774,58		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	17,50	R$ 7.774,58	0%
15.3	**ESCOVODROMO COM 5 TORNEIRA**								**R$2.867,56**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 2.867,56***	***0%***
15.3.1	AR ENG.	101159	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM (1ª VEZ (ESPESSURA 20CM)	M2	10,28	R$127,60	R$1.311,74		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,28	R$ 1.311,74	0%
15.3.2	AR ENG	96995	ATERRO MANUAL DA CAIXA DA OBRA	M3	0,57	R$49,58	R$28,15		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,57	R$ 28,15	0%
15.3.3	AR ENG.	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	1,44	R$39,94	R$57,51		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,44	R$ 57,51	0%
15.3.4	AR ENG	87531	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	5,54	R$30,36	R$168,21		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,54	R$ 168,21	0%
15.3.5	AR ENG.	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	5,54	R$53,08	R$294,06		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,54	R$ 294,06	0%
15.3.6	AR ENG	89495	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X40 MM	UN	2,00	R$7,13	R$14,26		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 14,26	0%
15.3.7	AR ENG	86916	TORNEIRA DE PRESSÃO PLÁSTICA COM4M, USO GERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$36,56	R$182,78		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 182,78	0%
15.3.8	AR ENG	CPU-28	PONTO DE ÁGUA FRIA	UN	5,00	R$120,16	R$600,82		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 600,82	0%
15.3.9	AR ENG.	CPU-29	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM	UN	2,00	R$88,23	R$176,46		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 176,46	0%
15.3.10	AR ENG	89353	REGISTRO DE GAVETA - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$33,57	R$33,57		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	R$ 33,57	0%
15.4	**CASA DE GÁS**								**R$3.421,89**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 3.421,89***	***0%***
15.4.1	AR ENG.	CPU-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES, ATÉ 1,50M	M3	0,74	R$54,57	R$40,38		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,74	R$ 40,38	0%
15.4.2	AR ENG.	CPU-13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COMAÇO DE 30KG	M2	1,86	R$30,89	R$57,45		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,86	R$ 57,45	0%
15.4.3	AR ENG.	94962	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M3	0,06	R$294,27	R$17,66		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,06	R$ 17,66	0%
15.4.4	AR ENG.	CPU-14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	2,53	R$77,95	R$197,22		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,53	R$ 197,22	0%
15.4.5	AR ENG	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	31,25	R$10,88	R$339,93		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	31,25	R$ 339,93	0%
15.4.6	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	6,84	R$13,84	R$94,65		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,84	R$ 94,65	0%
15.4.7	AR ENG.	94965	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=25,0 MPA	M3	0,37	R$368,06	R$136,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,37	R$ 136,52	0%
15.4.8	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	0,37	R$201,87	R$74,69		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,37	R$ 74,69	0%
15.4.9	AR ENG.	CPU-15	LAJE PRÉ-MOLDADA DE FORRO, E=8 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO E CIMBAMENTO	M2	2,40	R$49,52	R$118,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,40	R$ 118,84	0%
15.4.10	AR ENG.	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	0,82	R$25,45	R$173,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,82	R$ 173,56	0%
15.4.11	AR ENG	CPU-16	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X30CM, E=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 12MM	M2	8,06	R$36,25	R$292,21		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,06	R$ 292,21	0%
15.4.12	AR ENG.	87873	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	19,99	R$4,17	R$83,38		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	19,99	R$ 83,38	0%
15.4.13	AR ENG.	90408	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	19,99	R$32,51	R$649,91		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	19,99	R$ 649,91	0%
15.4.14	AR ENG	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSU[illegible]M. AF_06/2014	M2	1,47	R$39,94	R$58,71		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,47	R$ 58,71	0%

JOSÉ [illegible] R. MOURA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PA 95.[illegible]

15.4.15	AR ENG.	98670	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	1,47	R$30,12	R$44,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,47	R$ 44,28	0%
15.4.16	AR ENG	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 1 DEMÃO, MASSA PVA	M2	19,99	R$14,22	R$284,19		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	19,99	R$ 284,19	0%
15.4.17	AR ENG.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	M2	19,99	R$11,74	R$234,74		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	19,99	R$ 234,74	0%
15.4.18	AR ENG.	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3,57	R$25,39	R$90,63		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,57	R$ 90,63	0%
15.4.19	AR ENG.	CPU-48	PORTA TIPO GRADIL EM PERFIL DE METALON GALVANIZADO COM SEÇÃO 30X20 MM (ANTÁRTICO)	M2	1,79	R$241,86	R$432,94		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,79	R$ 432,94	0%
15.5	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**R$18.916,66**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 18.916,66***	***0%***
15.1	AR ENG.	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	299,47	R$3,31	R$991,91		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	299,47	R$ 991,91	0%
15.2	AR ENG.	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICOS	M2	87,63	R$10,31	R$903,85		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	87,63	R$ 903,85	0%
15.3	AR ENG.	CPU-39	LIMPEZA DE VIDROS	M2	81,21	R$12,87	R$1.045,46		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	81,21	R$ 1.045,46	0%
15.4	AR ENG.	CPU-40	LIMPEZA GERAL	M2	1.107,92	R$14,42	R$15.975,44		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.107,92	R$ 15.975,44	0%
TOTAL							**R$521.251,92**	**TOTAL ACUMULADO ANTERIOR**		**TOTAL ATUAL**		**TOTAL ACUMULADO**		**SALDO TOTAL**		**(%)**
								28.700,85		**30.581,18**		**59.282,02**		**R$ 1.519.964,04**		**11%**
QUINHENTOS E VINTE E UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS																	

TOTAL GERAL	**R$1.579.246,07**
UM MILHÃO, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS	

BM	DATA	VALOR	(%)
1	20/11/2021	R$ 61.894,62	4%
2	20/12/2021	R$ 120.300,71	11%

153

Vitória da Conquista - BA, 20 de dezembro de 2021.

AR Engenharia Eireli
CNPJ: 36.286.217/0001-57
André Luís Prates Rocha Moura
Engenheiro civil
CPF: [redacted]

André Luis P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA BA 95.390

José Flávio Maia de Oliveira
Engenheiro civil
CREA-BA- 27678/D

154

Relatório fotográfico BM 02

Modalidade: Tomada de preço

Contrato nº: 104-2021

Objeto: ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA - REFORMA E AMPLIAÇÃO (MÓDULO NOVO)

Contratante: Prefeitura Municipal

Contratada: Empresa AR Engenharia Eirelli

Cidade: José Gonçalves - Ba

Período de execução: 23/11/2021 à 20/12/2021

Número da medição: 02

Coordenadas geométricas: 14°43'41.6"S 40°43'35.3"W

Anaíé Luís P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

José Fábio Vieira de Oliveira
Engenheiro civil
CREA-BA- 276781D

155

FOTO 01: ANTES – Área de circulação da área de ampliação

FOTO 02: DEPOIS – Remoção de entulho e terraplanagem

André Luis P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.330

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

José Mário Alves de Oliveira
Engenheiro civil
CREA-BA- 27678/D

156

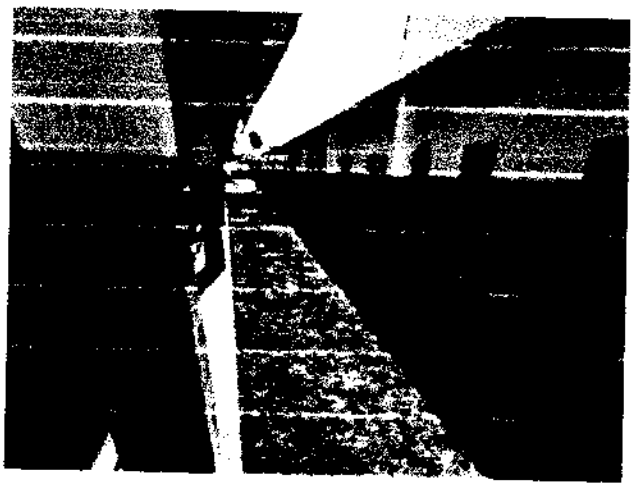

FOTO 03 – ÁREA DE CIRCULAÇÃO INTERNA DO LOCAL DA REFORMA

FOTO 04 – LOCAL DE INSTALAÇÃO DO CONTRAPISO COM CASCALHO DE REGULARIZAÇÃO E TAPUMES PARA EVITAR TRANSIÇÃO DE ALUNOS.

André Luiz P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

José Flávio Vieira de Oliveira
Engenheiro civil
CREA-BA- 27678/D

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

157

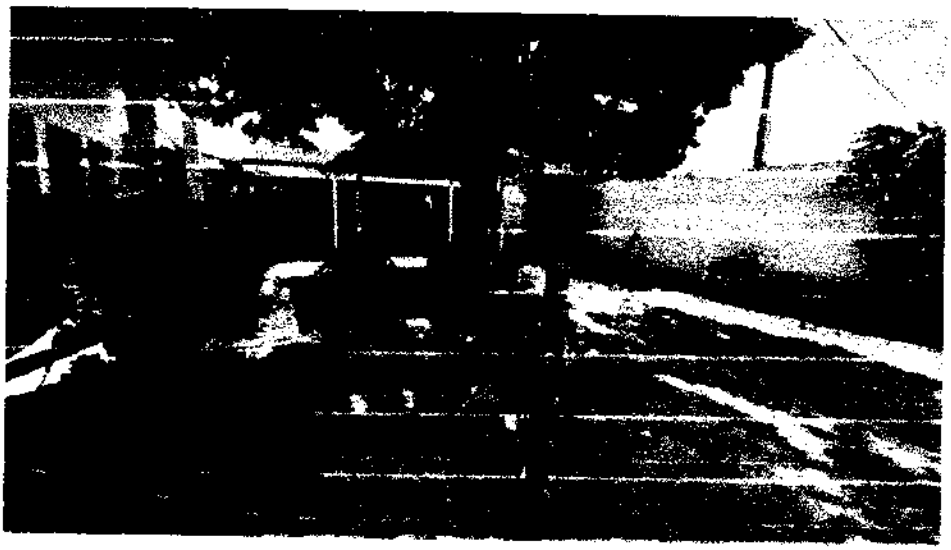

FOTO 05 – ÁREA DE CIRCULAÇÃO FRONTAL DA ESCOLA

FOTO 06 – INÍCIO DE CONTRAPISO EM ÁREA DE CIRCULAÇÃO FRONTAL DA ESCOLA

André Luis P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

José Tadeu Lopes da Silveira
Engenheiro civil
CREA-BA- 27678/D

158

FOTO 07 – ANTES – ÁREA DE CIRCULAÇÃO DAS 5 SALAS

FOTO 08 – DEPOIS – ÁREA DE CIRCULAÇÃO DAS 5 SALAS, SEM TELHADO E PILARES DE MADEIRA

André Luis P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.395

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

Engenheiro civil
CREA-BA- 276781D

159

FOTO 09 – GABARITO DA CONSTRUÇÃO DAS 10 SALAS DE AMPLIAÇÃO ARMADO, E FERRAGEM PARA SAPATAS E ARRANQUES ARMADAS E DOBRADAS.

André Luis P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

AR ENGENHARIA EIRELLI

CNPJ: 36.286.217/0001-57

Engenheiro civil
CREA-BA- 27678/D

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Codigo de Verificação para Autenticação: 17ab038630a2d83eed6d4f883f85fbb6

Gerado em 25/01/2022 10:08:08

Data de Emissão	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Série	Nº da Nota Fiscal
25/01/2022		Tributação Normal		PADRAO	202200000000002

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Optante	No Município (2933307 - Vitória da Conquista - BA)

PRESTADOR

Razão Social: AR ENGENHARIA EIRELI
Nome Fantasia:
Endereço: AVENIDA ALIRIO SALES - ATE 699/700, 25, ... - CANDEIAS
Vitória da Conquista - BA - CEP: 45028-080
E-mail: arengenhariaconstrutora@gmail.com - Fone: (00)8836-8479 - Celular: - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: ..... CPF/CNPJ: 36.286.217/0001-57

J60

TOMADOR

Razão Social: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1842, ... - Candeias
Vitória da Conquista - BA - CEP: 45000-000
E-mail: ..... - Fone: (77)3429-7750 - Celular:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 2009214 - CPF/CNPJ: 06.071.702/0001-42

SERVIÇO

2 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concr

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOISÉIS MEIRA EM VITÓRIA DA CONQUISTA JÁ EXECULTADO 6% DA OBRA PARA ESSA MEDIÇÃO.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO BRADESCO
AG: 270
CONTA CORRENTE: 421028-0
PIX: 36.286.217/0001-57

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESC. INCO. (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
93.083,07	0,00	0,00	93.083,07	3,10	2.885,58

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTOS (R$) DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.083,07

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site www.vitoriadaconquista.ba.gov.br

Engenheiro civil
CREA-BA- 2757/D

AR ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 36.286.217/0001-57
AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, 450 D - SL 3
ANDAR 1 FELÍCIA, CEP: 45055-155 VIT. DA CONQUISTA
TEL: (77) 9 9109-9040 andre.rocha.moura@hotmail.com

CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA - BA	INÍCIO DA OBRA: 15/10/2021
NºCONTRATO: 104-2021	PERÍODO: 20/12/2021 À 25/01/2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.579.246,07	DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI	29,67%
Obra:	ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA - REFORMA E AMPLIAÇÃO (MÓDULO NOVO)	REF.:	SINAPI 03/2021
Local:	DISTRITO DE JOSÉ GONÇALVES - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA	DATA:	09/2021

BM 03	DATA	VALOR	PORCENTAGEM
	25/01/2022	93.083,07	6%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATADO QUANT.	CONTRATADO PREÇO (COM BDI)	CONTRATADO VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR QUANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ATUAL QUANT.	ATUAL VALOR	ACUMULADO QUANT.	ACUMULADO VALOR	SALDO QUANT.	SALDO VALOR	EXECUTADO (%)
1	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**					**SUBTOTAL**	**R$55.239,72**		***R$ 18.472,54***		***R$ 9.191,88***		***R$ 27.664,42***		***R$ 27.575,30***	***50%***
1.1	AR ENG.	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$304,42	R$7.519,05	24	R$ 2.506,08	12	R$ 1.253,04	36	R$ 3.759,12	36,00	R$ 3.759,93	50%
1.2	AR ENG.	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00	R$33,99	R$44.865,65	440	R$ 14.951,60	220	R$ 7.477,80	660	R$ 22.433,40	660,00	R$ 22.432,25	50%
1.3	AR ENG.	150309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$58,42	R$2.766,36	24	R$ 922,08	12	R$ 461,04	36	R$ 1.383,12	36,00	R$ 1.383,12	50%
1.4	AR ENG.	CPU	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	1,00	R$88,78	R$88,78	1	R$ 88,78		R$ 0,00	1	R$ 88,78	0,00	R$ 0,00	100%
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**SUBTOTAL**	**R$44.431,75**		***R$ 44.431,76***		***R$ 0,00***		***R$ 44.431,76***		***-R$ 0,01***	***100%***
2.1	AR ENG.	CPU-1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO (SALAS EXISTENTES E CIRCULAÇÃO)	M2	249,66	R$30,57	R$7.631,35	249,66	R$ 7.631,35		R$ 0,00	249,66	R$ 7.631,35	0,00	R$ 0,00	100%
2.2	AR ENG.	CPU-2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	354,04	R$14,13	R$4.994,83	354,04	R$ 4.994,83		R$ 0,00	354,04	R$ 4.994,83	0,00	R$ 0,00	100%
2.3	AR ENG.	CPU-3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA	M2	354,04	R$35,78	R$12.667,86	354,04	R$ 12.667,86		R$ 0,00	354,04	R$ 12.667,86	0,00	R$ 0,00	100%
2.4	AR ENG.	CPU-4	REMOÇÃO DE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	M	37,21	R$5,15	R$191,63	37,21	R$ 191,63		R$ 0,00	37,21	R$ 191,63	0,00	R$ 0,00	100%
2.5	AR ENG.	CPU-5	RETIRADA DE PILARES DE MADEIRA, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO	UN	12,00	R$123,55	R$1.482,60	12	R$ 1.482,60		R$ 0,00	12	R$ 1.482,60	0,00	R$ 0,00	100%
2.6	AR ENG.	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	95,77	R$5,04	R$482,68	95,77	R$ 482,68		R$ 0,00	95,77	R$ 482,68	0,00	R$ 0,00	100%
2.7	AR ENG.	97914	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 14 KM	M3XKM	478,87	R$1,56	R$747,04	478,87	R$ 747,04		R$ 0,00	478,87	R$ 747,04	0,00	R$ 0,00	100%
2.8	AR ENG.	92210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	25,41	R$447,45	R$11.369,70	25,41	R$ 11.369,70		R$ 0,00	25,41	R$ 11.369,70	0,00	R$ 0,00	100%
2.9	AR ENG.	CPU-6	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	467,40	R$7,50	R$3.533,54	467,4	R$ 3.533,54		R$ 0,00	467,4	R$ 3.533,54	0,00	R$ 0,00	100%
2.10	AR ENG.	CPU-7	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	R$295,67	R$1.330,52	4,5	R$ 1.330,52		R$ 0,00	4,5	R$ 1.330,52	0,00	R$ 0,00	100%
3	**SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM**					**SUBTOTAL**	**R$6.965,68**		***R$ 6.965,68***		***R$ 0,00***		***R$ 6.965,68***		***R$ 0,00***	***100%***
3.1	AR ENG.	CPU-8	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, COM REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	788,33	R$0,49	R$386,28	788,33	R$ 386,28		R$ 0,00	788,33	R$ 386,28	0,00	R$ 0,00	100%
3.2	AR ENG.	CPU-9	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	358,69	R$2,61	R$936,18	358,69	R$ 936,18		R$ 0,00	358,69	R$ 936,18	0,00	R$ 0,00	100%
3.3	AR ENG.	97910	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT= 5,0 KM (ROTA FORA)	M3XKM	1.290,89	R$1,04	R$1.342,53	1290,89	R$ 1.342,53		R$ 0,00	1290,89	R$ 1.342,53	0,00	R$ 0,00	100%
3.4	AR ENG.	97918	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT= 14,0 KM (EMPRÉSTIMO)	M3XKM	2.510,83	R$1,04	R$2.611,26	2510,83	R$ 2.611,26		R$ 0,00	2510,83	R$ 2.611,26	0,00	R$ 0,00	100%
3.5	AR ENG.	CPU-10	ESPALHAMENTO DE MATERIAL TERROSO	M3	358,69	R$0,31	R$111,19	358,69	R$ 111,19		R$ 0,00	358,69	R$ 111,19	0,00	R$ 0,00	100%
3.6	AR ENG.	CPU-11	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M3	358,69	R$4,40	R$1.578,24	358,69	R$ 1.578,24		R$ 0,00	358,69	R$ 1.578,24	0,00	R$ 0,00	100%
4	**INFRAESTRUTURA**					**SUBTOTAL**	**R$80.011,35**		***R$ 38.926,46***		***R$ 24.443,21***		***R$ 63.369,68***		***R$ 16.641,67***	***79%***
4.1	AR ENG.	CPU-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES, ATÉ 1,30M	M3	125,74	R$58,93	R$6.861,63	60	R$ 3.274,20	35	R$ 1.909,95	95	R$ 5.184,15	30,74	R$ 1.677,48	76%
4.2	AR ENG.	CPU-13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30KG	M2	363,82	R$0,89	R$5.060,40	80	R$ 2.471,20	45	R$ 1.390,05	125	R$ 3.861,25	38,82	R$ 1.199,15	76%
4.3	AR ENG.	94962	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M3	4,91	R$294,27	R$1.444,87	2,45	R$ 720,96	1,2	R$ 353,42	3,65	R$ 1.074,38	1,26	R$ 370,78	74%
4.4	AR ENG.	96995	ATERRO MANUAL DA CAIXA DA OBRA	M3	71,40	R$49,38	R$3.525,61	35	R$ 1.728,30	18	R$ 889,84	53	R$ 2.617,14	18,60	R$ 908,47	74%
4.5	AR ENG.	96530	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	83,91	R$11,65	R$3.922,27	33	R$ 2.027,85	15	R$ 921,75	48	R$ 2.949,60	35,91	R$ 972,67	75%
4.6	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	2.116,23	R$10,88	R$23.024,58	1050	R$ 11.424,00	1066,23	R$ 11.600,58	2116,23	R$ 23.024,58	0,00	R$ 0,00	100%
4.7	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	136,76	R$13,84	R$1.665,96	55	R$ 761,20	61,76	R$ 854,76	116,76	R$ 1.615,96	0,00	R$ 0,00	100%
4.8	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	M3	52,64	R$44,83	R$2.359,52	25	R$ 1.120,75	12	R$ 561,88	37	R$ 1.682,63	15,64	R$ 676,89	70%
4.9	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	52,64	R$47.992,88	R$2.527,04	25	R$ 1.200,00	12	R$ 561,88	37	R$ 1.761,88	15,64	R$ 765,16	70%
4.10	AR ENG.	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	232,68	R$20,85	R$4.850,78	110	R$ 2.293,50	5	R$ 104,25	115	R$ 2.397,75	117,68	R$ 2.453,03	49%
5	**SUPERESTRUTURA**					**SUBTOTAL**	**R$166.627,19**		***R$ 0,00***		***R$ 15.931,35***		***R$ 15.931,35***		***R$ 90.695,84***	***15%***
5.1	AR ENG.	CPU-14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	173,49	R$53,95	R$9.359,55		R$ 0,00	40	R$ 2.158,00	40	R$ 2.158,00	133,49	R$ 7.201,55	23%
5.2	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	1.969,69	R$10,85	R$21.367,83		R$ 0,00	750	R$ 8.160,00	750	R$ 8.160,00	1.219,69	R$ 13.207,83	38%
5.3	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	575,20	R$13,84	R$7.960,77		R$ 0,00	130	R$ 1.799,20	130	R$ 1.799,20	445,20	R$ 6.161,57	23%
5.4	AR ENG.	94965	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=25,0 MPA	M3	25,97	R$368,96	R$10.339,81		R$ 0,00	5	R$ 1.844,80	5	R$ 1.844,80	22,97	R$ 8.475,01	18%
5.5	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	27,97	R$201,87	R$5.646,30		R$ 0,00	5	R$ 1.009,35	5	R$ 1.009,35	22,97	R$ 4.636,95	18%
5.6	AR ENG.	CPU-15	LAJE PRÉ-MOLDADA DE HORRO, E=8 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO E CAPEAMENTO	M2	303,24	R$49,52	R$15.016,44		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	303,24	R$ 15.016,44	0%
5.7	**LAJE MACIÇA DE CONCRETO, E=0,10M**						**R$22.714,32**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 22.714,32***	***0%***
5.7.1	AR ENG.	92267	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	M2	135,81	R$28,12	R$3.818,98		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	135,81	R$ 3.818,98	0%
5.7.2	AR ENG.	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.096,97	R$12,39	R$13.840,95		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.096,97	R$ 13.840,95	0%
5.7.3	AR ENG.	95439	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2015	M3	13,58	R$374,41	R$5.084,49		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	13,58	R$ 5.084,49	0%

José Fernando Oliveira Engenheiro Civil CREA-BA 216780

CREA-BA 93.390

5.8	RAMPA DE CONCRETO						R$9.798,17		R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 9.798,17	0%
5.8.1	AR ENG	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	80,33	R$28,12	R$2.258,88		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	80,33	R$ 2.258,88	0%
5.8.2	AR ENG	92766	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	360,03	R$12,59	R$4.532,78		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	360,03	R$ 4.532,78	0%
5.8.3	AR ENG	99439	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS REUTILIZÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇAL. AF_06/2015	M3	8,03	R$374,01	R$3.006,51		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	8,03	R$ 3.006,51	0%
6	VEDAÇÃO					SUBTOTAL	R$57.116,83		R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 57.116,83	0%
6.1	AR ENG.	CPU-16	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X30CM, E=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E ARTEIA, JUNTAS 12MM	M2	1.061,83	R$26,25	R$27.870,09		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	1061,83	R$ 27.870,09	0%
6.2	AR ENG.	CPU-17	COBOGÓ CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO) DE 9X20X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA	M2	125,72	R$104,73	R$13.166,18		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	125,72	R$ 13.166,18	0%
6.3	AR ENG	93182	VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO DE 10X20CM	M	219,80	R$39,49	R$4.729,76		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	219,80	R$ 4.729,76	0%
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA					SUBTOTAL	R$25.496,64		R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 25.496,64	0%
7.1	AR ENG	CPU-18	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,60 X 1,60 M, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FECHADURA	UN	6,00	R$1.002,73	R$6.016,38		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	6,00	R$ 6.016,38	0%
7.2	AR ENG	CPU-19	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	19,00	R$999,97	R$18.999,43		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	19,00	R$ 18.999,43	0%
7.3	AR ENG	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	7,00	R$68,69	R$480,83		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	7,00	R$ 480,83	0%
8	ESQUADRIAS METÁLICAS					SUBTOTAL	R$13.838,11		R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 13.838,11	0%
8.1	AR ENG	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	63,00	R$162,33	R$10.226,82		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	63,00	R$ 10.226,82	0%
8.2	AR ENG	CPU-20	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TIPO FANTASIA, PADRONIZADA	M2	3,90	R$328,64	R$1.281,97		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	3,90	R$ 1.281,97	0%
8.3	AR ENG	CPU-21	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" L, MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	3,15	R$739,59	R$2.329,72		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	3,15	R$ 2.329,72	0%
9	COBERTURA					SUBTOTAL	R$209.163,66		R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 209.163,66	0%
9.1	AR ENG	CPU-22	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIGA TRELIÇADA DE AÇO, VÃO DE 12,60 M, INCLUSO IÇAMENTO	UN	5,00	R$1.137,07	R$6.685,35		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	5,00	R$ 6.685,35	0%
9.2	AR ENG	CPU-23	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIGA TRELIÇADA DE AÇO, VÃO DE 6,50 M, INCLUSO IÇAMENTO	UN	5,00	R$1.092,60	R$5.463,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	5,00	R$ 5.463,00	0%
9.3	AR ENG	CPU-24	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TERÇA EM PERFIL U ENRIJECIDO 150X60X20	M	551,22	R$23,31	R$12.847,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	551,22	R$ 12.847,52	0%
9.4	AR ENG	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMO ACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	900,72	R$201,09	R$181.121,32		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	900,72	R$ 181.121,32	0%
9.5	AR ENG	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,15	R$53,52	R$329,17		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	6,15	R$ 329,17	0%
9.6	AR ENG	94231	RUFO METÁLICO, L=25 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	64,56	R$41,47	R$2.677,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	64,56	R$ 2.677,30	0%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					SUBTOTAL	R$12.860,06		R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 12.860,06	0%
10.1	AR ENG	89482	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$19,64	R$39,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	2,00	R$ 39,28	0%
10.2	AR ENG	86904	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSO, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$100,00	R$200,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	2,00	R$ 200,00	0%
10.3	AR ENG	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$108,02	R$432,08		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	4,00	R$ 432,08	0%
10.4	AR ENG	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA DE 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO OU CUBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$42,94	R$257,64		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	6,00	R$ 257,64	0%
10.5	AR ENG	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$8,66	R$51,96		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	6,00	R$ 51,96	0%
10.6	AR ENG	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$17,42	R$74,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	6,00	R$ 74,52	0%
10.7	AR ENG	95470	BACIA SIFONADA DE LOUÇA COM ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$149,99	R$1.199,92		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	8,00	R$ 1.199,92	0%
10.8	AR ENG	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R$29,91	R$239,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	8,00	R$ 239,28	0%
10.9	AR ENG	95544	PAPELEIRA DE METAL DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$27,69	R$221,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	8,00	R$ 221,52	0%
10.10	AR ENG	CPU-28	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 1 1/2" OU 40MM, INCLUSIVE TUBO DE DESCIDA COM JOELHO	UN	8,00	R$422,83	R$3.382,64		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	8,00	R$ 3.382,64	0%
10.11	AR ENG	95547	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$60,96	R$121,92		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	2,00	R$ 121,92	0%
10.12	AR ENG	CPU-26	DISPENSER PARA TOALHAS INTERFOLHADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$66,54	R$133,08		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	2,00	R$ 133,08	0%
10.13	AR ENG	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$62,82	R$125,64		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	2,00	R$ 125,64	0%
10.14	AR ENG	100869	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, L=900CM, D=38 MM	UN	4,00	R$217,82	R$871,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	4,00	R$ 871,28	0%
10.15	AR ENG	CPU-27	BANCADA DE GRANITO, LARG = 60	M2	1,92	R$291,24	R$559,18		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	1,92	R$ 559,18	0%
10.16	AR ENG	CPU-28	PONTO DE ÁGUA FRIA	UN	6,00	R$120,16	R$720,96		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	6,00	R$ 720,96	0%
10.17	AR ENG	CPU-29	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 40 MM	UN	6,00	R$86,23	R$529,38		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	6,00	R$ 529,38	0%
10.18	AR ENG	CPU-30	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 100 MM	UN	8,00	R$127,50	R$1.019,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	8,00	R$ 1.019,40	0%
10.19	AR ENG	89495	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X40 MM	UN	6,00	R$7,13	R$42,78		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	6,00	R$ 42,78	0%
10.20	AR ENG	89393	REGISTRO DE GAVETA, 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$33,57	R$67,14		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	2,00	R$ 67,14	0%
10.21	AR ENG	CPU-31	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE, CAP. 3.000 LITROS	UN	2,00	R$1.385,73	R$2.771,46		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	2,00	R$ 2.771,46	0%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					SUBTOTAL	R$51.880,17		R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 51.880,17	0%
11.1	AR ENG	CPU-32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ, EMBUTIR, 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$161,85	R$323,70		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	2,00	R$ 323,70	0%
11.2	AR ENG	CPU-33	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA, 200X200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$97,31	R$194,62		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	2,00	R$ 194,62	0%
11.3	AR ENG	101890	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 15 A, EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	12,00	R$12,13	R$145,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	12,00	R$ 145,56	0%
11.4	AR ENG	96985	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE COBRE COOPERWELD 5/8X2,40M, COM CONECTOR	UN	3,00	R$55,91	R$167,73		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	3,00	R$ 167,73	0%
11.5	AR ENG	CPU-34	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PLÁSTICO, COM BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	112,00	R$9,37	R$1.071,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	112,00	R$ 1.071,84	0%
11.6	AR ENG	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	112,00	R$19,95	R$2.234,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	112,00	R$ 2.234,40	0%
11.7	AR ENG	CPU-35	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	112,00	R$320,96	R$35.947,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	112,00	R$ 35.947,52	0%
11.8	AR ENG	CPU-36	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN	30,00	R$272,51	R$8.175,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0		R$ 0,00	30,00	R$ 8.175,30	0%

11.9	AR ENG	91141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	30,00	R$121,05	R$3.631,50		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	30,00	R$ 3.631,50	0%
12	FORRO DE GESSO					SUBTOTAL	R$1.702,80		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 1.702,80	0%
12.1	AR ENG.	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	41,33	R$41,20	R$1.702,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	41,33	R$ 1.702,80	0%
13	REVESTIMENTO DE FORRO E PAREDES					SUBTOTAL	R$92.686,37		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 92.686,37	0%
13.1	AR ENG.	87873	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	2.163,65	R$4,17	R$9.022,42		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2.163,65	R$ 9.022,42	0%
13.2	AR ENG.	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	419,67	R$8,62	R$3.701,49		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	419,67	R$ 3.701,49	0%
13.3	AR ENG.	88408	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	2.034,99	R$32,81	R$66.157,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2.034,99	R$ 66.157,52	0%
13.4	AR ENG.	87904	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	142,96	R$30,36	R$4.340,27		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	142,96	R$ 4.340,27	0%
13.5	AR ENG.	87274	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA 33X45 CM, JUNTA A PRUMO COM CIMENTO COLANTE	M2	142,96	R$66,23	R$9.464,67		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	142,96	R$ 9.464,67	0%
14	PISOS					SUBTOTAL	R$103.072,40		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 103.072,40	0%
14.1	AR ENG.	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	1.211,36	R$39,94	R$48.381,72		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.211,36	R$ 48.381,72	0%
14.2	AR ENG.	CPU-19	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM ARGAMASSA TRAÇO T4, ESP MÉDIA - 2,5CM	M2	42,19	R$28,37	R$1.196,93		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	42,19	R$ 1.196,93	0%
14.3	AR ENG.	93391	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA TIPO A, 42X42 CM, PEI 5, COM CIMENTO COLANTE	M2	42,19	R$30,04	R$1.267,39		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	42,19	R$ 1.267,39	0%
14.4	AR ENG.	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, AF_09/2020	M2	1.169,17	R$36,66	R$42.861,27		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.169,17	R$ 42.861,27	0%
14.5	AR ENG.	101741	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, 10 CM	M	393,60	R$23,58	R$9.279,13		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	393,60	R$ 9.279,13	0%
14.6	AR ENG.	98689	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA DE GRANITO, L=15CM	M	1,66	R$68,75	R$115,46		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,66	R$ 115,46	0%
15	PINTURA					SUBTOTAL	R$73.725,23		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 73.725,23	0%
15.1	AR ENG.	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 1 DEMÃO, MASSA PVA	M2	3.099,00	R$14,25	R$15.499,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3.099,00	R$ 15.499,80	0%
15.2	AR ENG.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	M2	1.557,32	R$11,74	R$18.282,94		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.557,32	R$ 18.282,94	0%
15.3	AR ENG.	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	419,67	R$27,94	R$11.725,59		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	419,67	R$ 11.725,59	0%
15.4	AR ENG.	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	419,67	R$11,06	R$4.640,94		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	419,67	R$ 4.640,94	0%
15.5	AR ENG.	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M2	794,46	R$14,22	R$11.297,22		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	794,46	R$ 11.297,22	0%
15.6	AR ENG.	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	1.057,92	R$9,95	R$10.526,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.057,92	R$ 10.526,30	0%
15.7	AR ENG.	102219	APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS, SOBRE MADEIRA	M2	100,36	R$15,08	R$1.513,43		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	100,36	R$ 1.513,43	0%
15.8	AR ENG.	CPU-38	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPÓXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA. UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	6,30	R$11,12	R$70,06		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,30	R$ 70,06	0%
15.9	AR ENG.	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	6,30	R$25,39	R$159,96		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,30	R$ 159,96	0%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					SUBTOTAL	R$29.858,65		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 29.858,65	0%
16.1	AR ENG.	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	88,00	R$96,78	R$8.516,64		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	88,00	R$ 8.516,64	0%
16.2	RAMPA DE ACESSO						R$21.342,01		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 21.342,01	0%
16.2.1	AR ENG.	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	2,40	R$61,45	R$147,48		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,40	R$ 147,48	0%
16.2.2	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	M3	3,60	R$341,81	R$1.230,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,60	R$ 1.230,52	0%
16.2.3	AR ENG.	98573	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M3	3,60	R$201,87	R$726,73		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,60	R$ 726,73	0%
16.4	AR ENG.	98806	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	142,96	R$3,31	R$473,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	142,96	R$ 473,20	0%
16.5	AR ENG.	98805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICOS	M2	42,19	R$10,31	R$434,59		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	42,19	R$ 434,59	0%
16.6	AR ENG.	CPU-39	LIMPEZA DE VIDROS	M2	66,90	R$12,87	R$861,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	66,90	R$ 861,00	0%
16.7	AR ENG.	CPU-40	LIMPEZA GERAL	M2	1.211,38	R$14,42	R$17.468,10		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.211,38	R$ 17.468,10	0%
17	MURO (L=148,73M H=2,6M)					SUBTOTAL	R$593.317,53									
17.1	INFRAESTRUTURA						R$22.938,50		R$ 22.938,50		R$ 0,00		R$ 22.938,50		R$ 0,00	100%
17.1.1	AR ENG.	CPU-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES, ATÉ 1,50M	M3	37,60	R$54,52	R$2.051,65	37,6	R$ 2.051,65		R$ 0,00	37,6	R$ 2.051,65	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.3	AR ENG.	94962	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M2	65,91	R$30,89	R$2.035,79	65,91	R$ 2.035,79		R$ 0,00	65,91	R$ 2.035,79	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.4	AR ENG.	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	1,98	R$294,27	R$582,66	1,98	R$ 582,66		R$ 0,00	1,98	R$ 582,66	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.5	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	55,69	R$61,45	R$3.422,26	55,69	R$ 3.422,26		R$ 0,00	55,69	R$ 3.422,26	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.6	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	644,09	R$10,88	R$7.006,27	644,09	R$ 7.006,27		R$ 0,00	644,09	R$ 7.006,27	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.7	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=30,0 MPA	M3	86,84	R$13,84	R$1.201,64	86,84	R$ 1.201,64		R$ 0,00	86,84	R$ 1.201,64	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.8	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	12,21	R$341,81	R$4.173,44	12,21	R$ 4.173,44		R$ 0,00	12,21	R$ 4.173,44	0,00	R$ 0,00	100%
17.2	SUPERESTRUTURA			M3	12,21	R$201,87	R$2.464,79	12,21	R$ 2.464,79		R$ 0,00	12,21	R$ 2.464,79	0,00	R$ 0,00	100%
17.2.1	AR ENG.	CPU-14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	78,44	R$71,95	R$5.644,66	78,44	R$ 5.644,66		R$ 0,00	78,44	R$ 5.644,66	0,00	R$ 0,00	100%
17.2.2	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	868,17	R$11,38	R$9.882,77	868,17	R$ 9.882,77		R$ 0,00	868,17	R$ 9.882,77	0,00	R$ 0,00	100%
17.2.3	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	259,06	R$13,84	R$3.584,71	259,06	R$ 3.584,71		R$ 0,00	259,06	R$ 3.584,71	0,00	R$ 0,00	100%
17.2.4	AR ENG.	94965	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=25,0 MPA	M3	10,63	R$368,96	R$3.922,04	10,63	R$ 3.922,04		R$ 0,00	10,63	R$ 3.922,04	0,00	R$ 0,00	100%
17.2.5	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	10,63	R$201,87	R$2.145,84	10,63	R$ 2.145,84		R$ 0,00	10,63	R$ 2.145,84	0,00	R$ 0,00	100%
17.3	VEDAÇÃO						R$14.828,33		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 14.828,33	0%
17.3.1	AR ENG.	CPU-16	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, E=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 12MM	M2	409,01	R$36,25	R$14.828,33		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	409,01	R$ 14.828,33	0%
17.4	REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDES						R$3.411,90		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.411,90	0%
17.4.1	AR ENG.	87873	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	818,02	R$4,17	R$3.411,90		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	818,02	R$ 3.411,90	0%
17.5	PINTURA						R$26.927,82		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 26.927,82	0%
17.5.1	AR ENG.	CPU-41	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	818,02	R$32,92	R$26.927,82		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	818,02	R$ 26.927,82	0%

TOTAL	R$1.057.994,14	TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL ATUAL	TOTAL ACUMULADO	SALDO TOTAL	(%)
UM MILHÃO, CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS		945,92	49.566,44	206.512,36	R$ 851.481,78	20%

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI I	29,67%
Obra:	ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BLOCO PRINCIPAL	REF.:	SINAPI 03/2021
Local:	DISTRITO DE JOSÉ GONÇALVES - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA	DATA	09/2021

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO (COM BDI)	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	(%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					SUBTOTAL	R$55.240,02		R$ 18.472,54		R$ 9.191,88		R$ 27.664,42		R$ 27.575,60	50%
1.1	AR ENG.	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$104,42	R$7.519,03	24	R$ 2.506,08	12	R$ 1.253,04	36	R$ 3.759,12	36,00	R$ 3.759,91	50%
1.2	AR ENG.	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00	R$13,99	R$44.863,65	440	R$ 14.955,60	220	R$ 7.477,80	660	R$ 22.433,40	660,00	R$ 22.492,25	50%
1.3	AR ENG.	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$38,42	R$2.766,54	24	R$ 922,08	12	R$ 461,04	36	R$ 1.383,12	36,00	R$ 1.383,42	50%
1.4	AR ENG.	CPU	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	1,00	R$88,78	R$88,78	1	R$ 88,78		R$ 0,00	1	R$ 88,78	0,00	R$ 0,00	100%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					SUBTOTAL	R$52.066,09		R$ 20.758,70		R$ 2.504,82		R$ 23.254,73		R$ 28.811,37	45%
2.1	AR ENG.	CPU-1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO (SALAS EXISTENTES E CIRCULAÇÃO)	M2	916,13	R$30,57	R$28.003,33	600	R$ 18.340,79	80	R$ 2.445,36	680	R$ 20.786,15	236,13	R$ 7.217,18	74%
2.2	AR ENG.	CPU-41	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	198,79	R$32,92	R$6.543,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	198,79	R$ 6.543,40	0%
2.3	AR ENG.	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017"	M2	178,74	R$22,65	R$4.044,42		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	178,74	R$ 4.044,42	0%
2.4	AR ENG.	CPU-2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	136,94	R$14,11	R$1.932,22		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	136,94	R$ 1.932,22	0%
2.5	AR ENG.	CPU-3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA	M2	136,94	R$35,38	R$4.899,71		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	136,94	R$ 4.899,71	0%
2.6	AR ENG.	CPU-4	REMOÇÃO DE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	M	4,15	R$5,15	R$21,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,15	R$ 21,37	0%
2.7	AR ENG.	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO, SEM REAPROVEITAMENTO (MURO)	M2	64,42	R$34,42	R$3.451,32		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	64,42	R$ 3.451,32	0%
2.8	AR ENG.	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	116,63	R$3,04	R$789,42	75	R$ 378,00		R$ 0,00	75	R$ 378,00	41,63	R$ 411,42	48%
2.9	AR ENG.	97914	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 14 KM	M3XKM	783,15	R$1,50	R$1.251,71	450	R$ 702,00		R$ 0,00	450	R$ 702,00	333,15	R$ 549,71	57%
2.10	AR ENG.	CPU-6	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	7,76	R$7,56	R$58,67		R$ 0,00	7,76	R$ 58,67	7,76	R$ 58,67	0,00	R$ 0,00	100%
2.10	AR ENG.	CPU-7	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	R$393,67	R$1.330,52	4,5	R$ 1.330,52		R$ 0,00	4,5	R$ 1.330,52	0,00	R$ 0,00	100%
3	INFRAESTRUTURA					SUBTOTAL	R$5.163,76		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 5.163,76	0%
3.1	AR ENG.	CPU-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES, ATÉ 1,50M	M3	6,54	R$54,57	R$356,89		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,54	R$ 356,89	0%
3.2	AR ENG.	CPU-13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM CAPO DE 30KG	M2	10,94	R$30,89	R$337,94		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,94	R$ 337,94	0%
3.3	AR ENG.	94962	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M3	0,33	R$294,27	R$97,11		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,33	R$ 97,11	0%
3.4	AR ENG.	96995	ATERRO MANUAL DA CAIXA DA OBRA	M3	1,36	R$49,38	R$67,16		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,36	R$ 67,16	0%
3.5	AR ENG.	96536	FORMA TABUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	17,32	R$41,41	R$717,14		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	17,32	R$ 717,14	0%
3.6	AR ENG.	92760	ARMADURA CA - 50 MEDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	169,27	R$10,88	R$1.841,86		R$ 0,00		R$ 0,00	109,27	R$ 1.188,86	60,00	R$ 652,99	35%
3.7	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	83,50	R$13,84	R$1.155,64		R$ 0,00		R$ 0,00	83,50	R$ 1.155,64	0,00	R$ 0,00	0%
3.8	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	M3	2,17	R$341,81	R$741,73		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,17	R$ 741,73	0%
3.9	AR ENG.	92723	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	2,17	R$201,81	R$438,06		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,17	R$ 438,06	0%
3.10	AR ENG.	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	20,93	R$325,45	R$684,86		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	20,93	R$ 684,86	0%
4	SUPERESTRUTURA					SUBTOTAL	R$6.385,69		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 6.385,69	0%
4.1	AR ENG.	CPU-14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	34,80	R$77,95	R$2.712,12		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	34,87	R$ 2.718,12	0%
4.2	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MEDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	137,40	R$40,88	R$1.712,51		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	137,40	R$ 1.712,51	0%
4.3	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	48,46	R$13,84	R$670,69		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	48,46	R$ 670,69	0%
4.4	AR ENG.	94965	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=25,0 MPA	M3	2,25	R$368,96	R$830,16		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,25	R$ 830,16	0%
4.5	AR ENG.	92723	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	2,25	R$201,87	R$454,21		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,25	R$ 454,21	0%
5	VEDAÇÃO					SUBTOTAL	R$3.353,54		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.353,54	0%
5.1	AR ENG.	CPU-43	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X10X19CM, E=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 12MM	M2	76,48	R$42,30	R$3.235,10		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	76,48	R$ 3.235,10	0%
5.2	AR ENG.	93182	VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO DE 10X20CM	M	3,00	R$39,48	R$118,44		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 118,44	0%
6	ESQUADRIA DE MADEIRA					SUBTOTAL	R$41.628,68		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 41.628,68	0%
6.1	AR ENG.	CPU-16	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,60 X 1,60 M, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FECHADURA	UN	10,00	R$1.002,73	R$10.027,27		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R$ 10.027,27	0%
6.2	AR ENG.	CPU-44	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 1,60 M, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FECHADURA	UN	2,00	R$1.119,30	R$2.238,59		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 2.238,59	0%
6.3	AR ENG.	CPU-45	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,60 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	5,00	R$897,87	R$4.489,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 4.489,37	0%
6.4	AR ENG.	CPU-46	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,70 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	3,00	R$915,29	R$2.745,88		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 2.745,88	0%
6.5	AR ENG.	CPU-47	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,70 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	21,00	R$1.014,44	R$21.303,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	21,00	R$ 21.303,30	0%
6.6	AR ENG.	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	12,00	R$68,69	R$824,27		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	12,00	R$ 824,27	0%
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA					SUBTOTAL	R$15.342,88		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 15.342,88	0%
7.1	AR ENG.	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	65,39	R$162,33	R$10.647,22		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	65,39	R$ 10.647,22	0%
7.2	AR ENG.	CPU-20	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TIPO FANTASIA, PADRONIZADA	M2	10,58	R$328,69	R$3.476,69		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,58	R$ 3.476,69	0%
7.3	AR ENG.	CPU-48	PORTA TIPO GRADIL EM PERFIL DE METALON GALVANEADO COM SEÇÃO 20X20 MM (SANITÁRIOS)	M2	5,04	R$241,86	R$1.218,97		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,04	R$ 1.218,97	0%
8	COBERTURA					SUBTOTAL	R$31.212,47		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 31.212,47	0%
8.1	AR ENG.	CPU-24	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TERÇA EM PERFIL U ENRIJECIDO 150X60X20	M	99,40	R$23,38	R$2.323,71		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	99,40	R$ 2.323,71	0%

Engenheiro Civil
CREA-BA- 276780

8.2	AR ENG	94210	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMO ACÚSTICA E = 30 MM, COM A DE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	136,94	R$201,09	R$27.536,59		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	136,94	R$ 27.536,59	0%
8.3	AR ENG.	CPU-49	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEIRA METÁLICA PARA TELHA TERMOACÚSTICA	M	11,80	R$76,22	R$899,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	11,80	R$ 899,37	0%
8.4	AR ENG.	94231	RUFO METÁLICO, L=25 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,92	R$41,47	R$452,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,92	R$ 452,80	0%
9	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**SUBTOTAL**	**R$34.247,83**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 34.247,83***	***0%***
9.1	AR ENG	89482	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R$19,64	R$176,76		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	9,00	R$ 176,76	0%
9.2	AR ENG	89495	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X40 MM	UN	4,00	R$7,13	R$28,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 28,52	0%
9.3	AR ENG.	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 53X50 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$171,79	R$858,95		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 858,95	0%
9.4	AR ENG.	86904	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSO, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$100,00	R$200,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 200,00	0%
9.5	AR ENG	86907	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R$195,62	R$1.956,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R$ 1.956,20	0%
9.6	AR ENG	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$36,86	R$184,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 184,30	0%
9.7	AR ENG.	86900	TORNEIRA CROMADA DE MESA DE 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO OU CUBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$42,94	R$429,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R$ 429,40	0%
9.8	AR ENG.	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R$8,66	R$86,60		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R$ 86,60	0%
9.9	AR ENG.	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R$12,42	R$124,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R$ 124,20	0%
9.10	AR ENG	95470	BACIA SIFONADA DE LOUÇA COM ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R$149,99	R$2.399,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 2.399,84	0%
9.11	AR ENG	100840	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	R$29,91	R$478,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 478,56	0%
9.12	AR ENG	95544	PAPELEIRA DE METAL DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R$27,09	R$443,04		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 443,04	0%
9.13	AR ENG.	CPU-25	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 1/2 OU 40MM, INCLUSIVE TUBO DE DESCIDA COM SOFISMO	UN	16,00	R$422,83	R$6.765,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 6.765,28	0%
9.14	AR ENG.	100858	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$437,35	R$1.312,05		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 1.312,05	0%
9.15	AR ENG	95547	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$60,96	R$243,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 243,84	0%
9.16	AR ENG	CPU-26	DISPENSER PARA TOALHAS INTERFOLHADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$66,54	R$266,16		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 266,16	0%
9.17	AR ENG	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2020	UN	4,00	R$62,82	R$251,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 251,28	0%
9.18	AR ENG.	100869	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, L=900MM, D=1 1/4 MM	UN	4,00	R$217,82	R$871,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 871,28	0%
9.19	AR ENG.	CPU-27	BANCADA DE GRANITO, LARG.= 60	M2	17,60	R$293,24	R$5.152,04		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	17,60	R$ 5.152,04	0%
9.20	AR ENG.	CPU-28	PONTO DE ÁGUA FRIA	UN	16,00	R$320,16	R$1.922,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 1.922,56	0%
9.21	AR ENG	CPU-29	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM	UN	16,00	R$88,23	R$1.411,68		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 1.411,68	0%
9.22	AR ENG.	CPU-30	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM	UN	16,00	R$127,50	R$2.036,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 2.036,80	0%
9.23	AR ENG	89495	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X40 MM	UN	12,00	R$7,13	R$85,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	12,00	R$ 85,56	0%
9.24	AR ENG.	89353	REGISTRO DE GAVETA - 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$33,57	R$134,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 134,28	0%
9.25	AR ENG	CPU-31	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS	UN	5,00	R$1.285,73	R$6.428,65		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 6.428,65	0%
10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**SUBTOTAL**	**R$50.036,52**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 50.036,52***	***0%***
10.1	AR ENG.	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$327,74	R$327,74		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	R$ 327,74	0%
10.2	AR ENG.	CPU-33	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA, 300X200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$97,31	R$97,31		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	R$ 97,31	0%
10.3	AR ENG.	101890	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 15 A, EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	12,00	R$12,13	R$145,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	12,00	R$ 145,56	0%
10.4	AR ENG.	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$69,96	R$69,96		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	R$ 69,96	0%
10.5	AR ENG.	96985	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE CORRE COPPERWELD 5/8X2,40M, COM CONECTOR	UN	3,00	R$51,91	R$155,73		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 155,73	0%
10.6	AR ENG.	CPU-34	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PLÁSTICO, COM BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	97,00	R$9,57	R$928,29		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	97,00	R$ 928,29	0%
10.7	AR ENG.	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	97,00	R$10,95	R$1.035,15		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	97,00	R$ 1.035,15	0%
10.8	AR ENG.	CPU-35	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	97,00	R$320,96	R$31.133,12		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	97,00	R$ 31.133,12	0%
10.9	AR ENG.	CPU-50	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN	11,00	R$274,06	R$3.014,66		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	11,00	R$ 3.014,66	0%
10.10	AR ENG.	CPU-36	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	UN	20,00	R$272,51	R$5.450,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	20,00	R$ 5.450,20	0%
10.11	AR ENG	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	56,00	R$121,05	R$6.778,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	56,00	R$ 6.778,80	0%
11	**FORRO DE PVC**					**SUBTOTAL**	**R$3.749,41**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 3.749,41***	***0%***
11.1	AR ENG	96118	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO EM FERRO EM PVC, INSTALADO	M2	56,93	R$65,86	R$3.749,41		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	56,93	R$ 3.749,41	0%
12	**REVESTIMENTO DE FORRO E PAREDES**					**SUBTOTAL**	**R$35.275,37**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 35.275,37***	***0%***
12.1	AR ENG	87879	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	331,69	R$4,17	R$1.383,35		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	331,69	R$ 1.383,35	0%
12.2	AR ENG.	90406	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	152,95	R$32,51	R$4.972,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	152,95	R$ 4.972,40	0%
12.3	AR ENG	87531	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	299,47	R$30,36	R$9.091,91		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	299,47	R$ 9.091,91	0%
12.4	AR ENG.	87274	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA 33X45 CM, JUNTA A PRUMO, COM CIMENTO COLANTE	M2	299,47	R$66,29	R$19.827,91		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	299,47	R$ 19.827,91	0%
13	**PISOS**					**SUBTOTAL**	**R$100.847,67**		***R$ 19.970,00***		***R$ 51.790,72***		***R$ 49.056,95***		***R$ 49.056,95***	***51%***
13.1	AR ENG	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPES AM. AF_06/2014	M2	1.107,92	R$39,94	R$44.250,32	500	970,00	607,92	R$ 24.283,25	0,00	R$ 44.250,32	0,00	R$ 0,00	100%

Página 5 de 7

13.2	AR ENG	CPU-17	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM ARGAMASSA TRAÇO T4, ESP MÉDIA = 2,5CM	M2	87,63	R$28,33	R$2 466,06		R$ 0,00	80	R$ 2 269,60	80	R$ 2 269,60	7,63	R$ 216,46	91%
13.3	AR ENG	93391	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA TIPO A 42X42 CM, PEI 5, COM CIMENTO COLANTE	M2	87,63	R$30,04	R$2 632,41		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	87,63	R$ 2 632,41	0%
13.4	AR ENG	CPU-51	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACH. REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	22,04	R$114,29	R$2 518,95		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	22,04	R$ 2 518,95	0%
13.5	AR ENG	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	1 020,29	R$36,66	R$37 403,83		R$ 0,00	80	R$ 2 932,80	80	R$ 2 932,80	940,29	R$ 34 471,03	8%
13.6	AR ENG	101741	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, 10 CM	M	472,30	R$23,38	R$11 042,37		R$ 0,00	100	R$ 2 338,00	100	R$ 2 338,00	372,30	R$ 8 704,37	21%
13.7	AR ENG	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM. AF_06/2014	M	13,14	R$36,25	R$476,33		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	13,14	R$ 476,33	0%
13.8	AR ENG	98689	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA DE GRANITO, L=15CM	M	6,28	R$68,73	R$431,60		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,28	R$ 431,60	0%
14	**PINTURA**						**SUBTOTAL**	**R$44.678,73**	**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 44.678,73**	**0%**
14.1	AR ENG.	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 1 DEMÃO, MASSA PVA	M2	256,05	R$14,22	R$3 641,03		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	256,05	R$ 3 641,03	0%
14.2	AR ENG	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	M2	1 030,98	R$11,76	R$12 103,71		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1 030,98	R$ 12 103,71	0%
14.3	AR ENG.	88485	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	225,03	R$16,91	R$3 803,01		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	225,03	R$ 3 803,01	0%
14.4	AR ENG	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	2.250,34	R$9,95	R$22 390,88		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2.250,34	R$ 22 390,88	0%
14.5	AR ENG	102219	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M2	157,30	R$15,08	R$2 372,08		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	157,30	R$ 2 372,08	0%
14.6	AR ENG	CPU-38	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	10,08	R$11,17	R$112,09		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,08	R$ 112,09	0%
14.7	AR ENG	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	10,08	R$25,39	R$255,93		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,08	R$ 255,93	0%
15	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**																
15.1	**RAMPA DE ACESSO**						**SUBTOTAL**	**R$42.023,26**	**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 3.871,40**	**0%**
15.1.1	AR ENG.	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	1,50	R$61,45	R$92,18		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,50	R$ 92,18	0%
15.1.2	AR ENG.	94470	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	M3	0,05	R$341,81	R$2 067,95		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,05	R$ 2.067,95	0%
15.1.3	AR ENG.	92823	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M2	6,08	R$201,87	R$1 227,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,08	R$ 1.227,37	0%
15.1.4	AR ENG.	90855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	5,00	R$96,78	R$483,90		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 483,90	0%
15.2	**BANCO EM GRANITO (2 UN)**							**R$12.945,75**	**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 12.945,75**	**0%**
15.2.1	AR ENG.	CPU-52	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACH. REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	15,75	R$209,61	R$3 301,39		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,75	R$ 3.301,39	0%
15.2.2	AR ENG.	90405	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	31,50	R$32,51	R$1 024,12		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	31,50	R$ 1.024,12	0%
15.2.3	AR ENG.	88426	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	31,50	R$16,90	R$532,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	31,50	R$ 532,30	0%
15.2.4	AR ENG.	95621	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	31,50	R$9,95	R$313,36		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	31,50	R$ 313,36	0%
15.2.5	AR ENG.	CPU-53	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACH. REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	17,50	R$444,26	R$7 774,58		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	17,50	R$ 7 774,58	0%
15.3	**ESCOVODROMO COM 5 TORNEIRA**							**R$2.867,56**	**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 2.867,56**	**0%**
15.3.1	AR ENG.	101159	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM)	M2	10,28	R$127,60	R$1 311,74		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,28	R$ 1 311,74	0%
15.3.2	AR ENG.	96995	ATERRO MANUAL DA CAIXA DA OBRA	M3	0,57	R$49,38	R$28,15		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,57	R$ 28,15	0%
15.3.3	AR ENG.	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA SOBE AF_06/2014	M2	1,44	R$39,94	R$57,51		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,44	R$ 57,51	0%
15.3.4	AR ENG.	87531	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	5,54	R$30,36	R$168,21		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,54	R$ 168,21	0%
15.3.5	AR ENG.	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	5,54	R$53,05	R$294,06		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,54	R$ 294,06	0%
15.3.6	AR ENG.	89495	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X40 MM	UN	2,00	R$7,13	R$14,26		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 14,26	0%
15.3.7	AR ENG.	86910	TORNEIRA DE PRESSÃO PLÁSTICA COMUM, USO GERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$36,56	R$182,78		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 182,78	0%
15.3.8	AR ENG.	CPU-28	PONTO DE ÁGUA FRIA	UN	5,00	R$120,16	R$600,82		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 600,82	0%
15.3.9	AR ENG	CPU-29	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM	UN	2,00	R$88,23	R$176,46		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 176,46	0%
15.3.10	AR ENG	89353	REGISTRO DE GAVETA - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$33,57	R$33,57		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	R$ 33,57	0%
15.4	**CASA DE GÁS**							**R$3.421,89**	**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 3.421,89**	**0%**
15.4.1	AR ENG	CPU-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES, ATÉ 1,50M	M3	0,74	R$54,57	R$40,38		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,74	R$ 40,38	0%
15.4.2	AR ENG	CPU-13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM MACACO DE 30KG	M2	1,86	R$30,89	R$57,45		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,86	R$ 57,45	0%
15.4.3	AR ENG.	94962	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M3	0,06	R$294,27	R$17,66		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,06	R$ 17,66	0%
15.4.4	AR ENG	CPU-14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	2,53	R$77,95	R$197,22		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,53	R$ 197,22	0%
15.4.5	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	31,25	R$10,88	R$339,93		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	31,25	R$ 339,93	0%
15.4.6	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	6,84	R$13,84	R$94,65		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,84	R$ 94,65	0%
15.4.7	AR ENG.	94965	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=25,0 MPA	M3	0,37	R$368,98	R$136,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,37	R$ 136,52	0%
15.4.8	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	0,37	R$207,87	R$74,09		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,37	R$ 74,69	0%
15.4.9	AR ENG.	CPU-15	LAJE PRÉ-MOLDADA DE FORRO E=8 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO E CAPEAMENTO	M2	2,40	R$49,53	R$118,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,40	R$ 118,84	0%
15.4.10	AR ENG.	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	6,82	R$25,64	R$175,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,82	R$ 175,56	0%
15.4.11	AR ENG.	CPU-16	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, E=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 12MM	M2	8,06	R$36,25	R$292,21		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,06	R$ 292,21	0%
15.4.12	AR ENG	87893	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	19,99	R$4,17	R$83,38		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	19,99	R$ 83,38	0%

Engenheiro Civil
CREA-BA- 27678/D

15.4.13	AR ENG.	90408	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	19,99	R$32,34	R$646,91		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	19,99	R$ 646,91	0%
15.4.14	AR ENG	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 9CM. AF_06/2014	M2	1,47	R$39,94	R$58,71		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,47	R$ 58,71	0%
15.4.15	AR ENG	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	1,47	R$30,13	R$44,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,47	R$ 44,28	0%
15.4.16	AR ENG.	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 1 DEMÃO, MASSA PVA	M2	19,99	R$14,22	R$284,19		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	19,99	R$ 284,19	0%
15.4.17	AR ENG	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	M2	19,99	R$11,74	R$234,74		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	19,99	R$ 234,74	0%
15.4.18	AR ENG.	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3,57	R$25,39	R$90,63		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,57	R$ 90,63	0%
15.4.19	AR ENG	CPU-48	PORTA TIPO GRADIL EM PERFIL DE METALON GALVANIZADO COM SEÇÃO 20X30 MM (SANEAR/SOL)	M2	1,79	R$241,86	R$432,94		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,79	R$ 432,94	0%
15.5	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**R$18.916,66**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 18.916,66***	***0%***
15.1	AR ENG.	99805	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	299,47	R$3,31	R$991,91		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	299,47	R$ 991,91	0%
15.2	AR ENG.	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICOS	M2	87,63	R$10,31	R$903,85		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	87,63	R$ 903,85	0%
15.3	AR ENG.	CPU-39	LIMPEZA DE VIDROS	M2	81,23	R$12,87	R$1.045,46		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	81,23	R$ 1.045,46	0%
15.4	AR ENG	CPU-40	LIMPEZA GERAL	M2	1.107,92	R$14,42	R$15.975,44		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.107,92	R$ 15.975,44	0%
TOTAL							**R$521.251,92**	**TOTAL ACUMULADO ANTERIOR**		**TOTAL ATUAL**		**TOTAL ACUMULADO**		**SALDO TOTAL**		**(%)**
QUINHENTOS E VINTE E UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS								**59.193,24**		**43.516,63**		**102.709,87**		**R$ 1.476.536,20**		**20%**

TOTAL GERAL	**R$1.579.246,07**
UM MILHÃO, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS	

BM	DATA	VALOR	(%)
1	20/11/2021	R$ 61.894,62	4%
2	20/12/2021	R$ 170.300,71	11%
3	25/01/2022	R$ 93.083,07	6%

Vitória da Conquista - BA, 25 de janeiro de 2021.

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

AR Engenharia Eireli
CNPJ: 36.286.217/0001-57
André Luís Prates Rocha Moura
Engenheiro civil
CPF [redacted]

José Flávio Magalhães de Oliveira
Engenheiro civil
CREA-BA- 276780

168

Relatório fotográfico BM 03

Modalidade: Tomada de preço

Contrato nº: 104-2021

Objeto: ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA - REFORMA E AMPLIAÇÃO (MÓDULO NOVO)

Contratante: Prefeitura Municipal

Contratada: Empresa AR Engenharia Eirelli

Cidade: José Gonçalves - Ba

Período de execução: 21/12/2021 à 25/01/2022

Número da medição: 03

Coordenadas geométricas: 14°43'41.6"S 40°43'35.3"W

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

Engenheiro Civil
CREA-BA- 276780

QUINTA COMISSÃO
Fls: 169
SINTRA

FOTO 01: ANTES – Área de circulação da área de ampliação

FOTO 02: DEPOIS – Sapatas escavadas da área de ampliação

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

José Ricardo Araújo de Oliveira
Engenheiro civil
CREA-BA- 276780

QUINTA COMISSÃO
Fls: 170
SINDIPA

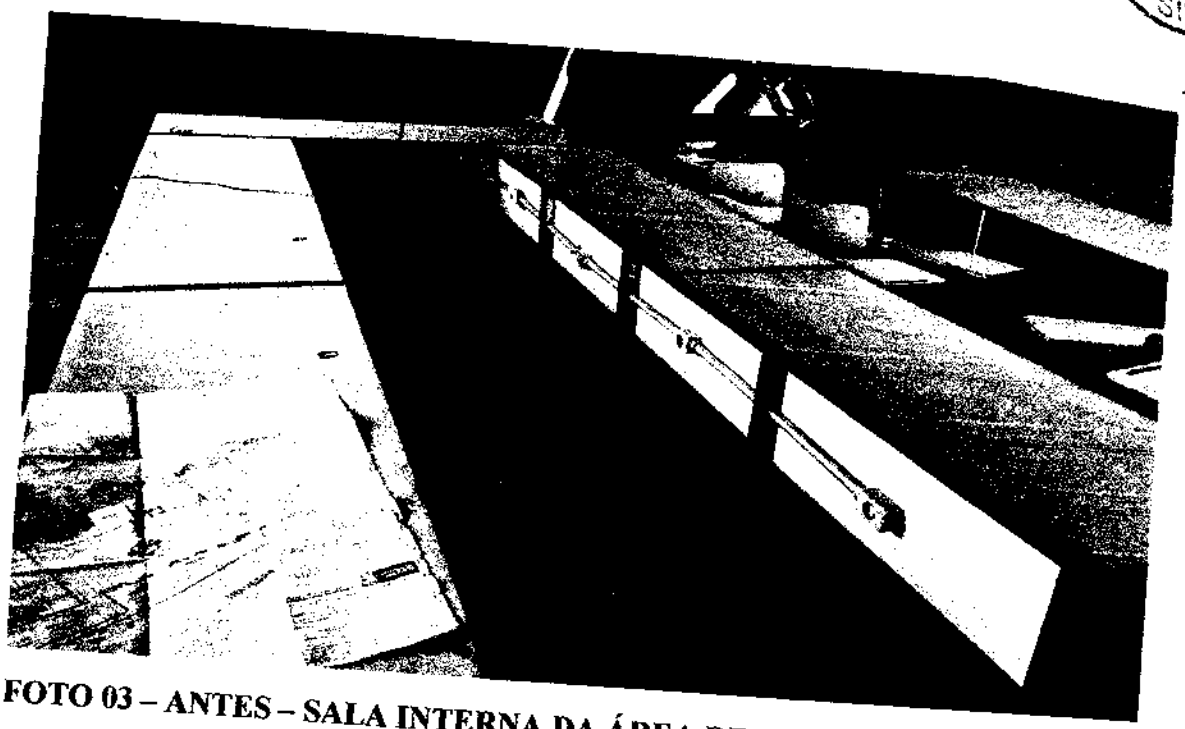

FOTO 03 – ANTES – SALA INTERNA DA ÁREA DE REFORMA

FOTO 04 – SALA INTERNA, ÁREA DE REFORMA - DEPOIS – MESAS REMOVIDAS E CONTRAPISO FEITO

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

Engenheiro civil
CREA-BA- 27678/D

FOTO 05 – ÁREA DE CIRCULAÇÃO FRONTAL DA ESCOLA

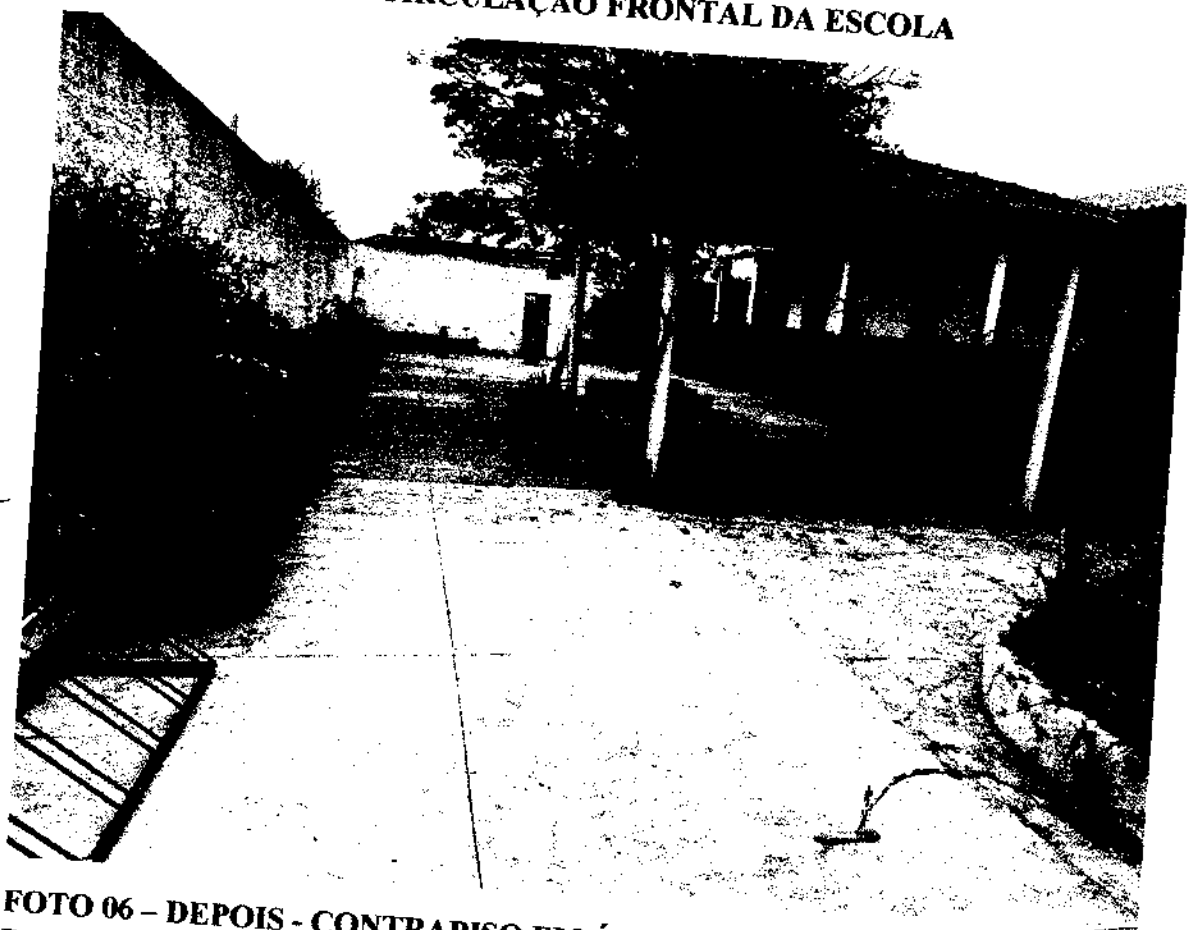

FOTO 06 – DEPOIS - CONTRAPISO EM ÁREA DE CIRCULAÇÃO FRONTAL DA ESCOLA

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

Engenheiro civil
CREA-BA- 276781D

QUINTA COMISSÃO
Fls: 172
SINDPA

FOTO 07 – ANTES – ÁREA DE CIRCULAÇÃO DAS 5 SALAS

FOTO 08 – DEPOIS – ÁREA DE CIRCULAÇÃO DAS 5 SALAS

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro Civil

COMISSÃO
173
SINDICA

FOTO 09 – GABARITO DA CONSTRUÇÃO DAS 10 SALAS DE AMPLIAÇÃO ARMADO, E FERRAGEM PARA SAPATAS E ARRANQUES ARMADAS E DOBRADAS.

FOTO 09 – SAPATA ARMADA E PRONTA PARA SER CONCRETADA

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

Engenheiro civil
CREA-BA- 276778/D

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Codigo de Verificação para Autenticação: c942ae9d590b7e03cb6b5e0352f77bc2

Gerado em 03/06/2022 07:07:10

Data de Emissão	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Série	Nº da Nota Fiscal
03/06/2022		Tributação Normal		PADRAO	202200000000016

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Retido na Fonte	Optante	No Município (2933307 - Vitória da Conquista - BA)

PRESTADOR

Razão Social: AR ENGENHARIA EIRELI
Nome Fantasia:
Endereço: AV ALIRIO SALES, 25, ... - Candeias
Vitória da Conquista - BA - CEP: 45028-180
E-mail: LIDER@CONTABILLIDER.COM.BR - Fone: (77)3081-1081 - Celular: - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 589872 - CPF/CNPJ: 36.286.217/0001-57

QUINTA COMISSÃO
Fls: 175
SINDIPA

TOMADOR

Razão Social: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Endereço: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1842 , - CANDEIAS
VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45000-000
E-mail: - Fone: (77)3429-7750 - Celular:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 2009214 - CPF/CNPJ: 06.071.702/0001-42

SERVIÇO

7[illegible]xecução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concr

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA EM VITÓRIA DA CONQUISTA JÁ EXECUTADA 36% DA OBRA PARA ESSA MEDIÇÃO.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO BRADESCO
AG: 270
CONTA CORRENTE: 421028-0
PIX: 36.286.217/0001-57

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESC. INCO. (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
125.921,82	0,00	0,00	125.921,82	3,82	4.810,21

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTOS DIVERSOS (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.111,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Liquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTA NOTA ESTÁ COM STATUS DE RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

José Flávio Maia de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

AR ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 36 286 217/0001-57
AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, 450 D - SL 3
ANDAR 1 FELÍCIA, CEP 45055-155 VIT. DA CONQUISTA
TEL. (77) 9 9109-9040 andre.rocha.moura@hotmail.com

CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA - BA	INÍCIO DA OBRA: 15/10/2021
CONTRATO: 104-2021	PERÍODO: 26/04/2022 À 25/05/2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.579.246,07	DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI 1	29,67%
Obra:	ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA - REFORMA E AMPLIAÇÃO (MODULO NOVO)	REF.	SINAPI 03/2021
Local:	DISTRITO DE JOSÉ GONÇALVES - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA	DATA	09/2021

BM 05	DATA	VALOR	PORCENTAGEM
	25/05/2022	125.921,82	8%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR		ATUAL		ACUMULADO		SALDO		EXECUTADO (%)
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO (COM BDI)	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					SUBTOTAL	R$55.239,72		R$ 27.664,42		R$ 0,00		R$ 27.664,42		R$ 27.575,30	50%
1.1	AR ENG	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$104,42	R$7.519,05	36	R$ 3.759,12		R$ 0,00	36	R$ 3.759,12	36,00	R$ 3.759,93	50%
1.2	AR ENG	90770	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00	R$33,99	R$44.865,63	660	R$ 22.433,40		R$ 0,00	660	R$ 22.433,40	660,00	R$ 22.432,25	50%
1.3	AR ENG	93201	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$38,42	R$2.766,24	36	R$ 1.383,12		R$ 0,00	36	R$ 1.383,12	36,00	R$ 1.383,12	50%
1.4	AR ENG	CPU	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART	UN	1,00	R$88,78	R$88,78	1	R$ 88,78		R$ 0,00	1	R$ 88,78	0,00	R$ 0,00	100%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					SUBTOTAL	R$44.431,75		R$ 44.431,76		R$ 0,00		R$ 44.431,76		-R$ 0,01	100%
2.1	AR ENG	CPU-1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO (SALAS EXISTENTES E CIRCULAÇÃO)	M2	249,66	R$30,57	R$7.631,35	249,66	R$ 7.631,35		R$ 0,00	249,66	R$ 7.631,35	0,00	R$ 0,00	100%
2.2	AR ENG	CPU-2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	354,04	R$14,13	R$4.994,83	354,04	R$ 4.994,83		R$ 0,00	354,04	R$ 4.994,83	0,00	R$ 0,00	100%
2.3	AR ENG	CPU-3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA	M2	354,04	R$35,78	R$12.667,86	354,04	R$ 12.667,86		R$ 0,00	354,04	R$ 12.667,86	0,00	R$ 0,00	100%
2.4	AR ENG	CPU-4	REMOÇÃO DE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	M	37,21	R$5,13	R$191,03	37,21	R$ 191,03		R$ 0,00	37,21	R$ 191,03	0,00	R$ 0,00	100%
2.5	AR ENG	CPU-5	RETIRADA DE PEÇAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BASEAMENTO	UN	12,00	R$123,55	R$1.482,60	12	R$ 1.482,60		R$ 0,00	12	R$ 1.482,60	0,00	R$ 0,00	100%
2.6	AR ENG	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	95,77	R$5,04	R$482,68	95,77	R$ 482,68		R$ 0,00	95,77	R$ 482,68	0,00	R$ 0,00	100%
2.7	AR ENG	97911	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, PASSA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 14 KM	M3xKM	478,87	R$1,56	R$747,04	478,87	R$ 747,04		R$ 0,00	478,87	R$ 747,04	0,00	R$ 0,00	100%
2.8	AR ENG	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	25,41	R$447,95	R$11.379,70	25,41	R$ 11.379,70		R$ 0,00	25,41	R$ 11.379,70	0,00	R$ 0,00	100%
2.9	AR ENG	CPU-6	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	467,40	R$7,56	R$3.533,54	467,4	R$ 3.533,54		R$ 0,00	467,4	R$ 3.533,54	0,00	R$ 0,00	100%
2.10	AR ENG	CPU-7	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	R$295,67	R$1.330,52	4,5	R$ 1.330,52		R$ 0,00	4,5	R$ 1.330,52	0,00	R$ 0,00	100%
3	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM					SUBTOTAL	R$6.965,68		R$ 6.965,68		R$ 0,00		R$ 6.965,68		R$ 0,00	100%
3.1	AR ENG	CPU-8	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	788,33	R$0,49	R$386,28	788,33	R$ 386,28		R$ 0,00	788,33	R$ 386,28	0,00	R$ 0,00	100%
3.2	AR ENG	CPU-9	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	358,69	R$2,61	R$936,18	358,69	R$ 936,18		R$ 0,00	358,69	R$ 936,18	0,00	R$ 0,00	100%
3.3	AR ENG	97918	TRANSPORTE DE MATERIAL (BOTA FORA)	M3XKM	1.290,89	R$1,04	R$1.342,53	1290,89	R$ 1.342,53		R$ 0,00	1290,89	R$ 1.342,53	0,00	R$ 0,00	100%
3.4	AR ENG	97918	TRANSPORTE DE MATERIAL (BOTA FORA)	M3XKM	2.510,83	R$1,04	R$2.611,26	2510,83	R$ 2.611,26		R$ 0,00	2510,83	R$ 2.611,26	0,00	R$ 0,00	100%
3.5	AR ENG	CPU-10	ESPALHAMENTO DE MATERIAL TERROSO	M3	358,69	R$0,31	R$111,19	358,69	R$ 111,19		R$ 0,00	358,69	R$ 111,19	0,00	R$ 0,00	100%
3.6	AR ENG	CPU-11	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M3	358,69	R$4,40	R$1.578,24	358,69	R$ 1.578,24		R$ 0,00	358,69	R$ 1.578,24	0,00	R$ 0,00	100%
4	INFRAESTRUTURA					SUBTOTAL	R$80.011,35		R$ 63.369,68		R$ 16.641,66		R$ 80.011,34		R$ 0,01	100%
4.1	AR ENG	CPU-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES, ATÉ 1,50M	M3	125,74	R$51,53	R$6.861,63	95	R$ 5.184,15	30,74	R$ 1.677,48	125,74	R$ 6.861,63	0,00	R$ 0,00	100%
4.2	AR ENG	CPU-13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COMAÇO DE 30KG	M2	163,82	R$30,49	R$5.060,40	125	R$ 3.861,25	38,82	R$ 1.199,15	163,82	R$ 5.060,40	0,00	R$ 0,00	100%
4.3	AR ENG	94962	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M3	4,91	R$294,37	R$1.444,87	3,65	R$ 1.074,09	1,26	R$ 370,78	4,91	R$ 1.444,87	0,00	R$ 0,00	100%
4.4	AR ENG	96995	ATERRO MANUAL DA CAIXA DA OBRA	M3	71,61	R$49,38	R$3.535,61	53	R$ 2.617,14	18,6	R$ 918,47	71,6	R$ 3.535,61	0,00	R$ 0,00	100%
4.5	AR ENG	96536	FORMA TABUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO (4 VEZES) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	63,91	R$61,45	R$3.927,37	48	R$ 2.949,60	15,91	R$ 977,67	63,91	R$ 3.927,27	0,00	R$ 0,00	100%
4.6	AR ENG	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	2.116,23	R$10,88	R$23.024,58	2116,23	R$ 23.024,58		R$ 0,00	2116,23	R$ 23.024,58	0,00	R$ 0,00	100%
4.7	AR ENG	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	116,76	R$13,84	R$1.615,96	116,76	R$ 1.615,96	0	R$ 0,00	116,76	R$ 1.615,96	0,00	R$ 0,00	100%
4.8	AR ENG	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20,0 MPA	M3	52,64	R$341,81	R$17.992,88	37	R$ 12.646,97	15,64	R$ 5.345,91	52,64	R$ 17.992,88	0,00	R$ 0,00	100%
4.9	AR ENG	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	52,64	R$201,87	R$10.626,44	37	R$ 7.469,19	15,64	R$ 3.157,25	52,64	R$ 10.626,44	0,00	R$ 0,00	100%
4.10	AR ENG	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	232,68	R$25,43	R$5.921,71	115	R$ 2.926,75	117,68	R$ 2.994,96	232,68	R$ 5.921,71	0,00	R$ 0,00	100%
5	SUPERESTRUTURA					SUBTOTAL	R$106.627,19		R$ 26.031,57		R$ 35.260,55		R$ 61.292,12		R$ 45.335,07	57%
5.1	AR ENG	CPU-14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 20MM, 03 USOS INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	123,49	R$77,95	R$14.523,55	70	R$ 5.456,50	70	R$ 5.456,50	140	R$ 10.913,00	33,49	R$ 2.610,55	81%
5.2	AR ENG	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	1.987,69	R$10,88	R$21.647,83	1050	R$ 11.424,00	540	R$ 5.875,20	1590	R$ 17.299,20	399,69	R$ 4.348,63	80%
5.3	AR ENG	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	373,20	R$13,84	R$5.260,77	290	R$ 4.013,60	180	R$ 2.491,20	470	R$ 6.504,80	103,20	R$ 1.454,97	82%
5.4	AR ENG	94965	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=25,0 MPA	M3	27,97	R$368,96	R$10.319,81	9	R$ 3.320,64	15	R$ 5.541,40	24	R$ 8.855,04	3,97	R$ 1.464,77	86%
5.5	AR ENG	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	27,97	R$201,87	R$5.646,30	9	R$ 1.816,83	15	R$ 3.028,05	24	R$ 4.844,88	3,97	R$ 801,42	86%
5.6	AR ENG	CPU-15	LAJE PRÉ-MOLDADA DE FORRO E=8 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO E CAPEAMENTO	M2	963,20	R$49,52	R$15.016,44		R$ 0,00	260	R$ 12.875,20	260	R$ 12.875,20	43,24	R$ 2.141,24	86%
5.7	LAJE MACIÇA DE CONCRETO, E=0,10M						R$22.714,32		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 22.714,32	0%
5.7.1	AR ENG	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. AF_09/2020	M2	135,81	R$28,12	R$3.818,98		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	135,81	R$ 3.818,98	0%
5.7.2	AR ENG	92760	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.090,97	R$12,59	R$13.810,85		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1090,97	R$ 13.810,85	0%
5.7.3	AR ENG	94939	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS (PARA 15 E 17 MPA) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA) LANÇAMENTO	M3	13,58	R$376,41	R$5.084,49		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	13,58	R$ 5.084,49	0%

José Flávio Vieira de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 276781D

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

5.8	**RAMPA DE CONCRETO**						**R$9.798,17**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$9.798,17***	***0%***
5.8.1	AR ENG.	92267	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, AF_09/2020	M2	80,33	R$28,12	R$2.258,88		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	80,33	R$ 2.258,88	0%
5.8.2	AR ENG	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	360,03	R$12,59	R$4.532,78		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	360,03	R$ 4.532,78	0%
5.8.3	AR ENG	94139	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES, LAJES E TETAS) COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015	M3	8,03	R$374,41	R$3.006,51		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,03	R$ 3.006,51	0%
6	**VEDAÇÃO**					**SUBTOTAL**	**R$57.016,83**		***R$ 13.970,17***		***R$ 13.970,17***		***R$ 27.940,35***		***R$ 29.176,48***	***49%***
6.1	AR ENG	CPU-16	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X30CM, E=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 12MM	M2	1.081,83	R$46,25	R$50.020,09	320	R$ 14.801,35	320	R$ 14.801,35	640	R$ 24.202,59	441,83	R$ 16.018,20	59%
6.2	AR ENG	CPU-17	COBOGÓ CERÂMICO QUADRADO VAZADO DE 9X20X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA	M2	125,72	R$104,73	R$13.166,18		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	125,72	R$ 13.166,18	0%
6.3	AR ENG	93182	VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO DE 10X20CM	M	119,80	R$39,48	R$4.729,76	60	R$ 2.368,83	60	R$ 2.368,83	120	R$ 4.737,66	-0,20	-R$ 7,90	100%
7	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**					**SUBTOTAL**	**R$25.496,64**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 25.496,64***	***0%***
7.1	AR ENG.	CPU-18	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 0,60 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FECHADURA	UN	6,00	R$1.002,73	R$6.016,38		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 6.016,38	0%
7.2	AR ENG.	CPU-19	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	19,00	R$999,97	R$18.999,43		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	19,00	R$ 18.999,43	0%
7.3	AR ENG.	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	7,00	R$68,69	R$480,83		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	7,00	R$ 480,83	0%
8	**ESQUADRIAS METÁLICAS**					**SUBTOTAL**	**R$13.838,11**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 13.838,11***	***0%***
8.1	AR ENG	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	63,00	R$162,33	R$10.226,82		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	63,00	R$ 10.226,82	0%
8.2	AR ENG	CPU-20	BOBELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA 2GL COM VIDROS TIPO FANTASIA, PADRONIZADA	M2	3,90	R$328,61	R$1.281,57		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,90	R$ 1.281,57	0%
8.3	AR ENG.	CPU-21	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	3,15	R$739,59	R$2.329,72		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,15	R$ 2.329,72	0%
9	**COBERTURA**					**SUBTOTAL**	**R$209.163,66**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 209.163,66***	***0%***
9.1	AR ENG	CPU-22	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIGA TRELIÇADA DE AÇO, VÃO DE 12,60 M, INCLUSO IÇAMENTO	UN	5,00	R$1.337,07	R$6.685,35		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 6.685,35	0%
9.2	AR ENG	CPU-23	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIGA TRELIÇADA DE AÇO, VÃO DE 6,50 M, INCLUSO IÇAMENTO	UN	5,00	R$1.092,60	R$5.463,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 5.463,00	0%
9.3	AR ENG	CPU-24	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TERÇA EM PERFIL U ENRIJECIDO 150X60X20	M	551,22	R$23,38	R$12.889,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	551,22	R$ 12.889,52	0%
9.4	AR ENG	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMO-ACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	900,72	R$201,09	R$181.121,32		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	900,72	R$ 181.121,32	0%
9.5	AR ENG	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,15	R$53,52	R$329,17		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,15	R$ 329,17	0%
9.6	AR ENG	94231	RUFO METÁLICO, L=25 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	64,56	R$41,47	R$2.677,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	64,56	R$ 2.677,30	0%
10	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**SUBTOTAL**	**R$12.860,06**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 12.860,06***	***0%***
10.1	AR ENG	89482	CAIXA SIFONADA PVC, 200 X 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$19,64	R$39,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 39,28	0%
10.2	AR ENG	86901	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSO, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$100,00	R$200,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 200,00	0%
10.3	AR ENG	86902	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$108,02	R$432,08		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 432,08	0%
10.4	AR ENG	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA DE 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO OU CUBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$42,94	R$257,64		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 257,64	0%
10.5	AR ENG	86885	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL, EM PVC, 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$8,66	R$51,96		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 51,96	0%
10.6	AR ENG	86883	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$12,42	R$74,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 74,52	0%
10.7	AR ENG	95470	BACIA SIFONADA DE LOUÇA COM ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$149,99	R$1.199,92		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,00	R$ 1.199,92	0%
10.8	AR ENG	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R$29,91	R$239,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,00	R$ 239,28	0%
10.9	AR ENG	95544	PAPELEIRA DE METAL, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$27,69	R$221,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,00	R$ 221,52	0%
10.10	AR ENG	CPU-25	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/ REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40MM, INCLUSIVE TUBO DE DESCIDA COM JOELHO	UN	8,00	R$422,83	R$3.382,64		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,00	R$ 3.382,64	0%
10.11	AR ENG.	95543	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$60,96	R$121,92		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 121,92	0%
10.12	AR ENG	CPU-26	DISPENSER PARA TOALHAS INTERFOLHADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$66,54	R$133,08		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 133,08	0%
10.13	AR ENG.	129860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$62,82	R$125,64		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 125,64	0%
10.14	AR ENG.	100869	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=35 MM	UN	4,00	R$217,82	R$871,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 871,28	0%
10.15	AR ENG.	CPU-27	BANCADA DE GRANITO, LARG=60	M2	1,92	R$291,24	R$559,18		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,92	R$ 559,18	0%
10.16	AR ENG	CPU-28	PONTO DE ÁGUA FRIA	UN	6,00	R$120,16	R$720,96		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 720,96	0%
10.17	AR ENG	CPU-29	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM	UN	6,00	R$88,23	R$529,38		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 529,38	0%
10.18	AR ENG	CPU-30	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM	UN	8,00	R$127,30	R$1.018,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,00	R$ 1.018,40	0%
10.19	AR ENG.	89495	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X40 MM	UN	6,00	R$7,13	R$42,78		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 42,78	0%
10.20	AR ENG.	89354	REGISTRO DE GAVETA 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$28,57	R$57,14		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 57,14	0%
10.21	AR ENG	CPU-31	CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS	UN	2,00	R$1.285,73	R$2.571,46		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 2.571,46	0%
11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**SUBTOTAL**	**R$51.880,17**		***R$ 0,00***		***R$ 9.597,50***		***R$ 9.597,50***		***R$ 42.282,67***	***18%***
11.1	AR ENG	CPU-32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FUC, EMBUTIR, 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$161,85	R$323,70		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 323,70	0%
11.2	AR ENG.	CPU-33	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA, 200X200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$97,31	R$194,62		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 194,62	0%
11.3	AR ENG.	101880	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 15 A, EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	12,00	R$12,13	R$145,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	12,00	R$ 145,56	0%
11.4	AR ENG.	96985	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE COBRE COOPERWELD 5/8"X2,4M, COM CONECTOR	UN	3,00	R$51,91	R$155,73		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 155,73	0%
11.5	AR ENG.	CPU-34	LUMINARIA TIPO PLAFON PLÁSTICO COM BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	112,00	R$9,57	R$1.071,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	112,00	R$ 1.071,84	0%
11.6	AR ENG	97612	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	112,00	R$19,95	R$2.234,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	112,00	R$ 2.234,40	0%
11.7	AR ENG	CPU-35	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO DE 3/4"	UN	172,00	R$326,06	R$56.074,32	20	R$ 6.319,20	20	R$ 6.319,20	40	R$ 26.792,90	132,00	R$ 29.528,82	53%
11.8	AR ENG	CPU-36	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	UN	69,00	R$272,51	R$18.803,19	5	R$ 1.362,55	5	R$ 1.362,55	10	R$ 5.462,35	25,00	R$ 6.812,75	12%

José Flávio Matta de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 276788/D

André Luís [illegible]
ENGENHEIRO
CREA-RA

11.9	AR ENG.	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A 250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	30,30	R$121,05	R$3.6[illegible],50		R$ 0,00	15	R$ 1.815,75	15	R$ 1.815,75	15,00	R$ 1.815,75	50%
12	**FORRO DE GESSO**					**SUBTOTAL**	**R$1.702,80**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$1.702,80***	**0%**
12.1	AR ENG.	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF_05/2017_P	M2	41,33	R$41,20	R$1.702,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	41,33	R$ 1.702,80	0%
13	**REVESTIMENTO DE FORRO E PAREDES**					**SUBTOTAL**	**R$92.686,37**		***R$ 25.239,20***		***R$ 25.239,20***		***R$ 50.478,40***		***R$ 42.207,97***	**54%**
13.1	AR ENG.	87871	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	2.164,65	R$4,17	R$9.022,42	640	R$ 2.668,80	640	R$ 2.668,80	1280	R$ 5.337,60	884,65	R$ 3.684,82	59%
13.2	AR ENG.	87905	CHAPINCO APLICADO EM AZULEJO (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	419,67	R$8,82	R$3.701,99	200	R$ 1.764,00	200	R$ 1.764,00	400	R$ 3.528,00	19,67	R$ 173,49	95%
13.3	AR ENG.	96408	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	2.634,96	R$32,51	R$66.153,52	640	R$ 20.806,40	640	R$ 20.806,40	1280	R$ 41.612,80	354,96	R$ 24.544,72	63%
13.4	AR ENG.	87911	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO PARA RECHEMIMENTO DE CERÂMICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	142,90	R$30,36	R$4.340,27		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	142,90	R$ 4.340,27	0%
13.5	AR ENG.	87274	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA 30X45 CM, JUNTA A PRUMO, COM CIMENTO COLANTE	M2	142,90	R$66,21	R$9.464,67		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	142,90	R$ 9.464,67	0%
14	**PISOS**					**SUBTOTAL**	**R$103.072,40**		***R$ 9.076,37***		***R$ 10.384,40***		***R$ 19.460,77***		***R$ 83.611,64***	**19%**
14.1	AR ENG.	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 9CM AF_06/2014	M2	1.211,36	R$39,94	R$48.381,72	227,25	R$ 9.076,37	260	R$ 10.384,40	487,25	R$ 19.460,77	724,11	R$ 28.920,96	40%
14.2	AR ENG.	CPU-37	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	42,19	R$28,37	R$1.196,93		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	42,19	R$ 1.196,93	0%
14.3	AR ENG.	93391	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA TIPO A, 42X42 CM, PEI 5, COM ADESIVO COLANTE	M2	42,19	R$30,04	R$1.267,39		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	42,19	R$ 1.267,39	0%
14.4	AR ENG.	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, AF_07/2020	M2	1.169,17	R$36,66	R$42.861,77		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.169,17	R$ 42.861,77	0%
14.5	AR ENG.	101741	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, H=10 CM	M	395,60	R$23,38	R$9.249,13		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	395,60	R$ 9.249,13	0%
14.6	AR ENG.	98689	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA DE GRANITO, L= 15CM	M	1,60	R$68,71	R$115,46		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,60	R$ 115,46	0%
15	**PINTURA**					**SUBTOTAL**	**R$73.725,23**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 73.725,23***	**0%**
15.1	AR ENG.	88489	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 1 DEMÃO, MASSA PVA	M2	1.093,00	R$14,22	R$15.499,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.093,00	R$ 15.499,80	0%
15.2	AR ENG.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	M2	1.557,32	R$11,74	R$18.282,94		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.557,32	R$ 18.282,94	0%
15.3	AR ENG.	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	419,67	R$27,94	R$11.725,58		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	419,67	R$ 11.725,58	0%
15.4	AR ENG.	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	419,67	R$11,08	R$4.649,94		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	419,67	R$ 4.649,94	0%
15.5	AR ENG.	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M2	794,46	R$14,22	R$11.297,22		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	794,46	R$ 11.297,22	0%
15.6	AR ENG.	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	1.057,92	R$9,95	R$10.526,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.057,92	R$ 10.526,30	0%
15.7	AR ENG.	102219	APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS, SOBRE MADEIRA	M2	100,36	R$15,08	R$1.513,43		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	100,36	R$ 1.513,43	0%
15.8	AR ENG.	CPU-38	FUNDO PREPARADOR PRIMER À BASE DE EPOXI PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	6,30	R$11,12	R$70,06		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,30	R$ 70,06	0%
15.9	AR ENG.	100326	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	6,30	R$25,39	R$159,96		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,30	R$ 159,96	0%
16	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**SUBTOTAL**	**R$29.858,65**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 29.858,65***	**0%**
16.1	AR ENG.	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019_P	M	88,00	R$96,78	R$8.516,64		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	88,00	R$ 8.516,64	0%
16.2	**RAMPA DE ACESSO**						**R$21.342,01**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 21.342,01***	**0%**
16.2.1	AR ENG.	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	2,40	R$61,45	R$147,48		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,40	R$ 147,48	0%
16.2.2	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	M3	3,60	R$441,81	R$1.590,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,60	R$ 1.240,52	0%
16.2.3	AR ENG.	92873	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M2	3,60	R$201,87	R$726,73		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,60	R$ 726,73	0%
16.3	AR ENG.	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	142,90	R$3,31	R$473,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	142,90	R$ 473,20	0%
16.4	AR ENG.	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICOS	M2	42,19	R$10,31	R$434,98		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	42,19	R$ 434,98	0%
16.5	AR ENG.	CPU 39	LIMPEZA DE VIDROS	M2	66,90	R$12,87	R$861,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	66,90	R$ 861,00	0%
16.6	AR ENG.	CPU-40	LIMPEZA GERAL	M2	1.211,38	R$14,42	R$17.468,10		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.211,38	R$ 17.468,10	0%
17	**MURO (L=148,73M H=2,6M)**					**SUBTOTAL**	**R$93.317,53**									
17.1	**INFRAESTRUTURA**						**R$22.938,50**		***R$ 22.938,50***		***R$ 0,00***		***R$ 22.938,50***		***R$ 0,00***	***100%***
17.1.1	AR ENG.	CPU-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES ATÉ 1,30M	M3	37,60	R$54,57	R$2.051,65	37,6	R$ 2.051,65		R$ 0,00	37,6	R$ 2.051,65	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.2	AR ENG.	CPU-13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS C/ MAÇO DE 30KG	M2	65,91	R$30,89	R$2.035,79	65,91	R$ 2.035,79		R$ 0,00	65,91	R$ 2.035,79	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.3	AR ENG.	94962	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M3	1,98	R$291,22	R$582,66	1,98	R$ 582,66		R$ 0,00	1,98	R$ 582,66	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.4	AR ENG.	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	55,69	R$61,45	R$3.422,26	55,69	R$ 3.422,26		R$ 0,00	55,69	R$ 3.422,26	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.5	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	634,09	R$10,98	R$7.006,27	634,09	R$ 7.006,27		R$ 0,00	634,09	R$ 7.006,27	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.6	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	86,84	R$13,84	R$1.201,64	86,84	R$ 1.201,64		R$ 0,00	86,84	R$ 1.201,64	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.7	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 20,0 MPA	M3	12,21	R$341,81	R$4.173,44	12,21	R$ 4.173,44		R$ 0,00	12,21	R$ 4.173,44	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.8	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	12,21	R$201,87	R$2.464,79	12,21	R$ 2.464,79		R$ 0,00	12,21	R$ 2.464,79	0,00	R$ 0,00	100%
17.2	**SUPERESTRUTURA**						**R$25.210,98**		***R$ 25.210,98***		***R$ 0,00***		***R$ 25.210,98***		***R$ 0,00***	***100%***
17.2.1	AR ENG.	CPU-14	FORMA PLACA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	78,44	R$77,95	R$6.114,62	78,44	R$ 6.114,62		R$ 0,00	78,44	R$ 6.114,62	0,00	R$ 0,00	100%
17.2.2	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	868,17	R$10,88	R$9.443,77	868,17	R$ 9.443,77		R$ 0,00	868,17	R$ 9.443,77	0,00	R$ 0,00	100%
17.2.3	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	259,06	R$13,84	R$3.584,71	259,06	R$ 3.584,71		R$ 0,00	259,06	R$ 3.584,71	0,00	R$ 0,00	100%
17.2.4	AR ENG.	94968	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 25,0 MPA	M3	10,63	R$368,96	R$3.922,04	10,63	R$ 3.922,04		R$ 0,00	10,63	R$ 3.922,04	0,00	R$ 0,00	100%
17.2.5	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	10,63	R$201,87	R$2.145,84	10,63	R$ 2.145,84		R$ 0,00	10,63	R$ 2.145,84	0,00	R$ 0,00	100%
17.3	**VEDAÇÃO**						**R$14.828,33**		***R$ 0,00***		***R$ 14.828,33***		***R$ 14.828,33***		***R$ 0,00***	***100%***
17.3.1	AR ENG.	CPU-16	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X30CM, E= 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 12MM	M2	409,01	R$36,25	R$14.828,33		R$ 0,00	409,01	R$ 14.828,33	409,01	R$ 14.828,33	0,00	R$ 0,00	100%
17.4	**REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDES**						**R$3.411,90**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$3.411,90***	**0%**
17.4.1	AR ENG	87873	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	818,02	R$4,17	R$3.411,90		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	818,02	R$ 3.411,90	0%
17.5	**PINTURA**						**R$26.927,82**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 26.927,82***	**0%**
17.5.1	AR ENG.	CPU-41	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	818,02	R$32,92	R$26.927,82		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	818,02	R$ 26.927,82	0%
TOTAL							**R$1.057.994,14**	**TOTAL ACUMULADO ANTERIOR**		**TOTAL ATUAL**		**TOTAL ACUMULADO**		**SALDO TOTAL**		**(%)**
UM MILHÃO, CINQUENTA E SETE MIL, NOVECE											**125.921,82**				**R$ 667.174,01**	**37%**

ENGENHEIRO E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS

José Flávio Maia
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI 1	29,67%
Obra:	ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BLOCO PRINCIPAL	REF.:	SINAPI 03/2021
Local:	DISTRITO DE JOSÉ GONÇALVES - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA	DATA	09/2021

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO (COM BDI)	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	(%)
1	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**					**SUBTOTAL**	**R$55.240,02**		***R$ 27.664,42***		***R$ 0,00***		***R$ 27.664,42***		***R$ 27.575,60***	***50%***
1.1	AR ENG	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$104,42	R$7.519,05	36	R$ 3.759,12		R$ 0,00	36	R$ 3.759,12	36,00	R$ 3.759,93	50%
1.2	AR ENG	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00	R$33,99	R$44.865,65	660	R$ 22.433,40		R$ 0,00	660	R$ 22.433,40	660,00	R$ 22.432,25	50%
1.3	AR ENG	100409	TECNICO EM SEGGRANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$38,42	R$2.766,54	36	R$ 1.383,12		R$ 0,00	36	R$ 1.383,12	36,00	R$ 1.383,42	50%
1.4	AR ENG	CPU	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART	UN	2,00	R$88,78	R$88,78	1	R$ 88,78		R$ 0,00	1	R$ 88,78	0,00	R$ 0,00	100%
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**SUBTOTAL**	**R$52.066,09**		***R$ 31.777,09***		***R$ 0,00***		***R$ 31.777,09***		***R$ 20.289,00***	***61%***
2.1	AR ENG	CPU-1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO (SALAS EXISTENTES E CIRCULAÇÃO)	M2	916,13	R$30,57	R$28.003,35	830	R$ 25.370,59		R$ 0,00	830	R$ 25.370,59	86,13	R$ 2.632,76	91%
2.2	AR ENG	CPU-11	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	191,79	R$32,92	R$6.313,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	191,79	R$ 6.313,40	0%
2.3	AR ENG	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	178,74	R$22,63	R$4.044,42		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	178,74	R$ 4.044,42	0%
2.4	AR ENG.	CPU-7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	136,94	R$14,11	R$1.932,22		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	136,94	R$ 1.932,22	0%
2.5	AR ENG.		DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA	M2	136,94	R$35,78	R$4.899,71		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	136,94	R$ 4.899,71	0%
2.6	AR ENG.	CPU-4	REMOÇÃO DE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	M	4,15	R$5,15	R$21,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,15	R$ 21,37	0%
2.7	AR ENG	97632	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO, SEM REAPROVEITAMENTO (MURO)	M2	63,42	R$54,42	R$3.451,32	63,42	R$ 3.451,32		R$ 0,00	63,42	R$ 3.451,32	0,00	R$ 0,00	100%
2.8	AR ENG	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	156,63	R$5,04	R$789,42	125	R$ 630,00		R$ 0,00	125	R$ 630,00	31,63	R$ 159,42	80%
2.9	AR ENG	95914	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 1% KM	M3xKM	783,15	R$1,56	R$1.221,71	600	R$ 936,00		R$ 0,00	600	R$ 936,00	183,15	R$ 285,71	77%
2.10	AR ENG.	CPU-5	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	7,76	R$7,56	R$58,67	7,76	R$ 58,67		R$ 0,00	7,76	R$ 58,67	0,00	R$ 0,00	100%
2.11	AR ENG.	CPU-7	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	R$395,67	R$1.780,52	4,5	R$ 1.780,52		R$ 0,00	4,5	R$ 1.780,52	0,00	R$ 0,00	100%
3	**INFRAESTRUTURA**					**SUBTOTAL**	**R$5.163,76**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$5.163,76***	***0%***
3.1	AR ENG.	CPU-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES, ATÉ 1,50M	M3	6,54	R$54,57	R$356,89		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,54	R$ 356,89	0%
3.2	AR ENG	CPU-13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS C MAÇO DE 30KG	M2	10,94	R$30,89	R$337,94		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,94	R$ 337,94	0%
3.3	AR ENG.	94962	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M3	0,33	R$294,27	R$97,11		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,33	R$ 97,11	0%
3.4	AR ENG	96995	ATERRO MANUAL DA CAIXA DA OBRA	M3	1,36	R$49,38	R$67,16		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,36	R$ 67,16	0%
3.5	AR ENG	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	17,32	R$61,45	R$1.064,31		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	17,32	R$ 1.064,31	0%
3.6	AR ENG	92762	ARMADURA CA - 50 MEDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	109,27	R$10,88	R$1.188,86		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	109,27	R$ 1.188,86	0%
3.7	AR ENG	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	13,50	R$13,84	R$186,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	13,50	R$ 186,84	0%
3.8	AR ENG	94990	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 20,0 MPA	M3	2,17	R$341,61	R$741,73		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,17	R$ 741,73	0%
3.9	AR ENG	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	2,17	R$201,87	R$438,06		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,17	R$ 438,06	0%
3.10	AR ENG	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	26,91	R$25,45	R$684,86		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	26,91	R$ 684,86	0%
4	**SUPERESTRUTURA**					**SUBTOTAL**	**R$6.385,69**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$6.385,69***	***0%***
4.1	AR ENG	CPU-14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	34,87	R$77,95	R$2.718,12		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	34,87	R$ 2.718,12	0%
4.2	AR ENG	92762	ARMADURA CA - 50 MEDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	157,40	R$10,88	R$1.712,51		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	157,40	R$ 1.712,51	0%
4.3	AR ENG	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	48,46	R$13,84	R$670,69		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	48,46	R$ 670,69	0%
4.4	AR ENG	94965	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25,0 MPA	M3	2,25	R$368,96	R$830,16		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,25	R$ 830,16	0%
4.5	AR ENG	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	2,23	R$201,87	R$454,21		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,25	R$ 454,21	0%
5	**VEDAÇÃO**					**SUBTOTAL**	**R$3.353,54**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$3.353,54***	***0%***
5.1	AR ENG	CPU-13	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, E=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 12MM	M2	76,48	R$42,30	R$3.235,10		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	76,48	R$ 3.235,10	0%
5.2	AR ENG	93182	VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO DE 10X20CM	M	3,00	R$39,48	R$118,44		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 118,44	0%
6	**ESQUADRIA DE MADEIRA**					**SUBTOTAL**	**R$41.628,68**		***R$ 11.531,41***		***R$ 0,00***		***R$ 11.531,41***		***R$ 30.097,27***	***28%***
6.1	AR ENG	CPU-13	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,60 X 1,60 M, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FECHADURA	UN	10,00	R$1.002,73	R$10.027,27	4	R$ 4.010,91		R$ 0,00	4	R$ 4.010,91	6,00	R$ 6.016,36	40%
6.2	AR ENG	CPU-44	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 1,60 M, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FECHADURA	UN	2,00	R$2.238,59	R$4.477,18	4	R$ 4.477,18		R$ 0,00	4	R$ 4.477,18	-2,00	-R$ 2.238,59	200%
6.3	AR ENG	CPU-45	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,60 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	5,00	R$897,87	R$4.489,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 4.489,37	0%
6.4	AR ENG	CPU-46	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,70 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	3,00	R$915,29	R$2.745,88		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 2.745,88	0%
6.5	AR ENG	CPU-47	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,70 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	21,00	R$1.014,44	R$21.303,30	3	R$ 3.043,33		R$ 0,00	3	R$ 3.043,33	18,00	R$ 18.259,97	14%
6.6	AR ENG	100595	TARJETA TIPO LIVRE OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	12,00	R$68,69	R$824,27		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	12,00	R$ 824,27	0%
7	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**					**SUBTOTAL**	**R$15.342,88**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 15.342,88***	***0%***
7.1	AR ENG	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	65,59	R$162,33	R$10.647,22		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	65,59	R$ 10.647,22	0%
7.2	AR ENG	CPU-26	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TIPO FANTASIA, PADRONIZADA	M2	10,58	R$328,61	R$3.476,69		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,58	R$ 3.476,69	0%
7.3	AR ENG	CPU-48	PORTA TIPO GRADIL EM PERFIL DE METALON GALVANIZADO COM SEÇÃO 20X20 MM (SANITÁRIOS)	M2	5,04	R$241,86	R$1.218,97		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,04	R$ 1.218,97	0%
8	**COBERTURA**					**SUBTOTAL**	**R$31.212,47**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 31.212,47***	***0%***
8.1	AR ENG.	CPU-24	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TERÇA EM PERFIL U ENRIJECIDO 150X50X20	M	99,40	R$23,38	R$2.323,71		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	99,40	R$ 2.323,71	0%

André Luís P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

José Flávio Dias de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

André Luís P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI 1:	29,67%
Obra:	ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BLOCO PRINCIPAL	REF.:	SINAPI 03/2021
Local:	DISTRITO DE JOSÉ GONÇALVES - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA	DATA	09/2021

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO (COM BDI)	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	(%)
1	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**					**SUBTOTAL**	**R$55.240,12**		***R$ 27.664,42***		***R$ 0,00***		***R$ 27.664,42***		***R$ 27.575,70***	***50%***
1.1	AR ENG.	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$104,43	R$7 51,.05	36	R$ 3.759,12		R$ 0,00	36	R$ 3.75[illegible]	36,00	R$ 3.7[illegible]	50%
1.2	AR ENG.	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00	R$33,99	R$44 865,65	660	R$ 22.433,4[illegible]		R$ 0,00	660	R$ 22.43[illegible]	660,00	R$ 22.4[illegible]	50%
1.3	AR ENG.	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$38,42	R$2 766,54	36	R$ 1.383,1[illegible]		R$ 0,00	36	R$ 1.38[illegible]	36,00	R$ 1.38[illegible]	50%
1.4	AR ENG.	CPU	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	1,00	R$88,78	R$88,78	1	R$ 88,7[illegible]		R$ 0,00	1	R$ [illegible]	0,00	R$ [illegible]	100%
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**SUBTOTAL**	**R$52.066,19**		***R$ 31.777,09***		***R$ 0,00***		***R$ 31.777,09***		***R$ 20.289,10***	***61 %***
2.1	AR ENG.	CPU-01	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO (SALAS EXISTENTES E CIRCULAÇÃO)	M2	916,13	R$30,57	R$28.003,33	830	R$ 25.370,[illegible]		R$ 0,00	830	R$ 25.3[illegible]	86,13	R$ 2.63[illegible]	9 [illegible]
2.2	AR ENG.	CPU-01	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	191,79	R$32,92	R$6 313,40		R$ 0,0[illegible]		R$ 0,00	0	R$ [illegible]	191,79	R$ 6.31[illegible]	[illegible]
2.3	AR ENG.	[illegible]93	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	178,74	R$22,63	R$4 044,42		R$ 0,0[illegible]		R$ 0,00	0	R$ [illegible]	178,74	R$ 4.04[illegible]	[illegible]
2.4	AR ENG.	[illegible]	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	136,94	R$14,11	R$1 932,22		R$ 0,0[illegible]		R$ 0,00	0	R$ [illegible]	136,94	R$ 1.932[illegible]	[illegible]
2.5	AR ENG.	[illegible]	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA	M2	136,94	R$35,78	R$4 899,31		R$ 0,0[illegible]		R$ 0,00	0	R$ [illegible]	136,94	R$ 4.899[illegible]	[illegible]
2.6	AR ENG.	[illegible]	REMOÇÃO DE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	M	4,15	R$5,15	R$21,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ [illegible]	4,15	R$ 21[illegible]	[illegible]
2.7	AR ENG.	[illegible]22	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO, SEM REAPROVEITAMENTO (MURO)	M2	63,42	R$54,42	R$3 451,32	63,42	R$ 3.451,32		R$ 0,00	63,42	R$ 3.451,[illegible]	0,00	R$ 0,[illegible]	100%
2.8	AR ENG.	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	156,63	R$5,04	R$789,42	125	R$ 630,00		R$ 0,00	125	R$ 630,[illegible]	31,63	R$ 159[illegible]	80%
2.9	[illegible]	97914	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 14 KM	M3XM	783,15	R$1,56	R$1 221,71	604	R$ 936,00		R$ 0,00	604	R$ 936,[illegible]	183,15	R$ 285,[illegible]	[illegible]
2.10	AR ENG.	CPU-6	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	7,76	R$7,56	R$58,67	7,76	R$ 58,67		R$ 0,00	7,76	R$ [illegible]	0,00	R$ 0,[illegible]	100%
2.10	AR ENG.	CPU-7	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	R$295,67	R$1.330,52	4,5	R$ 1.330,52		R$ 0,00	4,5	R$ 1.330,5[illegible]	0,00	R$ [illegible]	100%
3	**INFRAESTRUTURA**					**SUBTOTAL**	**R$5.163,76**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 5.163,76***	***0 %***
3.1	AR ENG.	CPU-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES, ATÉ 1,50M	M3	6,54	R$54,57	R$356,89		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,54	R$ 356,89	0%
3.2	AR ENG.	CPU-13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COMAÇO DE 30KG	M2	10,94	R$30,89	R$337,94		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,94	R$ 337,94	0%
3.3	AR ENG.	94962	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M3	0,33	R$294,27	R$97,11		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,33	R$ 97,11	0%
3.4	AR ENG.	96995	ATERRO MANUAL DA CAIXA DA OBRA	M3	1,36	R$49,38	R$67,16		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,36	R$ 67,16	0%
3.5	AR ENG.	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	17,32	R$61,45	R$1 064,31		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	17,32	R$ 1 064,31	0%
3.6	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	109,27	R$10,88	R$1 188,86		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	109,27	R$ 1 188,86	0%
3.7	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	13,50	R$13,84	R$186,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	13,50	R$ 186,84	0%
3.8	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	M3	2,17	R$341,83	R$741,73		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,17	R$ 741,73	0%
3.9	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	2,17	R$201,87	R$438,06		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,17	R$ 438,06	0%
3.10	AR ENG.	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM EMULSÃO ASFALTICA	M2	26,91	R$25,45	R$684,86		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	26,91	R$ 684,86	0%
4	**SUPERESTRUTURA**					**SUBTOTAL**	**R$6.385,69**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 6.385,69***	***0 %***
4.1	AR ENG.	CPU-14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCURAMENTO	M2	34,87	R$77,95	R$2 718,12		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	34,87	R$ 2.718,12	0%
4.2	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	157,40	R$10,88	R$1 712,51		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	157,40	R$ 1.712,51	0%
4.3	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	48,46	R$13,84	R$670,69		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	48,46	R$ 670,69	0%
4.4	AR ENG.	94965	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK= 25,0 MPA	M3	2,25	R$368,96	R$830,16		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,25	R$ 830,16	0%
4.5	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	2,25	R$201,87	R$454,21		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,25	R$ 454,21	0%
5	**VEDAÇÃO**					**SUBTOTAL**	**R$3.353,54**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 3.353,54***	***0 %***
5.1	AR ENG.	CPU-43	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X 19X9CM, E=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 12MM	M2	76,48	R$42,36	R$3 235,10		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	76,48	R$ 3.235,10	0%
5.2	AR ENG.	93182	VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO P/ 10X20CM	M	3,00	R$39,48	R$118,44		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 118,44	0%
6	**ESQUADRIA DE MADEIRA**					**SUBTOTAL**	**R$41.628,68**		***R$ 11.531,41***		***R$ 0,00***		***R$ 11.531,41***		***R$ 30.097,27***	***28 %***
6.1	AR ENG.	CPU-18	PORTA EM MADEIRA DE FEL ALMOFADADA, 60 X 1,60 M, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FECHADURA	UN	10,00	R$1.002,78	R$10.027,77	4	R$ 4.010,91		R$ 0,00	4	R$ 4.010,91	6,00	R$ 6.016,86	[illegible]
6.2	AR ENG.	CPU-44	PORTA EM MADEIRA DE FEL ALMOFADADA, 80 X 1,60 M, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FECHADURA	UN	2,00	R$1.119,30	R$2 238,59	4	R$ 4.477,18		R$ 0,00	4	R$ 4.477,18	-2,00	-R$ 2.238,59	2[illegible]
6.3	AR ENG.	CPU-45	PORTA EM MADEIRA DE FEL ALMOFADADA, 60 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	5,00	R$897,87	R$4 489,37		R$ 0,00		R$ 0,00	1	R$ 0,00	5,00	R$ 4.489,37	[illegible]
6.4	AR ENG.	CPU-46	PORTA EM MADEIRA DE FEL ALMOFADADA, 70 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	3,00	R$915,29	R$2 745,88		R$ 0,00		R$ 0,00	1	R$ 0,00	3,00	R$ 2.745,88	[illegible]
6.5	AR ENG.	CPU-47	PORTA EM MADEIRA DE FEL ALMOFADADA, 70 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	21,00	R$1.014,44	R$21.303,30	1	R$ 3.043,33		R$ 0,00	3	R$ 3.043,33	18,00	R$ 18.259,97	1[illegible]
6.6	AR ENG.	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	12,00	R$69,69	R$824,27		R$ 0,00		R$ 0,00	12	R$ 0,00	12,00	R$ 824,27	[illegible]
7	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**					**SUBTOTAL**	**R$18.342,88**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 18.342,88***	***0 %***
7.1	AR ENG.	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BAITENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	M2	65,59	R$162,33	R$10.647,22		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	65,59	R$ 10.647,22	[illegible]
7.2	AR ENG.	CPU-20	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TIPO FANTASIA, FOSCO/MISTA	M2	10,58	R$328,61	R$3.476,69		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,58	R$ 3.476,69	[illegible]
7.3	AR ENG.	CPU-48	PORTA TIPO GRADIL EM PERFIL DE METALON GALVANIZADO COM SEÇÃO 20X20 MM (SANITÁRIOS)	M2	5,04	R$241,86	R$1 218,97		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,04	R$ 1.218,97	[illegible]
8	**COBERTURA**					**SUBTOTAL**	**R$31.212,47**		**R$ 0,00**		***R$ 0,00***		***R$ [illegible]***		***R$ 31.212,47***	***0 %***
8.1	AR ENG.	CPU-24	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCA EM PERFIL U ENRIJECIDO 150X60X20	M	99,43	R$253,38	R$2 [illegible]		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ [illegible]		R$ 2.523,7[illegible]	[illegible]

José Flávio [illegible] de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 276780

[illegible] Luiz [illegible] Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95 300

8.2	AR ENG.	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMO ACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	136,94	R$201,09	R$27 536,59		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	136,94	R$ 27.536,59	0%
8.3	AR ENG.	CPU-49	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEIRA METÁLICA PARA TELHA TERMOAC	M	11,80	R$76,22	R$899,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	11,80	R$ 899,37	0%
8.4	AR ENG.	94231	RUFO METÁLICO, L=25 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,92	R$41,47	R$452,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,92	R$ 452,80	0%
9	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**SUBTOTAL**	**R$34.247,83**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 34.247,83***	***0%***
9.1	AR ENG.	89682	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R$19,64	R$176,76		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	9,00	R$ 176,76	0%
9.2	AR ENG.	89495	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X40 MM	UN	4,00	R$7,13	R$28,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 28,52	0%
9.3	AR ENG.	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 35X50 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$171,79	R$858,95		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 858,95	0%
9.4	AR ENG.	86904	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSO, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$100,00	R$200,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 200,00	0%
9.5	[illegible]	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R$195,62	R$1.956,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R$ 1.956,20	0%
9.6	[illegible]	[illegible]	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$36,86	R$184,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 184,30	0%
9.7	AR ENG.	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA DE 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO OU CUBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$42,94	R$429,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R$ 429,40	0%
9.8	AR ENG.	[illegible]	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R$8,66	R$86,60		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R$ 86,60	0%
9.9	AR ENG.	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R$12,42	R$124,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R$ 124,20	0%
9.10	AR ENG.	95470	BACIA SIFONADA DE LOUÇA COM ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R$149,99	R$2 399,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 2.399,84	0%
9.11	AR ENG.	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	16,00	R$29,91	R$478,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 478,56	0%
9.12	AR ENG.	95544	PAPELEIRA DE METAL DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R$27,69	R$443,04		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 443,04	0%
9.13	AR ENG.	CPU-25	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40MM, INCLUSIVE TUBO DE DESCIDA COM JOELHO	UN	16,00	R$422,83	R$6.765,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 6.765,28	0%
9.14	AR ENG	100858	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACARAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$437,33	R$1.312,05		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 1.312,03	0%
9.15	AR ENG	95547	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$60,96	R$243,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 243,84	0%
9.16	AR ENG.	CPU-26	DISPENSER PARA TOALHAS INTERFOLHADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$66,54	R$266,16		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 266,16	0%
9.17	AR ENG	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$62,82	R$251,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 251,28	0%
9.18	AR ENG	100869	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PCD EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38 MM	UN	4,00	R$217,82	R$871,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 871,28	0%
9.19	AR ENG	CPU-27	BANCADA DE GRANITO, LARG.= 60	M2	17,69	R$291,24	R$5.152,04		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	17,69	R$ 5.152,04	0%
9.20	AR ENG.	CPU-28	PONTO DE ÁGUA FRIA	UN	16,00	R$120,16	R$1.922,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 1.922,56	0%
9.21	AR ENG	CPU-29	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM	UN	16,00	R$88,23	R$1.411,68		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 1.411,68	0%
9.22	AR ENG	CPU-30	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM	UN	16,00	R$127,30	R$2.036,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 2.036,80	0%
9.23	AR ENG.	89495	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X40 MM	UN	12,00	R$7,13	R$85,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	12,00	R$ 85,56	0%
9.24	AR ENG	89353	REGISTRO DE GAVETA - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$33,57	R$134,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 134,28	0%
9.25	AR ENG	CPU-31	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS	UN	5,00	R$1.285,73	R$6 428,65		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 6.428,65	0%
10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**SUBTOTAL**	**R$50.036,52**		***R$ 39.491,72***		***R$ 0,00***		***R$ 39.491,72***		***R$ 10.544,80***	***79%***
10.1	AR ENG	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$327,74	R$327,74		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	R$ 327,74	0%
10.2	AR ENG.	CPU-33	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA, 200X200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$97,31	R$97,31		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	R$ 97,31	0%
10.3	AR ENG	101890	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 15 A, EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	12,00	R$12,13	R$145,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	12,00	R$ 145,56	0%
10.4	AR ENG	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$69,96	R$69,96		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	R$ 69,96	0%
10.5	AR ENG.	96985	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE COBRE COOPERWELD 5/8X2,40M, COM CONECTOR	UN	3,00	R$51,91	R$155,73		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 155,73	0%
10.6	AR ENG.	CPU-34	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PLÁSTICO, COM BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	97,00	R$9,57	R$928,29	80	R$ 765,60		R$ 0,00	80	R$ 765,60	17,00	R$ 162,69	83%
10.7	AR ENG.	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	97,00	R$19,95	R$1.935,15	80	R$ 1.596,00		R$ 0,00	80	R$ 1.596,00	17,00	R$ 339,15	82%
10.8	AR ENG.	CPU-35	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	97,00	R$320,96	R$31 133,12	80	R$ 25 676,80		R$ 0,00	80	R$ 25.676,80	17,00	R$ 5.456,32	82%
10.9	AR ENG.	CPU-50	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN	11,00	R$274,06	R$3.014,66	7	R$ 1.918,42		R$ 0,00	7	R$ 1.918,42	4,00	R$ 1.096,24	64%
10.10	AR ENG.	CPU-36	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	UN	20,00	R$272,51	R$5.450,20	15	R$ 4.087,65		R$ 0,00	15	R$ 4.087,65	5,00	R$ 1.362,55	75%
10.11	AR ENG	95141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	56,00	R$121,05	R$6.778,80	45	R$ 5.447,25		R$ 0,00	45	R$ 5.447,25	11,00	R$ 1.331,55	80%
11	**FORRO DE PVC**					**SUBTOTAL**	**R$3.749,41**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 3.749,41***	***0%***
11.1	AR ENG.	96111	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC), INSTALADO	M2	56,93	R$65,86	R$3.749,41		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	56,93	R$ 3.749,41	0%
12	**REVESTIMENTO DE FORRO E PAREDES**					**SUBTOTAL**	**R$35.275,37**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 35.275,37***	***0%***
12.1	AR ENG	87873	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	331,69	R$4,17	R$1.383,15		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	331,69	R$ 1.383,15	0%
12.2	AR ENG	90408	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	152,95	R$32,51	R$4.972,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	152,95	R$ 4.972,40	0%
12.3	AR ENG	87531	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	299,47	R$30,36	R$9 091,91		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	299,47	R$ 9.091,91	0%
12.4	AR ENG.	87274	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA 33X45 CM, JUNTA A PRUMO, COM CIMENTO COLANTE	M2	299,47	R$66,21	R$19 827,91		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	299,47	R$ 19.827,91	0%
13	**PISOS**					**SUBTOTAL**	**R$100.847,67**		***R$ 52.007,19***		***R$ 0,00***		***R$ 52.007,19***		***R$ 48.840,48***	***52%***
13.1	AR ENG	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6, SCM AF_06/2014	M2	1 107,92	R$39,94	R$44.250,32		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	100%

José Flávio [illegible] de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

André Luís P. S. Oliveira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

13.2	AR ENG	CPU-37	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM ARGAMASSA TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2.5CM	M2	87,63	R$28,37	R$2.486,06	87,63	R$ 2.486,06		R$ 0,00	87,63	R$ 2.486,06	0,00	R$ 0,00	100%
13.3	AR ENG	93391	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA TIPO A, 42X42 CM, COM CIMENTO COLANTE	M2	87,63	R$30,04	R$2.632,41		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	87,63	R$ 2.632,41	0%
13.4	AR ENG.	CPU-51	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	22,04	R$114,29	R$2.518,95		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	22,04	R$ 2.518,95	0%
13.5	AR ENG.	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, AF_09/2020	M2	1.020,29	R$36,66	R$37.403,83	80	R$ 2.932,80		R$ 0,00	80	R$ 2.932,80	940,29	R$ 34.471,03	8%
13.6	AR ENG.	101741	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, 10 CM	M	472,30	R$23,38	R$11.042,37	100	R$ 2.338,00		R$ 0,00	100	R$ 2.338,00	372,30	R$ 8.704,37	21%
13.7	AR ENG.	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	13,14	R$6,25	R$82,13		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	13,14	R$ 82,13	0%
13.8	AR ENG.	98689	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA DE GRANITO, L=15CM	M	6,28	R$68,73	R$431,60		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,28	R$ 431,60	0%
14	**PINTURA**						**SUBTOTAL**		**R$44.678,73**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 44.678,73***	***0%***
14.1	AR ENG.	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 1 DEMÃO, MASSA PVA	M2	256,05	R$14,22	R$3.641,03		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	256,05	R$ 3.641,03	0%
14.2	AR ENG.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	M2	1.030,98	R$11,74	R$12.103,71		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.030,98	R$ 12.103,71	0%
14.3	AR ENG.	88485	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	225,03	R$16,90	R$3.803,01		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	225,03	R$ 3.803,01	0%
14.4	AR ENG.	93628	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	2.250,34	R$9,95	R$22.390,88		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2.250,34	R$ 22.390,88	0%
14.5	AR ENG.	102219	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M2	157,30	R$15,08	R$2.372,08		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	157,30	R$ 2.372,08	0%
14.6	AR ENG.	CPU-39	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPÓXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MÍCRA	M2	10,08	R$11,12	R$112,09		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,08	R$ 112,09	0%
14.7	AR ENG.	100716	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	10,08	R$25,39	R$255,93		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,08	R$ 255,93	0%
15	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**SUBTOTAL**		**R$42.023,26**							
15.1	**RAMPA DE ACESSO**								**R$3.871,40**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 3.871,40***	***0%***
15.1.1	AR ENG.	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	1,50	R$61,45	R$92,18		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,50	R$ 92,18	0%
15.1.2	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	M3	6,05	R$341,81	R$2.067,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,05	R$ 2.067,95	0%
15.1.3	AR ENG.	92873	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M3	6,08	R$201,87	R$1.227,37		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,08	R$ 1.227,37	0%
15.1.4	AR ENG.	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2". EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	5,00	R$96,78	R$483,90		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 483,90	0%
15.2	**BANCO EM GRANITO (2 UN)**								**R$12.945,75**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 12.945,75***	***0%***
15.2.1	AR ENG.	CPU-52	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	15,75	R$209,61	R$3.301,39		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,75	R$ 3.301,39	0%
15.2.2	AR ENG.	90408	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	31,50	R$32,51	R$1.024,12		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	31,50	R$ 1.024,12	0%
15.2.3	AR ENG.	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	31,50	R$16,90	R$532,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	31,50	R$ 532,30	0%
15.2.4	AR ENG.	93623	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	31,50	R$9,95	R$313,36		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	31,50	R$ 313,36	0%
15.2.5	AR ENG.	CPU-53	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	17,50	R$444,26	R$7.774,58		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	17,50	R$ 7.774,58	0%
15.3	**ESCOVODROMO COM 5 TORNEIRA**								**R$2.867,56**		***R$ 253,87***		***R$ 0,00***		***R$ 253,87***	***R$ 2.613,69***	***9%***
15.3.1	AR ENG.	101159	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM)	M2	10,28	R$127,60	R$1.311,74		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,28	R$ 1.311,74	0%
15.3.2	AR ENG.	96995	ATERRO MANUAL DA CAIXA DA OBRA	M3	0,57	R$49,38	R$28,15	0,57	R$ 28,15		R$ 0,00	0,57	R$ 28,15	0,00	R$ 0,00	100%
15.3.3	AR ENG.	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM AF_06/2014	M2	1,44	R$39,94	R$57,51	1,44	R$ 57,51		R$ 0,00	1,44	R$ 57,51	0,00	R$ 0,00	100%
15.3.4	AR ENG.	87531	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	5,54	R$30,36	R$168,21	5,54	R$ 168,21		R$ 0,00	5,54	R$ 168,21	0,00	R$ 0,00	100%
15.3.5	AR ENG.	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	5,54	R$53,08	R$294,06		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,54	R$ 294,06	0%
15.3.6	AR ENG.	89495	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X40 MM	UN	2,00	R$7,13	R$14,26		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 14,26	0%
15.3.7	AR ENG.	86916	TORNEIRA DE PRESSÃO PLÁSTICA COMUM, USO GERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$36,56	R$182,78		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 182,78	0%
15.3.8	AR ENG.	CPU-28	PONTO DE ÁGUA FRIA	UN	5,00	R$120,16	R$600,82		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 600,82	0%
15.3.9	AR ENG.	CPU-29	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM	UN	2,00	R$88,23	R$176,46		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 176,46	0%
15.3.10	AR ENG.	89833	REGISTRO DE GAVETA - 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$33,57	R$33,57		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	R$ 33,57	0%
15.4	**CASA DE GÁS**								**R$3.421,89**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 3.421,89***	***0%***
15.4.1	AR ENG.	CPU-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES ATÉ 1,50M	M3	0,74	R$54,57	R$40,38		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,74	R$ 40,38	0%
15.4.2	AR ENG.	CPU-13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30KG	M2	1,86	R$30,89	R$57,45		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,86	R$ 57,45	0%
15.4.3	AR ENG.	94962	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M3	0,06	R$294,27	R$17,66		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,06	R$ 17,66	0%
15.4.4	AR ENG.	CPU-14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	2,53	R$77,95	R$197,22		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,53	R$ 197,22	0%
15.4.5	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	31,25	R$10,88	R$339,93		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	31,25	R$ 339,93	0%
15.4.6	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	6,84	R$13,84	R$94,65		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,84	R$ 94,65	0%
15.4.7	AR ENG.	94965	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=25,0 MPA	M3	0,37	R$368,96	R$136,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,37	R$ 136,52	0%
15.4.8	AR ENG.	92875	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	0,37	R$201,87	R$74,69		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,37	R$ 74,69	0%
15.4.9	AR ENG.	CPU-15	LAJE PRÉ-MOLDADA DE FORRO, E=8 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO E CAPEAMENTO	M2	2,40	R$49,52	R$118,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,40	R$ 118,84	0%
15.4.10	AR ENG.	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	6,82	R$25,45	R$173,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,82	R$ 173,56	0%
15.4.11	AR ENG.	CPU-16	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X30CM, E=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 12MM	M2	8,06	R$36,25	R$292,21		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,06	R$ 292,21	0%
15.4.12	AR ENG.	87873	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	19,99	R$4,17	R$83,38		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	19,99	R$ 83,38	0%

José Flávio Lima de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

15.4.13	AR ENG.	90408	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	19,99	R$32,51	R$649,91		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	19,99	R$ 649,91	0%
15.4.14	AR ENG.	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO I:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNI BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPE AF_06/2014	CM. M2	1,47	R$39,94	R$58,71		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,47	R$ 58,71	0%
15.4.15	AR ENG.	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	1,47	R$30,12	R$44,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,47	R$ 44,28	0%
15.4.16	AR ENG.	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 1 DEMÃO, MASSA PVA	M2	19,99	R$14,22	R$284,19		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	19,99	R$ 284,19	0%
15.4.17	AR ENG.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	M2	19,99	R$11,74	R$234,74		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	19,99	R$ 234,74	0%
15.4.18	AR ENG.	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3,57	R$25,39	R$90,63		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,57	R$ 90,63	0%
15.4.19	AR ENG.	CPU-48	PORTA TIPO GRADE EM PERFIL DE METALON GALVANIZADO COM SEÇÃO 20X20 MM (PANTAREIRA)	M2	1,79	R$241,86	R$432,94		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,79	R$ 432,94	0%
15.5	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**R$18.916,66**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 18.916,66***	***0%***
15.1	AR ENG.	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	299,47	R$3,31	R$991,91		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	299,47	R$ 991,91	0%
15.2	AR ENG.	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICOS	M2	87,63	R$10,31	R$903,85		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	87,63	R$ 903,85	0%
15.3	AR ENG.	CPU-39	LIMPEZA DE VIDROS	M2	81,21	R$12,87	R$1.045,46		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	81,21	R$ 1.045,46	0%
15.4	AR ENG.	CPU-40	LIMPEZA GERAL	M2	1.107,92	R$14,42	R$15.975,44		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.107,92	R$ 15.975,44	0%
TOTAL							**R$521.251,92**	**TOTAL ACUMULADO ANTERIOR**		**TOTAL ATUAL**		**TOTAL ACUMULADO**		**SALDO TOTAL**		**(%)**
									162.725,70		**0,00**		**162.725,70**		**R$ 358.526,22**	**31%**
QUINHENTOS E VINTE E UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS																

TOTAL GERAL	**R$1.579.246,07**
UM MILHÃO, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS	

BM	DATA	VALOR	(%)
1	20/11/2021	R$ 61.894,62	4%
2	20/12/2021	R$ 170.300,71	11%
3	25/01/2022	R$ 93.083,07	6%
4	25/04/2022	R$ 118.401,79	7%
5	25/05/2022	R$ 125.921,82	8%

COMISSÃO 183 SINAPA

Vitória da Conquista - BA, 02/05/2022 de abril de 2022.

AR Engenharia Eireli
CNPJ: 36.286.217/0001-57
André Luís Prates Rocha Moura
Engenheiro civil
CPF: [redacted]

André Luís P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.360

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

Relatório fotográfico BM 05

Modalidade: Tomada de preço

Contrato n°: 104-2021

Objeto: ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA - REFORMA E AMPLIAÇÃO (MÓDULO NOVO)

Contratante: Prefeitura Municipal

Contratada: Empresa AR Engenharia Eirelli

Cidade: José Gonçalves - Ba

Período de execução: 26/04/2022 à 25/05/2022

Número da medição: 05

Coordenadas geométricas: 14°43'41.6"S 40°43'35.3"W

André Luís P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

José Flávio Maffra de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

FOTO 01: ANTES – Área de circulação da área de ampliação

FOTO 02: DEPOIS – Area de circulação com as vigas baldrames impermeabilizadas

André Luís P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

José Flávio Maria de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

QUINTA COMISSÃO
Fls: 186
SINAPA

FOTO 04 – 5 salas construídas

FOTO 05 – 5 salas construídas e início da construção das 5 salas acima

André Luís P. R. Mouro
ENGENHEIRO
CREA-BA

José Flávio Maia de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

QUINTA COMISSÃO
Fls: 187
SINAPA

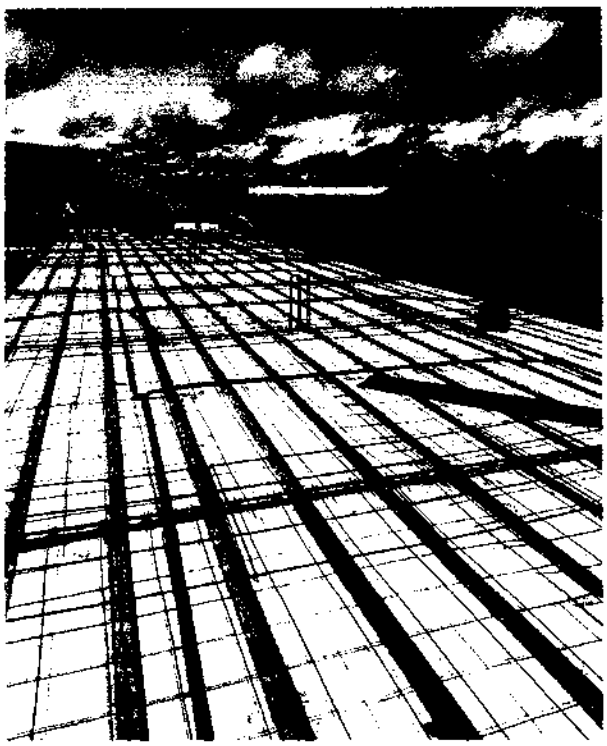

FOTO 06 – Laje armada para concretagem

FOTO 06 – Laje concretada

José Flávio Matta de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

QUINTA COMISSÃO
Fls: 188
SINAPA

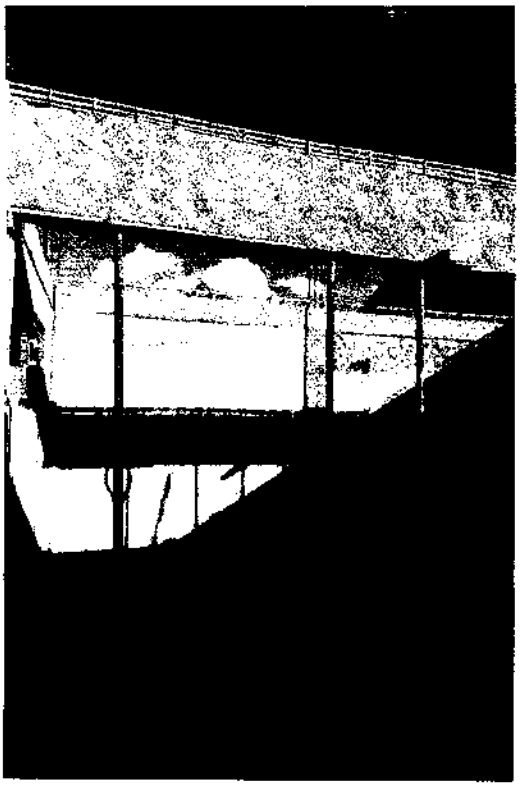

FOTO 07 – Vista anterior à concretagem da laje ANTES

FOTO 08 – Laje concretada e escorada DEPOIS

André Luís P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

QUINTA COMISSÃO
Fls: 189
SINDIPA

AR ENGENHARIA EIRELLI

CNPJ: 36.286.217/0001-57

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Codigo de Verificação para Autenticação: 9feb844032ec19f1eae817d65f0dd853

Gerado em 04/07/2022 09:15:26

Data de Emissão	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Série	Nº da Nota Fiscal
04/07/2022		Tributação Normal		PADRAO	202200000000018

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Retido na Fonte	Optante	No Município (2933307 - Vitória da Conquista - BA)

PRESTADOR

Razão Social: AR ENGENHARIA EIRELI
Nome Fantasia: AR ENGENHARIA EIRELI
Endereço: AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, 450, D ANDAR 1 SALA 3 - FELICIA
VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45055-155
E-mail: andrerochadiretor@gmail.com - Fone: (77)9109-9040 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 589872 - CPF/CNPJ: 36.286.217/0001-57

QUINTA COMISSÃO
Fls: 190
SINDUSCON

TOMADOR

Razão Social: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Endereço: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1842 , - CANDEIAS
VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45000-000
E-mail: - Fone: (77)3429-7750 - Celular:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 2009214 - CPF/CNPJ: 06.071.702/0001-42

SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concr

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA EM VITÓRIA DA CONQUISTA.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO BRADESCO
AG: 270
CONTA CORRENTE: 421028-0
PIX: 36.286.217/0001-57

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESC. INCO. (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
111.954,49	0,00	0,00	111.954,49	3,9000	4.366,23

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTOS DIVERSOS (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.588,26

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTA NOTA ESTÁ COM STATUS DE RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

AR ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 36.286.217/0001-57
AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, 450 D - SL 3
ANDAR 1 FELÍCIA, CEP: 45055-155 VIT. DA CONQUISTA
TEL: (77) 9 9109-9040 andre.rocha.moura@hotmail.com

CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA - BA	INÍCIO DA OBRA: 15/10/2021
Nº CONTRATO: 104-2021	PERÍODO: 28/05/2022 À 28/06/2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.579.246,07	DATA DA EMISSÃO: 28/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI:	29,67%
Obra:	ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA - REFORMA E AMPLIAÇÃO (MÓDULO NOVO)	REF.:	SINAPI 03/2021
Local:	DISTRITO DE JOSÉ GONÇALVES - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA	DATA:	09/2021

BM 06	DATA	VALOR	PORCENTAGEM
	29/06/2022	R$ 111.954,49	7%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO UNID	CONTRATADO QUANT.	CONTRATADO PREÇO (COM BDI)	CONTRATADO VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR QUANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ATUAL QUANT.	ATUAL VALOR	ACUMULADO QUANT.	ACUMULADO VALOR	SALDO QUANT.	SALDO VALOR	EXECUTADO (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						SUBTOTAL R$85.239,72		R$ 27.664,42		R$ 4.595,94		R$ 32.260,36		R$ 22.979,36	58%
1.1	AR ENG.	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$164,42	R$11.838,24	56	R$ 9.207,52	6	R$ 986,52	62	R$ 10.194,04	10,00	R$ 1.644,20	86%
1.2	AR ENG.	2710	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00	R$13,99	R$18.466,80	660	R$ 9.234,00	110	R$ 1.539,00	770	R$ 10.773,00	550,00	R$ 7.693,80	58%
1.3	AR ENG.	10009	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$20,42	R$1.470,24	36	R$ 735,12	6	R$ 122,52	42	R$ 857,64	30,00	R$ 612,60	58%
1.4	AR ENG.	CPU	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	1,00	R$88,78	R$88,78	1	R$ 88,78		R$ 0,00	1	R$ 88,78	0,00	R$ 0,00	100%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						SUBTOTAL R$44.431,75		R$ 44.431,76		R$ 0,00		R$ 44.431,76		-R$ 0,01	100%
2.1	AR ENG.	CPU41	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO (SALAS EXISTENTES E CIRCULAÇÃO)	M2	749,06	R$20,37	R$15.261,35	249,66	R$ 5.087,35		R$ 0,00	249,66	R$ 5.087,35	0,00	R$ 0,00	100%
2.2	AR ENG.	CPU42	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	334,04	R$14,11	R$4.714,03	334,04	R$ 4.994,83		R$ 0,00	334,04	R$ 4.994,83	0,00	R$ 0,00	100%
2.3	AR ENG.	CPU43	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA	M2	354,04	R$35,28	R$12.667,86	354,04	R$ 12.667,86		R$ 0,00	354,04	R$ 12.667,86	0,00	R$ 0,00	100%
2.4	AR ENG.	CPU44	REMOÇÃO DE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	M	37,21	R$5,35	R$191,63	37,21	R$ 191,63		R$ 0,00	37,21	R$ 191,63	0,00	R$ 0,00	100%
2.5	AR ENG.	CPU45	RETIRADA DE PILARES DE MADEIRA, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO	UN	12,00	R$123,45	R$1.481,40	12	R$ 1.481,40		R$ 0,00	12	R$ 1.481,40	0,00	R$ 0,00	100%
2.6	AR ENG.	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	95,77	R$5,04	R$482,68	95,77	R$ 482,68		R$ 0,00	95,77	R$ 482,68	0,00	R$ 0,00	100%
2.7	AR ENG.	97914	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 14 KM	M3XKM	478,87	R$1,56	R$747,04	478,87	R$ 747,04		R$ 0,00	478,87	R$ 747,04	0,00	R$ 0,00	100%
2.8	AR ENG.	95210	DEMOLIÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2018	M2	25,41	R$447,45	R$11.369,70	25,41	R$ 11.369,70		R$ 0,00	25,41	R$ 11.369,70	0,00	R$ 0,00	100%
2.9	AR ENG.	CPU46	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	467,40	R$7,56	R$3.533,54	467,4	R$ 3.533,54		R$ 0,00	467,4	R$ 3.533,54	0,00	R$ 0,00	100%
2.10	AR ENG.	CPU47	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	R$293,67	R$1.321,52	4,5	R$ 1.321,52		R$ 0,00	4,5	R$ 1.321,52	0,00	R$ 0,00	100%
3	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						SUBTOTAL R$6.965,68		R$ 6.965,68		R$ 0,00		R$ 6.965,68		R$ 0,00	100%
3.1	AR ENG.	CPU48	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	788,33	R$0,86	R$366,26	788,33	R$ 366,26		R$ 0,00	788,33	R$ 366,26	0,00	R$ 0,00	100%
3.2	AR ENG.	CPU49	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	356,69	R$2,61	R$936,18	338,69	R$ 936,18		R$ 0,00	338,69	R$ 936,18	0,00	R$ 0,00	100%
3.3	AR ENG.	97918	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT= 5,0 KM (RUA FORA)	M3XKM	1.290,89	R$1,04	R$1.342,53	1290,89	R$ 1.342,53		R$ 0,00	1290,89	R$ 1.342,53	0,00	R$ 0,00	100%
3.4	AR ENG.	97916	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT= 14,0 KM (EMPRÉSTIMO)	M3XKM	2.510,83	R$1,04	R$2.611,26	2510,83	R$ 2.611,26		R$ 0,00	2510,83	R$ 2.611,26	0,00	R$ 0,00	100%
3.5	AR ENG.	CPU50	ESPALHAMENTO DE MATERIAL TERROSO	M3	358,69	R$0,31	R$111,19	358,69	R$ 111,19		R$ 0,00	358,69	R$ 111,19	0,00	R$ 0,00	100%
3.6	AR ENG.	CPU51	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M3	358,69	R$4,40	R$1.578,24	358,69	R$ 1.578,24		R$ 0,00	358,69	R$ 1.578,24	0,00	R$ 0,00	100%
4	INFRAESTRUTURA						SUBTOTAL R$80.011,34		R$ 80.011,34		R$ 0,00		R$ 80.011,34		R$ 0,01	100%
4.1	AR ENG.	CPU52	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DE FUNDAÇÕES, ATÉ 1,50M	M3	125,74	R$54,97	R$6.911,62	125,74	R$ 6.911,62		R$ 0,00	125,74	R$ 6.911,62	0,00	R$ 0,00	100%
4.2	AR ENG.	93358	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM ÁREA DE 100 A 150 M²	M2	163,62	R$30,99	R$5.070,40	163,62	R$ 5.070,40		R$ 0,00	163,62	R$ 5.070,40	0,00	R$ 0,00	100%
4.3	AR ENG.	96995	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M3	4,91	R$294,97	R$1.448,57	4,91	R$ 1.448,57		R$ 0,00	4,91	R$ 1.448,57	0,00	R$ 0,00	100%
4.4	AR ENG.	96995	ATERRO MANUAL DA CAIXA DA OBRA	M3	71,69	R$49,78	R$3.535,61	71,69	R$ 3.535,61		R$ 0,00	71,69	R$ 3.535,61	0,00	R$ 0,00	100%
4.5	AR ENG.	96536	FORMA TABUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	63,91	R$49,27	R$3.927,27	63,91	R$ 3.927,27		R$ 0,00	63,91	R$ 3.927,27	0,00	R$ 0,00	100%
4.6	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	2.116,23	R$10,89	R$23.024,53	2116,23	R$ 23.024,53		R$ 0,00	2116,23	R$ 23.024,53	0,00	R$ 0,00	100%
4.7	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	116,76	R$15,52	R$1.811,96	116,76	R$ 1.811,96		R$ 0,00	116,76	R$ 1.811,96	0,00	R$ 0,00	100%
4.8	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	M3	52,64	R$341,81	R$17.992,98	52,64	R$ 17.992,98		R$ 0,00	52,64	R$ 17.992,98	0,00	R$ 0,00	100%
4.9	AR ENG.	92673	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	52,64	R$201,87	R$10.626,44	52,64	R$ 10.626,44		R$ 0,00	52,64	R$ 10.626,44	0,00	R$ 0,00	100%
4.10	AR ENG.	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	252,03	R$23,45	R$5.911,71	252,03	R$ 5.911,71		R$ 0,00	252,03	R$ 5.911,71	0,00	R$ 0,00	100%
5	SUPERESTRUTURA						SUBTOTAL R$106.627,19		R$ 61.292,12		R$ 5.136,23		R$ 66.428,35		R$ 40.198,84	62%
5.1	AR ENG.	CPU54	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03 USOS INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	173,49	R$77,65	R$13.527,55	140	R$ 10.913,60	20	R$ 1.559,00	160	R$ 12.472,60	13,49	R$ 1.054,95	92%
5.2	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	1.989,69	R$10,38	R$20.647,83	1590	R$ 17.396,20	200	R$ 2.170,96	1790	R$ 19.475,20	199,69	R$ 1.172,63	90%
5.3	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	575,20	R$15,54	R$7.904,77	470	R$ 6.504,50	60	R$ 830,40	530	R$ 7.335,20	45,20	R$ 625,57	92%
5.4	AR ENG.	94965	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=25,0 MPA	M3	27,45	R$356,96	R$10.349,81	24	R$ 8.355,04	1	R$ 306,96	25	R$ 9.226,00	2,45	R$ 1.095,81	89%
5.5	AR ENG.	92673	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	27,45	R$201,87	R$5.540,30	24	R$ 4.844,88	1	R$ 201,87	25	R$ 5.046,75	2,45	R$ 599,55	89%
5.6	AR ENG.	CPU55	LAJE PRÉ-MOLDADA DE FORRO, E=8 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO E CAPEAMENTO	M2	303,24	R$45,32	R$13.616,04	260	R$ 12.815,20	0	R$ 0,00	260	R$ 12.815,20	43,24	R$ 2.141,24	86%
5.7	LAJE MACIÇA DE CONCRETO, E=0,10M						R$22.714,32		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 22.714,32	0%
5.7.1	AR ENG.	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 25 MM. AF 09/2020	M2	135,81	R$28,12	R$3.818,96		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	135,81	R$ 3.818,96	0%
5.7.2	AR ENG.	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.098,97	R$12,59	R$13.830,85		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.098,97	R$ 13.830,85	0%
5.7.3	AR ENG.	94459	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇAL. AF 10/2015	M3	9,24	R$554,43	R$5.068,49		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	11,58	R$ 5.068,49	0%

José Flávio Machado de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

André Luis P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA Nº 390

André Luis P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL

5.8	RAMPA DE CONCRETO						R$9.798,17		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 9.798,17	0%
5.8.1	AR ENG.	92767	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 15 MM. AF_09/2020	M2	40,35	R$26,12	R$1.054,48		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	40,35	R$ 2.259,86	0%
5.8.2	AR ENG.	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	360,63	R$13,36	R$4.532,78		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	360,63	R$ 4.532,78	0%
5.8.3	AR ENG.	99829	CONCRETAGEM DE SUPERFÍCIES (PAREDES E LAJES) PLANAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015	M2	8,03	R$374,41	R$3.006,51		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,03	R$ 3.006,51	0%
6	VEDAÇÃO						SUBTOTAL	R$57.116,83	R$ 27.940,35		R$ 13.051,51		R$ 40.991,86		R$ 16.132,87	72%
6.1	AR ENG.	CPU-16	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, E=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 12MM	M2	1.081,87	R$26,25	R$28.226,69	640	R$ 21.302,66	240	R$ 13.051,51	1000	R$ 36.254,20	81,87	R$ 2.906,69	92%
6.2	AR ENG.	CPU-17	COBOGÓ CERÂMICO DE PADRÃO VAZADO, 09X26X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA	M2	125,72	R$104,73	R$13.166,18		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	125,72	R$ 13.166,18	0%
6.3	AR ENG.	92182	VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO DE 10X20 CM	M	119,10	R$36,48	R$4.344,76	120	R$ 4.737,69	120	R$ 0,00	120	R$ 4.737,69	-0,90	R$ 0,00	100%
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA						SUBTOTAL	R$25.496,64	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 25.496,64	0%
7.1	AR ENG.	CPU-18	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 1,60 M, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FERRADURA	UN	6,00	R$1.002,93	R$6.016,38		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 6.016,38	0%
7.2	AR ENG.	CPU-19	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	19,00	R$999,97	R$18.999,43		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	19,00	R$ 18.999,43	0%
7.3	AR ENG.	100319	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	7,00	R$68,63	R$480,83		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	7,00	R$ 480,83	0%
8	ESQUADRIAS METÁLICAS						SUBTOTAL	R$13.838,11	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 13.838,11	0%
8.1	AR ENG.	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	63,00	R$162,33	R$10.226,82		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	63,00	R$ 10.226,82	0%
8.2	AR ENG.	CPU-20	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TIPO FANTASIA, PADRONIZADA	M2	3,90	R$328,63	R$1.281,57		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,90	R$ 1.281,57	0%
8.3	AR ENG.	CPU-21	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS	M2	3,15	R$739,59	R$2.329,72		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,15	R$ 2.329,72	0%
9	COBERTURA						SUBTOTAL	R$209.163,66	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 209.163,66	0%
9.1	AR ENG.	CPU-22	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIGA TRELIÇADA DE AÇO, VÃO DE 12,60 M, INCLUSO ICAMENTO.	UN	5,00	R$1.937,07	R$9.685,35		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 9.685,35	0%
9.2	AR ENG.	CPU-23	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIGA TRELIÇADA DE AÇO, VÃO DE 6,50 M, INCLUSO ICAMENTO.	UN	5,00	R$1.092,60	R$5.463,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 5.463,00	0%
9.3	AR ENG.	CPU-24	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TÔRCA EM PERFIL U ENRIJECIDO 150X60X20	M	553,27	R$23,39	R$12.937,52		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	553,27	R$ 12.937,52	0%
9.4	AR ENG.	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMO ACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO	M2	900,29	R$201,09	R$181.121,32		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	900,29	R$ 181.121,32	0%
9.5	AR ENG.	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,15	R$53,52	R$329,17		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,15	R$ 329,17	0%
9.6	AR ENG.	94231	RUFO METÁLICO, L=25 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	64,56	R$41,97	R$2.677,30		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	64,56	R$ 2.677,30	0%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						SUBTOTAL	R$12.860,06	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 12.860,06	0%
10.1	AR ENG.	89482	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$19,64	R$39,28		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 39,28	0%
10.2	AR ENG.	86904	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSO, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$100,14	R$200,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 200,00	0%
10.3	AR ENG.	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$108,02	R$432,08		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 432,08	0%
10.4	AR ENG.	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA DE 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO OU CUBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$42,94	R$257,64		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 257,64	0%
10.5	AR ENG.	89989	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$8,66	R$51,96		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 51,96	0%
10.6	AR ENG.	89883	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$12,42	R$74,52		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 74,52	0%
10.7	AR ENG.	95470	BACIA SIFONADA DE LOUÇA COM ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$140,99	R$704,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 704,95	0%
10.8	AR ENG.	100649	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R$29,91	R$239,28		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,00	R$ 239,28	0%
10.9	AR ENG.	95544	PAPELEIRA DE METAL DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$27,69	R$221,52		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,00	R$ 221,52	0%
10.10	AR ENG.	CPU-25	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA COM REGISTRO ACOPLADO DE 1" OU 40MM, INCLUSIVE TUBO DE DESCIDA COM OBLÍQUO	UN	3,00	R$422,85	R$1.340,64		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 1.340,64	0%
10.11	AR ENG.	95547	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$60,96	R$121,92		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 121,92	0%
10.12	AR ENG.	CPU-26	DISPENSER PARA TOALHAS INTERFOLHADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$66,54	R$133,08		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 133,08	0%
10.13	AR ENG.	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$62,92	R$125,84		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 125,84	0%
10.14	AR ENG.	100859	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 80 CM	UN	4,00	R$217,82	R$871,28		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 871,28	0%
10.15	AR ENG.	CPU-27	BANCADA DE GRANITO, LARG=60	M2	1,92	R$285,84	R$549,18		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,92	R$ 549,18	0%
10.16	AR ENG.	CPU-28	PONTO DE ÁGUA FRIA	UN	6,00	R$120,16	R$720,96		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 720,96	0%
10.17	AR ENG.	CPU-29	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM	UN	6,00	R$88,21	R$529,26		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 529,26	0%
10.18	AR ENG.	CPU-30	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM	UN	6,00	R$129,36	R$1.018,68		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 529,26	0%
10.19	AR ENG.	89495	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X40 MM	UN	6,00	R$7,13	R$42,78		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00	R$ 42,78	0%
10.20	AR ENG.	89853	REGISTRO DE GAVETA - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$33,57	R$67,14		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 67,14	0%
10.21	AR ENG.	CPU-31	CAIXA D' ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 1.500 LITROS	UN	2,00	R$1.285,73	R$2.571,46		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 2.571,46	0%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						SUBTOTAL	R$51.880,17	R$ 9.597,58		R$ 18.565,99		R$ 28.163,40		R$ 23.716,77	54%
11.1	AR ENG.	CPU-32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ, EMBUTIR, 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$161,85	R$323,70		R$ 9,00	1	R$ 161,85	1	R$ 161,85	1,00	R$ 161,85	50%
11.2	AR ENG.	CPU-33	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA, 200X200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$97,31	R$194,62		R$ 0,00	1	R$ 97,31	1	R$ 97,31	1,00	R$ 97,31	50%
11.3	AR ENG.	101960	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 15 A, EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	12,00	R$12,13	R$145,56		R$ 0,00	6	R$ 72,78	6	R$ 72,78	6,00	R$ 72,78	50%
11.4	AR ENG.	96985	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE COBRE COOPERWELD 5/8X2,40M, COM CONECTOR	UN	3,00	R$51,91	R$155,73		R$ 0,00	1	R$ 51,91	1	R$ 51,91	2,00	R$ 103,82	33%
11.5	AR ENG.	CPU-34	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PLÁSTICO, COM BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	112,00	R$9,57	R$1.071,84		R$ 0,00	0	R$ 574,20	60	R$ 574,20	52,00	R$ 497,64	54%
11.6	AR ENG.	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	112,00	R$19,95	R$2.234,40		R$ 0,00	60	R$ 1.197,00	60	R$ 1.197,00	52,00	R$ 1.037,40	54%
11.7	AR ENG.	CPU-35	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO D 3/4"	UN	112,00	R$19,95	R$2.234,40		R$ 0,00	60	R$ 1.197,00	60	R$ 1.197,00	52,00	R$ 1.037,40	54%
11.8	AR ENG.	CPU-36	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	50,00	R$35,13	R$175,10	5	R$ 175,10	5	R$ 175,10	0	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0%
11.9	AR ENG.	CPU-37	PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.10	AR ENG.	CPU-38	PONTO DE INTERRUPTOR 04 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.11	AR ENG.	CPU-39	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.12	AR ENG.	CPU-40	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.13	AR ENG.	CPU-41	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.14	AR ENG.	CPU-42	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.15	AR ENG.	CPU-43	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.16	AR ENG.	CPU-44	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.17	AR ENG.	CPU-45	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.18	AR ENG.	CPU-46	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.19	AR ENG.	CPU-47	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.20	AR ENG.	CPU-48	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.21	AR ENG.	CPU-49	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.22	AR ENG.	CPU-50	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.23	AR ENG.	CPU-51	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.24	AR ENG.	CPU-52	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.25	AR ENG.	CPU-53	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.26	AR ENG.	CPU-54	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.27	AR ENG.	CPU-55	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.28	AR ENG.	CPU-56	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.29	AR ENG.	CPU-57	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.30	AR ENG.	CPU-58	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.31	AR ENG.	CPU-59	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.32	AR ENG.	CPU-60	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.33	AR ENG.	CPU-61	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.34	AR ENG.	CPU-62	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.35	AR ENG.	CPU-63	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.36	AR ENG.	CPU-64	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.37	AR ENG.	CPU-65	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.38	AR ENG.	CPU-66	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.39	AR ENG.	CPU-67	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.40	AR ENG.	CPU-68	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.41	AR ENG.	CPU-69	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.42	AR ENG.	CPU-70	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.43	AR ENG.	CPU-71	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.44	AR ENG.	CPU-72	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.45	AR ENG.	CPU-73	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.46	AR ENG.	CPU-74	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.47	AR ENG.	CPU-75	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.48	AR ENG.	CPU-76	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.49	AR ENG.	CPU-77	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.50	AR ENG.	CPU-78	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.51	AR ENG.	CPU-79	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.52	AR ENG.	CPU-80	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,00	R$ 526,95	0%
11.53	AR ENG.	CPU-81	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FLEXÍVEL D 3/4"	UN	15,00	R$35,13	R$526,95		R$ 0,00

11.0	AR ENG.	95241	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A 250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	39,00	R$124,48	R$3.453,36	15	R$ 1.615,74	7	R$ 847,35	22	R$ 1.605,10	4,00	R$ 468,40	73%
12	**FORRO DE GESSO**																
12.1	AR ENG.	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	41,52	R$41,20	R$1.702,80		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 1.702,80	0%
13	**REVESTIMENTO DE FORRO E PAREDES**																
13.1	AR ENG.	87879	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	2.163,68	R$4,17	R$9.022,42	1490	R$ 6.213,30	660	R$ 2.502,00	1990	R$ 7.858,00	285,68	R$ 1.162,62	87%
13.2	AR ENG.	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE PACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	414,47	R$8,62	R$3.571,49	400	R$ 3.520,00	0	R$ 0,00	400	R$ 3.520,00	51,47	R$ 443,49	95%
13.3	AR ENG.	90408	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	2.034,54	R$32,51	R$66.157,52	1280	R$ 41.612,80	640	R$ 20.806,40	1680	R$ 62.419,20	354,54	R$ 3.738,32	94%
13.4	AR ENG.	87531	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, TRAÇO 1:2:8 PREPARO COM BETONEIRA	M2	162,96	R$30,36	R$4.946,27		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	162,96	R$ 4.946,27	0%
13.5	AR ENG.	87274	REVESTIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA 33X45 CM, JUNTA A PRUMO, COM CIMENTO COLANTE	M2	162,96	R$60,21	R$9.810,67		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	162,96	R$ 9.810,67	0%
14	**PISOS**																
14.1	AR ENG.	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5 CM. AF_06/2014	M2	1.211,38	R$39,94	R$48.381,33	687,25	R$ 27.460,77	800	R$ 31.964,00	1087,25	R$ 43.424,77	124,13	R$ 4.956,56	90%
14.2	AR ENG.	87627	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ESP. MÉDIA = 2,5 CM	M2	42,19	R$38,27	R$1.614,93		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	42,19	R$ 1.614,93	0%
14.3	AR ENG.	87251	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA TIPO A, 42X42 CM, PEI 5, EXCLUSO CIMENTO COLANTE	M2	42,19	R$30,04	R$1.267,39		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	42,19	R$ 1.267,39	0%
14.4	AR ENG.	104998	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	1.169,17	R$36,66	R$42.861,77		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.169,17	R$ 42.861,77	0%
14.5	AR ENG.	88650	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, 10 CM	M	351,00	R$23,38	R$8.205,13		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	365,00	R$ 8.535,13	0%
14.6	AR ENG.	99600	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA DE GRANITO, L=15CM	M	1,60	R$69,73	R$111,56		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,60	R$ 111,56	0%
15	**PINTURA**																
15.1	AR ENG.	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M2	1.090,00	R$16,22	R$25.409,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.090,00	R$ 15.409,80	0%
15.2	AR ENG.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	M2	1.557,32	R$11,74	R$18.282,96		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.557,32	R$ 18.282,96	0%
15.3	AR ENG.	88486	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	419,67	R$27,94	R$11.725,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	419,67	R$ 11.725,56	0%
15.4	AR ENG.	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	419,67	R$11,08	R$4.649,94		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	419,67	R$ 4.649,94	0%
15.5	AR ENG.	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M2	794,66	R$14,22	R$11.297,22		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	794,66	R$ 11.297,22	0%
15.6	AR ENG.	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	1.057,92	R$9,95	R$10.526,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.057,92	R$ 10.526,30	0%
15.7	AR ENG.	102319	APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS, SOBRE MADEIRA	M2	160,26	R$15,08	R$1.513,43		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	100,26	R$ 1.513,43	0%
15.8	AR ENG.	CPL-38	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPÓXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	6,30	R$11,12	R$70,06		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,30	R$ 70,06	0%
15.9	AR ENG.	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	6,46	R$25,39	R$159,96		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,30	R$ 159,96	0%
16	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**																
16.1	AR ENG.	99155	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2016_P	M	88,00	R$46,76	R$4.115,66		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	88,00	R$ 4.115,66	0%
16.2	**RAMPA DE ACESSO**						R$21.342,01		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 21.342,01	0%
16.2.1	AR ENG.	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	2,40	R$61,45	R$147,48		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,40	R$ 147,48	0%
16.2.2	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	M3	3,60	R$344,81	R$1.230,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,60	R$ 1.230,52	0%
16.2.3	AR ENG.	92873	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M2	3,60	R$201,87	R$726,73		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,60	R$ 726,73	0%
16.3	AR ENG.	96108	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	142,96	R$3,31	R$473,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	142,96	R$ 473,20	0%
16.4	AR ENG.	95505	LIMPEZA DE PISO CERÂMICOS	M2	42,19	R$10,31	R$434,98		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	42,19	R$ 434,98	0%
16.5	AR ENG.	CPL-39	LIMPEZA DE VIDROS	M2	66,90	R$12,97	R$867,69		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	66,90	R$ 867,69	0%
16.6	AR ENG.	CPL-40	LIMPEZA GERAL	M2	1.211,38	R$10,43	R$12.637,10		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.211,38	R$ 12.637,10	0%
17	**MURO (L=148,73M H=2,65)**						R$93.317,53										
17.1	**INFRAESTRUTURA**						R$22.938,50		R$ 22.938,50		R$ 0,00		R$ 22.938,50		R$ 0,00	100%
17.1.1	AR ENG.	CPL-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES, ATÉ 1,50M	M3	80,00	R$54,57	R$2.051,05	37,6	R$ 2.051,05		R$ 0,00	37,6	R$ 2.051,05	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.2	AR ENG.	CPL-13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COMAÇO DE 30KG	M2	65,91	R$30,89	R$2.035,79	65,91	R$ 2.035,79		R$ 0,00	65,91	R$ 2.035,79	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.3	AR ENG.	94965	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M3	1,98	R$294,27	R$582,66	1,98	R$ 582,66		R$ 0,00	1,98	R$ 582,66	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.4	AR ENG.	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	55,69	R$61,45	R$3.422,26	55,69	R$ 3.422,26		R$ 0,00	55,69	R$ 3.422,26	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.5	AR ENG.	92792	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	644,09	R$10,36	R$7.006,27	644,09	R$ 7.006,27		R$ 0,00	644,09	R$ 7.006,27	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.6	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	86,84	R$11,82	R$1.261,64	86,84	R$ 1.261,64		R$ 0,00	86,84	R$ 1.261,64	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.7	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	M3	12,21	R$344,81	R$4.173,44	12,21	R$ 4.173,44		R$ 0,00	12,21	R$ 4.173,44	0,00	R$ 0,00	100%
17.1.8	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	12,21	R$201,87	R$2.464,79	12,21	R$ 2.464,79		R$ 0,00	12,21	R$ 2.464,79	0,00	R$ 0,00	100%
17.2	**SUPERESTRUTURA**						R$25.210,98		R$ 25.210,98		R$ 0,00		R$ 25.210,98		R$ 0,00	100%
17.2.1	AR ENG.	CPL-14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	78,44	R$77,95	R$6.114,62	78,44	R$ 6.114,62		R$ 0,00	78,44	R$ 6.114,62	0,00	R$ 0,00	100%
17.2.2	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	868,17	R$10,88	R$9.443,77	868,17	R$ 9.443,77		R$ 0,00	868,17	R$ 9.443,77	0,00	R$ 0,00	100%
17.2.3	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	259,06	R$13,84	R$3.584,71	259,06	R$ 3.584,71		R$ 0,00	259,06	R$ 3.584,71	0,00	R$ 0,00	100%
17.2.4	AR ENG.	94965	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=25 MPA	M3	10,63	R$368,96	R$3.922,04	10,63	R$ 3.922,04		R$ 0,00	10,63	R$ 3.922,04	0,00	R$ 0,00	100%
17.2.5	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	10,63	R$201,87	R$2.145,84	10,63	R$ 2.145,84		R$ 0,00	10,63	R$ 2.145,84	0,00	R$ 0,00	100%
17.3	**VEDAÇÃO**						R$14.828,33		R$ 14.828,33		R$ 0,00		R$ 14.828,33		R$ 0,00	100%
17.3.1	AR ENG.	CPL-16	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X30CM, E=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 15MM	M2	409,01	R$36,25	R$14.828,33	409,01	R$ 14.828,33		R$ 0,00	409,01	R$ 14.828,33	0,00	R$ 0,00	100%
17.4	**REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDES**						R$3.411,90		R$ 0,00		R$ 2.592,55		R$ 2.502,55		R$ 909,35	73%
17.4.1	AR ENG.	87879	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	816,02	R$4,17	R$3.411,90		R$ 0,00	616	R$ 2.592,55	600	R$ 2.502,55	216,02	R$ 909,35	73%
17.5	**PINTURA**						R$26.927,82		R$ 0,00		R$ 19.750,97		R$ 19.750,97		R$ 7.176,85	73%
17.5.1	AR ENG.	CPL-41	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	816,02	R$32,99	R$26.927,82		R$ 0,00	616	R$ 19.750,97	600	R$ 19.750,97	216,02	R$ 7.176,85	73%

TOTAL	**R$1.057.994,14**	**TOTAL ACUMULADO ANTERIOR**	**TOTAL ATUAL**	**TOTAL ACUMULADO**	**SALDO TOTAL**	**(%)**
UM MILHÃO, CINQUENTA E SETE MIL, NOVEC		390.820,14	109.575,11	500.395,25	R$ 557.598,90	47%

E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS

André Luís P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

Flávio Matta de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 2761

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI :	29,67%
Obra:	ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BLOCO PRINCIPAL	REF.:	SINAPI 03/2021
Local:	DISTRITO DE JOSÉ GONÇALVES - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA	DATA	09/2021

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO (COM BDI)	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	(%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					SUBTOTAL	R$55.240,02		R$ 27.664,42		R$ 0,00		R$ 27.664,42		R$ 27.575,60	50%
1.1	AR ENG.	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$104,42	R$7 519,05	36	R$ 3 759,12	36	R$ 3.759,12	36,00	R$ 3.759,93	50%
1.2	AR ENG.	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1 320,00	R$33,95	R$44 865,65	660	R$ 22.433,40	660	R$ 22.433,40	660,00	R$ 22.432,25	50%
1.3	AR ENG.	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$39,42	R$2.760,54	36	R$ 1.380,12	36	R$ 1.380,12	36,00	R$ 1.380,42	50%
1.4	AR ENG.	CPU	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	1,00	R$88,78	R$88,78	1	R$ 88,78	1	R$ 88,78	0,00	R$ 0,00	100%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					SUBTOTAL	R$52.066,09		R$ 31.777,09		R$ 0,00		R$ 31.777,09		R$ 20.289,00	61%
2.1	AR ENG.	CPU-11	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO (SALAS PORTÕES E CIRCULAÇÃO)	M2	916,13	R$30,57	R$28 007,35	830	R$ 25.370,59	830	R$ 25.370,59	86,13	R$ 2 636,76	91%
2.2	AR ENG.	CPU-11	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	191,79	R$22,62	R$4.338,46		R$ 0,00	0	R$ 0,00	191,79	R$ 4.313,49	99%
2.3	AR ENG.	95623	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	178,74	R$22,65	R$4.044,62		R$ 0,00	0	R$ 0,00	178,74	R$ 4.044,62	0%
2.4	AR ENG.	CPU-12	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	136,94	R$14,11	R$1.932,22		R$ 0,00	0	R$ 0,00	136,94	R$ 1.932,22	0%
2.5	AR ENG.	CPU-13	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA	M2	136,94	R$35,38	R$4.844,71		R$ 0,00	0	R$ 0,00	136,94	R$ 4.869,71	0%
2.6	AR ENG.	95622	REMOÇÃO DE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	M	4,15	R$35,15	R$21,37		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,15	R$ 21,37	0%
2.7	AR ENG.	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO SEM REAPROVEITAMENTO (MURO)	M2	63,42	R$14,42	R$59.451,32	63,42	R$ 3.451,32	63,42	R$ 3.451,32	0,00	R$ 0,00	100%
2.8	AR ENG.	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	156,62	R$5,04	R$789,42	125	R$ 630,00	125	R$ 630,00	31,62	R$ 159,42	80%
2.9	AR ENG.	97914	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 14 KM	M3xKM	748,15	R$1,56	R$1.221,71	600	R$ 936,00	600	R$ 936,00	184,15	R$ 285,71	77%
2.10	AR ENG.	CPU-6	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	7,76	R$7,36	R$57,07	7,76	R$ 57,07	7,76	R$ 56,67	0,00	R$ 0,00	100%
2.11	AR ENG.	CPU-7	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	R$295,67	R$1 330,52	4,5	R$ 1.330,52	4,5	R$ 1.330,52	0,00	R$ 0,00	100%
3	INFRAESTRUTURA					SUBTOTAL	R$5.163,76		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 5.163,76	0%
3.1	AR ENG.	CPU-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES ATÉ 1,30M	M3	9,56	R$54,57	R$356,89		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,56	R$ 356,89	6%
3.2	AR ENG.	CPU-13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM PESO DE 30KG	M2	10,94	R$30,89	R$337,94		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,94	R$ 337,94	0%
3.3	AR ENG.	94962	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M3	0,93	R$294,27	R$97,11		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,93	R$ 97,11	0%
3.4	AR ENG.	96995	ATERRO MANUAL DA CAIXA DA OBRA	M3	1,56	R$49,38	R$67,16		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,56	R$ 67,16	0%
3.5	AR ENG.	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	17,32	R$61,05	R$1 064,31		R$ 0,00	0	R$ 0,00	17,32	R$ 1.064,31	0%
3.6	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	109,27	R$10,39	R$1.135,46		R$ 0,00	0	R$ 0,00	109,27	R$ 1.136,46	0%
3.7	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	13,50	R$13,84	R$186,84		R$ 0,00	0	R$ 0,00	13,50	R$ 186,84	0%
3.8	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, TCK=20,0 MPA	M3	2,17	R$341,81	R$741,73		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,17	R$ 741,73	0%
3.9	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	2,17	R$201,87	R$438,06		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,17	R$ 438,06	0%
3.10	AR ENG.	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	26,94	R$25,45	R$685,56		R$ 0,00	0	R$ 0,00	26,94	R$ 684,96	0%
4	SUPERESTRUTURA					SUBTOTAL	R$6.385,69		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 6.385,69	0%
4.1	AR ENG.	CPU-14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	34,87	R$77,63	R$2.706,12		R$ 0,00	0	R$ 0,00	34,87	R$ 2.706,12	0%
4.2	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	157,40	R$10,39	R$1.635,51		R$ 0,00	0	R$ 0,00	157,40	R$ 1.712,51	0%
4.3	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	48,46	R$13,84	R$670,69		R$ 0,00	0	R$ 0,00	48,46	R$ 670,69	0%
4.4	AR ENG.	94965	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=25,0 MPA	M3	2,25	R$193,96	R$436,16		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,25	R$ 436,16	0%
4.5	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	2,25	R$201,87	R$454,21		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,25	R$ 454,21	0%
5	VEDAÇÃO					SUBTOTAL	R$3.353,54		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.353,54	0%
5.1	AR ENG.	CPU-43	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, E=19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 12MM	M2	76,98	R$42,30	R$3.255,16		R$ 0,00	0	R$ 0,00	76,98	R$ 3.255,10	0%
5.2	AR ENG.	93182	VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO DE 19X20CM	M	3,00	R$39,46	R$118,44		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 118,44	0%
6	ESQUADRIA DE MADEIRA					SUBTOTAL	R$41.628,68		R$ 11.531,41		R$ 0,00		R$ 11.531,41		R$ 30.097,27	28%
6.1	AR ENG.	CPU-18	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,60 X 1,60 M, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FECHADURA	UN	10,00	R$1.602,73	R$16 027,27	4	R$ 4.010,91	4	R$ 4.010,91	6,00	R$ 6.016,36	40%
6.2	AR ENG.	CPU-44	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 1,60 M, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FECHADURA	UN	2,00	R$4.119,36	R$8.238,69	4	R$ 4.477,18	4	R$ 4.477,18	-2,00	-R$ 2.238,49	206%
6.3	AR ENG.	CPU-45	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 1,60 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	5,00	R$897,87	R$4.489,37		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 4.489,37	0%
6.4	AR ENG.	CPU-46	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,70 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	3,00	R$915,29	R$2.745,88		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$ 2.745,88	0%
6.5	AR ENG.	CPU-47	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,70 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	21,00	R$1.014,44	R$21 303,30	3	R$ 3.043,23	3	R$ 3.043,23	18,00	R$ 18.259,97	14%
6.6	AR ENG.	100965	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	12,00	R$96,69	R$624,27		R$ 0,00	0	R$ 0,00	12,00	R$ 834,27	0%
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA					SUBTOTAL	R$15.342,88		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 15.342,88	0%
7.1	AR ENG.	94571	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	65,59	R$162,31	R$10 647,23		R$ 0,00	0	R$ 0,00	65,59	R$ 11.647,22	0%
7.2	AR ENG.	CPU-20	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO TIPO FANTASIA, PADRONIZADA	M2	10,58	R$329,61	R$3.476,69		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,58	R$ 3.476,69	0%
7.3	AR ENG.	CPU-48	PORTA TIPO GRADIL EM PERFIL DE SUSTENTAÇÃO GALVANIZADO COM SEÇÃO 70X20 MM (SANITÁRIOS)	UN	5,04	R$241,86	R$1 218,97		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,04	R$ 1.218,97	0%
8	COBERTURA					SUBTOTAL	R$31.212,47		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 31.212,47	0%
8.1	AR ENG.	CPU-24	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TERÇA EM PERFIL U ENRIJECIDO 150X40X2	KG	1.693,36	R$23,36	R$52.233,74		R$ 0,00	0	R$ 0,00	95,40	R$ 7.323,77	0%

André Luis P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95,390

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

8.2	AR ENG	94226	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMO ACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO ACAMENTO	M2	439,81	R$40,24	R$17.696,36		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	439,81	R$ 27.536,59	0%
8.3	AR ENG	CPU-49	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA METÁLICA PARA TELHA TERMOACÚSTICA	M	11,80	R$76,33	R$900,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	11,80	R$ 899,37	0%
8.4	AR ENG	94831	RUFO METÁLICO, E=25 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,92	R$41,47	R$452,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,92	R$ 452,80	0%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						SUBTOTAL	R$34.247,83		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 34.247,83	0%
9.1	AR ENG.	89482	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R$19,64	R$176,76		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	9,00	R$ 176,76	0%
9.2	AR ENG.	89469	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X40 MM	UN	4,00	R$7,13	R$28,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 28,52	0%
9.3	AR ENG.	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 35X50 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$171,79	R$858,95		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 858,95	0%
9.4	AR ENG.	86904	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSO, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$100,00	R$200,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 200,00	0%
9.5	AR ENG.	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R$195,62	R$1.956,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R$ 1.956,20	0%
9.6	AR ENG.	86900	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$36,96	R$184,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 184,80	0%
9.7	AR ENG.	86900	TORNEIRA CROMADA DE MESA DE 1" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO OU CUBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$42,94	R$429,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R$ 429,40	0%
9.8	AR ENG.	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R$8,66	R$86,60		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R$ 86,60	0%
9.9	AR ENG.	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 30 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R$12,42	R$124,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R$ 124,20	0%
9.10	AR ENG.	95470	BACIA SIFONADA DE LOUÇA COM ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R$349,99	R$5.599,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 5.599,84	0%
9.11	AR ENG.	86849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	R$29,91	R$478,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 478,56	0%
9.12	AR ENG.	95544	PAPELEIRA DE METAL DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R$27,66	R$442,04		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 442,04	0%
9.13	AR ENG.	CPU-25	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 1 1/2 OU 40MM, INCLUSIVE TUBO DE DESCIDA COM JOELHO	UN	16,00	R$422,83	R$6.765,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 6.765,28	0%
9.14	AR ENG.	100958	MICTÓRIO SIFONADO DE Llouça BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$637,35	R$1.312,05		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 1.312,05	0%
9.15	AR ENG.	95547	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$60,98	R$243,94		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 243,94	0%
9.16	AR ENG.	CPU-26	DISPENSER PARA TOALHAS INTERFOLHADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$66,54	R$266,16		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 266,16	0%
9.17	AR ENG.	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$62,82	R$251,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 251,28	0%
9.18	AR ENG.	100869	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, L=900 MM, D=38 MM	UN	4,00	R$217,82	R$871,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 871,28	0%
9.19	AR ENG.	CPU-27	BANCADA DE GRANITO, LARG.= 60	M2	17,69	R$291,24	R$5.152,04		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	17,69	R$ 5.152,04	0%
9.20	AR ENG.	CPU-26	PONTO DE ÁGUA FRIA	UN	16,00	R$120,16	R$1.922,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 1.922,56	0%
9.21	AR ENG.	CPU-29	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM	UN	16,00	R$88,23	R$1.411,68		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 1.411,68	0%
9.22	AR ENG.	CPU-30	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM	UN	16,00	R$127,20	R$2.035,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R$ 2.035,20	0%
9.23	AR ENG.	89445	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X40 MM	UN	12,00	R$7,13	R$85,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	12,00	R$ 85,56	0%
9.24	AR ENG.	89383	REGISTRO DE GAVETA - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$33,57	R$134,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	R$ 134,28	0%
9.25	AR ENG.	CPU-31	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE, CAP. 3.000 LITROS	UN	5,00	R$1.285,73	R$6.428,65		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 6.428,65	0%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						SUBTOTAL	R$50.036,52		R$ 39.491,72		R$ 0,00		R$ 39.491,72		R$ 10.544,80	79%
10.1	AR ENG.	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$327,74	R$327,74		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	R$ 327,74	0%
10.2	AR ENG.	CPU-33	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA, 200X200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$97,31	R$97,31		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	R$ 97,31	0%
10.3	AR ENG.	101890	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 15 A, EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	13,00	R$12,11	R$145,56		R$ 0,00		R$ 1,00	1	R$ 0,00	12,00	R$ 145,56	0%
10.4	AR ENG.	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$69,96	R$69,96		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	R$ 69,96	0%
10.5	AR ENG	96985	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE COBRE COOPERWELD 5/8X2,40M, COM CONECTOR	UN	5,00	R$31,15	R$155,75		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 155,75	0%
10.6	AR ENG	CPU-38	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PLÁSTICO, COM BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	93,00	R$99,67	R$9.268,20	80	R$ 765,60		R$ 0,00	80	R$ 765,60	13,00	R$ 162,60	92%
10.7	AR ENG.	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 26 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	97,00	R$19,53	R$1.935,15	80	R$ 1.596,00		R$ 0,00	80	R$ 1.596,00	17,00	R$ 339,15	82%
10.8	AR ENG.	CPU-35	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø 3/4"	UN	97,00	R$320,96	R$31.133,12	80	R$ 25.676,80		R$ 0,00	80	R$ 25.676,80	17,00	R$ 5.456,32	82%
10.9	AR ENG.	CPU-50	PONTO DE INTERRUPTOR (1 SEÇÃO OU 2) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN	11,00	R$274,66	R$3.014,66	7	R$ 1.918,42		R$ 0,00	7	R$ 1.918,42	4,00	R$ 1.096,24	64%
10.10	AR ENG.	CPU-36	PONTO DE INTERRUPTOR (2 SEÇÕES) EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	UN	20,00	R$272,51	R$5.450,20	15	R$ 4.087,65		R$ 0,00	15	R$ 4.087,65	5,00	R$ 1.362,55	75%
10.11	AR ENG.	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A 250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CURD IAMENTO	UN	56,00	R$124,45	R$6.969,20	43	R$ 5.447,35		R$ 0,00	43	R$ 5.447,35	13,00	R$ 1.521,85	78%
11	FORRO DE PVC						SUBTOTAL	R$3.749,41		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.749,41	0%
11.1	AR ENG.	96111	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC), INSTALADO	M2	56,93	R$65,86	R$3.749,41		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	56,93	R$ 3.749,41	0%
12	REVESTIMENTO DE FORRO E PAREDES						SUBTOTAL	R$35.275,37		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 35.275,37	0%
12.1	AR ENG	87673	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	331,69	R$4,17	R$1.383,15		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	331,69	R$ 1.383,15	0%
12.2	AR ENG	90408	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	152,95	R$32,41	R$4.957,46		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	152,95	R$ 4.957,46	0%
12.3	AR ENG.	87531	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	299,47	R$30,36	R$9.091,91		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	299,47	R$ 9.091,91	0%
12.4	AR ENG.	87274	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA 33X45 CM, JUNTA A PRUMO, COM CIMENTO COLANTE	M2	299,47	R$66,21	R$19.827,91		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	299,47	R$ 19.827,91	0%
13	PISOS						SUBTOTAL	R$100.847,67		R$ 52.007,19		R$ 0,00		R$ 52.007,19		R$ 48.840,48	52%
13.1	AR ENG.	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6 CM. AF_06/2014	M2	1.107,92	R$39,94	R$44.250,32	1107,92	R$ 44.250,32		R$ 0,00	1107,92	R$ 44.250,32	0,00	R$ 0,00	100%

André Luis P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

José Mario de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

12.2	AR ENG.	CPU-52	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, TAP. MÉDIA = 4,5CM	M2	R$ 7,63	R$26,37	R$2.466,66	R$ 7,63	R$ 2.466,66		R$ 0,00	R$ 7,63	R$ 2.466,66	0,00	R$ 0,00	100%
13.1	AR ENG.	9537	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA TIPO A, 45X45 CM, PEI 5, COM CIMENTO COLANTE	M2	R$ 83,68	R$30,04	R$2.632,41		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	87,63	R$ 2.632,41	0%
13.4	AR ENG.	CPU-51	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	23,04	R$114,29	R$2.516,95		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	21,04	R$ 2.516,95	0%
13.5	AR ENG.	96742	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	1.010,10	R$36,66	R$37.460,91	90	R$ 1.932,80		R$ 0,00	90	R$ 2.932,80	940,20	R$ 34.477,03	8%
13.6	AR ENG.	10431	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, 10 CM	M	672,70	R$23,38	R$11.042,37	100	R$ 2.338,00		R$ 0,00	100	R$ 2.338,00	372,50	R$ 8.704,37	21%
13.7	AR ENG.	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	11,14	R$8,25	R$92,17		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	11,14	R$ 92,17	0%
13.8	AR ENG.	98659	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA DE GRANITO, L=15CM	M	0,28	R$65,73	R$431,60		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,28	R$ 431,60	0%
14	**PINTURA**						**SUBTOTAL**	**R$44.678,73**			***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 44.678,73***	***0%***
14.1	AR ENG.	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 1 DEMÃO, MASSA PVA	M2	296,05	R$14,22	R$4.141,67		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	256,05	R$ 3.641,05	0%
14.2	AR ENG.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	M2	1.030,98	R$11,74	R$12.103,71		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.030,98	R$ 12.103,71	0%
14.3	AR ENG.	96120	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	225,63	R$16,90	R$3.803,01		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	225,63	R$ 3.803,01	0%
14.4	AR ENG.	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	2.250,34	R$9,95	R$22.390,88		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2.250,34	R$ 22.390,88	0%
14.5	AR ENG.	88278	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M2	157,50	R$16,08	R$2.532,08		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	157,50	R$ 2.532,08	0%
14.6	AR ENG.	CPU-48	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE ÉPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	10,08	R$11,22	R$113,09		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,08	R$ 113,09	0%
14.7	AR ENG.	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	10,08	R$25,34	R$255,93		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,08	R$ 255,93	0%
15	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**SUBTOTAL**	**R$42.023,26**								
15.1	**RAMPA DE ACESSO**							**R$3.871,40**			***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 3.871,40***	***0%***
15.1.1	AR ENG.	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	1,50	R$61,45	R$92,18		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,50	R$ 92,18	0%
15.1.2	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	M3	6,05	R$341,81	R$2.067,95		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,05	R$ 2.067,95	0%
15.1.3	AR ENG.	92871	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M2	6,05	R$202,87	R$1.227,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,05	R$ 1.227,37	0%
15.1.4	AR ENG.	99153	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_06/2019, P	M	5,00	R$96,78	R$483,90		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 483,90	0%
15.2	**BANCO EM GRANITO (2 UN)**							**R$12.945,75**			***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 12.945,75***	***0%***
15.2.1	AR ENG.	CPU-52	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	15,75	R$209,61	R$3.301,39		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,75	R$ 3.301,39	0%
15.2.2	AR ENG.	96401	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	31,50	R$32,51	R$1.024,13		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	31,50	R$ 1.024,13	0%
15.2.3	AR ENG.	96120	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	31,50	R$16,90	R$532,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	31,50	R$ 532,30	0%
15.2.4	AR ENG.	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	31,50	R$9,95	R$313,36		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	31,50	R$ 313,36	0%
15.2.5	AR ENG.	CPU-53	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	17,50	R$444,26	R$7.774,58		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	17,50	R$ 7.774,58	0%
15.3	**ESCOVODROMO COM 5 TORNEIRA**							**R$2.867,56**			***R$ 253,87***		***R$ 0,00***		***R$ 2.613,69***	***9%***
15.3.1	AR ENG.	103159	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM)	M2	10,28	R$137,00	R$1.351,74		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,28	R$ 1.351,74	0%
15.3.2	AR ENG.	96995	ATERRO MANUAL DA CAIXA DA OBRA	M3	0,57	R$45,38	R$26,15	0,57	R$ 26,15		R$ 0,00	0,57	R$ 28,15	0,00	R$ 0,00	100%
15.3.3	AR ENG.	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4,5 M. AF_06/2014	M2	1,44	R$39,94	R$57,51	1,44	R$ 57,51		R$ 0,00	1,44	R$ 57,51	0,00	R$ 0,00	100%
15.3.4	AR ENG.	87531	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	5,54	R$30,36	R$168,21	5,54	R$ 168,21		R$ 0,00	5,54	R$ 168,21	0,00	R$ 0,00	100%
15.3.5	AR ENG.	87707	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	5,54	R$53,08	R$294,06		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,54	R$ 294,06	0%
15.3.6	AR ENG.	89495	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X40 MM	UN	2,00	R$17,13	R$34,26		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 34,26	0%
15.3.7	AR ENG.	86916	TORNEIRA DE PRESSÃO PLÁSTICA COMUM, USO GERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$36,56	R$182,78		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 182,78	0%
15.3.8	AR ENG.	CPU-28	PONTO DE ÁGUA FRIA	UN	5,00	R$120,16	R$600,82		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$ 600,82	0%
15.3.9	AR ENG.	CPU-29	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM	UN	2,00	R$86,22	R$172,44		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R$ 172,44	0%
15.3.10	AR ENG.	89383	REGISTRO DE GAVETA - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$33,57	R$33,57		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	R$ 33,57	0%
15.4	**CASA DE GÁS**							**R$3.421,89**			***R$ 0,00***		***R$ 2.379,38***		***R$ 1.042,51***	***70%***
15.4.1	AR ENG.	CPU-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES, ATÉ 1,50M	M3	0,74	R$34,57	R$46,38		R$ 0,00	0,74	R$ 40,38	0,74	R$ 46,38	0,00	R$ 0,00	100%
15.4.2	AR ENG.	CPU-13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM SOCO DE 20KG	M2	1,96	R$30,59	R$57,45		R$ 0,00	1,96	R$ 57,45	1,96	R$ 57,45	0,00	R$ 0,00	100%
15.4.3	AR ENG.	94962	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA CASTRO	M3	0,06	R$294,27	R$17,66		R$ 0,00	0,06	R$ 17,66	0,06	R$ 17,66	0,00	R$ 0,00	100%
15.4.4	AR ENG.	CPU-14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	3,53	R$77,95	R$197,22		R$ 0,00	2,53	R$ 197,22	3,53	R$ 197,22	0,00	R$ 0,00	100%
15.4.5	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	31,25	R$10,90	R$339,93		R$ 0,00	31,25	R$ 339,93	31,25	R$ 339,93	0,00	R$ 0,00	100%
15.4.6	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	6,84	R$13,88	R$94,65		R$ 0,00	6,84	R$ 94,65	6,84	R$ 94,65	0,00	R$ 0,00	100%
15.4.7	AR ENG.	94965	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=25,0 MPA	M3	0,37	R$369,56	R$136,52		R$ 0,00	0,37	R$ 136,52	0,37	R$ 136,52	0,00	R$ 0,00	100%
15.4.8	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	0,37	R$201,97	R$74,69		R$ 0,00	0,37	R$ 74,69	0,37	R$ 74,69	0,00	R$ 0,00	100%
15.4.9	AR ENG.	CPU-15	LAJE PRÉ-MOLDADA DE FORRO, E=8 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO E CAPEAMENTO	M2	2,40	R$449,52	R$119,84		R$ 0,00	2,4	R$ 119,84	2,4	R$ 119,84	0,00	R$ 0,00	100%
15.4.10	AR ENG.	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	6,82	R$25,45	R$173,56		R$ 0,00	6,82	R$ 173,56	6,82	R$ 173,56	0,00	R$ 0,00	100%
15.4.11	AR ENG.	CPU-16	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, E= 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 12MM	M2	8,06	R$36,38	R$293,21		R$ 0,00	8,06	R$ 292,21	8,06	R$ 292,21	0,00	R$ 0,00	100%
15.4.12	AR ENG.	87904	CHAPISCO APLICADO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	19,99	R$4,35	R$86,98		R$ 0,00	19,99	R$ 85,36	19,99	R$ 85,36	0,00	R$ 0,00	100%

André Luis P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 05.390

José Flávio Matta de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

198

Relatório fotográfico BM 06

Modalidade: Tomada de preço

Contrato nº: 104-2021

Objeto: ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA - REFORMA E AMPLIAÇÃO (MÓDULO NOVO)

Contratante: Prefeitura Municipal

Contratada: Empresa AR Engenharia Eirelli

Cidade: José Gonçalves - Ba

Período de execução: 26/05/2022 à 29/06/2022

Número da medição: 06

Coordenadas geométricas: 14°43'41.6"S 40°43'35.3"W

José Flávio Maia de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

André Luís P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

199

FOTO 01: ANTES – Área de circulação da área de ampliação

FOTO 02: DEPOIS – Area de circulação com o piso concretado

André Luís P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

José Flávio Maia de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

COMISSÃO
200
LICITAÇÃO

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, por ordem do Sr. Presidente da Comissão de Inquérito, lavrei o presente termo de encerramento do Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022, que tem como primeira folha a de nº 01 e como última a de nº 200. Do que, para constar, lavrei, o presente termo.

Elbert Cleber de Santana Monteiro
Secretário

Volume II

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
Processo Administrativo Disciplinar
Sindicância Administrativa
Processo Administrativo

CAPA DE PROCESSO

AUTUAÇÃO: ____/____/____ **PROCESSO Nº** PAI 068/2022 **PORTARIA Nº** CRGM 065/2022

DENUNCIADO(S):

NOME: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 36.286.217/0001-57

END.: .....

DENUNCIANTE(S):

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOME: .....

NOME: .....

MOVIMENTAÇÃO

DESTINO	DATA		DESTINO	DATA	
	ENTRADA	SAÍDA		ENTRADA	SAÍDA

NÚMERO DE FOLHAS CONTIDAS NO PROCESSO

001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200

O PREENCHIMENTO DESTA CAPA É EXCLUSIVO DA PREFEITURA

201

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 09 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, por ordem da ***Sra. Presidente*** da Comissão de Inquérito, lavrei o presente termo de abertura deste volume II do Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022, que tem como primeira folha a de nº 201, que corresponde a este termo. Do que, para constar, lavrei, na condição de Secretário da Comissão, o presente termo.

Elbert Cleber de Santana de Monteiro
Secretário

Fls: 202

SMAD/IPA

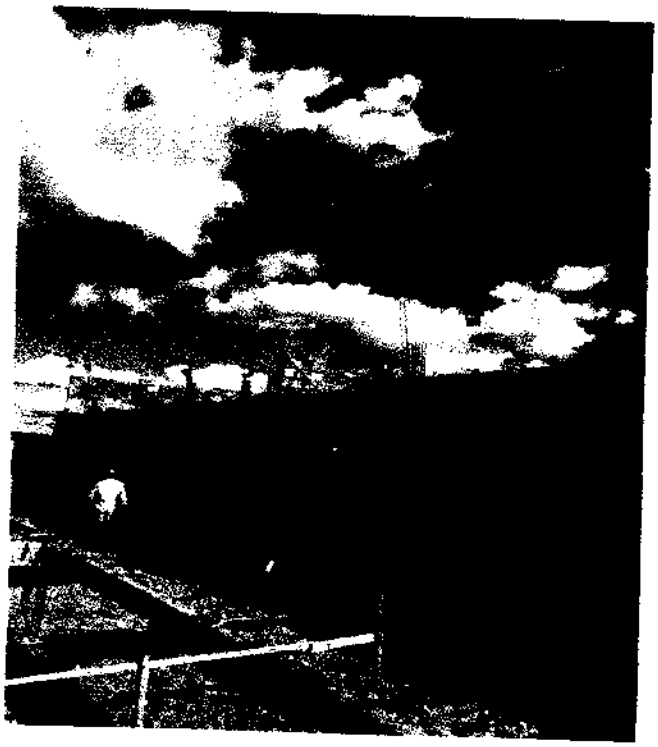

FOTO 03 – 5 salas construídas ANTES

FOTO 04 – Salas superiores DEPOIS

André Luís P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

José Flávio Maia de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

203
SINDUFA

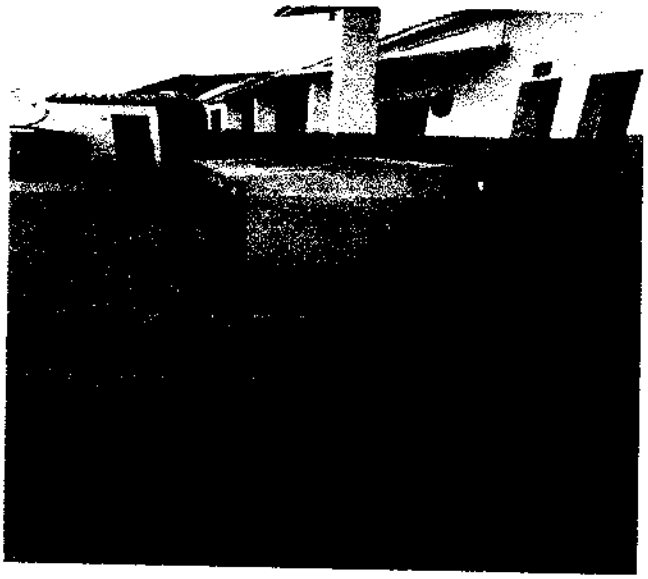

FOTO 05 – Casa de gás

FOTO 06 – Muro externo construído e pintado

André Luís P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

José Flávio Mattos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

204
SINAPI/PA

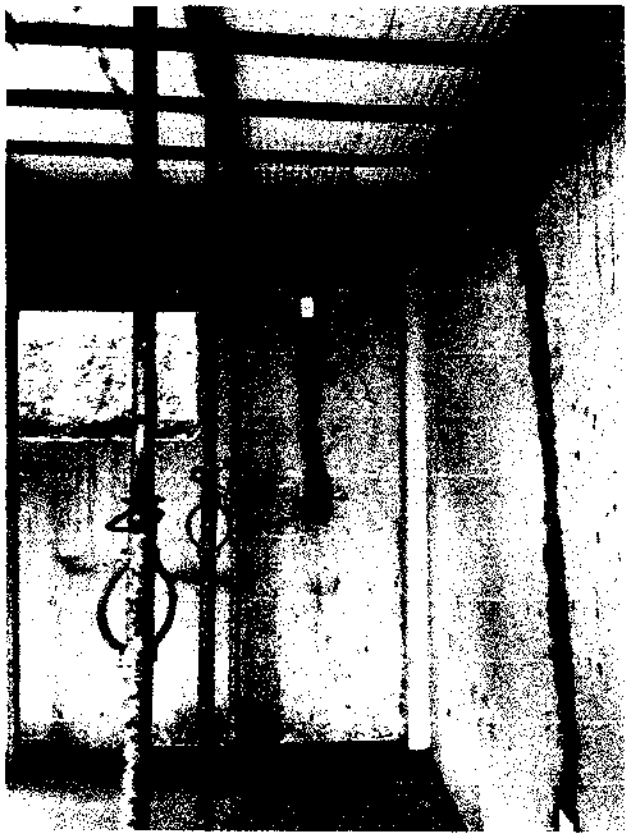

FOTO 07 – Instalações elétricas área de ampliação

AR ENGENHARIA EIRELLI

CNPJ: 36.286.217/0001-57

André Luís P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

Rua Alírio Sales, 25 – Candeias – 45028-180 – Vitória da Conquista – Ba
Fone (77) 99109-9040 – arengenhariaconstrutora@gmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Codigo de Verificação para Autenticação: f51dded3cef40d458eb7bf182997c159

Gerado em 05/08/2022 10:16:05

Data de Emissão	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Série	Nº da Nota Fiscal
05/08/2022		Tributação Normal		PADRAO	202200000000022

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Retido na Fonte	Optante	No Município (2933307 - Vitória da Conquista - BA)

PRESTADOR

Razão Social: AR ENGENHARIA EIRELI
Nome Fantasia: AR ENGENHARIA EIRELI
Endereço: AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, 450, D ANDAR 1 SALA 3 - FELICIA
VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45055-155
E-mail: andrerochadiretor@gmail.com - Fone: (77)9109-9040 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 589872 - CPF/CNPJ: 36.286.217/0001-57

TOMADOR

Razão Social: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Endereço: **AVENIDA** SIQUEIRA CAMPOS, 1842 , - CANDEIAS
VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45000-000
E-mail: - Fone: (77)3429-7750 - Celular:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 2009214 - CPF/CNPJ: 06.071.702/0001-42

205

SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concr

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA EM VITÓRIA DA CONQUISTA.

DADOS BANCÁRIOS

[redacted]

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESC. INCO. (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
113.902,78	0,00	0,00	113.902,78	4,0700	4.635,84

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTOS DIVERSOS (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.266,94

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTA NOTA ESTÁ COM STATUS DE RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

. oliveira

AR ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 36.286.217/0001-57
AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, 450 D - SL 3
ANDAR 1 FELÍCIA, CEP: 45055-155 VIT. DA CONQUISTA
TEL: (77) 9 9109-9040 andre.rocha.moura@hotmail.com

CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA - BA	INÍCIO DA OBRA: 15/10/20
Nº CONTRATO: 104-2021	PERÍODO: 25/05/2022 À 28/06/
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.579.246,07	DATA DA EMISSÃO: 28/06/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI:	29,67%
Obra:	ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA - REFORMA E AMPLIAÇÃO (MÓDULO NOVO)	REF.:	SINAPI 03/2021
Local:	DISTRITO DE JOSÉ GONÇALVES - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA	DATA	09/2021

BM 07	DATA	VALOR	PORCENTAGE
	01/08/2022	R$ 113.902,78	7%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATADO QUANT.	CONTRATADO PREÇO (COM BDI)	CONTRATADO VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR QUANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ATUAL QUANT.	ATUAL VALOR	ACUMULADO QUANT.	ACUMULADO VALOR	SALDO QUANT.	SALDO VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA														
1.1	AR ENG.	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$70,62	R$5.084,64	42	R$ 4.965,68	12	R$ 1.253,04	54	R$ 6.218,64	18,00	R$
1.2	AR ENG.	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00	R$22,99	R$30.346,80	778	R$ 17.886,22	220	R$ 5.057,60	998	R$ 22.943,82	322,00	R$
1.3	AR ENG.	100389	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$36,42	R$2.622,24	42	R$ 1.529,64	12	R$ 437,04	54	R$ 1.966,68	18,00	R$
1.4	AR ENG.	CPU	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	U	1,00	R$88,78	R$88,78	1	R$ 88,78		R$ 0,00	1	R$ 88,78	0,00	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES														
2.1	AR ENG.	CPU1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO (SALAS EXISTENTES E CIRCULAÇÃO)	M2	349,00	R$40,53	R$14.147,97	349,00	R$ 14.147,97		R$ 0,00	349,00	R$ 14.147,97	0,00	R$
2.2	AR ENG.	CPU2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	354,04	R$14,11	R$4.994,83	354,04	R$ 4.994,83		R$ 0,00	354,04	R$ 4.994,83	0,00	
2.3	AR ENG.	CPU3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA	M2	354,04	R$35,76	R$12.657,66	354,04	R$ 12.657,66		R$ 0,00	354,04	R$ 12.657,66	0,00	
2.4	AR ENG.	CPU4	REMOÇÃO DE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	M	37,21	R$5,11	R$191,03	37,21	R$ 191,03		R$ 0,00	37,21	R$ 191,03	0,00	
2.5	AR ENG.	CPU5	RETIRADA DE PILARES DE MADEIRA, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO	M	37,21	R$39,91	R$1.485,26	37,21	R$ 1.485,26		R$ 0,00	37,21	R$ 1.485,26	0,00	
2.6	AR ENG.	100827	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	TXK	12,00	R$12,35	R$148,20	12	R$ 148,20		R$ 0,00	12	R$ 148,20	0,00	
2.7	AR ENG.	97914	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 14 KM	M3XKM	97,77	R$17,85	R$1.745,20	97,77	R$ 1.745,20		R$ 0,00	97,77	R$ 1.745,20	0,00	
2.8	AR ENG.	97914	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 14 KM	M3XKM	97,77	R$24,69	R$2.413,68	97,77	R$ 2.413,68		R$ 0,00	97,77	R$ 2.413,68	0,00	
2.8	AR ENG.	97914	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 14 KM	M3XKM	4.716,51	R$1,56	R$7347,04	470,97	R$ 347,04		R$ 0,00	470,97	R$ 7347,04	0,00	
2.9	AR ENG.	CPU6	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	35,41	R$449,68	R$11.369,70	25,41	R$ 11.369,70		R$ 0,00	25,41	R$ 11.369,70	0,00	
2.10	AR ENG.	CPU7	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	467,38	R$7,56	R$3.533,54	467,4	R$ 3.533,54		R$ 0,00	467,4	R$ 3.533,54	0,00	
2.11	AR ENG.	CPU8	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	R$295,67	R$1.330,52	4,5	R$ 1.330,52		R$ 0,00	4,5	R$ 1.330,52	0,00	
3	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM														
3.1	AR ENG.	CPU9	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	766,91	R$8,46	R$6.965,68	789,13	R$ 6.965,68		R$ 0,00	789,13	R$ 6.965,68	0,00	R$
3.2	AR ENG.	CPU4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	383,46	R$2,61	R$936,18	358,69	R$ 936,18		R$ 0,00	358,69	R$ 936,18	0,00	
3.3	AR ENG.	97910	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT=5,0 KM(NOTA FORA)	M3XKM	1.290,69	R$1,04	R$1 342,53	1290,69	R$ 1.342,53		R$ 0,00	1290,69	R$ 1.342,53	0,00	
3.4	AR ENG.	97910	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT= 14,0 KM (EMPRESTARO)	M3XKM	2.510,03	R$1,04	R$2 611,26	2510,03	R$ 2 611,26		R$ 0,00	2510,03	R$ 2 611,26	0,00	
3.5	AR ENG.	CPU10	ESPALHAMENTO DE MATERIAL INERTE	M3	358,69	R$0,31	R$111,19	358,69	R$ 111,19		R$ 0,00	358,69	R$ 111,19	0,00	
3.6	AR ENG.	CPU11	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M3	358,69	R$4,41	R$1 579,24	358,69	R$ 1.579,24		R$ 0,00	358,69	R$ 1.579,24	0,00	
4	INFRAESTRUTURA														
4.1	AR ENG.	CPU12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM FUNDAÇÕES, ATÉ 1,30M	M3	325,74	R$34,37	R$11.196,51	325,74	R$ 11.196,51		R$ 0,00	325,74	R$ 11.196,51	0,00	R$
4.2	AR ENG.	CPU13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M2	183,82	R$2,89	R$530,99	183,82	R$ 530,99		R$ 0,00	183,82	R$ 530,99	0,00	
4.3	AR ENG.	94963	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M2	4,91	R$294,37	R$1.444,97	4,91	R$ 1.444,97		R$ 0,00	4,91	R$ 1.444,97	0,00	
4.4	AR ENG.	96995	ATERRO MANUAL DA CAIXA DA OBRA	M3	71,69	R$49,38	R$3 535,61	71,6	R$ 3.535,61		R$ 0,00	71,6	R$ 3.535,61	0,00	
4.5	AR ENG.	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	63,91	R$51,45	R$3.289,23	63,91	R$ 3.929,23		R$ 0,00	63,91	R$ 3 929,23	0,00	R
4.6	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	2.116,33	R$10,86	R$22.984,56	2116,33	R$ 22.984,56		R$ 0,00	2116,33	R$ 22.984,56	0,00	
4.7	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	116,76	R$13,84	R$1 615,96	116,76	R$ 1.615,96		R$ 0,00	116,76	R$ 1.615,96	0,00	
4.8	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	M3	52,64	R$341,81	R$17.992,87	52,64	R$ 17.992,87		R$ 0,00	52,64	R$ 17.992,87	0,00	
4.9	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO S/M FUNDAÇÃO	M3	52,64	R$201,97	R$10.629,44	52,64	R$ 10.629,44		R$ 0,00	52,64	R$ 10.629,44	0,00	R
4.10	AR ENG.	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	232,68	R$15,45	R$3.931,71	232,68	R$ 3.931,71		R$ 0,00	232,68	R$ 3.931,71	0,00	R
5	SUPERESTRUTURA														
5.1	AR ENG.	CPU14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	173,49	R$77,95	R$13.523,55	160	R$ 13.472,00	13,49	R$ 1.051,55	173,49	R$ 13.523,55	0,00	R$
5.2	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	1.989,69	R$10,89	R$21.667,83	1790	R$ 19.475,20	199,69	R$ 2.192,63	1989,69	R$ 21.667,83	0,00	R$
5.3	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	575,20	R$13,84	R$7.960,77	530	R$ 7.335,20	45,2	R$ 625,57	575,2	R$ 7.960,77	0,00	R$
5.4	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	27,97	R$268,98	R$7 519,81	25	R$ 6.924,00	2,97	R$ 1.095,81	27,97	R$ 7 019,81	0,00	R$
5.5	AR ENG.	CPU15	LAJE PRÉ-MOLDADA DE FORRO, E=8 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO E CAPEAMENTO	M2	27,97	R$201,97	R$5 646,30	25	R$ 5.646,75	2,97	R$ 599,55	27,97	R$ 5.646,30	0,00	R$
5.6	AR ENG.	CPU16	LAJE MACIÇA DE CONCRETO, E=0,1031	M2	303,24	R$46,52	R$15.016,44	260	R$ 13.875,20	43,24	R$ 2.141,24	303,24	R$ 15.016,44	0,00	R$
5.7	LAJE MACIÇA DE CONCRETO, E=0,1031						R$22.714,32		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 22.714
5.7.1	AR ENG.	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 06/2020	M2	175,81	R$28,32	R$3 918,98		R$ 0,00		R$ 0,00	9	R$ 0,00	132,81	R$ 3.81
5.7.2	AR ENG.	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.096,93	R$12,59	R$13 800,85		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	1096,93	R$ 13,81
5.7.3	AR ENG.	94439	CONCRETAGEM DE LOSAS COM ÁREAS E LAJES; FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO LANÇADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015	M3	13,58	R$	R$		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	13,58	R$ 5.616

José Flávio Maia de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

André Luiz L. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

	AR ENG.	92265	[illegible]	M2	60,35	R$78,15	[illegible]		R$ 0,00	60	R$ 1.174,80	60	R$ 1.174,80	60,35		R$ 5
5.8.2	AR ENG	92786	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	368,07	R$12,35	R$4.532,76		R$ 0,00	160	R$ 2.016,00	160	R$ 2.016,00	368,07		R
5.8.3	AR ENG	94439	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUFRAVEN, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015	M3	9,93	R$374,41	R$3.406,51		R$ 0,00	4	R$ 1.497,64	4	R$ 1.497,64	4,05		R
6	VEDAÇÃO						SUBTOTAL	R$57.116,83		R$ 40.991,86		R$ 9,00		R$ 40.991,86			R$ 16.
6.1	AR ENG.	CPU-16	PAREDEN EM TIJOLO CERÂMICO FURADO HORIZONTAL E=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 12MM	M2	1083,09	R$56,25	R$60.926,09	1699	R$ 56.234,25	1699	R$ 56.234,25	81,85		R
6.2	AR ENG.	CPU-17	CORDÃO CERÂMICO (REAPROVEITAMENTO VAZADO), DE 9X20X30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	125,72	R$106,71	R$11.166,19		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	125,72		R$
6.3	AR ENG	93182	VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO DE 10X20CM	M	119,68	R$39,48	R$4.726,78	120	R$ 4.737,60	120	R$ 4.737,60	-0,92		R$
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA						SUBTOTAL	R$25.406,64		R$ 0,00		R$ 9.999,70		R$ 9.999,70			R$ 15.
7.1	AR ENG.	CPU-18	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 1,10 M, INCLUSIVE BATENTE DOBRADIÇAS, FECHADURA	UN	6,00	R$1.000,75	R$6.004,50		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00		R$
7.2	AR ENG.	CPU-19	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	10,00	R$999,97	R$10.999,67	10	R$ 9.999,70	10	R$ 9.999,70	9,00		R$
7.3	AR ENG.	100795	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	7,00	R$69,69	R$486,83		R$ 0,00	0	R$ 0,00	7,00		R$
8	ESQUADRIAS METÁLICAS						SUBTOTAL	R$23.838,11		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 13.
8.1	AR ENG.	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	42,00	R$562,53	R$10.226,63		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	63,60		R$
8.2	AR ENG.	CPU-20	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TIPO FANTASIA, FAIXA LISA	M2	3,90	R$328,61	R$1.281,57		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,90		R$
8.3	AR ENG.	CPU-21	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	5,15	R$739,56	R$2.929,72		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,15		R$
9	COBERTURA						SUBTOTAL	R$289.163,66		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 299.
9.1	AR ENG.	CPU-22	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIGA TRELIÇADA DE AÇO, VÃO DE 12,60 M, INCLUSO ACAMENTO	UN	5,00	R$1.557,17	R$7.785,85		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00		R$
9.2	AR ENG.	CPU-23	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIGA TRELIÇADA DE AÇO, VÃO DE 6,50 M, INCLUSO ACAMENTO	UN	5,00	R$1.092,86	R$5.463,60		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00		R$
9.3	AR ENG.	CPU-24	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA, U ENRIJECIDO (150X60X20	M	551,22	R$11,39	R$6.279,57		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	551,22		R$
9.4	AR ENG.	94218	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMO ACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ACAMENTO	M2	508,72	R$261,29	R$132.931,32		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	508,72		R$
9.5	AR ENG	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,15	R$53,62	R$329,67		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,15		R$
9.6	AR ENG.	94221	RUFO METÁLICO, L=25 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	64,56	R$91,43	R$5.902,54		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	64,56		R$
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						SUBTOTAL	R$13.360,06		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 12.
10.1	AR ENG.	89902	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$19,64	R$39,28		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00		R$
10.2	AR ENG.	86904	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSO, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$100,00	R$200,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00		R$
10.3	AR ENG.	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$108,02	R$432,08		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00		R$
10.4	AR ENG.	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA DE 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO OU CUBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$42,94	R$257,64		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00		R$
10.5	AR ENG	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$8,66	R$51,96		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00		R$
10.6	AR ENG	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$12,42	R$74,52		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00		R$
10.7	AR ENG.	95472	BACIA SIFONADA DE LOUÇA COM ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$189,95	R$569,85		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00		R$
10.8	AR ENG.	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$29,91	R$179,46		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00		R$
10.9	AR ENG.	95544	PAPELEIRA DE METAL DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$37,64	R$225,84		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00		R$
10.10	AR ENG.	CPU-25	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA CONJUGADO ACIONADO DE 1" COM HASTE, INCLUSIVE TUBO DE DESCIDA COM JOELHO	UN	6,00	R$37,64	R$225,84		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00		R$
10.11	AR ENG.	95547	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$23,83	R$143,04		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00		R$
10.12	AR ENG.	CPU-26	DISPENSER PARA TOALHAS INTERFOLHADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$60,96	R$121,92		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00		R$
10.13	AR ENG.	86869	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$64,50	R$129,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00		R$
10.14	AR ENG.	100869	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETO EM AÇO INOX POLIDO, L=400,0 D=31 MM	UN	4,00	R$31,32	R$125,64		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00		R$
10.15	AR ENG.	CPU-27	BANCADA DE GRANITO, LARG=46	M2	1,92	R$217,82	R$418,21		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,92		R$
10.16	AR ENG.	CPU-28	PONTO DE ÁGUA FRIA	UN	6,00	R$91,24	R$598,18		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00		R$
10.17	AR ENG.	CPU-29	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM	UN	6,00	R$120,16	R$720,96		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00		R$
10.18	AR ENG.	CPU-30	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM	UN	6,00	R$99,33	R$595,98		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00		R$
10.19	AR ENG.	89498	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X40 MM	UN	8,00	R$127,36	R$1.018,88		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	8,00		R$
10.20	AR ENG.	89355	REGISTRO DE GAVETA - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$97,73	R$586,38		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,00		R$
10.21	AR ENG.	CPU-31	CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS	UN	2,00	R$1.283,79	R$2.567,58		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00		R$
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						SUBTOTAL	R$51.880,87		R$ 28.163,40		R$ 23.716,77		R$ 51.880,17			R$ 0
11.1	AR ENG.	CPU-32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ, DISJUNTOR E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$161,85	R$323,70	1	R$ 161,85	1	R$ 161,85	2	R$ 323,70	0,00		R$
11.2	AR ENG.	CPU-33	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA 200X200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$97,31	R$194,62	1	R$ 97,31	1	R$ 97,31	2	R$ 194,62	0,00		R$
11.3	AR ENG.	91840	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 15 A, EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	12,00	R$12,13	R$145,56	0	R$ 12,13	0	R$ 72,78	12	R$ 145,56	0,00		R$
11.4	AR ENG.	96985	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE COBRE COOPERWELD 5/8X2,400M, COM CONECTOR	UN	3,00	R$51,91	R$155,73	1	R$ 51,91	2	R$ 103,82	3	R$ 155,73	0,00		R$
11.5	AR ENG	CPU-34	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PLÁSTICO, COM BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	132,00	R$9,57	R$1.071,84	99	R$ 574,20	52	R$ 497,64	172	R$ 1.071,84	0,00		R$
11.6	AR ENG.	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	132,00	R$19,95	R$2.334,40	99	R$ 1.167,00	52	R$ 1.037,40	172	R$ 2.334,40	0,00		R$
11.7	AR ENG.	CPU-35	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	132,00	R$320,96	R$42.366,72	80	R$ 19.257,60	52	R$ 16.692,48	132	R$ 35.950,08	0,00		R$
11.8	AR ENG.	CPU-36	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	UN	30,00	R$175,31	R$5.259,30	15	R$ 2.629,65	15	R$ 2.629,65	30	R$ 5.259,30	0,00		R$

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 276780

André Luis P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

11.9	AR ENG.	92161	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A 250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	PTN	39,00	R$121,05	R$4.721,50	22	R$ 2.662,10	1	R$ 96,40	39	R$ 3.831,50	4,00		
12	**FORRO DE GESSO**					**SUBTOTAL**	**R$1.702,80**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***			***R$ 1.***
12.1	AR ENG.	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	41,32	R$41,20	R$1.702,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	41,32		R$
13	**REVESTIMENTO DE FORRO E PAREDES**					**SUBTOTAL**	**R$91.686,37**		***R$ 73.486,40***		***R$ 0,00***		***R$ 73.486,40***			***R$ 20.***
13.1	AR ENG.	87272	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	1.163,65	R$4,13	R$4.822,42	1440	R$ 5.944,80		R$ 0,00	1440	R$ 5.944,80	401,65		R$
13.2	AR ENG.	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	419,67	R$8,42	R$3.701,49	600	R$ 5.520,00		R$ 0,00	400	R$ 3.680,00	19,67		
13.3	AR ENG.	96408	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	2.054,04	R$92,51	R$66.397,52	1180	R$ 81.119,80		R$ 0,00	1180	R$ 81.119,80	174,04		R$
13.4	AR ENG.	87531	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	162,96	R$90,36	R$4.944,27		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	162,96		R$
13.5	AR ENG.	87274	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA 33X45 CM, BINTA A PRUMO, COM CIMENTO COLANTE	M2	162,96	R$56,21	R$9.464,67		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	162,96		R$
14	**PISOS**					**SUBTOTAL**	**R$103.071,40**		***R$ 43.424,77***		***R$ 23.670,00***		***R$ 67.094,77***			***R$ 35.***
14.1	AR ENG.	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	1.211,36	R$39,94	R$48.381,72	1087,25	R$ 43.424,77		R$ 0,00	1087,25	R$ 43.424,77	124,11		R$
14.2	AR ENG.	CPU-29	ROCIAGEM/APICOAMENTO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	42,19	R$26,37	R$1.196,93		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	42,19		R$
14.3	AR ENG.	93381	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA TIPO A, 42X42 CM, PEI 5, COM CIMENTO COLANTE	M2	42,19	R$50,04	R$1.267,39		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	42,19		R$
14.4	AR ENG.	101753	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	1.169,17	R$46,66	R$42.961,77		R$ 0,00	550	R$ 20.163,00	550	R$ 20.163,00	619,17		R$
14.5	AR ENG.	101761	POLIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, 10 CM	M	395,00	R$23,36	R$9.229,13		R$ 0,00	150	R$ 3.507,00	150	R$ 3.507,00	245,00		R$
14.6	AR ENG.	96189	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA DE GRANITO, E=15CM	M	1,65	R$98,73	R$162,66		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,65		
15	**PINTURA**					**SUBTOTAL**	**R$73.725,23**		***R$ 0,00***		***R$ 15.232,90***		***R$ 15.232,90***			***R$ 58.***
15.1	AR ENG.	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 1 DEMÃO, MASSA PVA	M2	1.496,96	R$14,22	R$21.009,80		R$ 0,00	250	R$ 3.555,00	250	R$ 3.555,00	846,96		R$
15.2	AR ENG.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	M2	1.557,52	R$11,74	R$18.282,94		R$ 0,00	250	R$ 2.700,20	250	R$ 2.700,20	1.307,52		R$
15.3	AR ENG.	88488	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	419,67	R$27,94	R$11.725,58		R$ 0,00	100	R$ 2.794,00	100	R$ 2.794,00	319,67		R$
15.4	AR ENG.	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	419,67	R$11,04	R$4.634,54		R$ 0,00	100	R$ 1.104,00	100	R$ 1.104,00	319,67		R$
15.5	AR ENG.	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M2	794,66	R$14,23	R$11.307,23		R$ 0,00	210	R$ 2.986,20	210	R$ 2.986,20	584,66		R$
15.6	AR ENG.	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	1.057,92	R$9,63	R$10.186,30		R$ 0,00	210	R$ 2.019,30	210	R$ 2.019,30	847,92		R$
15.7	AR ENG.	102194	APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS, SOBRE MADEIRA	M2	108,76	R$15,08	R$1.511,43		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	108,76		
15.8	AR ENG.	CPU-38	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE ÉPOXI PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	6,30	R$11,12	R$70,09		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,30		
15.9	AR ENG.	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	6,30	R$25,34	R$159,66		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,30		
16	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**SUBTOTAL**	**R$29.883,05**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***			***R$ 29.***
16.1	AR ENG.	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2016_P	M	84,00	R$96,79	R$8.130,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	84,00		R$
16.2	**RAMPA DE ACESSO**						**R$21.342,01**		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***		***R$ 0,00***			***R$ 21.***
16.2.1	AR ENG.	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	2,40	R$61,45	R$147,48		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,40		
16.2.2	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=30,0 MPA	M3	3,60	R$381,61	R$1.236,53		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,60		R$
16.2.3	AR ENG.	92873	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M3	3,60	R$201,67	R$726,73		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,60		
16.3	AR ENG.	96108	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	142,96	R$3,31	R$473,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	142,96		
16.4	AR ENG.	96105	LIMPEZA DE PISO CERÂMICOS	M2	42,19	R$10,31	R$434,91		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	42,19		
16.5	AR ENG.	CPU-39	LIMPEZA DE VIDROS	M2	84,60	R$12,87	R$1.088,80		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	84,60		
16.6	AR ENG.	CPU-40	LIMPEZA GERAL	M2	1.211,36	R$14,42	R$17.469,10		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.211,36		R$
17	**MURO (L=148,73M H=2,6M)**					**SUBTOTAL**	**R$93.317,53**									
17.1	**INFRAESTRUTURA**						**R$22.938,50**		***R$ 22.938,50***		***R$ 0,00***		***R$ 22.938,50***			***R***
17.1.1	AR ENG.	CPU-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES, ATÉ 1,30M	M3	37,69	R$54,57	R$2.057,69	37,69	R$ 2.057,69		R$ 0,00	37,69	R$ 2.057,69	0,00		
17.1.2	AR ENG.	CPU-13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COMACO DE 30KG	M2	65,91	R$30,89	R$2.035,79	65,91	R$ 2.035,79		R$ 0,00	65,91	R$ 2.035,79	0,00		
17.1.3	AR ENG.	94962	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M3	1,98	R$384,57	R$761,66	1,98	R$ 761,66		R$ 0,00	1,98	R$ 761,66	0,00		
17.1.4	AR ENG.	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	55,69	R$61,45	R$3.422,26	55,69	R$ 3.422,26		R$ 0,00	55,69	R$ 3.422,26	0,00		
17.1.5	AR ENG.	92787	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	644,09	R$10,88	R$7.006,77	644,09	R$ 7.006,77		R$ 0,00	644,09	R$ 7.006,77	0,00		
17.1.6	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	86,84	R$11,84	R$1.201,64	86,84	R$ 1.201,64		R$ 0,00	86,84	R$ 1.201,64	0,00		
17.1.7	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=30,0 MPA	M3	12,21	R$341,81	R$4.173,44	12,21	R$ 4.173,44		R$ 0,00	12,21	R$ 4.173,44	0,00		
17.1.8	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	12,21	R$201,67	R$2.464,79	12,21	R$ 2.464,79		R$ 0,00	12,21	R$ 2.464,79	0,00		
17.2	**SUPERESTRUTURA**						**R$25.210,98**		***R$ 25.210,98***		***R$ 0,00***		***R$ 25.210,98***			***R***
17.2.1	AR ENG.	CPU-14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	78,44	R$77,95	R$6.114,62	78,44	R$ 6.114,62		R$ 0,00	78,44	R$ 6.114,62	0,00		
17.2.2	AR ENG.	92767	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	869,17	R$10,88	R$9.443,77	869,17	R$ 9.443,77		R$ 0,00	869,17	R$ 9.443,77	0,00		
17.2.3	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	259,06	R$11,84	R$3.584,71	259,06	R$ 3.584,71		R$ 0,00	259,06	R$ 3.584,71	0,00		
17.2.4	AR ENG.	94965	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=25,0 MPA	M3	10,63	R$348,96	R$3.921,04	10,63	R$ 3.921,04		R$ 0,00	10,63	R$ 3.921,04	0,00		
17.2.5	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	10,63	R$201,67	R$2.145,84	10,63	R$ 2.145,84		R$ 0,00	10,63	R$ 2.145,84	0,00		
17.3	**VEDAÇÃO**						**R$14.828,33**		***R$ 14.828,33***		***R$ 0,00***		***R$ 14.828,33***			***R***
17.3.1	AR ENG.	CPU-16	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, E= 19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 12MM	M2	409,01	R$36,23	R$14.828,33	409,01	R$ 14.828,33		R$ 0,00	409,01	R$ 14.828,33	0,00		
17.4	**REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDES**						**R$3.411,98**		***R$ 2.502,55***		***R$ 0,00***		***R$ 2.502,55***			***R$ 1***
17.4.1	AR ENG.	87271	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	616,02	R$4,17	R$3.411,98	600	R$ 2.502,55		R$ 0,00	600	R$ 2.502,55	216,02		
17.5	**PINTURA**						**R$26.927,82**		***R$ 19.750,97***		***R$ 0,00***		***R$ 19.750,97***			***R$ 7.***
17.5.1	AR ENG.	CPU-41	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	816,02	R$32,92	R$26.927,82	600	R$ 19.750,97		R$ 0,00	600	R$ 19.750,97	216,02		R$

TOTAL	R$1.057.994,14	TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL ATUAL	TOTAL ACUMULADO / SALDO TOTAL
		500.395,25		594.529,69 / R$ 463.

UM MILHÃO, CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 216180

André Luis P. R. Mauro
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	BDI	29,67%
Obra:	ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BLOCO PRINCIPAL	REF.:	SINAPI 03/2021
Local:	DISTRITO DE JOSÉ GONÇALVES - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA	DATA	09/2021

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO (COM BDI)	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					SUBTOTAL	R$58.146,82		R$ 27.664,42		R$ 4.595,94		R$ 32.260,36		R$ 22.
1.1	AR ENG.	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$104,43	R$7.519,03	56	R$ 5.759,12	6	R$ 626,52	43	R$ 4.343,64	30,00	R$
1.2	AR ENG.	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00	R$53,99	R$71.268,00	660	R$ 22.673,40	110	R$ 2.726,50	770	R$ 26.157,20	550,00	R$
1.3	AR ENG.	101389	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$38,42	R$2.766,24	36	R$ 1.382,12	6	R$ 230,52	42	R$ 1.613,64	30,00	R$
1.4	AR ENG.	CPU	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	1,00	R$98,79	R$98,79	1	R$ 98,79		R$ 0,00	1	R$ 98,79	0,00	R$
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					SUBTOTAL	R$52.866,89		R$ 31.777,89		R$ 0,00		R$ 31.777,89		R$ 20.
2.1	AR ENG.	CPU-41	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO (SALAS EXISTENTES E CIRCULAÇÃO)	M2	916,13	R$30,57	R$28.009,35	850	R$ 25.976,59		R$ 0,00	850	R$ 25.976,59	86,13	R$
2.2	AR ENG.	CPU-41	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	191,79	R$32,92	R$6.313,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	191,79	R$
2.3	AR ENG.	CPU-43	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	178,74	R$22,65	R$4.046,42		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	178,74	R$
2.4	AR ENG.	CPU-42	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	136,94	R$14,13	R$1.934,23		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	136,94	R$
2.5	AR ENG.	CPU-43	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA	M2	136,94	R$35,78	R$4.899,71		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	136,94	R$
2.6	AR ENG.	CPU-44	REMOÇÃO DE RALO EM CHAPA GALVANIZADA	M	4,25	R$5,15	R$21,87		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,15	
2.7	AR ENG.	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO, SEM REAPROVEITAMENTO (OURO)	M2	69,42	R$24,42	R$1.451,32	65,42	R$ 1.451,32		R$ 0,00	65,42	R$ 1.451,32	0,00	
2.8	AR ENG	100971	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	156,63	R$3,04	R$769,42	125	R$ 650,90		R$ 0,00	125	R$ 650,90	31,63	
2.9	AR ENG	97914	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 14 KM	M3XKM	703,15	R$1,56	R$1.224,71	600	R$ 936,00		R$ 0,00	600	R$ 936,00	103,15	
2.10	AR ENG.	CPU-6	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	7,76	R$7,56	R$58,67	7,76	R$ 58,67		R$ 0,00	7,76	R$ 58,67	0,00	
2.10	AR ENG.	CPU-7	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	R$295,67	R$1.330,52	4,5	R$ 1.330,52		R$ 0,00	4,5	R$ 1.330,52	0,00	
3	INFRAESTRUTURA					SUBTOTAL	R$5.163,76		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 5.
3.1	AR ENG.	CPU-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU FUNDAÇÕES, ATÉ 1,30M	M3	6,54	R$34,57	R$226,09		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,54	R
3.2	AR ENG.	CPU-13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM PLACA DE 20KG	M2	10,04	R$30,89	R$310,04		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,04	R
3.3	AR ENG.	94963	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M2	0,33	R$294,27	R$97,11		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0,33	
3.4	AR ENG	92955	ATERRO MANUAL DA CAVA DA OBRA	M3	1,36	R$49,38	R$67,16		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,36	
3.5	AR ENG.	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES. UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	17,32	R$61,45	R$1.064,31		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	17,32	R$
3.6	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	109,27	R$10,88	R$1.188,96		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	109,27	R$
3.7	AR ENG	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	13,50	R$13,64	R$184,14		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	13,50	R
3.8	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0 MPA	M3	2,17	R$341,81	R$741,72		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,17	R
3.9	AR ENG.	92873	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	2,17	R$201,87	R$438,06		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,17	R
3.10	AR ENG.	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	2x,91	R$25,65	R$664,86		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2x,91	R
4	SUPERESTRUTURA					SUBTOTAL	R$6.385,69		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 6.
4.1	AR ENG.	CPU-14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM 03 USOS INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	34,87	R$77,93	R$2.718,12		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	34,87	R$
4.2	AR ENG.	92762	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	157,46	R$10,88	R$1.712,81		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	157,46	R$
4.3	AR ENG	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	48,46	R$13,64	R$670,60		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	48,46	R
4.4	AR ENG.	94965	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=25,0 MPA	M3	2,25	R$368,96	R$830,16		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,25	R
4.5	AR ENG.	92875	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	2,25	R$201,87	R$454,21		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,25	R
5	VEDAÇÃO					SUBTOTAL	R$3.353,54		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.
5.1	AR ENG.	CPU-40	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X39CM, E=19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA, JUNTAS 12MM	M2	76,48	R$42,30	R$3.235,10		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	76,48	R$
5.2	AR ENG.	93182	VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO DE 10X20CM	M	3,00	R$39,48	R$118,44		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R
6	ESQUADRIA DE MADEIRA					SUBTOTAL	R$41.628,68		R$ 11.531,41		R$ 0,00		R$ 11.531,41		R$ 30.
6.1	AR ENG.	CPU-16	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,60 X 1,60 M, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FECHADURA	UN	10,00	R$1.002,73	R$10.027,27	4	R$ 4.010,91		R$ 0,00	4	R$ 4.010,91	6,00	R$
6.2	AR ENG.	CPU-44	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 1,60 M, EXCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FECHADURA	UN	2,00	R$1.119,30	R$2.238,59	4	R$ 4.477,18		R$ 0,00	4	R$ 4.477,18	-2,00	-R$
6.3	AR ENG	CPU-45	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,60 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	5,00	R$965,87	R$4.829,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R$
6.4	AR ENG.	CPU-46	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,70 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	3,00	R$915,29	R$2.745,88		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R$
6.5	AR ENG.	CPU-47	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,70 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	21,00	R$1.014,44	R$21.303,30	3	R$ 3.043,33		R$ 0,00	3	R$ 3.043,33	18,00	R$ 1
6.6	AR ENG.	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	12,00	R$49,69	R$596,27		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	12,00	R
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA					SUBTOTAL	R$15.341,88		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 15.
7.1	AR ENG.	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	65,59	R$162,33	R$10.647,22		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	65,59	R$
7.2	AR ENG.	CPU-70	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TIPO FANTASIA, PADRONIZADA	M2	10,98	R$326,61	R$3.476,09		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,56	R$
7.3	AR ENG.	CPU-48	PORTA TIPO GRADIL EM FERRO, DE METALON GALVANIZADO COM SEÇÃO 20X20 MM (SANITÁRIOS)	M2	5,04	R$241,86	R$1.218,57		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,04	R$
8	COBERTURA					SUBTOTAL	R$31.212,47		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 31.
8.1	AR ENG.	CPU-74	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TERÇA EM PERFIL U ENRIJECIDO 150X60X20			R$23,38	R$5.323,71		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	99,00	R$

Engº Flávio Maia de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

André Luís P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

8.2	AR ENG.	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TRMO ACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO RAMPEIO	M2	136,94	R$201,89	R$27.536,51		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	136,94	R$
8.3	AR ENG.	CPU-09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA METÁLICA PARA TELHA TERMOACÚSTICA	M	11,80	R$76,22	R$899,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	11,80	
8.4	AR ENG.	9937 I	RUFO METÁLICO, I = 33 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,92	R$41,93	R$492,86		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,92	
9	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**SUBTOTAL**	**R$34.247,83**		**R$ 6,09**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 34.**
9.1	AR ENG.	94895	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R$18,84	R$169,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	9,00	
9.2	AR ENG.	89855	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X40 MM	UN	4,00	R$7,13	R$28,52		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	
9.3	AR ENG.	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 35X50 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$171,79	R$858,95		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	
9.4	AR ENG.	86934	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSO, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$100,00	R$200,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	
9.5	AR ENG.	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	10,00	R$195,62	R$1.956,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	R
9.6	AR ENG.	86913	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$36,38	R$181,90		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	
9.7	AR ENG.	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA DE 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO OU CUBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R$42,04	R$429,64		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	
9.8	AR ENG.	94553	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	10,00	R$8,66	R$86,60		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	
9.9	AR ENG.	86885	JOELHO FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 3/8", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	10,00	R$12,42	R$124,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	
9.10	AR ENG.	95470	RALO SIFONADO DE LOUÇA COM ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R$140,95	R$2.255,20		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R
9.11	AR ENG.	10001-09	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	16,00	R$29,91	R$478,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	
9.12	AR ENG.	95544	PAPELEIRA DE METAL DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R$27,65	R$442,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	
9.13	AR ENG.	CPU-25	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 1 1/2 40MM, INCLUSIVE TUBO DE FIXO A COM JOELHO	UN	16,00	R$422,63	R$6.762,08		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R
9.14	AR ENG.	100855	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1 2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES P CONJUNTO PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R$437,55	R$1.312,65		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	R
9.15	AR ENG.	95547	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$60,96	R$243,84		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	
9.16	AR ENG.	CPU-26	DISPENSER PARA TOALHAS INTERCALADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$66,14	R$264,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	
9.17	AR ENG.	9868	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	R$92,62	R$351,28		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	
9.18	AR ENG.	100869	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RTO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=32 MM	UN	4,00	R$239,02	R$971,24		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	
9.19	AR ENG.	CPU-27	BANCADA DE GRANITO, LARG = 60	M2	17,00	R$391,24	R$5.152,04		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	17,00	R
9.20	AR ENG.	CPU-28	PONTO DE ÁGUA FRIA	UN	16,00	R$120,14	R$1.922,24		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R
9.21	AR ENG.	CPU-29	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM	UN	16,00	R$86,25	R$1.380,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R
9.22	AR ENG.	CPU-30	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM	UN	16,00	R$127,26	R$2.036,16		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	16,00	R
9.23	AR ENG.	89495	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X40 MM	UN	12,00	R$7,13	R$85,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	12,00	
9.24	AR ENG.	89353	REGISTRO DE GAVETA - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$31,37	R$125,48		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	4,00	
9.25	AR ENG.	CPU-31	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3 000 LITROS	UN	5,00	R$1.285,73	R$6.428,65		R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R
10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**SUBTOTAL**	**R$50.036,52**		**R$ 39.491,72**		**R$ 0,00**		**R$ 39.491,72**		**R$ 10.**
10.1	AR ENG.	10875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	R$527,74	R$527,74		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	
10.2	AR ENG.	CPU-33	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA, 200X200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$97,31	R$97,31		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	
10.3	AR ENG.	101890	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 15 A, EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	12,00	R$12,13	R$145,56		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	12,00	
10.4	AR ENG.	20393	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	R$89,06	R$89,06		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	
10.5	AR ENG.	91985	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE COBRE COOPERWELD 5/8X2,4MM COM CONECTOR	UN	3,00	R$51,91	R$155,73		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,00	
10.6	AR ENG.	CPU-34	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PLÁSTICO COM BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	97,00	R$9,37	R$908,89	80	R$ 765,60	80	R$ 765,60	17,00			
10.7	AR ENG.	97812	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 26 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	97,00	R$19,85	R$1.925,45	80	R$ 1.590,80	80	R$ 1.590,80	17,00			
10.8	AR ENG.	CPU-35	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO 3/4"	UN	97,00	R$929,98	R$21.193,12	80	R$ 25.676,80	69	R$ 25.676,80	17,00			R$
10.9	AR ENG.	CPU-36	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES (1 SEÇÃO) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	UN	11,00	R$274,46	R$3.034,06	7	R$ 1.918,42	7	R$ 1.918,42	4,00			R$
10.10	AR ENG.	CPU-37	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	UN	20,00	R$372,51	R$5.450,20	15	R$ 4.087,65	15	R$ 4.087,65	5,00			R$
10.11	AR ENG.	91961	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A 250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	56,00	R$121,05	R$6.779,80	45	R$ 5.447,25	45	R$ 5.447,25	11,00			R$
11	**FORRO DE PVC**					**SUBTOTAL**	**R$3.749,41**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 3.**
11.1	AR ENG.	96111	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC), INSTALADO	M2	56,93	R$65,86	R$3.749,41		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	56,93	R$
12	**REVESTIMENTO DE FORRO E PAREDES**					**SUBTOTAL**	**R$35.275,37**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 35.**
12.1	AR ENG.	87273	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	331,69	R$4,17	R$1.382,15		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	331,69	R$
12.2	AR ENG.	96081	CONFEÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	152,95	R$33,51	R$5.124,40		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	152,95	R$
12.3	AR ENG.	87281	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	299,47	R$10,36	R$3.091,91		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	299,47	R$
12.4	AR ENG.	87274	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA 33X45 CM, PEI/NBR A PRUMO, COM CIMENTO COLANTE	M2	299,47	R$66,23	R$19.827,91		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	299,47	R$
13	**PISOS**					**SUBTOTAL**	**R$100.847,67**		**R$ 52.007,19**		**R$ 39.491,72**		**R$ 61.209,54**		**R$ 39.**
13.1	AR ENG.	87696	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, AF_06/2014	M2	1107,92	R$139,94	R$44.250,32	1107,92	R$ 44.250,32		R$ 44.250,32		R$ 44.250,32	0,00	

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

André Luis P. C. Mota
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

			MEDIA + 1 X M	M2	57,63	R$24,57	R$2.486,64	57,63	R$ 2.486,64		R$ 0,00	57,63	R$ 2.486,64	0,00	
13.3	AR ENG.	97301	PORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERAMICA ESMALTADA TIPO A, 42X42 CM, PEI 5, COM COMPACTO COLANTE	M2	57,63	R$30,04	R$2.432,41		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	57,63	R$
13.4	AR ENG	CPU-31	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	22,04	R$114,29	R$2.518,95		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	22,04	R$
13.5	AR ENG	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANILINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	1.020,29	R$36,50	R$37.405,83	30	R$ 1.095,00	300	R$ 10.950,00	720,29	R$ 26.455,83		R$
13.6	AR ENG	101741	PORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, 10 CM	M	673,36	R$23,59	R$11.042,27	100	R$ 2.359,00	90	R$ 1.415,40	100	R$ 4.248,60	583,36	R$
13.7	AR ENG	94569	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 42X45CM. AF_06/2014	M	13,14	R$6,35	R$83,47		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	13,14	
13.8	AR ENG.	91689	POR/ASSENTAMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA DE GRANITO, L=15CM	M	6,26	R$96,92	R$431,10		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,26	
14	**PINTURA**						**SUBTOTAL**	**R$44.678,73**		**R$ 0,00**		**R$ 5.970,00**		**R$ 5.970,00**		**R$ 38.**
14.1	AR ENG.	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 1 DEMÃO, MASSA PVA	M2	256,05	R$14,22	R$3.641,03		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	256,05	R$
14.2	AR ENG.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	M2	1.020,98	R$11,74	R$12.003,71		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.020,98	R$
14.3	AR ENG.	88496	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	325,03	R$16,59	R$5.903,01		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	325,03	R$
14.4	AR ENG.	88485	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	2.250,34	R$9,95	R$22.360,89	600	R$ 5.970,00	600	R$ 5.970,00	1.650,34	R$ 16.420,89		R$
14.5	AR ENG.	88489	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M2	157,50	R$15,08	R$2.375,01		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	157,50	R$
14.6	AR ENG.	88496	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPÓXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MÍCRA	M2	10,00	R$11,42	R$114,16		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	
14.7	AR ENG.	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	10,00	R$25,59	R$255,95		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,00	
15	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**SUBTOTAL**	**R$42.925,26**							
15.1	**RAMPA DE ACESSO**							**R$3.871,48**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**	**R$ 3.**
15.1.1	AR ENG	96536	FORMA TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, UTILIZAÇÃO 4 VEZES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	1,50	R$62,45	R$93,68		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,50	
15.1.2	AR ENG.	94970	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25,0 MPA	M3	6,05	R$341,81	R$2.067,93		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,05	R$
15.1.3	AR ENG.	92373	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃO, MASSA PVA	M2	6,88	R$201,47	R$1.327,37		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	6,88	R$
15.1.4	AR ENG	99955	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2016_P	M	5,00	R$96,79	R$483,95		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	
15.2	**BANCO EM GRANITO (2 UN)**							**R$12.945,75**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**	**R$ 12.**
15.2.1	AR ENG.	CPU-32	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	15,75	R$269,61	R$3.301,36		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	15,75	R$
15.2.2	AR ENG	90408	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	31,50	R$32,51	R$1.024,12		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	31,50	R$
15.2.3	AR ENG.	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	31,50	R$16,59	R$522,36		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	31,50	
15.2.4	AR ENG.	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	31,50	R$9,95	R$313,36		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	31,50	R
15.2.5	AR ENG.	CPU-33	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	17,50	R$444,36	R$7.776,63		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	17,50	R$
15.3	**ESCOVODROMO COM 5 TORNEIRA**							**R$1.967,96**		**R$ 253,87**		**R$ 0,00**		**R$ 253,87**	**R$ 2.**
15.3.1	AR ENG.	101159	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM)	M2	10,28	R$127,60	R$1.311,74		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	10,28	R$
15.3.2	AR ENG.	96995	ATERRO MANUAL DA CAIXA DA OBRA	M3	0,57	R$46,38	R$26,15	0,57	R$ 26,15	0,57	R$ 26,15	0,00			
15.3.3	AR ENG.	87619	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	1,44	R$39,94	R$57,51	1,44	R$ 57,51	1,44	R$ 57,51	0,00			
15.3.4	AR ENG.	87911	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	5,54	R$30,36	R$168,21	5,54	R$ 168,21	5,54	R$ 168,21	0,00			
15.3.5	AR ENG.	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	5,54	R$53,00	R$294,00		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,54	R
15.3.6	AR ENG.	89465	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, 100X60 MM	UN	2,00	R$7,15	R$14,30		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	
15.3.7	AR ENG.	89965	TORNEIRA DE PRESSÃO PLÁSTICA COMUM, USO GERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$36,56	R$182,78		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R
15.3.8	AR ENG.	CPU-28	PONTO DE ÁGUA FRIA	UN	5,00	R$120,16	R$600,82		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	5,00	R
15.3.9	AR ENG	CPU-29	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM	UN	2,00	R$86,23	R$172,46		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	2,00	R
15.3.10	AR ENG.	89353	REGISTRO DE GAVETA - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$31,87	R$31,87		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,00	
15.4	**CASA DE GÁS**							**R$3.421,89**		**R$ 2.379,38**		**R$ 0,00**		**R$ 2.379,38**	**R$ 1.0**
15.4.1	AR ENG.	CPU-12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES, ATÉ 1,00M	M3	0,74	R$54,57	R$40,38	0,74	R$ 40,38		R$ 0,00	0,74	R$ 40,38	0,00	
15.4.2	AR ENG.	CPU-13	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM MACO DE 30KG	M2	1,86	R$30,39	R$57,45	1,86	R$ 57,45		R$ 0,00	1,86	R$ 57,45	0,00	
15.4.3	AR ENG.	94962	PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	M3	0,06	R$244,27	R$17,66	0,06	R$ 17,66		R$ 0,00	0,06	R$ 17,66	0,00	
15.4.4	AR ENG.	CPU-14	FORMA PLANA PARA BALDRAMES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	2,53	R$77,95	R$197,22	2,53	R$ 197,22		R$ 0,00	2,53	R$ 197,22	0,00	
15.4.5	AR ENG.	92760	ARMADURA CA - 50 MÉDIA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	31,25	R$10,90	R$339,93	31,25	R$ 339,93		R$ 0,00	31,25	R$ 339,93	0,00	
15.4.6	AR ENG.	92759	ARMADURA CA - 50 FINA - TRANSPORTE, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	6,84	R$13,54	R$94,65	6,84	R$ 94,65		R$ 0,00	6,84	R$ 94,65	0,00	
15.4.7	AR ENG.	94965	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=25,0 MPA	M3	0,37	R$366,90	R$134,52	0,37	R$ 136,52		R$ 0,00	0,37	R$ 136,52	0,00	
15.4.8	AR ENG.	92871	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	0,37	R$201,47	R$74,69	0,37	R$ 74,69		R$ 0,00	0,37	R$ 74,69	0,00	
15.4.9	AR ENG	CPU-15	LAJE PRÉ-MOLDADA DE FORRO, E=8 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO E CAPEAMENTO	M2	2,40	R$49,32	R$118,34	2,4	R$ 118,34		R$ 0,00	2,4	R$ 118,34	0,00	
15.4.10	AR ENG.	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	6,82	R$25,45	R$173,56	6,82	R$ 173,56		R$ 0,00	6,82	R$ 173,56	0,00	
15.4.11	AR ENG.	CPU-16	PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO FURADO HORIZONTAL E=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, CIMENTO E AREIA, JUNTAR 12MM	M2	5,06	R$57,23	R$289,53	5,06	R$ 289,53		R$ 0,00	5,06	R$ 289,53	0,00	
15.4.12	AR ENG.	87273	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	19,99	R$4,17	R$83,39	19,99	R$ 83,39		R$ 0,00	19,99	R$ 83,39	0,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

André Luis P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 05.390

15.4.13	AR ENG.	98408	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA	M2	19,99	R$32,51	R$649,91	19,99	R$ 649,91		R$ 0,00	19,99	R$ 649,91	0,00	
15.4.14	AR ENG.	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5 CM. AF_06/2014	M2	1,47	R$38,94	R$57,71	1,47	R$ 57,71		R$ 0,00	1,47	R$ 57,71	0,00	
15.4.15	AR ENG.	96679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	1,47	R$30,12	R$44,28	1,47	R$ 44,28		R$ 0,00	1,47	R$ 44,28	0,00	
15.4.16	AR ENG.	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 1 DEMÃO, MASSA PVA	M2	19,99	R$14,23	R$284,19		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	19,99	R
15.4.17	AR ENG.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	M2	19,99	R$11,73	R$234,74		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	19,99	R
15.4.18	AR ENG.	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	3,57	R$25,59	R$96,63		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	3,57	
15.4.19	AR ENG.	CPU-48	PORTA TIPO GRADIL EM PERFIL DE FERRO GALVANIZADO COM PICAPORTE EM [illegible]	M2	1,79	R$241,06	R$431,04		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1,79	R
15.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R$10.916,66		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 10.9
15.1	AR ENG.	98068	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	299,47	R$3,31	R$991,01		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	299,47	R
15.2	AR ENG.	98065	LIMPEZA DE PISO CERÂMICOS	M2	967,43	R$1,03	R$961,85		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	967,86	R
15.3	AR ENG.	CPU-39	LIMPEZA DE VIDROS	M2	81,21	R$12,87	R$1.045,46		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	81,21	R$
15.4	AR ENG.	CPU-40	LIMPEZA GERAL	M2	1.167,92	R$14,62	R$13.925,44		R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 0,00	1.167,92	R$ 1
TOTAL							**R$521.251,92**	**TOTAL ACUMULADO ANTERIOR**		**TOTAL ATUAL**		**TOTAL ACUMULADO**		**SALDO TOTAL**	
									165.105,08		**19.768,34**		**184.873,42**		**R$ 336.**
QUINHENTOS E VINTE E UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS															

TOTAL GERAL	**R$1.579.246,07**
UM MILHÃO, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS	

BM	DATA	VALOR	(%)
1	20/11/2021	R$ 61.894,62	4%
2	20/12/2021	R$ 190.270,71	12%
3	25/01/2022	R$ 117.126,48	7%
4	25/04/2022	R$ 118.401,79	7%
5	25/05/2022	R$ 125.921,82	8%
6	29/06/2022	R$ 113.404,66	7%
7	01/08/2022	R$ 113.902,78	7%

Vitória da Conquista - BA, 01 de agosto de 2022.

AR Engenharia Eireli
CNPJ: 36.286.217/0001-57
André Luís Praies Rocha Moura
Engenheiro civil
CPF: [redacted]

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

André Luís P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

QUINTA COMISSÃO
213
SINDIPA

FOTO 06 – Rampa concretada

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

André Luis [illegible]
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

QUINTA COMISSÃO
FLS. 214

FOTO 04 – Rampa pronta para ser concretada

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

Ana [illegible] Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

COMISSÃO
215
SINDIPA

FOTO 03 – Sala de reforma com granilite executado

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro
CREA - PE

ENGENHEIRO
CREA

QUINTA COMISSÃO
Fls: 216
CREA

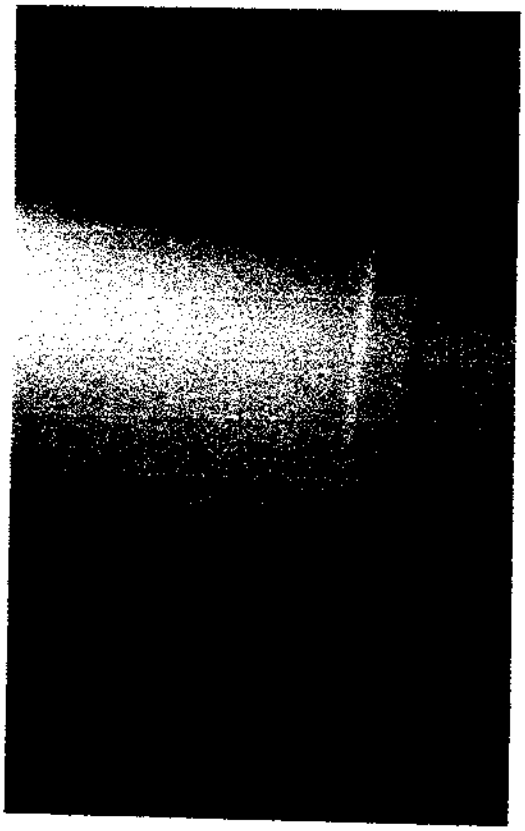

FOTO 01: ANTES – Sala da ampliação com emassamento

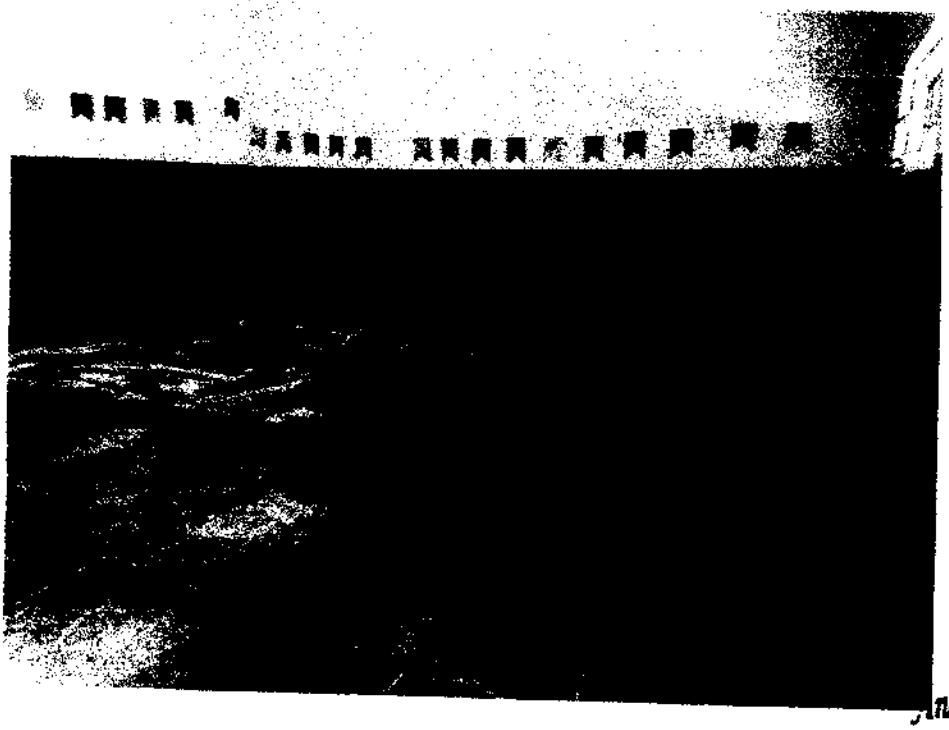

FOTO 02: Sala de reforma com execução de granilite

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

Ana Luis P. N. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 06.390

QUINTA COMISSÃO
Fls 217
SINDIPA

Relatório fotográfico BM 07

Modalidade: Tomada de preço

Contrato nº: 104-2021

Objeto: ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA - REFORMA E AMPLIAÇÃO (MÓDULO NOVO)

Contratante: Prefeitura Municipal

Contratada: Empresa AR Engenharia Eirelli

Cidade: José Gonçalves - Ba

Período de execução: 30/06/2022 à 29/07/2022

Número da medição: 07

Coordenadas geométricas: 14°43'41.6"S 40°43'35.3"W

André Luis P. R. Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 95.390

José Flávio Mafra de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - BA - 27678/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

218

Protocolo - ***09736/2023***

PAI 068/2022 - Garantia contratual e medição da obra

Vitória da Conquista, 09 de março de 2023

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022

Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57

Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

Ao Ilmº. Sr.

Maximiliano Leandro Alves

Núcleo de Manutenção e Infraestrutura - SMED

Rua Siqueira Campos, nº 1.842, Vila Emurc, Candeias.

Na condição de Presidente da Comissão de Inquérito designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, com o intuito de **apurar** denúncia de infração cometida, em tese, pela pessoa jurídica intitulada **AR ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no **CNPJ** sob o **n.º 36.286.217/0001-57,** no âmbito do Processo Licitatório da **Concorrência Pública nº 002/2021**, decorrente do Processo Administrativo nº 14.980/2021, relacionada a inexecução parcial de obra de ampliação da Escola Municipal Moisés Meira, localizada no Distrito de José Gonçalves, solicito esclarecimento referente aos boletins de medição enviados por meio do Protocolo GEP nº 09736/2023, quanto ao entendimento de que foi executado efetivamente 52% (cinquenta e dois por cento) do total da obra, conforme tabela constante no boletim de medição nº 7.

Atenciosamente,

Recebido 15.03.2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

219

MEG DE SOUSA MARQUES
AGENTE ADMINISTRATIVO
18644-4
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - STPC

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
NUCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

220

Protocolo - **09736/2023**

PAI 068/2022 - Garantia contratual e medição da obra

Vitória da Conquista, 14 de março de 2023

Prezados,

Segue anexo relatório sintético da obra em questão, com as informações da empresa até o momento do abandono.

Atenciosamente,

MAXIMILIANO LEANDRO ALVES
COORDENAÇÃO
22979
NUCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA - SMED

221

Vitória Da Conquista, 30 de agosto de 2022

Relatório sintético de obra

Trata-se este documento, de relatório sintético da obra vinculada ao contrato nº 124/2021 para Reformas Estruturais e ampliação. Reparos e Manutenção de Infraestrutura da Escola Municipal Moisés Meira. Localizada no Distrito de José Gonçalves, nos termos do processo Licitatório Concorrência Pública nº 002/2021 e Processo Administrativo nº 14.980/2021, firmado com a EMPRESA AR ENGENHARIA EIRELI, empresa com inscrição de CNPJ nº 36.286.217/001-57.

Este relatório, apresentara de modo sucinto o histórico de obra, em suas apresentações formais, (contratos, ofícios, medições, relatórios e notificações), comparando com as obrigações do contrato bem como seus ajustes

Deste modo, segue apresentado de maneira pontuada e conforme datas de registro os seguintes fatos:

1. Publicação do Edital para Concorrência nº 002/2021 com data de sessão púbica para 20/09/2021. Após todo o tramite legal da sessão, ficou declarada vencedora a EMPRESA AR ENGENHARIA EIRELI, com valor total de R$ 1.579.246,07
2. Foi assinado o contrato de prestação de serviço e em seguida emitido a ordem de serviço, com início efetivo da obra em 15/10/2021.
3. Da obra em questão, existem dois cronogramas distintos, um para a execução da Reforma e ampliação do módulo novo, e outro para Ampliação e Reforma do Bloco Principal, com quantitativos/volume de execução diferentes, mas com prazo final total idênticos, seis meses. Assim apresentados em valor e percentual na licitação:

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO (Valor Licitado)

	SERVIÇOS		1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	TOTAL	%
.01	Reforma e ampliação do módulo novo	%	0,10	0,18	0,08	0,19	0,21	0,23	100%	
		R$	143.661,94	247.278,71	116.620,29	274.485,39	299.388,51	327.962,79	R$ 1.409.407,63	68%
.02	Ampliação e Reforma do Bloco Principa	%	10%	6%	5%	16%	23%	41%	100%	
		R$	63.947,18	37.012,37	30.263,68	107.391,73	151.991,45	268.576,86	R$ 659.183,27	32%
	TOTAL DO MÊS	R$	207.609,12	284.291,08	146.883,98	381.877,12	451.389,97	596.539,65	R$ 2.068.590,91	
	% DO VALOR	%	10%	14%	7%	18%	22%	29%		
	TOTAL ACUMULADO	R$	207.609,12	491.900,20	638.784,18	1.020.661,30	1.472.051,26	2.068.590,91		
	% ACUMULADO	%	10%	24%	31%	49%	71%	100%		

4. Desde o inicio da obra em 15/10/2021, até 27/07/2022 foram feitas medições no valor de R$ 816.844,41, equivalente a 51,72% da obra, conforme resumo:

Maximiliano Leandro Alves
2297-9
Coord. de Infraestrutura-SMED

Danilo Gusmão
Engenheiro Civil
CREA: 0515388289

Rua Formosa, nº 54, Bairro Jurema
Fone: (77) 3429-7750
CEP 45.023-290- Vitória da Conquista - Bahia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANTIGO

ITEM	SERVIÇOS		BM 01 16/10/2021 20/11/2021	BM 02 21/11/2021 20/12/2021	BM 03 21/12/2021 20/01/2022	BM 04 21/01/2022 25/04/2022	BM 05 26/04/2022 25/05/2022	BM 06 26/05/2022 29/06/2022	BM 07 30/06/2022 31/07/2022	TOTAL	
		Dias	35	30	31	95	30	34	29	294	
01	Reforma e ampliação do módulo novo	%	4,12%	10,21%	4,63%	7,54%	3,53%	1,33%	1,61%	32,97%	R$ 642.242,87
		R$	43.554,44	108.719,53	49.144,44	79.[illegible],79	37.[illegible],53	14.[illegible],79	17.[illegible],23	350.[illegible],19	
02	Ampliação e Reforma do Bloco Principal	%	3,52%	5,87%	2,36%	11,91%	3,36%	2,[illegible]%	1,[illegible]%	29,[illegible]%	R$ 174.601,54
		R$	18.340,19	30.531,18	12.[illegible],63	62.[illegible],53	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	TOTAL DO MÊS	R$	61.894,62	170.300,71	93.083,07	139.[illegible],92	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 816.844,41
	% DO VALOR	%	3,92%	10,78%	5,89%	8,85%	[illegible]%	[illegible]%	[illegible]%	[illegible]%	51,72%
	TOTAL ACUMULADO	R$	61.894,62	232.195,33	325.[illegible],40	465.[illegible],32	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	% ACUMULADO	%	3,92%	14,70%	20,[illegible]%	29,45%	[illegible]%	[illegible]%	[illegible]%	[illegible]%	

Cronograma Inicial

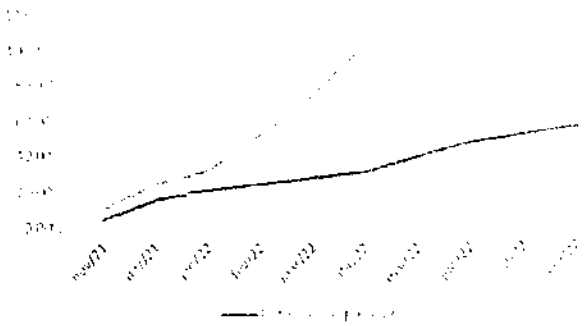

5. A obra tinha prazo inicial de término para 15/04/2022, entretanto houve um termo aditivo de prazo, prorrogando a obra por mais seis meses, conforme justificativas no termo. Deste modo, na data do aditivo, a obra havia evoluido 29,45%, restando 70,55% para reprogramação.
6. Diante deste novo prazo, a obra apresentou evolução de 22,28% em 92 (noventa e dois) dias. Apresentando média mensal de 7,43%, em que o esperado era uma evolução de 11,76%. Deste modo, a obra apresentou evolução 36,85% menor que o esperado.

Cronograma Reprogramado

Maximiliano Leandro Alves
2297-9
Coord. de Infraestrutura-SMED

Danilo Gusmão
Engenheiro Civil
CREA: 0515388289

7. Foi apurado deste modo, que a execução da obra não corresponde ao Cronograma Físico/Financeiro proposto no processo Licitatório, nem em conformidade com aditivo de prazo ao contrato para execução até o dia 15/10/2022, sem a devida evolução esperada para o lastro de tempo decorrido desde o início dos trabalhos até a presente data, estando assim os serviços em atraso.
8. Ainda em visita a obra, no dia 24/08/2022, para vistoria, foi constado a paralização total das obras. No ato foi identificado que todo o equipamento necessário a execução havia sido retirado do local, tendo sido ainda informado por funcionários que se encontravam no local que os mesmos não continuariam a trabalhar na obra por falta de pagamento.
9. Foi feito ainda no local no dia 24/08/2022, um relatório fotográfico do estado atual da obra, que ainda apresenta 48,28% dos serviços a serem executados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
MAXIMILIANO LEANDRO ALVES
COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA / SMED
INFRAESTRUTURA/SMED – MAT 2297-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
DANILO DAMASCENO GUSMÃO
ENGº CIVIL, CREA – BA 3000033207/D
INFRAESTRUTURA/SMED – MAT 14600-0

224

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

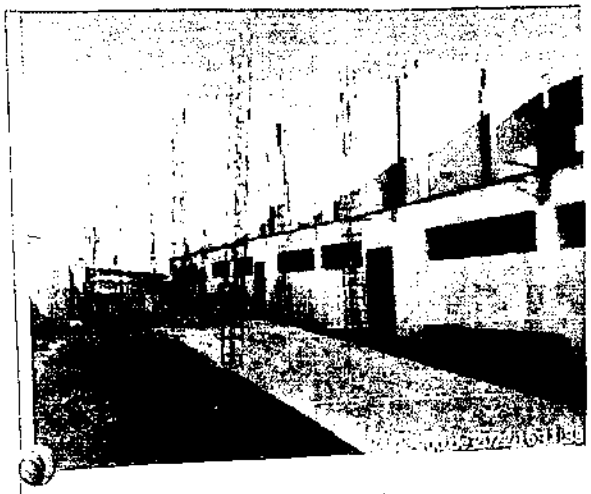

Foto 01 Rampa de acesso 1º andar

Foto 02 Salas de Reforma da Ampliação

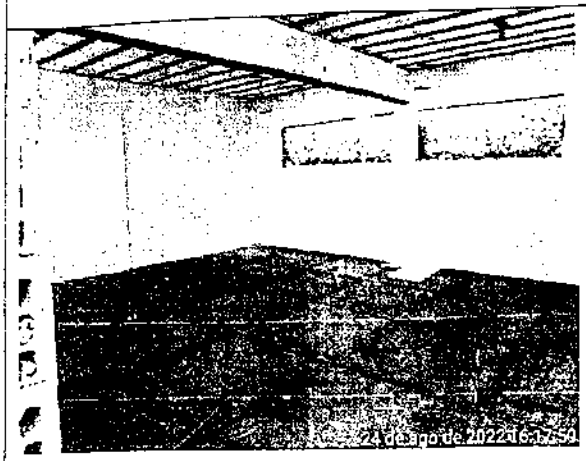

Foto 03 Sala 01 Prédio Novo

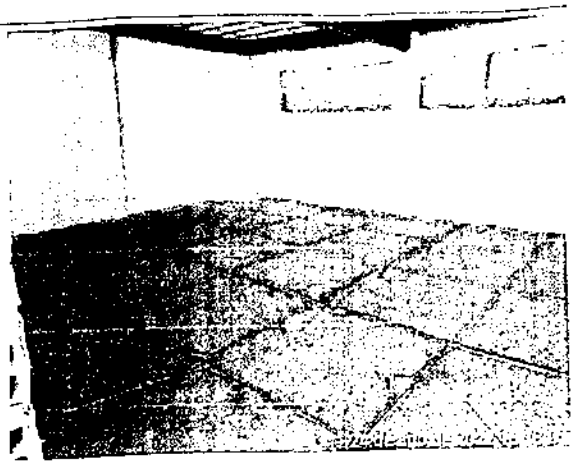

Foto 04 Sala 02 Prédio Novo

Escola Municipal Moisés Meira, Distrito de José Gonçalves

Rua Formosa, nº 54, Bairro Jurema
Fone: (77) 3429-7750
CEP 45.023-290 - Vitória da Conquista - Bahia

Danilo Gusmão
Engenheiro Civil
CREA: 0515388289

Escola Municipal Moisés Meira, Distrito de José Gonçalves

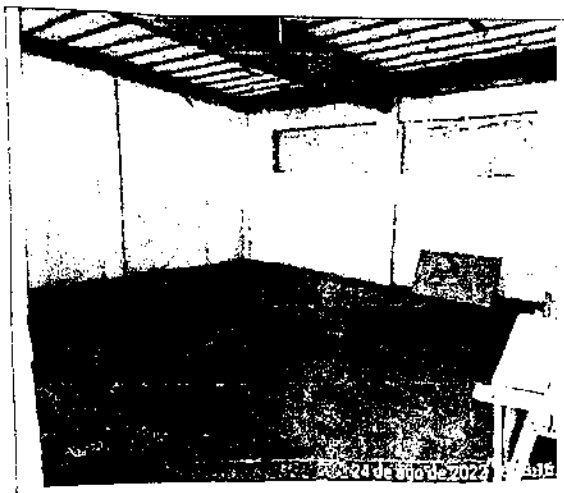

Foto 05 Sala 03 Prédio Novo

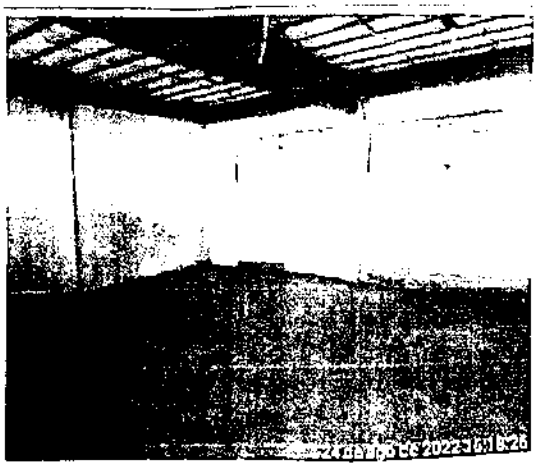

Foto 06 Sala 04 Prédio Novo

Foto 07 Sala 05 Prédio Novo

Foto 08 Barracão do canteiro

Danilo Gusmão
Engenheiro Civil
CREA: 0515388289

226

Foto 09 *Pátio de acesso ao Banheiro da ampliação*

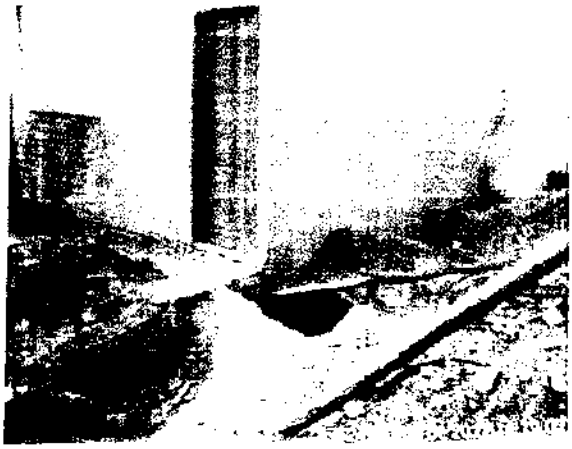

Foto 10 *Banheiro da ampliação*

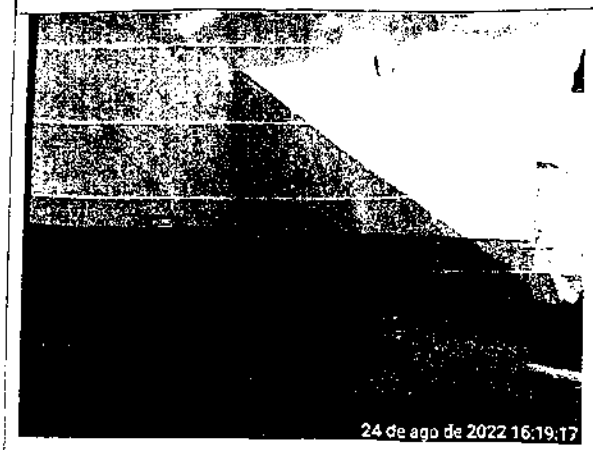

Foto 11 *Sala 01 salas a reformar no modulo ampliado*

Foto 12 *Corredor no modulo ampliado*

Escola Municipal Moisés Meira, Distrito de José Gonçalves

Danilo Gusmão
Engenheiro Civil
CREA: 0515388289

Rua Formosa, nº 54, Bairro Jurema
Fone: (77) 3429-7750
CEP 45.023-290- Vitória da Conquista - Bahia

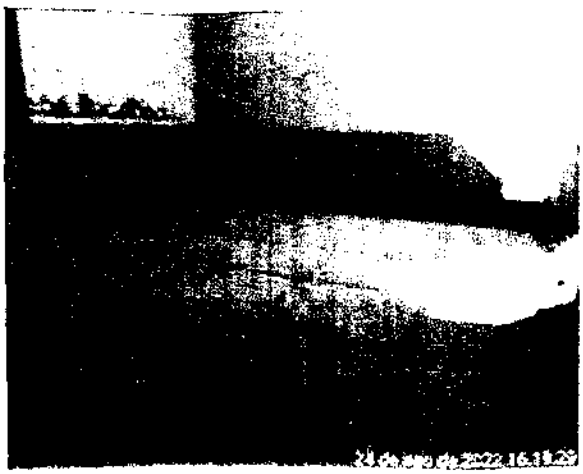

Foto 13 Sala 02 salas a reformar no modulo ampliado

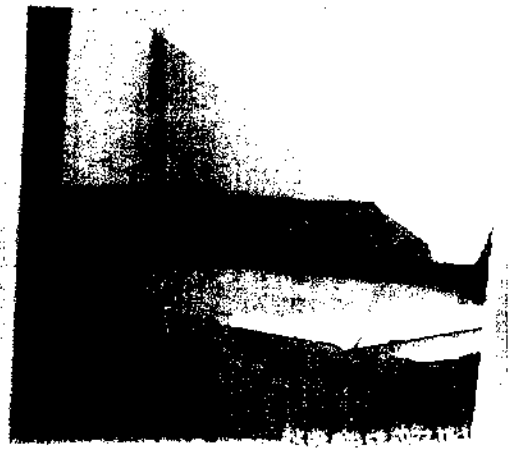

Foto 14 Sala 03 salas a reformar no modulo ampliado

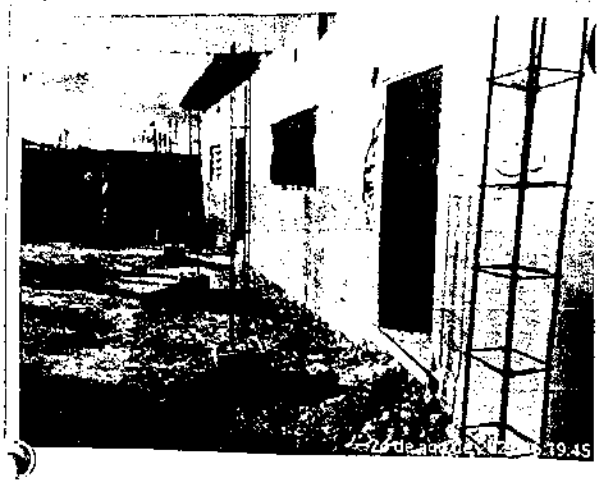

Foto 15 Pátio no modulo ampliado

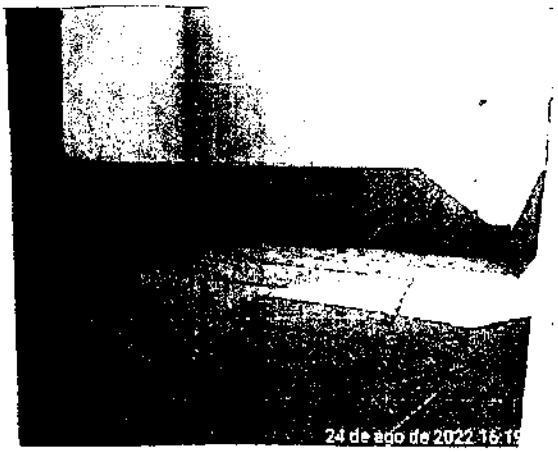

Foto 16 Sala 04 salas a reformar no modulo ampliado

Escola Municipal Moisés Meira, Distrito de José Gonçalves

Danilo Gusmão
Engenheiro Civil
CREA: 0515388289

Rua Formosa, nº 54, Bairro Jurema
Fone: (77) 3429-7750
CEP 45.023-290 - Vitória da Conquista - Bahia

228

Foto 17 *Sala 05 salas a reformar no modulo ampliado*

Foto 18 *Salas a reformar no modulo ampliado*

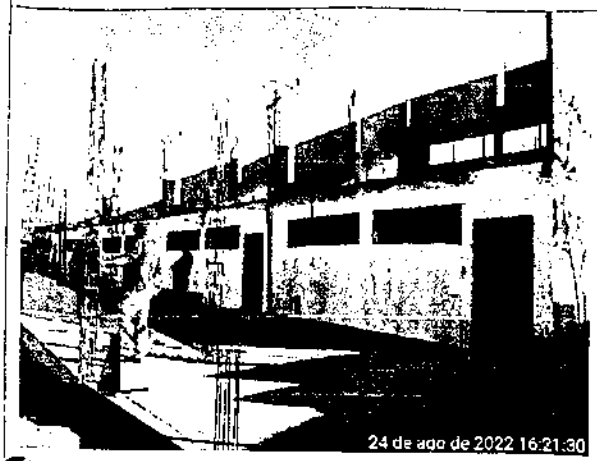

Foto 19 *Pátio das Salas Ampliada*

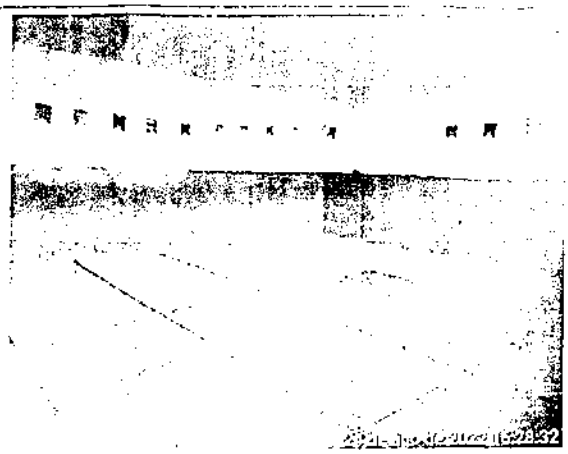

Foto 20 *Sala do módulo existente a reformar*

Escola Municipal Moisés Meira, Distrito de José Gonçalves

Danilo Cusmão
Engenheiro Civil
CREA: 0515388289

Rua Formosa, nº 54, Bairro Jurema
Fone: (77) 3429-7750
CEP 45.023-290 - Vitória da Conquista - Bahia

229

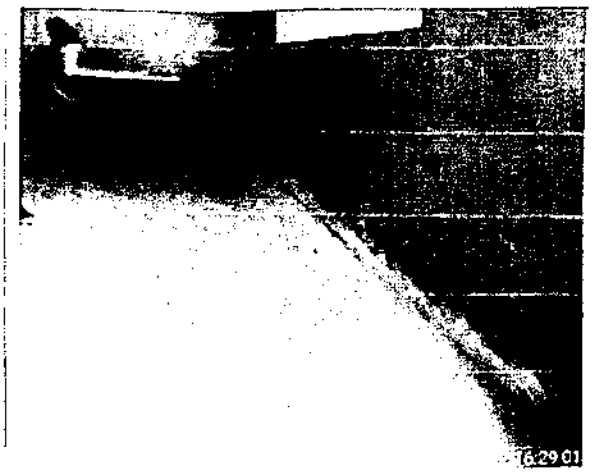

Foto 21 Sala do módulo existente a reformar

Foto 22 Sala do módulo existente a reformar

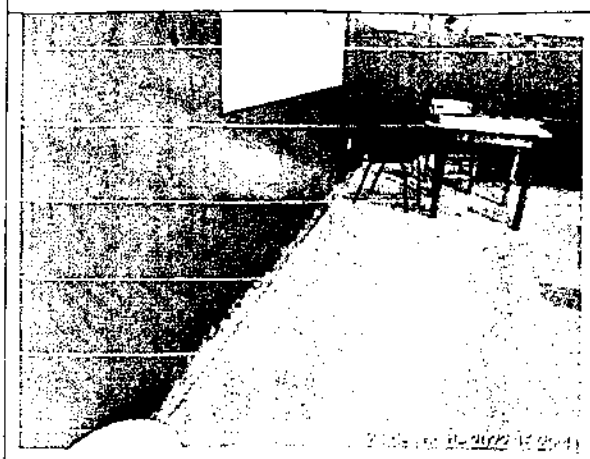

Foto 23 Sala do módulo existente a reformar

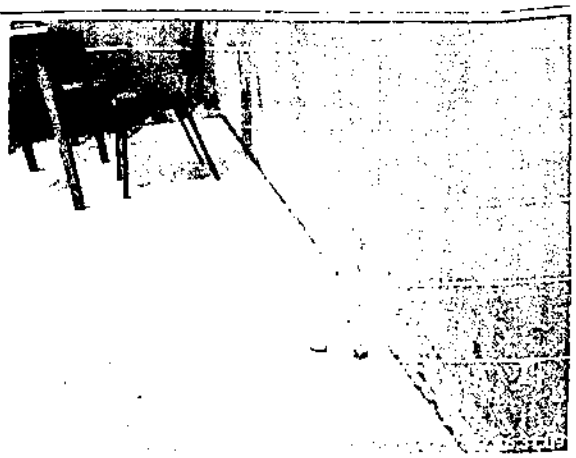

Foto 24 Sala do módulo existente a reformar

Escola Municipal Moisés Meira,
Distrito de José Gonçalves

Danilo Gusmão
Engenheiro Civil
CREA: 0515388289

Rua Formosa, nº 54, Bairro Jurema
Fone: (77) 3429-7750
CEP 45.023-290 - Vitória da Conquista - Bahia

230

Escola Municipal Moises Marti
Distrito de Jose Gonçalves

Foto 25 Sala do módulo existente a reformar

Foto 26 Sala do módulo existente a reformar

Danilo Gusmão
Engenheiro Civil
CREA: 0515388289

Rua Formosa, nº 54, Bairro Jurema
Fone: (77) 3429-7750
CEP 45.023-290 - Vitória da Conquista - Bahia

231

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

ATA DE DELIBERAÇÃO

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março do ano de 2023, às 14:30h, na sala de reuniões das Corregedoria-Geral do Município, situada na Rua João Norberto, nº 46, CEP. 45.005-040, Alto Maron, nesta, aí presentes ***Meg de Sousa Marques, Nayara Ferraz Oliveira e Elbert Cleber de Santana Monteiro,*** respectivamente presidente e vogais da Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022, designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, **DELIBERAM** pela intimação da denunciada para alegações finais, nos termos do Artigo 44, §4, do Decreto Municipal n.º 18.484 de 13 de março de 2018, em razão de juntada de novos documentos aos autos. Isto posto, eu, Meg de Sousa Marques, na condição de Presidente da Comissão, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os membros da Comissão.

Meg de Sousa Marques
Presidente

Nayara Ferraz Oliveira
Membro

Elbert Cleber de Santana Monteiro
Secretário

232

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

Vitória da Conquista - BA, 23 de março de 2023.

Ofício nº. 299/2023 – STPC/CRGM
À AR ENGENHARIA EIRELI
CNPJ nº 36.286.217/0001-57
Av. Deputado Ulisses Guimarães, nº 450 D- SL03, Andar 1, Bairro Felícia
Vitória da Conquista - BA
CEP: 45055-155

Na condição de Presidente da Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022, designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, instaurado para apurar suposta infração, em tese, no âmbito da Concorrência nº 002/2021, decorrente do Processo Administrativo nº 14.980/2021, em virtude da inexecução parcial de obra de ampliação da Escola Municipal Moisés Meira, localizada no distrito de José Gonçalves, o que representa, caso seja comprovada, violação à Cláusula Primeira, Cláusula Segunda (itens 2.1 e 2.4) e Cláusula Sexta (itens 6.1 e 6.4) do Contrato Administrativo nº 124/2021, consoante informações contidas na Comunicação Interna nº 189/2022-SMED (GEP 56739/2022), oriunda da Secretaria Municipal de Educação e documentos anexos, fica **INTIMADA para, na pessoa de seu representante legal, apresentar alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias úteis**, contados a partir do recebimento da presente intimação, considerando a juntada de novos documentos aos autos após a defesa escrita, conforme Art. 44, §4º do Decreto Municipal nº 18.484/2018.

234

CERTIDÃO

Certifico que não pude dar cumprimento ao Ofício n.º 299/2023- CRGM/STPC, vez que ao me dirigir ao endereço da Av. Deputado Ulisses Guimarães, nº 450 D, SL 03 - Bairro Felícia, nesta cidade, no dia 30-03-2023 ás 11:00 fui informado por um Sr. de prenome Mateus que a Empresa AR ENGENHARIA EIRELLI não está mais no endereço supracitado, O referido é verdade e dou fé.

Vitória da Conquista – BA, 03 de abril de 2023.

Rielson Mendes de Souza Lima
Matrícula nº 07-11047-2

235

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

ATA DE DELIBERAÇÃO

Aos 04 (quatro) dias do mês de abril do ano de 2023, às 11h, na sala de reuniões da Corregedoria-Geral do Município, situada na Rua João Norberto, nº 46 - Alto Maron, CEP. 45.005-040, Nesta, aí presentes ***Meg de Sousa Marques, Elbert Cleber de Santana Monteiro e Nayara Ferraz Oliveira,*** respectivamente presidente e vogais da Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022, designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, **DELIBERARAM** por INTIMAR POR EDITAL a pessoa jurídica **AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57**, para apresentar ALEGAÇÕES FINAIS no prazo de 10 (dez) dias úteis, nos termos do Artigo 39, §1º, do Decreto Municipal n.º 18.484 de 13 de março de 2018, em razão de juntada de novos documentos aos autos, e pela Comissão não ter logrado êxito na intimação pessoal da empresa, no endereço constante na proposta de preços, bem como a inexistência de outros endereços nos autos, conforme certidão constante à fl. 234, do que, para constar, eu, Meg de Sousa Marques, na condição de Presidente da Comissão, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos demais membros.

Meg de Sousa Marques
Presidente

Nayara Ferraz Oliveira
Membro

Elbert Cleber de Santana Monteiro
Secretário

Rua João Norberto, 46 – Alto Maron
Fone: (77) 3421-8001 / 3424-8505
CEP 45005-040 - Vitória da Conquista - Bahia
www.pmvc.ba.gov.br

236

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

Diário Eletrônico / PMVC
Publicado em 11/04/23
Edição nº 3423
Página(s)

Vitória da Conquista, 06 de abril de 2023.

Na condição de Presidente da Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022, designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, instaurado para apurar representação de irregularidades praticadas, em tese, no âmbito da Concorrência nº 002/2021, decorrente do Processo Administrativo nº 14.980/2021, em virtude da inexecução parcial de obra de ampliação da Escola Municipal Moisés Meira, localizada no distrito de José Gonçalves, o que representa, caso seja comprovada, violação à Cláusula Primeira, Cláusula Segunda (itens 2.1 e 2.4) e Cláusula Sexta (itens 6.1 e 6.4) do Contrato Administrativo nº 124/2021, consoante informações contidas na Comunicação Interna nº 189/2022-SMED (GEP 56739/2022), oriunda da Secretaria Municipal de Educação e documentos anexos, fica a empresa **AR ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 36.286.217/0001-57, *INTIMADA*** por meio do presente EDITAL, em razão do insucesso da intimação pessoal, para, querendo, apresentar alegações finais, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de publicação do edital, conforme o disposto no Artigo 39, §1º, do Decreto Municipal n.º 18.484 de 13 de março de 2018.

Ademais, informamos que os autos do processo encontram-se na Corregedoria Geral do Município, situada na Rua João Norberto, n.º 46 - Alto Maron, neste Município, que funciona de segunda a sexta-feira de 08h às 12h e 14h às 18h, à disposição para vistas ou extração de cópias fora da repartição, que só poderão ser concedidos ao representante legal ou procurador da empresa legalmente habilitado nos autos. Impede destacar que as alegações poderão ser promovidas por representante legal ou advogado legalmente constituído nos autos, devendo a mesma ser entregue no local e horário supracitados.

Meg de Sousa Marques
Presidente

Rua João Norberto n.º 46, Alto Maron
Fone: (77) 3421-8001
CEP 45005-040 - Vitória da Conquista - Bahia
www.pmvc.ba.gov.br

237

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PAI N.º 068/2022

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

Vitória da Conquista, 06 de abril de 2023.

Na condição de Presidente da Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022, designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, instaurado para apurar representação de irregularidades praticadas, em tese, no âmbito da Concorrência nº 002/2021, decorrente do Processo Administrativo nº 14.980/2021, em virtude da inexecução parcial de obra de ampliação da Escola Municipal Moisés Meira, localizada no distrito de José Gonçalves, o que representa, caso seja comprovada, violação à Cláusula Primeira, Cláusula Segunda (itens 2.1 e 2.4) e Cláusula Sexta (itens 6.1 e 6.4) do Contrato Administrativo nº 124/2021, consoante informações contidas na Comunicação Interna nº 189/2022-SMED (GEP 56739/2022), oriunda da Secretaria Municipal de Educação e documentos anexos, fica a empresa **AR ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 36.286.217/0001-57, *INTIMADA*** por meio do presente EDITAL, em razão do insucesso da intimação pessoal, para, querendo, apresentar alegações finais, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de publicação do edital, conforme o disposto no Artigo 39, §1º, do Decreto Municipal n.º 18.484 de 13 de março de 2018.
Ademais, informamos que os autos do processo encontram-se na Corregedoria Geral do Município, situada na Rua João Norberto, n.º 46 - Alto Maron, neste Município, que funciona de segunda a sexta-feira de 08h às 12h e 14h às 18h, à disposição para vistas ou extração de cópias fora da repartição, que só poderão ser concedidos ao representante legal ou procurador da empresa legalmente habilitado nos autos. Impede destacar que as alegações poderão ser promovidas por representante legal ou advogado legalmente constituído nos autos, devendo a mesma ser entregue no local e horário supracitados.

Meg de Sousa Marques
Presidente

PORTARIA

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO Nº. 058/2023 - GESTÃO DE CONTRATOS FSVC

DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS.

O Diretor Geral da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista - FSVC, no uso das atribuições que lhe confere os art. 13, art. 14, inciso IV e art. 15, inciso III do Estatuto Social da FSVC, de 20 de março de 2012,
CONSIDERANDO que, cabe à Administração Pública, nos termos do art.67 da Lei Federal Nº 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados, através de um representante;

CONSIDERANDO que, o entendimento majoritário das Cortes de Contas Pátrias, recomenda a indicação expressa dos fiscais e gestores dos contratos, a exemplo do decisório do Plenário do TCU, conforme Acordão nº. 1.094/2013.

RESOLVE,

Art. 1º - Designar os empregados abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Contrato Nº 058/2023, celebrado entre a **FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA** e a empresa **NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA**, regularmente inscrita no CNPJ sob o n º07.797.967/0001-95, assinado no dia 30 de Março de 2023, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, que tem como objetivo a **prestação de serviço para o fornecimento de acesso ao sistema de Banco de Preços,** visando atender as necessidades da FSVC, conforme Processo Administrativo nº 102/2023 e Compra Direta nº 036/2023.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

238

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que transcorreu o prazo legal estipulado no Edital, publicado no Diário Oficial do Município no dia 11 de abril de 2023, para apresentação de aleaçãoes finais (fl. 236), sem que a empresa **AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57**, tenha se manifestado.

Vitória da Conquista – BA, 27 de abril de 2023.

Meg de Sousa Marques
Presidente

25

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

Ao Ilmo. Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo
Corregedor-Geral do Município
Rua João Norberto, 46 – Alto Maron, Vitória da Conquista – BA
CEP 45005-040

Sr. Corregedor,

A Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência nº. 068/2022 designada por meio da Portaria CRGM-SMTC nº 065, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, para apurar denúncia de infração cometida, em tese, pela pessoa jurídica intitulada **AR ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.286.217/0001-57,** no âmbito do Processo Licitatório da Concorrência Pública nº 002/2021, decorrente do Processo Administrativo nº 14.980/2021, consoante informações contidas nas Comunicações Internas nº 189/2022-SMED (GEP 56739/2022), e documentos anexos, oriundos da Coordenação de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação, relacionadas, em tese, a inexecução parcial de obra de ampliação da Escola Municipal Moisés Meira, localizada no Distrito de José Gonçalves, o que pode configurar, caso seja comprovada, infração prevista violação da Cláusula primeira, Cláusula segunda (itens 2.1 e 2.4) e Cláusula sexta (itens 6.1 e 6.4) do contrato Administrativo nº 124/2021, consoante informações contidas na Comunicação Interna nº 027/2022-PGM/SMED e documentos anexos, expedida em 26 de agosto de 2022, oriunda do Procuradoria Geral do Município – SMED, subscrita pela Srª Maria José Viana Santos, Advogada pública Municipal, inscrita na OAB/BA nº 40.978, com fulcro nas disposições do art. 17 do Decreto Municipal nº 18.484/2018, vem, respeitosamente, apresentar o seu

RELATÓRIO:

O presente Processo Administrativo foi instaurado para apuração de denúncia de infração cometida, em tese, pela pessoa jurídica intitulada **AR ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.286.217/0001-57,** no âmbito do Processo Licitatório da Concorrência Pública nº 002/2021, decorrente do Processo Administrativo nº 14.980/2021, consoante informações contidas nas Comunicações Internas nº 189/2022-SMED (GEP 56739/2022), e documentos anexos, oriundos da Coordenação de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação, relacionadas, em tese, a inexecução parcial de obra de ampliação da Escola Municipal Moisés Meira, localizada no Distrito de José Gonçalves, o que pode

240

configurar, caso seja comprovada, infração prevista violação da Cláusula primeira, Cláusula segunda (itens 2.1 e 2.4) e Cláusula sexta (itens 6.1 e 6.4) do contrato Administrativo nº 124/2021, consoante informações contidas nas Comunicações Internas nº 189/2022-SMED e nº 027/2022-PGM/SMED, expedida em 25 e 26 de agosto de 2022 respectivamente, oriunda da Coordenação de Infraestrutura – SMED e Procuradoria Geral do Município – SMED, e demais documentos acostados aos autos.

Impende destacar que após analisar a denúncia formulada através das Comunicações Internas nº 189/2022-SMED e nº 027/2022-PGM/SMED, oriunda da Secretaria Municipal de Educação, a Procuradoria Geral do Município emitiu o Parecer nº 213/2022 em que consta o seguinte entendimento:

> *Destarte, esta Procuradoria opina pela instauração de* ***PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INADIMPLÊNCIA (PAI)*** *em face da empresa AR ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.286.217/0001-57, respeitando os ditames da Lei Federal nº 8.666/1993, assim como o procedimento disciplinado no Decreto Municipal nº 18.484/2018, a fim de apurar a denúncia em tela, e possível responsabilidade administrativa, civil e penal do(s) envolvido(s).*

Amparados da interpelação promovida pela Secretaria Municipal de Educação, em 1º de novembro de 2022, nos termos do art. 23 do Decreto Municipal nº 18.484/2018, foi designada a Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022 por meio da Portaria CRM-SMTC nº 065/2022.

Seguindo o rito do devido processo legal, foram realizados pela Comissão diversos atos, que se encontram consignados nos autos através da lavratura de termos de diligências, atas de deliberações, portarias, notificações e documentos juntados aos autos.

Durante todo o desenvolvimento do processo em tela, na busca da verdade real dos fatos, os princípios da impessoalidade, da isonomia, da razoabilidade e do interesse público, norteadores de tais ritos administrativos, foram observados ininterruptamente, assegurando-se à elucidação dos fatos o emprego de todos os meios de prova e recursos admitidos em Direito.

Com o início da instrução processual, a Presidente da Comissão ordenou a notificação da empresa denunciada para que a mesma apresentasse defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da notificação. Diante disso, foi expedido o Ofício nº. 1013/2022 - CRGM (fls. 082 a 84) e encaminhado ao endereço constante no cartão CNPJ da empresa supracitada, entretanto, na data de 21 de novembro de 2022, a correspondência com a citação foi devolvida pelo Sr. Rielson Mendes de Souza Lima, que certificou o insucesso na citação, pois a empresa não exercia suas atividades empresariais na localização indicada, conforme certidão à fl. 85. Considerando a devolutiva da citação, deliberou-se por realizar

nova citação à empresa no endereço disposto na proposta de preços do processo licitatório Concorrência nº 002/2021, por meio do Ofício 1103/2022 – CRGM (fls. 88 a 90), contudo, a pessoa jurídica também não foi encontrada no endereço mencionado na proposta de preços, como comprovado nos autos mediante certidão (fl. 87) assinada pelo Sr. Rielson Mendes de Souza Lima.

Esgotadas as tentativas de citação pessoal, deliberou-se por realizar a citação por Edital, conforme previsão do Art. 39 do Decreto Municipal nº 18.484/2018, tendo sido publicado no Diário Oficial do Município, no dia 14 de dezembro de 2022, em nome da denunciada para apresentação de defesa no prazo de 20 (vinte) dias úteis. Finalizado o prazo para apresentação da defesa sem manifestação da empresa denunciada, foi lavrado Termo de Revelia (fl. 99).

Em 09 de fevereiro do corrente ano, a Comissão encaminhou Comunicação Interna – Protocolo – 09736/2023 (fl. 106-107), solicitando que a Secretaria Municipal de Educação informasse sobre o pagamento da garantia contratual da obra licitada, se por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme item 21 do Edital da Concorrência Pública nº 002/2021, bem como a medição de obras e o registro dos quantitativos de serviços efetivamente executados, conforme a especificação técnica do projeto. Na mesma oportunidade, a Comissão enviou Comunicação Interna para a Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária, para que informe sobre o pagamento da garantia contratual da obra licitada se por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

Em resposta à comunicação enviada, a Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária informou que, após consulta à SMED, a secretaria elucidou que a empresa denunciada apresentou apólice seguro garantia, conforme cópia enviada e anexada aos autos (fls. 112-128).

Em 07 de março, a Secretaria Municipal de Educação encaminhou para a comissão as cópias das notas e medições da obra, esta documentação foi juntada aos autos às fls. 131-217. Ainda para fins da apuração, a comissão solicitou, junto a SMED, esclarecimento referente aos boletins de medição, para que a denunciante pontuasse qual foi o percentual efetivamente executado da obra, esta solicitação foi atendida em 14 de março, quando foi encaminhado relatório sintético da execução da obra, juntado aos autos (fls 220-230), o qual consta que no dia 24/08/2022 foi feito relatório fotográfico do estado atual da obra e que restavam 48,28% dos serviços a serem executados.

Considerando a juntada de novos documentos, e atendendo ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em 23 de março de 2023, a Comissão deliberou pela

intimação da denunciada para alegações finais, e encaminhou o Ofício nº 299/2023 – STPC/CRGM (fl. 232) ao endereço constante na proposta de preços apresentada pela empresa supracitada, o qual foi devolvido à comissão sem dar cumprimento, conforme certidão (fl. 234) presente nos autos. Esgotadas as tentativas de intimação pessoal, deliberou-se por realizar a intimação por Edital, conforme artigo 39, § 1º, do Decreto Municipal nº 18.484 de 13 de março de 2018, tendo sido publicado no Diário Oficial do Município, no dia 11 de abril de 2023. Entretanto, encerrado o prazo concedido no referido edital, não houve manifestação da denunciada, sendo lavrada Certidão de Decurso de Prazo (fl. 238).

Após a conclusão da instrução processual, esta Comissão decidiu por finalizar o processo emitindo o presente relatório. Desse modo, passa-se à análise do mérito:

O presente Processo Administrativo de Inadimplência foi instaurado para apuração de denúncia de infração cometida, em tese, pela pessoa jurídica intitulada **AR ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.286.217/0001-57,** no âmbito do PROCESSO Licitatório de Concorrência Pública nº 002/2021, decorrente do Processo Administrativo nº 14.980/2021, consoante informações contidas nas Comunicações Internas nº 189/2022-SMED (GEP 56739/2022), e documentos anexos, oriundos da Coordenação de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação, relacionadas, em tese, a inexecução parcial de obra de ampliação da Escola Municipal Moisés Meira, localizada no Distrito de José Gonçalves, o que pode configurar, caso seja comprovada, infração prevista violação da Cláusula primeira, Cláusula segunda (itens 2.1 e 2.4) e Cláusula sexta (itens 6.1 e 6.4) do contrato Administrativo nº 124/2021, consoante informações contidas nas Comunicações Internas nº 189/2022-SMED e nº 027/2022-PGM/SMED, expedida em 25 e 26 de agosto de 2022 respectivamente, oriunda da Coordenação de Infraestrutura – SMED e Procuradoria Geral do Município – SMED, e demais documentos acostados aos autos, infrações que, se comprovadas, são puníveis, conforme art. 58 do Decreto Municipal nº 18.484/2018 e art. 87 da Lei 8666/93:

> *Decreto Municipal 18.484/2018 - Art. 58: Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a Administração Pública Municipal e aos licitantes que cometam atos visando a frustrar os objetivos da licitação, mediante a regular tramitação de processo administrativo de inadimplência, serão aplicadas as seguintes sanções:*
> *I – Advertência: comunicação formal ao fornecedor, advertindo sobre o descumprimento de cláusulas contratuais e outras obrigações assumidas, e, conforme o caso, em que se confere prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis;*
> *II – Multa: na forma prevista no instrumento convocatório e/ou no contrato;*
> *III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior 2 (dois) anos;*

243

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Artigo 87 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993: Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I - Advertência;
II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Pela análise dos autos do PAI nº 068/2022, verifica-se que a empresa denunciada sagrou-se vencedora, com a melhor proposta no certame da Concorrência Pública n.º 002/2021, entretanto, após a homologação, durante a execução da obra, a denunciada não cumpriu com o estabelecido no Cronograma Físico/Financeiro, bem como executou a obra de forma parcial, conforme verificado pela Coordenação de Infraestrutura – SMED.

Durante as visitas da fiscalização no local da obra, foi constatada a ausência de responsável técnico e do encarregado dos serviços designado pela empresa, de acordo com Anexo III - Declaração de Disponibilidade da Equipe Técnica; exigência habilitatória que foi entregue devidamente assinada pela empresa durante o procedimento licitatório. Diante de tal comprovação, fica evidente que a empresa AR ENGENHARIA EIRELI colocou a qualidade da obra, a segurança dos alunos e professores e a qualidade da edificação em risco. Ademais, foi notada a ausência de Equipamentos de Segurança Individual – EPI, por parte dos operários, colocando em risco a integridade física dos profissionais envolvidos nos trabalhos da reforma e ampliação da escola. A utilização de EPIs conforme estabelecido na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), alterada pela Lei Federal nº 6.514/77, obriga a compra de equipamentos de proteção pela organização, distribuição gratuita para funcionários em situação de risco de acidentes e treinamento para uso apropriado dos EPIs. Também é dever do empregador fornecer o reparo e troca imediata em caso de dano ou extravio, bem como a manutenção e higienização periódica. A regulamentação desse texto, na prática, está presente na NR 6, Norma Regulamentadora do Governo Federal que dispõe

sobre responsabilidades, procedimentos e características da compra e uso de equipamentos desse tipo.

> *NR 06 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI: 6.5 Responsabilidades da organização*
> *6.5.1 Cabe à organização, quanto ao EPI:*
> *a) adquirir somente o aprovado pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;*
> *b) orientar e treinar o empregado;*
> *c) fornecer ao empregado, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas situações previstas no subitem 1.5.5.1.2 da Norma Regulamentadora nº 01 (NR-01) - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, observada a hierarquia das medidas de prevenção;*
> *d) registrar o seu fornecimento ao empregado, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, inclusive, por sistema biométrico;*
> *e) exigir seu uso;*
> *f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, quando aplicáveis esses procedimentos, em conformidade com as informações fornecidas pelo fabricante ou importador;*
> *g) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado; e*
> *h) comunicar ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho qualquer irregularidade observada.*

Outrossim, o item 17.2 da Concorrência Pública 002/2021, obriga à empresa vencedora do certame a disponibilização de EPI's aos trabalhadores, vejamos o que diz o texto do instrumento convocatório: *"Licitante vencedora deverá fornecer, além dos uniformes, equipamentos de proteção individual - EPI a todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de segurança em vigor"*. Logo percebe-se que a empresa descumpriu as regras editalícias e as normas que regem as Leis Trabalhistas.

Em visita a obra para vistoria do serviço, em 24 de agosto de 2022, conforme informação do Protocolo – 56739/2022 (fl. 13), foi constatada a paralisação total das obras. No ato, a Coordenação de Infraestrutura da SMED, identificou que todos os equipamentos necessários à execução da obra haviam sido retirados o local. Durante os trabalhos, foi apurado que a execução da obra não correspondia ao Cronograma Físico-Financeiro proposto no processo licitatório, bem como, não estava em conformidade com o aditivo de prazo do contrato para execução. Desta forma, fica evidente os descumprimentos contratuais durante toda a execução do contrato, pois a denunciada não honrou com os prazos estipulados no cronograma físico-financeiro. A Cláusula Sexta do Contrato Administrativo nº 124/2021, firmado entre a Administração e a empresa AR Engenharia estabelece os prazos,

245

as normas técnicas, as relações trabalhista, entre outras questões que definem as relações entre a contratada e contratante nos moldes que segue abaixo:

> *Cláusula Sexta - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Além das obrigações constantes deste contrato, bem como as contidas no Edital da Licitação Concorrência nº 002/2021 e seus anexos, obriga-se a CONTRATADA a:*
> *6.1. Executar, rigorosamente e cumprir tempestivamente, as determinações do Instrumento Convocatório e das Normas Técnicas, atinentes aos serviços executados e às disposições contratuais;*
> *6.2. Substituir às suas custas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções;*
> *6.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração Municipal ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;*
> *6.4. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais relativos à execução do contrato;*
> *6.4.1. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos neste item, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;*
> *6.5. A CONTRATADA compromete-se, ainda, a executar os serviços objeto do contrato pelos preços unitários que propôs na planilha, aceita pelo Município;*
> *6.6. A CONTRATADA deverá adotar todas as precauções visando evitar agressões ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança, se responsabilizando por quaisquer danos causados ao meio ambiente, bem como os custos das correções efetuadas pelo CONTRATANTE serão descontadas dos pagamentos devidas ou da garantia oferecida, ou ainda cobrados judicialmente, servindo para tanto, este instrumento como título executivo extrajudicial.*

Não obstante, conforme CI nº 027/2022PGM/SMED (fls. 10-12), houve um princípio de tumulto provocado pelos funcionários da empresa denunciada, que ameaçaram retirar o "granilite" aplicado no local da obra, Escola Municipal Moisés Meira, sob a alegação de não pagamento pelos serviços prestados. Na oportunidade, foi ressaltado que os pedreiros da área de construção não tinham recebido o pagamento do salário. Diante dos fatos apontados, foi registrado na Polícia Civil, 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior – Vitória da Conquista – BA, um Boletim de Ocorrência (fls. 27-28), contra a pessoa jurídica AR ENGENHARIA EIRELI para que fosse investigada a natureza das ameaças.

Com base nas denúncias contidas no protocolo nº 56.683/2022 (fls. 10-12), em desfavor da empresa AR ENGENHARIA EIRELI, contratada por meio do Processo Licitatório

Concorrência nº 002/2021, bem como os apontamentos de descumprimento contratual, desrespeito ao cronograma física-financeiro e Notificações Extrajudiciais, a pessoa jurídica continuou com a postura inadimplente apesar de todos os avisos do Município.

Concorrência é uma modalidade de licitação para contratos de grande vulto, que se realiza com ampla competição, não havendo necessidade de cadastro prévio dos concorrentes. Utilizada, em regra geral, para contratos de obras e serviços de engenharia e aquisição de bens móveis, quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto podem participar do certame.

É cediço que a participação na licitação vincula a licitante ao Edital do procedimento licitatório, resultando em obrigações e compromissos. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao mesmo tempo em que privilegia a transparência do certame, garantindo a plena observância dos princípios da igualdade, impessoalidade, publicidade, moralidade e probidade administrativa, preceitua que o julgamento das propostas seja o mais objetivo possível, nos exatos termos das regras previamente estipuladas. A Administração tem o dever de respeitar aquilo que foi estabelecido pelo diploma editalício, não podendo, de forma alguma, esquivar-se das regras preliminarmente estabelecidas.

A aplicação da sanção administrativa decorre do poder-dever de agir do Administrador Público, que não pode se omitir diante da verificação de uma conduta culposa ou dolosa do contratado que inviabilize o atendimento ao interesse público a ser atingido com a celebração do contrato. Para tanto, a Administração Pública dispõe das sanções de natureza administrativa e de direito público previstas em lei, que podem ser aplicadas ao contratado, em caso de inexecução parcial ou total do objeto principal do contrato, pelo descumprimento de obrigação acessória ou de infração à lei. O Edital da Concorrência n.º 002/2021 no item 20.1 expressa que:

> *"comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que* ***inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas*** *em decorrência da contratação;* ***ensejar o retardamento da execução do objeto;*** *fraudar na execução do contrato;* ***comportar-se de modo inidôneo;*** *cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta"* (grifo nosso).

A previsão no edital e no contrato das obrigações a serem cumpridas e das sanções administrativas garante a transparência e a segurança para exigir o exato cumprimento do que foi avençado, bem como para o contratado, que saberá quais são os seus deveres, impedindo que seja demandado ou penalizado por uma obrigação não estabelecida pelo contrato.

247

Neste sentido, é possível a adoção de medidas como descredenciamento da empresa AR ENGENHARIA EIRELI do sistema de cadastro de Fornecedores do Município, a fim de suspender sua participação em futuros certames, nos termos dos Artigos 77 e 87, II da Lei 8666/93, a Administração poderá, em razão da inexecução total ou parcial do contrato, aplicar ao contratado a penalidade de multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, desde que seja assegurada a prévia defesa, garantida, aliás, erigida a direito fundamental pelo Artigo 5º, LV, da Constituição Federal de 1988.

> *Art. 77 da lei 8666/93: A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.*
>
> *Art. 88 da Lei 8666/93: As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:*
> *II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;*
>
> *Art. 5º Constituição Federal de 1988: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*
> *LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;*

Além disso, o referido Edital dispõe de regras claras quanto a inexecução total ou parcial da obra, conforme itens: 20.1, 20.7, 20.8 e Cláusula Décima do Contrato Administrativo nº 124/2021:

> *Edital da Concorrência n.º 002/2021: 20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta;*
> *[...]*
> *20.7. multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;*
> *20.8. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; e [...]*
> *Cláusula Décima do Contrato Administrativo nº 124/2021: A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e*

248

> *as previstas em lei ou regulamento, conforme previsão do art. 77, da Lei n.º 8.666/93, sendo reconhecidos pela CONTRATADA os direitos da CONTRATANTE.*

Em que pese o disposto nos itens mencionados acima, a denunciada possuía pleno conhecimento das condições de participação na licitação, visto que concordou com os termos do processo licitatório no momento em que se dispôs a participar sem qualquer questionamento às regras impostas pela Administração. Não obstante, considerando a prerrogativa do item 23.4 do instrumento convocatório:

> *23.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.*

O próprio instrumento convocatório torna-se lei no certame ao qual regulamenta, é impossibilitado que as cláusulas sejam descumpridas por qualquer uma das partes, seja a Administração, sejam as empresas participantes. Nesse sentido, resta clara a necessidade de que os interessados em participar das licitações ajam com diligência e acuidade no acompanhamento do certame para não incidirem em falta com a Administração Pública. O interessado em participar da licitação tem que se atentar a todas as fases e tudo o que foi solicitado para que não venha a prejudicar o bom andamento do certame e ser penalizado. A empresa atuou como licitante, assinou contrato ciente dos compromissos assumidos, estando enquadrada no rol das empresas que podem responder por ilícitos praticados contra a Administração Pública.

Sobreleva-se dos autos, por fim, que a empresa violou o disposto nos itens 20.1, 20.7, 20.8 do Edital Concorrência Pública 002/2021, Cláusula de Décima, Cláusula Primeira, Cláusula Segunda (itens: 2.1 e 6.4) e Cláusula Sexta (6.1 e 6.4) de forma que merece prosperar o alegado na Denúncia.

Ante o exposto e em observação ao disposto no Decreto Municipal nº 18.484/2018, a Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022 opina, ante o lastro probatório juntado aos autos, em razão de violação ao Edital da Concorrência nº 002/2021, pela procedência da Denúncia, sendo cabível a aplicação das penalidades de:

- **IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme inteligência do Art. 58 do Decreto Municipal nº 18.484/2018, Artigo 87 da Lei nº 8.666/93;**

249

- **Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor aplicado de forma proporcional à obrigação inadimplida aos item(s)/grupo(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante, conforme item 20.8 do Edital da Concorrência n.º 002/2021, totalizando a quantia de R$ R$ 76.246,00 (setenta e seis mil duzentos e quarenta e seis reais); e poderá ser executada de acordo com o disposto no item 21. DA GARANTIA CONTRATUAL, subitem 21.1.3, do Anexo II - Termo de Referência do Edital da Concorrência n.º 002/2021:**

Valor total do contrato	Valor percentual a ser executado 48,28%	Multa de 10%
R$ 1.579.246,07	R$ 762.460,00*	R$ 76.246,00**
	TOTAL:	R$ 76.246,00

* Valor total a ser executado é de R$ 762.460,00 (setecentos e sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta reais).

** Valor total da multa a ser paga pela empresa de acordo com o item 20.8 do Edital da Concorrência n.º 002/2021 é de R$ 76.246,00 (setenta e seis mil duzentos e quarenta e seis reais).

Considerando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e uma vez que o edital é a regra superior do procedimento licitatório, verificada a divergência relativa à aplicação da multa entre a cláusula Sétima do Contrato e o edital, entende-se pela aplicação das sanções administrativas previstas no item 20.8 do Edital da Concorrência n.º 002/2021.

E sendo o que tinha para constar, foi encerrado o presente Relatório, o qual a Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência nº. 068/2022 submete à apreciação do Sr. Corregedor-Geral do Município, nos termos da legislação vigente, que vai por mim, **Meg de Sousa Marques** e pelos demais membros da Comissão, assinado, ao passo que decidimos encaminhar o mesmo à autoridade julgadora, conforme orienta o Decreto Municipal nº 18.484/2018.

Vitória da Conquista – BA, 27 de abril de 2023.

Elbert Cleber de Santana Monteiro
Secretário

Nayara Ferraz Oliveira
Membro

Meg de Sousa Marques
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

250

Protocolo - **28653/2023**

ENCAMINHA RELATÓRIO CONCLUSIVO PAI 068/2022

Vitória da Conquista, 27 de abril de 2023

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022

Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57

Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

Ao Ilm.º Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo

Corregedor-Geral do Município

Rua João Norberto, n.º 46 - Alto Maron

Vitória da Conquista – BA

Na condição de Presidente da Comissão de Inquérito do Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022, designada pelo Corregedor-Geral do Município, Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, pelo Ilmo. Corregedor-Geral do Município - Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo, encaminho os autos digitalizados do Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022 para análise e emissão de parecer do relatório conclusivo.

MEG DE SOUSA MARQUES
AGENTE ADMINISTRATIVO
18644-4
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - STPC

PMVC - SEMAD - PAD
PROTOCOLO
Recebido em 28/04/23
Quant. de laudas:
Ass:

FLS 251

PARECER Nº 045/2023 – CRGM/STPC

Ao Ilmº Sr.

MATEUS NASCIMENTO NOVAIS

Secretário Municipal de Transparência, Controle e Prevenção à Corrupção

Ref.: Relatório conclusivo do PAI nº 068/2022

Na condição de Corregedor-Geral do Município, no uso das atribuições previstas no inciso II do art. 48 da Lei Complementar Municipal nº 2.647/2022 e no art. 51 do Decreto Municipal nº 18.484/2018, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.375/2023, encaminho a V.S.ª manifestação relativa ao Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022.

Trata-se de Processo Administrativo de Inadimplência movido em face de **AR ENGENNHARIA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 36.286.217/0001-57, em virtude de descumprimento parcial do contrato administrativo n. 124/2021, decorrente do Processo Licitatório de Concorrência Pública nº 002/2021 e Processos Administrativo n. 14.980/2021.

Depois de analisada a denúncia por meio da Comunicação Interna nº 189/2022 (GEP-56739/2022) e documentos anexos, oriunda da Secretaria Municipal de Educação (SMED), foi instaurado o presente procedimento administrativo através da Portaria CRGM nº 065/2022.

Feitas as necessárias apurações, a Comissão responsável, através do Relatório de fls. 239 a 249, com fundamento na constatação da violação ao Edital da Concorrência n. 002/2021, opina pela procedência da denúncia e consequente aplicação, à denunciada, das penalidades de **IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS; e MULTA NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DO ITEM CONTRATUAL.**

FLS 252

Considerando a independência da Comissão Processante com relação à conclusão lançada no relatório, bem como a plena regularidade procedimental, tendo sido assegurado à acusada o direito à ampla defesa e ao contraditório, faço remessa dos autos para julgamento, por ter preenchido todos os requisitos legais.

Em face do exposto, por força do artigo 51, do Decreto nº 18.484/2018, encaminha – se os autos vertentes a autoridade competente.

É o pronunciamento.

Gabinete do Corregedor Geral do Município, 28 de abril de 2023.

ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA ARAÚJO
CORREGEDOR-GERAL DO MUNICÍPIO

253

Diário Eletrônico / PMVC
Publicado em 05 / 05 / 23
Edição nº 3440
Página(s) _____

DECISÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do art. 30 da Lei Complementar Municipal nº 2.647/2022, bem como Decreto Municipais n.º 18.484/2018, nº 19.827/2019 e nº 20.920/2021, expedidos pelo(a) chefe do Poder Executivo Municipal, vem através do presente, emitir seu julgamento relativo ao Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022.

Trata-se de Processo Administrativo de Inadimplência instaurado por meio da Portaria CRGM-STPC nº 065/2023, de 01 de novembro de 2022, com o intuito de apurar denúncia de suposta infração cometida pela pessoa jurídica **AR ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.071.702/0001-42**, em virtude de descumprimento do Contrato Administrativo nº 124/2021, oriundo da Concorrência nº 002/2021 (Processo Administrativo nº 14980/2021), em especial, por falha na execução do contrato, haja vista a inexecução parcial da obra de ampliação da Escola Municipal Moisés Meira, localizada no distrito de José Gonçalves, o que representa, caso seja comprovada, violação às cláusulas primeira, segunda e sexta do referido Contrato, bem como itens 13.1; 13.4; 13.8; e 13.9 do Anexo II-Termo de Referência do Edital da Concorrência Pública nº 002/2021.

A Procuradoria Geral do Município sugeriu por meio do Parecer nº 213/2022, a instauração de Processo Administrativo de Inadimplência para apurar a responsabilidade administrativa dos envolvidos.

Realizada tentativa de citação (fls. 82-84) no endereço constante no cartão CNPJ da empresa (fls. 68-69), foi certificada (fl. 85) a impossibilidade de cumprimento da diligência, em razão da não localização da empresa no local. Ato contínuo, foi feita tentativa de citação no endereço da representante contábil da empresa denunciada, sendo certificado (fl. 87), mais uma vez, a impossibilidade de cumprimento em razão de não mais existir vínculo entre a empresa e o referido escritório. Não restando alternativas, foi deliberado (fl. 93) pela

254

citação por Edital (fls. 94-96), que foi devidamente publicado no Diário Oficial do Município em 14 de dezembro de 2022 e no mural de publicações da Prefeitura de Vitória da Conquista no período de 14 a 21 de dezembro de 2022, nos termos do art. 39 do Decreto Municipal nº 18.484/2018.

Não tendo se manifestado no prazo legal, a Comissão lavrou Termo de Revelia (fl. 99).

O processo foi instruído com diversos documentos, a exemplo da íntegra do processo licitatório (fl. 67); notificações e comunicações relativas à paralisação da obra (fls. 14-41); informações acerca da garantia prestada pela empresa (fls. 111-128); histórico de medições da obra (fls. 132-217); relatório de execução da obra (fls. 221-230)

Considerando a juntada de documentos novos, foi possibilitado à empresa a apresentação de alegações finais, conforme art. 44 do Decreto Municipal nº 18.484/2018. Realizada tentativa de intimação no endereço constante na proposta da empresa, foi certificado (fl. 234) que a empresa não funciona mais naquele local. Inviabilizada a intimação pessoal, foi feita a intimação mediante edital publicado no Diário Oficial do Município em 11 de abril de 2023, tendo sido certificado o transcurso do prazo sem manifestação.

Averiguadas as informações contidas nos autos, a Comissão Processante emitiu relatório conclusivo (fls. 239-249), em que recomenda o acolhimento da denúncia e a aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar com o Município de Vitória da Conquista pelo prazo de 02 (dois) anos, além de multa no importe de R$76.246,00 (setenta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais), calculada no percentual de 10% do percentual inadimplido da obra.

Remetidos os autos para análise do Corregedor-Geral do Município, este apresentou o Parecer nº 045/2023-CRGM/STPC, remetendo os autos para julgamento, por ter preenchido os requisitos legais.

Vistos e examinados os autos do presente Processo Administrativo por Inadimplência, passa-se à decisão.

A Administração Pública Municipal realizou a Concorrência nº 002/2021, tendo como objeto a "contratação de pessoa jurídica especializada em obras de engenharia civil, mão de

FLS 255

obra com material de construção, para a realização de reformas estruturais e ampliação, reparos e manutenção de infraestrutura da Escola Municipal Moisés Meira, localizada no distrito de José Gonçalves". Realizado o processo licitatório, a pessoa jurídica AR ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.071.702/0001-42, ora denunciada, foi a vencedora do certame, que originou o Contrato Administrativo nº 124/2021.

Pelo que consta nos autos, em especial nas notificações (fls. 14-41), foram verificados diversos problemas na execução do contrato, a saber: a) não cumprimento do Cronograma Físico/Financeiro, mesmo tendo sido o contrato aditivado com vigência dobrada em relação ao prazo de execução inicial; b) ausência de responsável técnico e de encarregado de serviços na obra; c) falta de uso de EPIs por parte dos trabalhadores da obra; d) paralisação total da obra, constatada em 24/08/2022, com retirada de todo o equipamento necessário para execução dos serviços do canteiro de obras; e) informação, por parte de funcionários, de inadimplemento de obrigações trabalhistas, culminando inclusive em tumulto no ambiente escolar, tendo sido lavrado boletim de ocorrência (fls. 27-28).

Ademais, pela análise sistêmica do processo, verifica-se que foi firmado Termo Aditivo em 14 de abril de 2022, passando o contrato a ter vigência até 14 de outubro de 2022, ao passo que a última medição da obra (em 01/08/2022, fl. 212) e o relatório expedido pelos fiscais do contrato (fls. 221-223), datado de 30 de agosto de 2022, demonstram que restam, portanto, 48,28% da obra a ser feita.

Há, portanto, concretização da falha contratual de inexecução parcial da obra, sendo impossível qualquer tentativa de resolução junto à empresa, em razão de ter expirado a vigência do contrato e sequer se ter notícias do paradeiro dos seus representantes.

A Lei 8.666/1993 prevê:

> Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, **respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.**
>
> Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

§ 1o **A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.**
§ 2o A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.
§ 3o Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

O Edital da Concorrência nº 002/2021 e o Contrato nº 124/2021 assim previram:

Edital:
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Constituem obrigações da CONTRATADA:
13.1. Cumprir todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos.
13.4. Responsabilizar-se pela execução do contrato, observando todas as condições estabelecidas neste instrumento;
13.8. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura passem a vigorar nas constâncias do Contrato.
13.9. Manter seus empregados uniformizados-com a identificação da empresa e com os devidos equipamentos de higiene e segurança do trabalho;

21. DA GARANTIA CONTRATUAL.
A partir da data de assinatura do contrato, a contratada terá um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública Municipal, para apresentação de garantia, correspondente a 10% (dez por cento) do seu valor total, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária (conforme inciso 1 e paragráfo 30 do ART 56 da Lei 8.666/93);

Contrato:
Cláusula Segunda — DO REGIME DE EXECUCAO
A obra contratada será executada sob o regime de execução indireta, do tipo Empreitada por Preço Global, de acordo com o Projeto Básico, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico- financeiro e demais elementos constantes nos anexos do Edital da Concorrência de n.º 002/2021.
2.1. A CONTRATADA deverá realizar a obra, pautada estritamente nos termos do Projeto Básico e das planilhas anexas do Edital da Concorrência n.º 002/2021, observando a qualidade dos materiais empregados, suas respectivas quantidades, os prazos de execução de cada etapa e as normas gerais de engenharia e arquitetura;

Clausula Sexta - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Além das obrigações constantes deste contrato, bem como as contidas no Edital da Licitação, Concorrência nº 002/2021 e seus anexos, obriga-se a CONTRATADA a:
6.1. Executar, rigorosamente e cumprir tempestivamente, as determinações do Instrumento Convocatório e das Normas Técnicas, atinentes aos serviços executados e as disposições contratuais;
6.4. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais relativos à execução do contrato;

A constatação da inexecução parcial da obra, por culpa exclusiva da empresa contratada, como é o caso em epígrafe, não só autoriza, mas gera poder-dever de aplicar as sanções cabíveis, conforme art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993. Nesse sentido, assim se posiciona o Tribunal de Contas da União (Manual de Sanções):

> **Diante do poder disciplinar da Administração Pública, entende-se que a apuração para a aplicação de sanção, nos casos de infração administrativa, não é um ato discricionário, é um poder-dever. Assim, tendo conhecimento de indícios da existência de uma infração administrativa praticada por servidor ou particular, a Administração tem o dever de**

instaurar o procedimento adequado à sua apuração e, conforme o caso, realizar a consequente aplicação das penas cabíveis.

No caso concreto, verifica-se, ainda, o grave prejuízo causado pela interrupção da obra, em razão de se tratar de uma Unidade Escolar que está sendo completamente reformada, inviabilizando, pela simples análise das fotos apensadas ao processo, a saudável continuidade das aulas naquele prédio. A não entrega da obra, portanto, prejudica não a Prefeitura, como ente estatal, mas a toda a coletividade, em especial à comunidade da Escola Moisés Meira e do distrito de José Gonçalves.

Merece, portanto, prosperar a denúncia.

Desse modo, considerando o relatório conclusivo deste Processo Administrativo e a supremacia do interesse público, bem como conforme inteligência dos arts. 56, inciso I do Decreto Municipal nº 18.484/2018, **resolvo acolher o entendimento da Comissão de Inquérito do PAI nº 068/2022, ao passo que decido pela aplicação, à pessoa jurídica AR ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.286.217/0001-57, em razão de sua responsabilidade na inexecução parcial da obra de reforma e ampliação da Escola Moisés Meira, das sanções de:**

- **IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, pelo prazo de 02 (dois) anos, com fundamento no Art. 58 do Decreto Municipal nº 18.484/2018 e Artigo 87, III da Lei Federal nº 8.666/93;**

- **MULTA no importe de R$ 76.246,00 (setenta e seis mil duzentos e quarenta e seis reais), calculada no percentual de 10% (dez por cento) sobre a obrigação inadimplida, conforme item 20.8 do Edital da Concorrência n.º 002/2021.**

Ante o exposto, **DETERMINO**:

1) Que seja dada ciência do inteiro teor desta decisão à empresa AR ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.286.217/0001-57, para, querendo, apresentar recurso administrativo no prazo de 10 (dez) dias

259

úteis, contados na forma prevista no art. 74 do Decreto Municipal nº 18.484/2018, sob as penas da lei;

2) Decorrido o prazo recursal, sem a interposição de irresignação voluntária, encaminhem-se cópias desta decisão à:

2.1) Secretaria Municipal de Educação (SMED), para que tenha ciência do inteiro teor desta decisão e proceda aos registros de praxe e, sendo cabível, realize a rescisão unilateral do Contrato Administrativo nº 124/2021;

2.2) Coordenação de Material e Patrimônio e Gerência de Compras da Secretaria Municipal de Gestão e Inovação (SEMGI), para que se proceda à inscrição da denunciada no CAFIMP pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme previsto nos artigos 78 e 79 do Decreto Municipal n.º 18.484/2018, tendo em vista o impedimento de licitar e contratar com a o Município de Vitória da Conquista;

2.3) Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária, para que proceda com a cobrança da multa no importe de R$ 76.246,00 (setenta e seis mil duzentos e quarenta e seis reais), mediante a seguinte ordem:

2.3.1) execução do valor do seguro-garantia no valor total (R$20.685,91), conforme apólice de seguro nº 05-0775-0296571 (fls. 112-128);

2.3.2) após, expedição do DAM no valor restante, caso haja sucesso na execução da garantia, ou no valor total da multa em caso de insucesso;

2.3.3) não havendo pagamento voluntário no prazo de 30 (trinta) dias, que proceda com a inscrição da empresa AR ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.286.217/0001-57, na Dívida Ativa do Município, encaminhando-se para execução fiscal nos termos da lei.

260

3) Inscreva-se a empresa AR ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.286.217/0001-57 no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS PUNIDAS - CNEP, em razão da aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar com o Município de Vitória da Conquista, nos termos dos artigos 84 a 87 do Decreto Municipal nº 18.484/2018.
4) Após, arquivem-se.

Vitória da Conquista/BA, 03 de maio de 2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MATEUS NASCIMENTO NOVAIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

PROCURAÇÃO

PMVC - SMTC - NUCAD FLS 161

OUTORGANTE

AR ENGENHARIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 36.286.217/0001-57, com endereço à Rua Hormindo Barros, 770, bairro Candeias, na cidade de Vitória da Conquista, aqui representado por seu sócio [redacted], engenheiro civil, inscrito no CPF sob o [redacted], com endereço à [redacted]

OUTORGADO(S)

Ficam outorgados os advogados HELIO ALMEIDA SANTOS JÚNIOR, CPF [redacted] inscrito na OAB/BA sob o nº 29.375, LUCAS DA CUNHA CARVALHO, CPF [redacted] inscrito na OAB/BA sob o nº 39.517, FLORISVALDO DE JESUS SILVA, CPF [redacted] inscrito na OAB/BA sob o nº 59.066, MICAELE DA SILVA BESERRA, CPF [redacted] inscrita na OAB/BA sob o nº 68.228, EMANUELLE SOARES SILVA, CPF [redacted] inscrita na OAB/BA sob o nº 41.682, neste ato atuando em nome da Sociedade de Advogados ADVOCACIA ALMEIDA E CARVALHO, registrada na Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Estado da Bahia sob o número 1966/2011, com sede na Avenida João Abuchidid, nº 194, Bairro Candeias, CEP 45.028-125, Vitória da Conquista (BA) e endereço eletrônico *publicacoes@aacadvocacia.com.br*.

PODERES

Gerais: O(a) outorgante confere aos outorgados amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula *ad-judicia*, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, usando os recursos legais e acompanhando.

Específicos: O(a) outorgante confere ainda aos outorgados poderes especiais para receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, desistir, transigir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber e dar quitação, firmar compromissos ou acordos, assinar declaração de hipossuficiência e requerer gratuidade da justiça, agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso.

FINALIDADE

A presente procuração tem por finalidade atuar em Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022, Processo Administrativo nº 14.980/2021 e Edital Concorrência nº 002/2021 perante juízo/órgão competente.

Vitória da Conquista (BA), 10 de Maio de 2023.

AR ENGENHARIA LTDA

ANDRE LUIS PRATES ROCHA MOURA

PMVC - SEMAD - PAD
PROTOCOLO
Recebido em 10/05/23
Quant. de laudas:
Ass: 13612-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA, DO CONTROLE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO
Corregedoria-Geral do Município
www.corregedoriageral@pmvc.ba.gov.br

PMVC - SMTC - NUCAD FLS 262

REQUERIMENTO DE VISTA E CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

NOME: Helio Almeida Santos Sánior

MATRÍCULA/OAB/CPF: 29.375 BA

Endereço: [redacted]

Telefone/celular: _____ **Whatsapp:** [redacted]

E-mail para envio: contato@aacadvocacia.com.br

Requer:

- [ ] **Vista**
- [x] **Cópia Digital Integral**
- [ ] **Cópia Digital das Páginas** _____

( ) **PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº** _____

( ) **SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº** _____

(X) **PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INADIMPLÊNCIA Nº** 068/2022

( ) **PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO Nº** _____

( ) **OUTROS DOCUMENTOS** _____

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas.

DATA DO PEDIDO: 10/05/23 **ASS: POR EXTENSO** Helio Almeida S. Sánior

DATA DA ENTREGA: 11/05/23 **ASS: DO SETOR** _____

Antônio Gabriel Oliveira Araújo
Corregedor-Geral do Município

FLS 263

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

Vitória da Conquista, 08 de maio de 2023.

Ofício nº. 480/2023 - CRGM/STPC
À AR ENGENHARIA EIRELI
CNPJ nº 36.286.217/0001-57
Av. Deputado Ulisses Guimarães, nº 450 D- SL03, Andar 1, Bairro Felícia
Vitória da Conquista - BA
CEP: 45055-155

Por ordem do Secretário Municipal da Transparência, Controle e Prevenção à Corrupção de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, Sr. Mateus Nascimento Novais, que emitiu decisão relativa ao Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022, **fica INTIMADA, por meio deste ofício, a pessoa jurídica AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57, na pessoa do seu representante, acerca do inteiro teor da decisão exarada em 03 de maio de 2023 nos autos do processo supracitado, bem como, para, querendo, interpor recurso administrativo no prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme disposto no art. 74 do Decreto Municipal nº 18.484 de 13 de março de 2018, publicado no Diário Oficial do Município em 16 de março de 2018, sob penas da lei.**

Ainda nessa oportunidade, informo que os autos do processo (físico) em epígrafe se encontram na Corregedoria-Geral do Município, situada na Rua João Norberto n.º 46, Alto Maron, Vitória da Conquista - BA, que fica aberta de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial, sendo este o local em que deverá ocorrer o protocolo do recurso.

Os autos digitalizados do PAI 068/2022 podem ser acessados através do link: ***https://encurtador.com.br/pDFX3***

Atenciosamente,

Adriana Borges Magalhães Barbosa
Auxiliar administrativo
Mat. 07-15062-8

FLS 264

CERTIDÃO

Certifico que não pude dar cumprimento ao Ofício n.º 480/2023- CRGM/STPC, vez que ao me dirigir ao endereço da Av. Deputado Ulisses Guimarães, nº 450 D, SL 03 - Bairro Felícia, nesta cidade, no dia 11-05-2023 ás 11:30 fui informado por um Sr. de prenome Neto que a Empresa AR ENGENHARIA EIRELLI não está mais no endereço supracitado, O referido é verdade e dou fé.

Vitória da Conquista – BA, 11 de maio de 2023.

Rielson Mendes de Souza Lima
Matrícula nº 07-11047-2

FLS 265

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

Vitória da Conquista, 08 de maio de 2023.

Ofício nº. 501/2023 - CRGM/STPC
À Sociedade de advogados ADVOCACIA ALMEIDA E CARVALHO
Av. João abuchidid, nº 194, bairro Candeias, Nesta.
CEP. 45.028-125

Por ordem do Secretário Municipal da Transparência, Controle e Prevenção à Corrupção de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, Sr. Mateus Nascimento Novais, que emitiu decisão relativa ao Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022, **fica INTIMADA, por meio deste ofício, a pessoa jurídica AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57, na pessoa do seu representante, acerca do inteiro teor da decisão exarada em 03 de maio de 2023 nos autos do processo supracitado, bem como, para, querendo, interpor recurso administrativo no prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme disposto no art. 74 do Decreto Municipal nº 18.484 de 13 de março de 2018, publicado no Diário Oficial do Município em 16 de março de 2018, sob penas da lei.**

Ainda nessa oportunidade, informo que os autos do processo (físico) em epígrafe se encontram na Corregedoria-Geral do Município, situada na Rua João Norberto n.º 46, Alto Maron, Vitória da Conquista - BA, que fica aberta de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial, sendo este o local em que deverá ocorrer o protocolo do recurso.

Os autos digitalizados do PAI 068/2022 podem ser acessados através do link: ***https://encurtador.com.br/pDFX3***

Atenciosamente,

Adriana Borges Magalhães Barbosa
Auxiliar administrativo
Mat. 07-15062-8

Recebido em 15/05/2023
OAB/BA: 39517

PMVC · SMTC · NUCAD FLS 266

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA

Referências: Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022
Contrato Administrativo nº 124/2021
Concorrência nº 002/2021
Processo administrativo nº 14.980/2021

AR ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 36.286.217/0001-57, com escritório profissional dos seus procuradores situado na Avenida João Abuchidid, 194, bairro Candeias, Vitória da Conquista, Bahia, vem tempestiva e respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no artigo 74, do Decreto Municipal 18.484/2018, interpor **RECURSO ADMINISTRATIVO**, face à Decisão proferida nos autos do Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022, em virtude dos fatos e fundamentos a seguir aduzidos.

I – DA TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, cumpre anotar que o presente recurso administrativo é tempestivo, visto que protocolado dentro do interstício de 10 (dez) dias úteis, a que alude o artigo 74, do Decreto Municipal nº 18.484/2018. Sendo assim, tendo em vista que o recurso foi recebido por essa municipalidade dentro do intervalo acima referido, insurgindo no seu direito do mérito do presente ser examinado pelo ilustre Julgador.

II – DAS INTIMAÇÕES E PUBLICAÇÕES

Recebido em: 29/05/23 às 16:20
Ass:
Matrícula: 136125

Requer que todas as publicações veiculadas no Diário oficial, intimações e qualquer ato de comunicação referente ao presente processo sejam feitas em nome do procurador **HELIO ALMEIDA SANTOS JÚNIOR, OAB/BA 29.375**,

PMVC - SMTC - NUCAD
FLS
267

sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto no artigo 42, do Decreto Municipal nº 18.484/2018 cumulado com o artigo 236, §1º, do Código de Processo Civil.

Na oportunidade, registra-se o endereço eletrônico do procurador do Requerido, qual seja, contato@aacadvocacia.com.br.

III – DA NULIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA – ART. 61 DO DECRETO MUNICIPAL 18.484/2018

Fundamenta a Comissão Julgadora a aplicação de sanção administrativa ao Requerido, conforme disposto no artigo 58, do Decreto Municipal nº 18.484/2018:

> **Art. 58.** Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a Administração Pública Municipal e aos licitantes que cometam atos visando a frustrar os objetivos da licitação, mediante a regular tramitação de processo administrativo de inadimplência, serão aplicadas as seguintes sanções:
> **I** - Advertência: comunicação formal ao fornecedor, advertindo sobre o descumprimento de cláusulas contratuais e outras obrigações assumidas, e, conforme o caso, em que se confere prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis;
> **II** - Multa: na forma prevista no instrumento convocatório e/ou no contrato;
> **III** - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
> **IV** - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
> **Parágrafo único**. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

FMVC - SMTC - NUCAD
FLS
268

Ocorre, contudo, que a norma municipal prevê que **a sanção que se intenta impor ao Requerido é exclusiva da apuração de supostas infrações no âmbito de processos licitatórios realizados sob a modalidade de pregão**.

> Art. 61. **Exclusivamente, nos processos licitatórios realizados sob a modalidade pregão**, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, **será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Municipio, por prazo não superior a 5 (cinco) anos**, sendo descredenciado do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

Nesse sentido, chama atenção a pretensão de impor ao Requerido uma penalidade incompatível com a tipificação legal estabelecida e que, além disso, destoa da conjuntura fático-processual. Justifica-se essa argumentação diante da inexistência de conduta reiterada do Requerido ao fato de inexistir arcabouço jurídico-legal para a aplicação da sanção que almeja impor a Administração Pública.

Vale destacar que a capacidade técnica operacional do Requerido foi atestada em documento emitido pelo fiscal da obra (Doc. Anexo):

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
www.pmvc.ba.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA AR ENGENHARIA EIRELI, está executando os serviços de Ampliação e Reforma da Escola Municipal Moises Melo, Distrito de José Gonçalves, estando assim distribuídos

1. Construção de prédio anexo em dois pavimentos com 10 salas de aula, sanitários e acessibilidade;
2. Reforma com ampliações de ambientes do bloco principal da escola

Os serviços estão sendo executado de acordo com as cláusulas contratuais, dentro de boa técnica e prazo acordado. Informamos ainda os dados relativos ao contrato

PMVC - SMTC - JURIDICO
FLS
269

À evidência, resta caracterizada a impossibilidade jurídica e inviabilidade fática para aplicação da sanção administrativa de Impedimento de Licitar e Contratar com o Município de Vitória da Conquista, Bahia, pelo prazo de 02 (dois) anos bem como da multa no importe de R$76.246,00 (setenta e seis mil e duzentos e quarenta e seis reais).

Destaca-se, *in casu*, o princípio da autotutela da Administração Pública o qual estabelece o poder-dever de rever os próprios atos e, quando eivados de vícios, anulá-los, conforme disposição da Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal:

> **Súmula 473**
> A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Assim, considerando a inexistência de condutas reiteradas da empresa, bem como a inexistência de sanções administrativas anteriores; e, ainda, a aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, autotutela e legalidade; e a Súmula 473, do STF, **requer a reforma da medida administrativa aplicada, atenuando-a para a sanção prevista no inciso I, art. 58, do Decreto Municipal nº 18.484/2018, qual seja, a Advertência**:

> Advertência: comunicação formal ao fornecedor, advertindo sobre o descumprimento de cláusulas contratuais e outras obrigações assumidas, e, conforme o caso, em que se confere prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis;

Subsidiariamente, requer a reforma da decisão com a redução para aplicação exclusiva da sanção de suspensão temporária de participação em licitação, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, retroativo à 01 de novembro de 2022 (Fl. 03 – PAI 068/2022).

IV – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

PMVC · SMTC · NUCAD
FLS
270

a) O recebimento do presente Recurso Administrativo, com o encaminhamento dos autos para pronunciamento da Procuradoria Geral do Município, nos termos do artigo 74, caput e §1º, do Decreto Municipal 18.484/2018;

b) Que todas as publicações veiculadas no Diário oficial, intimações e qualquer ato de comunicação referente ao presente processo sejam feitas em nome do procurador **HELIO ALMEIDA SANTOS JÚNIOR, OAB/BA 29.375, endereço eletrônico:** contato@aacadvocacia.com.br;

c) A reforma da medida administrativa aplicada, **atenuando-a para a sanção prevista no inciso I, art. 58, do Decreto Municipal nº 18.484/2018, qual seja, a Advertência;**

   i. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão com a sua redução para aplicação exclusiva da sanção de suspensão temporária de participação em licitação, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, retroativo à 01 de novembro de 2022 (Fl. 03 – PAI 068/2022)

Nestes termos, pede deferimento.

Vitória da Conquista, Bahia, em 29 de maio de 2023.

AR ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 36.286.217/0001-57
HELIO ALMEIDA SANTOS JÚNIOR
Advogado e Procurador
OAB/BA 29.375

PMVC - SMTC - FLS 271

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA AR ENGENHARIA EIRELI, está executando os serviços de Ampliação e Reforma da Escola Municipal Moisés Meira, Distrito de José Gonçalves, estando assim distribuídos:

1. Construção de prédio anexo em dois pavimentos com 10 salas de aula, sanitário e acessibilidade;
2. Reforma com ampliações de ambientes do bloco principal da escola.

Os serviços estão sendo executado de acordo com as cláusulas contratuais, dentro de boa técnica e prazo acordado. Informamos ainda os dados relativos ao contrato:

- Contrato: nº 104-2021

- Objeto do contrato: Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Moisés Meira

- Contratante: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista – Ba

Cnpj: 14.239.578/0001-00

-Contratada: AR Engenharia Eireli

Cnpj 36.286.217/0001-57

Responsável técnico: André Luís Prates Rocha Moura

Crea: CREA nº 051401327-3

- Valor contratado: R$ 1.579.246,07

- Prazo contratual 1 ano

- Início e término do contrato: 15/10/2021 a 15/10/2022

- Endereço dos locais dos serviços: Distrito de José Gonçalves

José Flávio Meira de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-BA 27678/D

Digitalizado com CamScanner

PMVC - SMTC - FLS 272

- Serviços executados:

SERVIÇOS PRELIMINARES		
Demolição de piso cimentado sobre lastro (salas existentes e circulação)	m2	249,66
Demolição manual de cobertura com telha cerâmica, sem reaproveitamento	m2	354,04
Demolição de estrutura de madeira para telhados	m2	354,04
Remoção de rufo em chapa galvanizada	m	37,21
Retirada de pilares de madeira, inclusive base em concreto.	un	12,00
Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m3	95,77
Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, para distâncias superiores a 5 Km	m3xkm	478,87
Abrigo provisório com 1 pavimento, depósito	m2	25,41
Locação da obra	m2	467,40
Placa da obra - confecção e instalação	m2	4,50
Projetos complementares com software em tecnologia BIM (estrutural, hidrossanitário e elétrico)	m2	1.211,36
Limpeza mecanizada do terreno, com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m2	788,33
Escavação e carga de material de 1ª categoria	m3	358,69
Transporte de material dmt= 5,0 km(Bota Fora)	m3xkm	1.290,89
Transporte de material dmt= 14,0 km (Emprestimo)	m3xkm	2.510,83
Espalhamento de material terroso	m3	358,69
Compactação de aterro	m3	358,69
INFRAESTRUTURA		
Escavação manual de valas ou fundações, até 1,50m	m3	125,74
Apiloamento de fundo de valas c/maço de 30kg	m2	163,82

Rua Siqueira Campos, nº 1842, Vila Emurc, Bairro Candeias
Fone: (77) 3429-7750
Cep 45028-548 – Vitória da Conquista - Ba

José Flavio Matta de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-BA 27678/D

Digitalizado com CamScanner

PMVC - SMTC - NUCAD FLS 273

Preparo e aplicação de concreto magro para lastro	m3	4,91
Aterro manual da caixa da obra	m3	71,60
Forma tábuas para fundações, utilização 4 vezes - fabricação, montagem e desmontagem	m2	63,91
Armadura CA - 50 média - transporte, corte, dobra e montagem	kg	2.116,23
Armadura CA - 50 fina - transporte, corte, dobra e montagem	kg	116,76
Confecção e aplicação de concreto estrutural, FCK=20.0 Mpa	m3	52,64
Lançamento de concreto em fundação	m3	52,64
Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfáltica	m2	232,68
SUPERESTRUTURA		
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	173,49
Armadura CA - 50 média - transporte, corte, dobra e montagem	kg	1.989,69
Armadura CA - 50 fina - transporte, corte, dobra e montagem	kg	575,20
Confecção e aplicação de concreto estrutural, FCK=25,0 Mpa	m3	27,97
Lançamento de concreto em estrutura	m3	27,97
Laje pré-moldada de forro, E=8 cm, inclusive escoramento e capeamento	m2	303,24

JOSÉ FLÁVIO MAFRA DE OLIVEIRA
ENG° CIVIL, CREA – BA 27678/D
INFRAESTRUTURA/SMED – MAT 17389-0

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PMVC - SMTC - NUCAD FLS 274

Protocolo - **36246/2023**

Ref. Encaminha pedido de Recurso Administrativo para análise e emissão de parecer

Vitória da Conquista, 30 de maio de 2023

De: Corregedoria Geral do Município

Para: Corregedoria Geral do Município

Em atenção: Antônio Gabriel Oliveira Araújo.

Ao Ilm. Sr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo

Corregedor-Geral do Município

Ao tempo em que o cumprimento cordialmente, venho por meio deste encaminhar os autos do Processo Administrativo de inadimplência nº 068/2022, movido em face da pessoa jurídica **AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57**, com pedido de recurso administrativo, para análise e emissão de parecer pelo Corregedor-Municipal Dr. Antônio Gabriel Oliveira Araújo.

Respeitosamente,

ADRIANA BORGES MAGALHÃES BARBOSA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
15062-8
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - STPC

PMVC - SMTC - NUC.AD FLS 275

PARECER Nº 059/2023 – CRGM/STPC

À Exmª Srª

ANA SHEILA LEMOS ANDRADE

Prefeita Municipal de Vitória da Conquista

Ref.: Recurso Administrativo interposto no âmbito do Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022

Na condição de Corregedor-Geral do Município, no uso das atribuições previstas no inciso II do art. 48 da Lei Complementar Municipal nº 2.647/2022 e nos arts. 51 e 78, §1º, do Decreto Municipal nº 18.484/2018, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.375/2023, encaminho a V.S.ª manifestação relativa ao Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022.

Trata-se, na originalidade, de Processo Administrativo de Inadimplência, instaurado através da Portaria CRGM nº 065/2022, movido em face de **AR ENGENHARIA EIRELI,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 36.286.217/0001-57, em virtude de descumprimento do Contrato Administrativo nº 124/2021, oriundo da Concorrência nº 002/2021 (Processo Administrativo nº 14980/2021), em especial, por falha na execução do contrato, haja vista a inexecução parcial da obra de ampliação da Escola Municipal Moisés Meira

Após a devida instrução processual, a Comissão Processante emitiu relatório conclusivo (fls. 239-249), em que recomenda o acolhimento da denúncia e a aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar com o Município de Vitória da Conquista pelo prazo de 02 (dois) anos, além de multa no importe de R$76.246,00 (setenta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais), calculada no percentual de 10% do percentual inadimplido da obra.

Proferida Decisão (fls. 253-260), esta acolheu o entendimento da Comissão de Inquérito, aplicando as penalidades acima mencionadas.

Irresignada, a denunciada apresentou recurso administrativo (fls. 266-270), objetivando a reforma da decisão guerreada, com aplicação da sanção de advertência. Subsidiariamente, requer tão somente a aplicação da penalidade de suspensão temporária por 01 (um) ano, isentando a aplicação da multa.

Acerca da pretensão reformatória, assim leciona o Decreto Municipal nº 18.484/2018:

PMVC - SMTC - NUCAO FLS 276

> *Art. 74 É facultado ao fornecedor interpor recurso endereçado ao Prefeito Municipal contra decisão do Secretário Municipal de Administração de aplicação das penas descritas no Capítulo III deste Decreto, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da ciência da respectiva intimação.*

Compulsando-se os autos, verifica-se que a denunciada foi intimada da decisão em 15/05/2023 (fls. 265), interpondo recurso administrativo em 29/05/2023 (fls. 266-270). Ou seja, além de **cabível**, a pretensão recursal também é **tempestiva**.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, **o pedido de reconsideração deve ser conhecido**.

Adiante, no que tange às alegações de mérito, sorte não assiste a recorrente.

Sustenta a denunciada suposto vício na aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar sob o argumento de que a referida sanção somente seria cabível nos processos licitatórios realizados sob a modalidade pregão (Art. 61 do Decreto Municipal nº 18.484/2018).

Ocorre que, como colacionado pelo próprio Recorrente em sua petição, a sanção acima identificada também se encontra prevista no art. 58 do mesmo diploma legal, aplicando-se à todas as modalidades de processo licitatório. Confira-se:

> *Art. 58 Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a Administração Pública Municipal e aos licitantes que cometam atos visando a frustrar os objetivos da licitação, mediante a regular tramitação de processo administrativo de inadimplência, serão aplicadas as seguintes sanções:*
> *I – Advertência: comunicação formal ao fornecedor, advertindo sobre o descumprimento de cláusulas contratuais e outras obrigações assumidas, e, conforme o caso, em que se confere prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis;*
> *II – Multa: na forma prevista no instrumento convocatório e/ou no contrato;*
> *III – Suspensão temporária de participação em licitação e* ***impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;***
> *IV - Declaração de inidoneidade para Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. (grifos nossos)*

PMVC · SMTC · NUCAD FLS 277

Em verdade, a previsão legal positivada no art. 61 do Decreto Municipal nº 18.484/2018 trata-se de uma majoração da sanção prevista no inciso III do art. 58 com efeitos idênticos, não acarretando em qualquer nulidade que seja feita a correção da nomenclatura da sanção, visto que não haverá qualquer prejuízo à denunciada, haja vista que não se trata de *reformatio in pejus*, mas tão somente correção de erro material.

Não obstante, havendo expressa previsão das sanções no edital, não há que se falar em discricionariedade da administração em deixar de aplicar sanção de multa ou sanção qualquer que seja, haja vista que é imperativa a responsabilização dos atos ilícitos praticados por fornecedor/contratado. Dessa forma, havendo inexecução parcial do objeto do contrato, tendo a empresa abandonado a obra, não há que se falar em aplicação de advertência, posto que não há qualquer viabilidade em "adoção das medidas corretivas cabíveis", conforme previsto no art. 58, I do Decreto Municipal nº 18.484/2018. Ademais, em relação ao pedido de aplicação retroativa da sanção do art. 58, III, não há previsão legal para tal, devendo os efeitos serem produzidos a partir do trânsito em julgado da decisão.

Em face do exposto, encaminha-se os autos vertentes à autoridade competente para decisão, com a recomendação de recebimento do recurso, em razão de estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e manutenção da decisão de piso, pelas razões acima mencionadas, com a correção do erro material da decisão relativa à aplicação da sanção de "suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos".

É o pronunciamento, salvo melhor juízo.

Gabinete do Corregedor Geral do Município, 31 de maio de 2023.

ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA ARAÚJO
CORREGEDOR-GERAL DO MUNICÍPIO

PMVC - SMTC - NUCAD
FLS 278

Diário Eletrônico / PMVC
Publicado em 15/06/23
Edição nº 3470
Página(s)

DECISÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem os arts. 152, inciso I, e 193, da Lei Complementar Municipal nº 1.786/2011, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal nº 1.902/2013, vem emitir sua decisão relativa ao recurso administrativo interposto em face do julgamento do Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022.

Trata-se, na originalidade, de Processo Administrativo de Inadimplência, instaurado através da Portaria CRGM-STPC nº 065/2022, movido em face de AR ENGENHARIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 36.286.217/0001-57, em virtude de descumprimento do Contrato Administrativo nº 124/2021, oriundo da Concorrência nº 002/2021 (Processo Administrativo nº 14980/2021), em especial, por falha na execução do contrato, haja vista a inexecução parcial da obra de ampliação da Escola Municipal Moisés Meira, localizada no distrito de José Gonçalves.

Averiguadas as informações contidas nos autos, a Comissão Processante emitiu relatório conclusivo (fls. 239-249), em que recomenda o acolhimento da denúncia e a aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar com o Município de Vitória da Conquista pelo prazo de 02 (dois) anos, além de multa no importe de R$76.246,00 (setenta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais), calculada no percentual de 10% do percentual inadimplido da obra.

Remetidos os autos à autoridade julgadora, esta proferiu decisão (fls. 253-260) acolhendo o entendimento da Comissão Processante, tendo sido determinada a aplicação das penalidades acima mencionadas.

Em 29 de maio de 2023, a empresa denunciada interpôs, tempestivamente, recurso administrativo (fls. 266-270), requerendo a reforma da decisão guerreada e a não aplicação da penalidade de advertência. Subsidiariamente, requereu, a recorrente, a não aplicação da pena de multa.

Encaminhados os autos para pronunciamento do Corregedor-Geral do Município, nos termos do art. 74, §§ 1º e 2º do Decreto Municipal nº 18.484/2018, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.375/2023, este manifestou-se pelo conhecimento do recurso e desprovimento.

Vistos e examinados os autos do presente Processo Administrativo, passa-se à decisão.

Trata-se de recurso administrativo (fls. 266-270) interposto em face da decisão de fls. 253-260, objetivando a reforma da decisão guerreada e a aplicação da penalidade de advertência. Subsidiariamente, requereu, a recorrente, a não aplicação da pena de multa.

PMVC - SMTC - NUCAD
FLS
279

Compulsando-se os autos, verifica-se que a denunciada foi intimada da decisão em 15/05/2023 (fls. 265), interpondo recurso administrativo em 29/05/2023 (fls. 266-270), dentro do prazo previsto no art. 74, *caput*, do Decreto nº 18.484/2018.

Portanto, além de **cabível** a presente pretensão recursal, esta se mostra **tempestiva**. Preenchidos, portanto, os requisitos de admissibilidade recursal, **conheço do recurso administrativo.**

Quanto ao mérito, alega, a recorrente, nulidade na aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar, sob o frágil argumento de que a referida penalidade somente seria cabível em processos licitatórios regidos sob a modalidade pregão, suscitando, ainda, o art. 61 do Decreto Municipal n.º 18.484/2018.

Evidentemente, fundamento não assiste a recorrente. Confira-se o que dispõe o diploma legal acima mencionado:

> *Art. 58 Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a Administração Pública Municipal e aos licitantes que cometam atos visando a frustrar os objetivos da licitação, mediante a regular tramitação de processo administrativo de inadimplência, serão aplicadas as seguintes sanções:*
>
> *I – Advertência: comunicação formal ao fornecedor, advertindo sobre o descumprimento de cláusulas contratuais e outras obrigações assumidas, e, conforme o caso, em que se confere prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis;*
>
> *II – Multa: na forma prevista no instrumento convocatório e/ou no contrato;*
>
> *III – Suspensão temporária de participação em licitação e **impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;***
>
> *IV - Declaração de inidoneidade para Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. (grifos nossos)*
>
> *Art. 61. **Exclusivamente, nos processos licitatórios realizados sob a modalidade pregão**, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, **será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Município, por prazo não superior a 5 (cinco) anos**, sendo descredenciado do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais*

PMVC - SMTC - NUCAD
FLS 280

cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

Da leitura dos referidos dispositivos, verifica-se que, em verdade, a previsão legal positivada no art. 61 do Decreto Municipal nº 18.484/2018 trata-se de uma majoração da sanção prevista no inciso III do art. 58, produzindo repercussão jurídica absolutamente idêntica, qual seja, a inviabilidade temporária de licitar e contratar com a Administração Pública.

Veja-se, na verdade, que a aplicação de tal sanção é prevista na Lei Federal nº 8.666/1993 com efeitos em toda a Administração, entretanto esta municipalidade, aderindo a jurisprudência do TCU e as novações trazidas pela Lei 14.133, aplicou a sanção somente na esfera e no poder do executivo municipal, sendo, portanto, perfeitamente moldada ao caso concreto.

Do exposto, inexiste qualquer nulidade na decisão guerreada ou na aplicação da referida penalidade, carecendo de mera correção de erro material, não incidindo em qualquer nulidade insanável, haja vista que, conforme bem exposto na peça recursal, a Administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício, bem como que, no caso concreto, por não ter transitado em julgado a decisão guerreada, não foram efetivamente produzidos efeitos jurídicos da sanção.

Destarte, não há que se falar em mitigação da sanção aplicada para aquela prevista no art. 58, inciso I do Decreto Municipal nº 18.484/2018, senão vejamos:

> Art. 58. Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a Administração Pública Municipal e aos licitantes que cometam atos visando a frustrar os objetivos da licitação, mediante a regular tramitação de processo administrativo de inadimplência, serão aplicadas as seguintes sanções:
>
> **I - Advertência: comunicação formal ao fornecedor, advertindo sobre o descumprimento de cláusulas contratuais e outras obrigações assumidas, e, conforme o caso, em que se confere prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis;**
>
> Art. 59. A suspensão temporária, prevista na Lei Federal nº 8.666/1993, impedirá o fornecedor de licitar e contratar com a Administração Pública pelos seguintes prazos: [...]
>
> II - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
>
> [...]
>
> **b) paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração;**
>
> [...]

PMVC · SMTC · NUCAD FLS 0861

e) descumprimento das obrigações legais quanto ao objeto do contrato.

A paralisação e abandono da obra da Escola Moisés Meira representa infração grave ao contrato. Não há viabilidade em advertir a empresa, posto que a obra foi, em definitivo, abandonada, não tendo o quê ser ajustado, por não se tratar de mero desajuste. Em relação ao prazo da suspensão temporária, há previsão expressa no art. 59, inciso II, alíneas 'b' e 'e' do Decreto supramencionado (acima colacionado), não podendo haver decisão destoante daquilo que prega as normas vigentes, de forma a pautar-se, portanto, pela segurança jurídica das decisões desta municipalidade.

Neste sentido, a jurisprudência é pacífica:

> TJ-SC - Apelação: APL 50312026020218240023 Jurisprudência•Data de publicação: 07/03/2023 APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/201. IMPETRANTE VENCEDORA EM TRÊS LOTES. CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA E A CASAN, DESTINADOS À OBRAS DE MELHORIAS NOS MUNICÍPIOS DE CORREIA PINTO, OTACÍLIO COSTA E BOCAINA DO SUL. DEMORA INJUSTIFICADA DO INÍCIO DOS TRABALHOS. INFRUTÍFERAS TENTATIVAS DE SOLUCIONAR O ATRASO POR MEIO DE AJUSTES E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. POSSIBILITADA A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA COM APRESENTAÇÃO DE DEFESA E PARTICIPAÇÃO NAS ETAPAS. CONTRATO ADMINISTRATIVO INADIMPLIDO POR INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS. PENALIDADES APLICADAS EM PROPORÇÃO À GRAVIDADE DA CONDUTA. HIGIDEZ NAS SANÇÕES DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO, IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A CASAN PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS, RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E APLICAÇÃO DE MULTA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. "**A empresa vitoriosa em processo licitatório deve estar preparada para cumprir a proposta nos exatos termos em que foi lançada. Se assim não o faz, deixando de adotar as providências mais elementares para assegurar o fornecimento dos bens pretendidos pelo Poder Público, apresenta-se correta a rescisão unilateral do contrato, com a imposição de multa e suspensão do direito de licitar com a Administração, o que se fez em estrita observância ao devido processo legal**" (TJSC, Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2005.029265-3, da Capital, rel. Jânio Machado, Quarta Câmara de Direito Público, j. 24-

PMVC - SMTC - NUCAD FLS 282

> 01-2008). Por fim, "a revisão das sanções aplicadas na esfera administrativa, em razão na inexecução total ou parcial de contrato administrativo, à luz da razoabilidade da pretensão, é medida absolutamente excepcional, reservada para os casos de manifesta desproporcionalidade entre a gravidade da infração [...]
>
> TJ-PR - Apelação / Reexame Necessário: REEX 298868320208160014 Londrina 0029886-83.2020.8.16.0014 (Acórdão) Jurisprudência•Data de publicação: 30/09/2021 APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL E APLICAÇÃO DE SANÇÕES. RESPALDO EM LEI E NO CONTRATO. LEGALIDADE OBSERVADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PENALIDADES MANTIDAS. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0029886-83.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA - J. 27.09.2021)

Por fim, quanto à multa, há de se chamar atenção a gravidade da infração cometida pela recorrente e o princípio da legalidade, que nos informa, não tão somente no caso em concreto, mas também de maneira abstrata, que em caso de cometimento de infração, a aplicação da penalidade é uma obrigação e não uma faculdade por parte da Administração Pública:

Segundo MEIRELES:

> *"Ademais, a aplicação de sanções não se trata de faculdade do administrador público, mas sim de um poder-dever da Administração, posto que esta encontra-se vinculada ao princípio da legalidade, ou seja, incidindo o contratado em uma inexecução ou em uma execução deficiente, a Administração deve aplicar-lhe as sanções cabíveis, conforme dispostos normativos."*

Do exposto e nos termos da fundamentação supra, CONHEÇO do recurso administrativo interposto para no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme os fundamentos acima mencionados, devendo ser mantida a decisão de piso por seus próprios fundamentos, havendo, tão somente, correção de erro material, com aplicação das sanções de:

• SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, pelo prazo de 02

PMVC · SMTC · NUCAD
FLS
283

(dois) anos, com fundamento no Art. 58 do Decreto Municipal nº 18.484/2018 e Artigo 87, III da Lei Federal nº 8.666/93;

• MULTA no importe de R$ 76.246,00 (setenta e seis mil duzentos e quarenta e seis reais), calculada no percentual de 10% (dez por cento) sobre a obrigação inadimplida, conforme item 20.8 do Edital da Concorrência n.º 002/2021.

Ante o exposto, DETERMINO:

1) Que seja dada ciência do inteiro teor deste termo a **AR ENGENHARIA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 36.286.217/0001-57, por meio de seus patronos e representantes legais;

2) Encaminhem-se cópias desta decisão à:

2.1) **Secretaria Municipal de Educação (SMED)**, para que tenha ciência do inteiro teor desta decisão e proceda aos registros de praxe e, sendo cabível, realize a rescisão unilateral do Contrato Administrativo nº 124/2021;

2.2) **Coordenação de Material e Patrimônio e Gerência de Compras da Secretaria Municipal de Gestão e Inovação (SEMGI)**, para que se proceda à inscrição da denunciada no CAFIMP pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme previsto nos artigos 78 e 79 do Decreto Municipal n.º 18.484/2018, tendo em vista o impedimento de licitar e contratar com a o Município de Vitória da Conquista;

2.3) **Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária**, para que proceda com a cobrança da multa no importe de R$ 76.246,00 (setenta e seis mil duzentos e quarenta e seis reais), mediante a seguinte ordem:

2.3.1) execução do valor do seguro-garantia no valor total (R$20.685,91), conforme apólice de seguro nº 05-0775-0296571 (fls. 112-128);

2.3.2) após, expedição do DAM no valor restante, caso haja sucesso na execução da garantia, ou no valor total da multa, em caso de insucesso;

2.3.3) não havendo pagamento voluntário no prazo de 30 (trinta) dias, que proceda com a inscrição da empresa AR ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.286.217/0001-

PMVC - SMTC - NUCAD
FLS
284

57, na Dívida Ativa do Município, encaminhando-se para execução fiscal nos termos da lei.

3) Inscreva-se a empresa AR ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.286.217/0001-57 no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS PUNIDAS - CNEP, em razão da aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar com o Município de Vitória da Conquista, nos termos dos artigos 84 a 87 do Decreto Municipal nº 18.484/2018.

4) Após, arquivem-se.

Vitória da Conquista/BA, 05 de junho de 2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ANA SHEILA LEMOS ANDRADE
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PMVC - CNTC - NUCAD FLS 285

Protocolo - **40110/2023**

Ref. Encaminha cópia da Decisão do PAI nº 068/2022 para expedição de DAM

Vitória da Conquista, 16 de junho de 2023

De: Corregedoria Geral do Município

Para: Gabinete do Secretário

Em atenção: Rodrigo Cardoso Bulhoes, Eliana Souza França.

Ao Ilm.º Sr. Rodrigo Cardoso Bulhões

Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária

Por ordem da Prefeita Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, Sr.ª Ana Sheila Lemos Andrade, que emitiu Decisão relativa ao Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022, movido em face da pessoa jurídica AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57, encaminho cópia da decisão exarada, em 05 de junho de 2023, nos autos do processo supracitado, **para que V. S.ª tenha ciência do seu inteiro teor e providencie a cobrança da multa no importe de R$ 76.246,00 (setenta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais), mediante a seguinte ordem:**

1. **Execução do valor do seguro-garantia no valor total de R$ 20.685,91 (vinte mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), conforme apólice de seguro nº 05-0775-0296571 (fls. 112-128);**
2. **Após, expedição do DAM no valor restante, caso haja sucesso na execução da garantia, ou no valor total da multa, em caso de insucesso;**
3. **Não havendo pagamento voluntário no prazo de 30 (trinta) dias, que proceda com a inscrição da empresa AR ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 36.286.217/0001-57, na Dívida Ativa do município, encaminhando-se para execução fiscal nos termos da lei.**

Após a emissão do DAM, solicitamos o envio da cópia deste e, em caso de decurso do prazo para pagamento, **que também seja enviado**, a este setor, cópia de documento comprobatório

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PMVC - SMTC - NUCAD FLS 286

Protocolo - **40110/2023**

Ref. Encaminha cópia da Decisão do PAI nº 068/2022 para expedição de DAM

Vitória da Conquista, 16 de junho de 2023

De: Corregedoria Geral do Município

Para: Inspetoria Geral de Rendas

Em atenção: Vanusia Moreira dos Santos, JOSELENE BITTENCOURT SANTOS.

Recebi em 16.06.23 Joselene Bittencourt Santos Inspetora Geral de Rendas Mat. nº 24311-4 Bittencourt às 14:40 h.

Ao Ilm.º Sr. Rodrigo Cardoso Bulhões

Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária

Por ordem da Prefeita Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, Sr.ª Ana Sheila Lemos Andrade, que emitiu Decisão relativa ao Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022, movido em face da pessoa jurídica AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57, encaminho cópia da decisão exarada, em 05 de junho de 2023, nos autos do processo supracitado, **para que V. S.ª tenha ciência do seu inteiro teor e providencie a cobrança da multa no importe de R$ 76.246,00 (setenta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais), mediante a seguinte ordem:**

1. **Execução do valor do seguro-garantia no valor total de R$ 20.685,91 (vinte mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), conforme apólice de seguro nº 05-0775-0296571 (fls. 112-128);**
2. **Após, expedição do DAM no valor restante, caso haja sucesso na execução da garantia, ou no valor total da multa, em caso de insucesso;**
3. **Não havendo pagamento voluntário no prazo de 30 (trinta) dias, que proceda com a inscrição da empresa AR ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 36.286.217/0001-57, na Dívida Ativa do município, encaminhando-se para execução fiscal nos termos da lei.**

Após a emissão do DAM, solicitamos o envio da cópia deste e, em caso de decurso do prazo para pagamento, **que também seja enviado**, a este setor, cópia de documento comprobatório atestando o recolhimento da multa pela pessoa jurídica supracitada, ou, **em havendo**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PMVC - SMTC - NUCAD FLS 287

Protocolo - **40110/2023**

Ref. Encaminha cópia da Decisão do PAI nº 068/2022 para expedição de DAM

Vitória da Conquista, 16 de junho de 2023

De: Corregedoria Geral do Município

Para: Gerência de Fiscalização

Em atenção: Josélia Rodrigues Alves, Régis Barreto Cortes.

Ao Ilm.º Sr. Rodrigo Cardoso Bulhões

Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária

Por ordem da Prefeita Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, Sr.ª Ana Sheila Lemos Andrade, que emitiu Decisão relativa ao Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022, movido em face da pessoa jurídica AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57, encaminho cópia da decisão exarada, em 05 de junho de 2023, nos autos do processo supracitado, **para que V. S.ª tenha ciência do seu inteiro teor e providencie a cobrança da multa no importe de R$ 76.246,00 (setenta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais), mediante a seguinte ordem:**

1. **Execução do valor do seguro-garantia no valor total de R$ 20.685,91 (vinte mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), conforme apólice de seguro nº 05-0775-0296571 (fls. 112-128);**
2. **Após, expedição do DAM no valor restante, caso haja sucesso na execução da garantia, ou no valor total da multa, em caso de insucesso;**
3. **Não havendo pagamento voluntário no prazo de 30 (trinta) dias, que proceda com a inscrição da empresa AR ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 36.286.217/0001-57, na Dívida Ativa do município, encaminhando-se para execução fiscal nos termos da lei.**

Após a emissão do DAM, solicitamos o envio da cópia deste e, em caso de decurso do prazo para pagamento, **que também seja enviado**, a este setor, cópia de documento comprobatório

Recebido 16/06/23 Régis Barreto Cortes Corregedoria Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SMTC - NUCAD FLS 288

Protocolo - **40123/2023**

Ref. Encaminha cópia da Decisão do PAI nº 068/2022 para inclusão da empresa no CAFIMP

Vitória da Conquista, 16 de junho de 2023

De: Corregedoria Geral do Município

Para: Coordenação de Material e Patrimônio

À Ilmª. Srª. Lara Betânia Lélis Oliveira

Coordenação de Material e Patrimônio /Secretaria Municipal de Gestão e Inovação

Por ordem da Prefeita Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, Sr.ª Ana Sheila Lemos Andrade, que emitiu Decisão relativa ao Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022, **encaminho a V. S.ª cópia da Decisão exarada em 05 de junho de 2023, para que tenha ciência do inteiro teor e para que se proceda à inscrição da pessoa jurídica AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57, no CAFIMP pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme previsto nos artigos 78 e 79 do Decreto Municipal 18.484/2018, tendo em vista o impedimento de licitar e contratar com o Município de Vitória da Conquista.**

Após o feito do procedimento acima descrito, que seja encaminhada cópia do CAFIMP para que seja juntada ao devido Processo.

ADRIANA BORGES MAGALHÃES BARBOSA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
15062-8
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - STPC

RECEBIDO
16/06/2023
14:34 hs

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PMVC - SMTC - NUCAD
FLS 289

Protocolo - **40018/2023**

Ref. Encaminha cópia da Decisão do PAI nº 068/2023 - AR ENGENHARIA EIRELI

Vitória da Conquista, 15 de junho de 2023

De: Corregedoria Geral do Município

Para: Gabinete do Secretário

Em atenção: Jaciara do Prado Costa, Edgard Larry Andrade Soares.

Ao Ilm. Sr. Edgard Larry Andrade Soares

Secretaria Municipal de Educação

Por ordem da Prefeita Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, Sr.ª Ana Sheila Lemos Andrade, que emitiu Decisão relativa ao Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2023, **encaminho a V. S.ª cópia da Decisão (em anexo) exarada em 05 de junho de 2023, para que tenha ciência do inteiro teor desta de decisão e proceda aos registros de praxe e, sendo cabível, realize a rescisão unilateral do contrato Administrativo nº 124/2021.**

Atenciosamente,

Recebido em 19 / 06 / 2023

Isabel
Gabinete - SMED

ADRIANA BORGES MAGALHÃES BARBOSA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
15062-8
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - STPC

PMVC - SMTC - NUCAD
FLS
290

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

Vitória da Conquista, 15 de junho de 2023.

Ofício nº. 617/2023 - CRGM/STPC
À **Sociedade de advogados ADVOCACIA ALMEIDA E CARVALHO**
Av. João abuchidid, nº 194, bairro Candeias, Nesta.
CEP. 45.028-125

Por ordem da Prefeita Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, Sr.ª Ana Sheila Lemos Andrade, que emitiu decisão relativa ao Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022, fica **a pessoa jurídica AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57, na pessoa do seu representante, INTIMADA acerca do inteiro teor da supracitada Decisão do processo supracitado.**

Os autos digitalizados do PAI 068/2022 podem ser acessados através do link: ***https://encurtador.com.br/cnoF4***

Atenciosamente,

Adriana Borges Magalhães Barbosa
Auxiliar administrativo
Mat. 07-15062-8

Recebido em 19/06/2023
LUCAS DA CUNHA CARVALHO
OAB/BA: 39.517

PMVC - SMTC - NUCAD
FLS 291

CERTIDÃO

Certifico que não pude dar cumprimento ao Ofício n.º 616/2023- CRGM/STPC, vez que ao me dirigir ao endereço da Av. Deputado Ulisses Guimarães, nº 450 D, SL 03 - Bairro Felícia, nesta cidade, no dia 22-06-2023 ás 11:30 fui informado por terceiros que a Empresa AR ENGENHARIA EIRELLI não está mais no endereço supracitado, o referido é verdade e dou fé.

Vitória da Conquista – BA, 26 de junho de 2023.

Rielson Mendes de Souza Lima
Matrícula nº 07-11047-2

SMTC - NUCAD
PMVC
FLS 292

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

Vitória da Conquista, 15 de junho de 2023.

Ofício nº. 616/2023 - CRGM/STPC
À **AR ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ nº 36.286.217/0001-57
Av. Deputado Ulisses Guimarães, nº 450 D- SL03, Andar 1, Bairro Felícia
Vitória da Conquista - BA
CEP: 45055-155

Por ordem da Prefeita Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, Sr.ª Ana Sheila Lemos Andrade, que emitiu decisão relativa ao Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022, fica **a pessoa jurídica AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57, na pessoa do seu representante, INTIMADA acerca do inteiro teor da supracitada Decisão do processo supracitado.**

Os autos digitalizados do PAI 068/2022 podem ser acessados através do link: ***https://encurtador.com.br/cnoF4***

Atenciosamente,

Adriana Borges Magalhães Barbosa
Auxiliar administrativo
Mat. 07-15062-8

PMVC - SMTC - NUCAD FLS 293

CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CAFIMP

(Emitido em atendimento ao disposto o Decreto Municipal nº 18.484/2018)

CERTIDÃO POSITIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que a pessoa jurídica **AR Engenharia Eireli**, inscrita no CNPJ nº **36.286.217/0001-57**, apresenta impedimento no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal de Vitória da Conquista – CAFIMP:

TIPO DE PENALIDADE	**IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR**
MOTIVO IMPEDIMENTO	**Descumprimento do Contrato Administrativo nº 124/2021, oriundo da Concorrência nº 002/2021 (Processo Administrativo 14980/2021)**
DATA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO	15/06/2023
DATA DE INÍCIO DO PERÍODO DA VIGÊNCIA DA PENALIDADE	**15/06/2023**
DATA DE FIM DO PERÍODO DA VIGÊNCIA DA PENALIDADE:	15/06/2025
ÓRGÃO DENUNCIANTE	**Secretaria Municipal de Educação**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	068/2022– Processo Administrativo de Inadimplência
AUTORIDADE JULGADORA	**Secretário Municipal de Gestão e Inovação**

Vitória da Conquista, 20 de junho de 2023.

Cláudio Correia da Costa
Central Estratégica de Compras Públicas/SEMGI

Lara Betânia Lélis Oliveira
Coordenação de Material e Patrimônio/SEMGI

Edimário Freitas de Andrade Junior
Secretário Municipal de Gestão e Inovação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CAFIMP

LISTA DE EMPRESAS INSCRITAS JULGADAS

ÃO	CNPJ DA EMPRESA DENUNCIADA	NOME DA EMPRESA DENUNCIADA	PENALIDADES APLICADAS	DATA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO	DURAÇÃO DA PENALIDADE (MESES)	PERÍODO DE SUSPENSÃO / IMPEDIMENTO DE LICITAR
4	07.699.088/0001-20	LSC MINERAÇÃO E EXTRAÇÃO LTDA	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar por 05 (cinco) anos.	19/11/18	60	19/11/2018 a 19/11/2023
0	04.872.498/0001-33	VIAÇÃO MS TRANSPORTES LTDA-ME	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar por 05 (cinco) anos.	21/05/2021	60	21/05/2021 a 21/05/2026
6	00.175.233/0001-25	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar por 24 (VINTE E QUATRO) meses.	18/08/2021	24	18/08/2021 a 18/08/2023
9	09.258.809/0001-92	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA-EPP	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar por 24 (VINTE E QUATRO) meses.	20/05/2021	24	20/05/2021 a 20/05/2024
0	10.158.358/0001-09	LAPTEK CONSTRUÇÃO LTDA	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar por 24 (VINTE E QUATRO) meses.	03/11/2021	24	03/11/2021 a 03/11/2023
1	03.154.807/0001-77	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar por 24 (VINTE E QUATRO) meses.	17/11/2021	24	17/11/2021 a 17/11/2023
1	00.429.189/0001-32	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar por 24 (VINTE E QUATRO) meses.	17/11/2021	24	17/11/2021 a 17/11/2023
1	22.838.229/0001-32	GOMES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar	22/02/2022	24	22/02/2022 a 22/025/2024
1	22.096.056/0001-24	PEDRA DO SOL TRANSPORTES LTDA - ME	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar	18/02/2022	24	18/02/2022 a 18/02/2024
1	22.096.056/0001-24	PEDRA DO SOL TRANSPORTES LTDA - ME	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar	18/02/2022	24	18/02/2022 a 18/02/2024
7	03.009.582/0001-65	TEIXEIRA CNSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar	17/02/2022	24	17/02/2022 a 17/02/2024
8	10.544.471/0001-14	CONSTRUTORA & SERVIÇOS BOM JARDIM LTDA - M	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar	22/11/2021	24	22/11/2021 a 22/11/2023
4	36.871.002/0001-01	MARIA GORETH PEREIRA DA SILVA CORDEIRO - ME	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar	05/01/2022	24	05/01/2022 a 05/01/2024
21	09.572.429/0001-28	DANRO PAPELARIA, INFORMÁTICA EPRESENTES EIRELI	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar	22/03/2022	48	22/03/2022 a 22/03/2026
20	21.383.842/0001-40	CONSÓRCIO VITÓRIA DA CONQUISTA ROTATIVO	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar	06/05/2022	24	06/05/2022 a 06/05/2024
21	10.754.716/0001-38	VIANA LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA ME	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar	16/05/2022	24	16/05/2022 a 16/05/2024
22	08.822.105/0004-80	RETINA EYE CLINIC SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar	19/05/2022	24	19/05/2022 a 19/05/2024
21	15.723.680/0001-49	GOMES VEÍCULOS ESPECIAI EIRELI	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar	29/04/2022	36	29/04/2022 a 29/04/2024
22	27.811.891/0001-12	FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar	13/05/2022	24	13/05/2022 a 13/05/2024
21	04.246.089/0001-21	GILCAR TRASNSPORTES LTDA ME	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar	25/02/2022	60	25/02/2022 a 25/02/2027
19	02.065.283/0001-85	A&M Transportes e Turismos Eireli	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar	15/06/2022	60	15/06/2022 a 15/06/2027

Cláudio Correia da Costa
Dep: Licitações - CECP

Lara Betânia Lélis Oliveira
Coordenadora de Material
e Patrimônio SEMGI

Mário Freitas de Andrade Junior
Sec. Mun. de Gestão e Inovação

011/2022	29.066.378/0001-70	JCBD Construtora Eireli	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar	12/07/2022	24	12/07/2022 a 12/0
035/2022	03.792.636/0001-01	Viação Cardoso Tur Ltda	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar (24 meses)	15/09/2022	24	15/09/2022 a 15/0
036/2022	12.239.019/0001-74	E. de Andrade Paim Transportes e Serviços de Eventos Eireli	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar (24 meses)	10/10/2022	24	10/10/2022 a 10/1
024/2022	12.396.993/0001-41	YM 8 Comercial de Livros, Produtos e Papelaria, Limpeza, Informática, Cosméticos e Segurança Eireli	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar (24 meses)	15/09/2022	24	15/09/2022 a 15/0
061/2022	09.102.295/0001-81	Ybyplast Fabricação de Artefatos e Móveis Eireli	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar (24 meses)	12/12/2022	24	12/12/2022 a 12/1
058/2022	24.845.457/00001-65	Itaca Eireli	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar (24 meses)	02/02/2023	24	02/02/2023 a 02/0
069/2022	39.368.629/0001-24	Ecomais Ar Condicionados Ltda	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar (24 meses)	24/01/2023	24	24/01/2023 a 24/0
087/2022	31.157.789/0001-12	Jorge Luiz de Gusmão Eireli (Freire Comércio de Móveis LTDA)	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar (24 meses)	15/03/2023	24	15/03/2023 a 15/0
070/2022	10.754.716/0001-38	Viana Empreendimentos e Serviços Combinados Eireli	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar (24 meses)	15/03/2023	24	15/03/2023 a 15/0
007/2023	26.728.117/0001-80	R. Clean Comercial Eireli	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar (36 meses)	12/04/2023	36	12/04/2023 a 12/0
022/2022	08.061.409/0001-20	Construtora Construbrasil Ltda	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar (24 meses)	18/04/2023	24	18/04/2023 a 18/0
068/2022	36.286.217/0001-57	AR Engenharia Eireli	Suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar (24 meses)	15/06/2023	24	15/06/2023 a 15/0

Cláudio Correia da Costa
Dep: Licitações - CECP
Mat. 10683-9

Lara Betânia Lélis Oliveira
Coordenadora de Material
e Patrimônio SEMGI
Mat. 245720

Edmano Freitas de Andrade Junior
Sec. Mun. de Gestão e Inovação
Mat. 248846

PMVC FLS 295

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária
Gerência de Fiscalização
www.pmvc.ba.gov.br

FLS 296

C.I. nº 004/2023

Vitória da Conquista-Ba, 30 de novembro de 2023.

DA: GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
PARA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
ATT. ADRIANA BORGES MAGALHÃES BARBOSA

RECEBIDO EM 30/11/2023
Por:

Prezada Senhora,

Conforme solicitado por meio do protocolo 40110/2023, informamos a inclusão da empresa **AR ENGENHARIA EIRELI LTDA** na Dívida Ativa Não-Tributária do Município, em razão do não pagamento do valor referente DAM, expedido para cobrança da penalidade de multa, perfazendo o total de R$ 76.246, (setenta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais).

Encaminhamos em anexo, extrato comprobatório da inscrição em Dívida Ativa.

Atenciosamente,

Régis Barreto Cortes
Gerente de Fiscalização

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA

CNPJ: 14.239.578/0001-00

PRAÇA JOAQUIM CORREA, 55 , CENTRO, VITÓRIA DA CONQUISTA-BA CEP: 45040-901

29/11/2023 13:29

Emitido Por :

REGIS BARRETO CORTES

DETALHAMENTO DOS VALORES DO EXTRATO

FLS 297

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL

Razão Social/Nome: AR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 36.286.217/0001-57

Endereço Correspondêcia: Rua ZEFERINO CORREIA, 77 SALA 305 - CENTRO - Vitória da Conquista - BA CEP:

Inscrição Municipal: 589872

Endereço Imóvel: Rua ZEFERINO CORREIA, 77 SALA 305 - CENTRO - Vitória da Conquista - BA CEP: 45000520

DISCRIMINAÇÃO DO DÉBITO

Tipo: Dívida Ativa **Numero da Guia:**

Competência: **Declaração:**

Cód. Parcelamento: **Linha Digitável:**

Ano	Parcela	Data Lançamento	Venc. Original	Venc.	Situação	Processo
2023	0	28/09/2023	31/08/2023	30/11/2023	Parcelado	

Agrupamento: MULTA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Observação:

Tributo	Vlr Original	Juros	Multa	Correção	Desconto	Valor Total
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIV	76.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.246,00
Total Débito:	**76.246,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.246,00**

INFORMAÇÕES DA BAIXA

Data de Pagamento	Data Crédito	Valor Pago	Banco	Arq. Retorno
		R$0,00		

RELAÇÃO DE PARCELAMENTOS

Código Parcelamento	Data Parcelamento	Quantidades de Parcelas
00114044247	29/11/2023	60

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PMVC - CORREGEDORIA
FLS 298

Protocolo - **40110/2023**

Encaminha cópia da Decisão do PAI nº 068/2022 para expedição de DAM

Vitória da Conquista, 28 de novembro de 2023

Ao Ilmº. Sr. Regis Barreto Cortes

Gerência de Fiscalização- Secretaria Municipal de Finanças

Solicitamos a V. Sª. que seja verificado se houve o pagamento do DAM emitido expedido para recolhimento de MULTA, aplicada em razão do Processo Administrativo de Inadimplência nº 068/2022. Caso a empresa processada não tenha realizado o recolhimento, solicitamos que sejam tomadas as providências necessárias à inscrição da pessoa jurídica AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57, na Dívida Ativa do Município (não tributária) em virtude do não pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido para cobrança da penalidade de multa, perfazendo o total de R$ 76.246,00 (setenta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais).

Respeitosamente,

ADRIANA BORGES MAGALHÃES BARBOSA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
15062-8
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - STPC

Recebido
Em 29.11.2023
Marcos Paulo
09:22 horas

PMVC - CMTC - NUCAD
FLS 299

TERMO DE CONCLUSÃO

Certifico que foi concluído o Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022, por meio da Portaria CRGM nº 065/2022, de 01 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03 de novembro de 2022, devidamente publicada, para apuração de denúncia de infração cometida pela pessoa jurídica AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57, e que todas as partes interessadas tiveram ciência da decisão (fls.285 a 298). Isto posto, determino o **ENCERRAMENTO** dos autos do procedimento supracitado com a devida baixa e anotações de praxe.

Corregedoria Geral do Município, 01 de dezembro de 2023.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA ARAÚJO
CORREGEDOR GERAL DO MUNICÍPIO

PMVC - SMTC - NUCAD FLS 300

Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022
Denunciada: AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 36.286.217/0001-57
Denunciante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

TERMO DE ENCERRAMENTO

CERTIFICO que, nesta data, depois de concluídas as apurações do Processo Administrativo de Inadimplência n.º 068/2022, o qual resultou em multa no valor de R$ 76.246,00 (setenta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais) e impedimento de licitar e contratar com o município por 02 (dois) anos, fiz o encerramento dos autos contendo 300 (trezentas) laudas. Do que para constar, lavrei o presente termo.

Vitória da Conquista – BA, 01 de dezembro de 2023.

Adriana Borges Magalhães Barbosa
Auxiliar administrativo
Mat. 07-15062-8
